



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · CABIN DESIGN & ENGINEERING SYSTEM

MASTER PLAN

ZG-MP-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Plano completo do que tem de ser feito para fabricar e montar as quatro unidades da Zion Glamping Collection (Casulo, Safari, Lodge 38 e Cápsula) em quatro lotes independentes de contratação: 1 deck e infraestrutura · 2 estrutura metálica (serralheiro no Brasil) · 3 lonas, revestimentos e vidros (confeccionista e vidraceiro) · 4 mobílias. Tudo modular, transportável e montável em montanha sem guindaste e sem concreto. Este documento une os 16 lotes (anexos) num único pacote.

4

MODELOS

16

DOCUMENTOS DE LOTE

0

SOLDA OU CONCRETO EM CAMPO

≤ 120 kg

MAIOR PEÇA (4 PESSOAS)

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE DO MASTER PLAN

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZG-MP-01	Linha e estratégia	2
ZG-MP-02	Modularidade	3
ZG-MP-03	Cronograma e WBS	4
ZG-MP-04	Interfaces e responsabilidades	5
ZG-MP-05	Sequência integrada e riscos	6
ZG-MP-06	Validação e anexos	7

Anexos: os 16 documentos de lote seguem após a seção ZG-MP-06, cada um com a sua capa.

A LINHA E A ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO EM 4 LOTES

cada modelo é um kit; cada kit é comprado em quatro contratos separados e montado por uma equipe Zion

MODELO	FAMÍLIA	DIMENSÕES	M2 INT.	M2 DECK	DIAS DE MONTAGEM	CATEGORIA
ZION CASULO	Cabana biomórfica em casulo	9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m	48,0	29,9		12 SIGNATURE
ZION SAFARI	Cabana escultural de dois cumes	9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m	48,4	28,0		15 SIGNATURE
ZION LODGE 38	Pavilhão octogonal com Lanterna Zion	octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m	38,3	30,4		9 PREMIUM
ZION CÁPSULA	Cápsula monocoque transportável	8,40 x 3,20 x 3,20 m	19,9	8,3		3 PREMIUM

OS 4 LOTES

LOTE	CONTEÚDO	FORNECEDOR-TIPO	CONTRATO
1 · Deck e infra	Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização	fundações helicoidais + montadores + eletricista/encanador	por unidade, no sitio
2 · Estrutura metálica	Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil	serralheiro no Brasil com calandra CNC e galvanizador	por kit, em fábrica
3 · Lonas, revestimentos e vidros	Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros	confeccionista de membranas + vidraceiro + instaladores	por kit, em fábrica + instalação
4 · Mobílias	Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E	marcenaria CNC + FF&E + instalador	por unidade

POR QUE SEPARAR

Cada fornecedor cota só o que domina: o serralheiro não precisa entender de lona, o confeccionista recebe os padrões prontos e os ferros já definidos.

A Zion controla as interfaces com planilhas de as-built entre lotes e mantém o projeto (geometria única em geometry.py) como fonte de verdade.

Permite comprar em série (10 kits de ferro, 10 de lona) com fornecedores diferentes por região e montar onde não chega guindaste.

Cada lote tem seu RFQ, sua lista de materiais e seu checklist de aceite; os preços ficam em documento interno.

REGRA DE OURO


Se eu entregar isto a uma fábrica amanhã, ela entende o que fabricar, pergunta o que falta e devolve orçamento? Cada documento de lote foi escrito para responder sim; onde depende de cálculo ou norma, está marcado **⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**.

MODULARIDADE PARA SÍTIOS DE MONTANHA

regras que valem para os 4 modelos e os 4 lotes: ferros, lonas, vidros e mobílias

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N-m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

CADEIA DE TRANSPORTE




EXCEÇÃO: CÁPSULA

A Cápsula viaja inteira (8,4 x 3,2 x 3,2 m, ≈ 4,2 t) em caminhão-prancha e pousa com munck de 8 t ou por guincho e trilhos: exige acesso de caminhão até 30 m do ponto de pouso. Em sítios sem esse acesso, usar Casulo, Safari ou Lodge.

CRONOGRAMA-ALVO DA PRIMEIRA UNIDADE (SEMANAS)

da liberação do projeto executivo à entrega · unidades seguintes em série: lotes 2 a 4 em paralelo, 1 unidade a cada 2 semanas por equipe de montagem

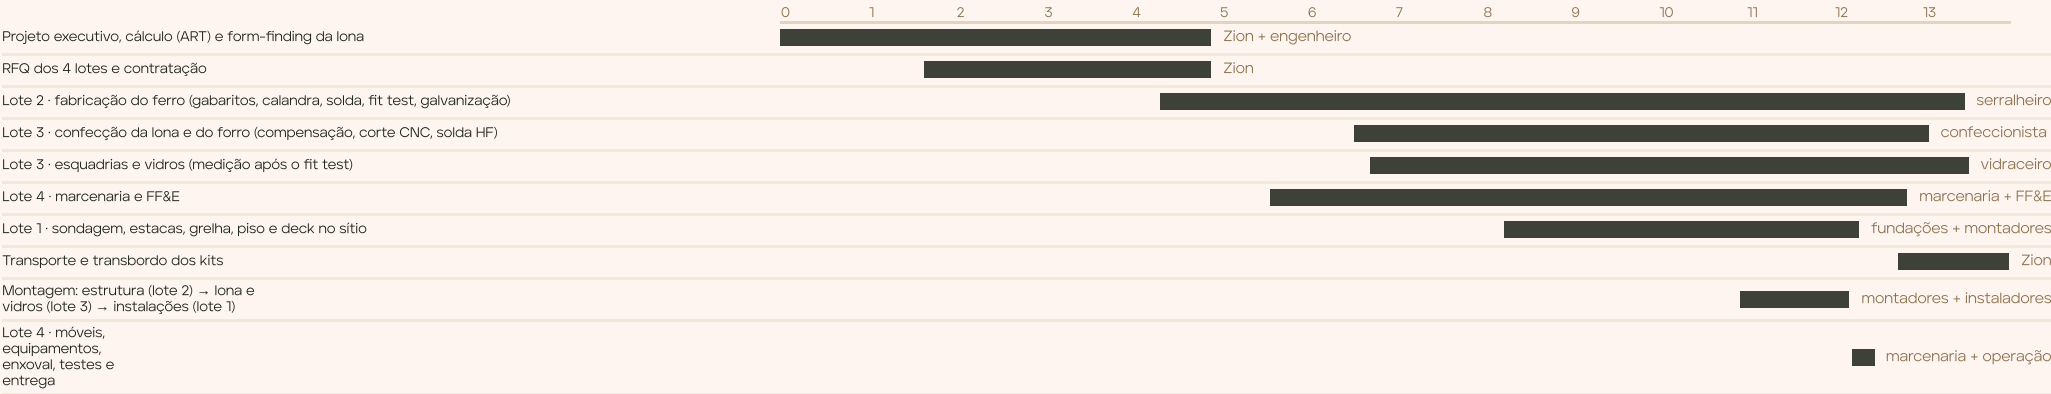

WBS · ESTRUTURA ANALÍTICA

NÍVEL 1	NÍVEL 2	ENTREGÁVEL	DOCUMENTO
Projeto	Executivo e cálculo	ART / RRT, form-finding, DXF finais	ZG-TEC-001, ZC-INT-001, -LON-001
Compras	4 RFQs por modelo	contratos, amostras, fit test	-LOT1.4-RFQ
Fábrica	Lotes 2, 3 e 4	kits etiquetados, listas de volumes	-LOT2/3/4-001
Sítio	Lote 1 + montagem	as-built da fundação e da grelha; relatório de esquadro; teste de água; entrega	-LOT1-001, manual 17 etapas
Operação	Entrega	manual do operador, inventário, garantias	checklist de entrega

MATRIZ DE INTERFACES ENTRE LOTES

o que cada lote entrega ao seguinte, com tolerância e documento de passagem

INTERFACE	ENTREGA E TOLERÂNCIA	DOCUMENTO DE PASSAGEM
Lote 1 → Lote 2	Posição dos apoios (chapas de base / cabeçotes) ± 10 mm, nível ± 5 mm, diagonais ± 10 mm; furos M16 nas vigas de borda	As-built da grelha assinado pelo líder
Lote 2 → Lote 3	Topo dos arcos / cumes / anel ± 15 mm; prumo 1/500; perfis keder, clamps e trilhos de harpão instalados; sem rebarbas; presilhas e olhais nas posições	Relatório de esquadro e liberação para a lona (etapa 7 do manual)
Lote 3 → Lote 4	Envelope fechado e estanque (teste de água 15 min); forro tensionado; requadros dos Olhos; vidros instalados	Checklist de estanqueidade
Lote 1 → Lote 3	Trilhos de base e calha ligados aos tubos de queda; alimentação para LED do rodapé	Teste de escoamento
Lote 1 → Lote 4	Pontos de água / esgoto da mini cozinha e do banho; tomadas dedicadas (cooktop 20 A, forno 16 A); dutos e difusores	Teste hidráulico e elétrico
Lote 2 → Lote 4	Talões e cantoneiras nos arcos / pilares para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha	Gabarito conferido em fábrica
Lote 3 (lona) → Lote 3 (vidros)	Vidraceiro mede na estrutura montada (após o fit test ou no sítio) antes de cortar: tolerância ± 3 mm	Planilha de medidas

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PACOTE	EXECUTA	APOIA / INSPECIONA	VALIDA
Projeto e geometria	Zion (este repositório)	engenheiro (ART)	fornecedores comentam
Fundação e grelha	empreiteiro de estacas + montadores	Zion (líder)	engenheiro
Ferro	serralheiro	Zion (inspeção em fábrica)	galvanizador
Lona e forro	confeccionista	instaladores de membrana	Zion
Vidros	vidraceiro	Zion	—
Móveis e FF&E	marcenaria + fornecedores	Zion (curadoria)	operação
Montagem no sítio	líder + 4 montadores Zion	eletricista / encanador locais	engenheiro (vistoria)
Entrega e operação	Zion	operador do glamping	—

SEQUÊNCIA INTEGRADA DE MONTAGEM

as 17 etapas do manual, com o lote responsável; vale para Casulo, Safari e Lodge (a Cápsula segue as 6 etapas do seu lote 1)

ETAPA	O QUE	LOTE
01	Preparação e locação	1
02	Estacas helicoidais	1
03	Grelha de vigas	1
04	Módulos de piso e deck	1
05	Estrutura principal (arcos / mastros / pilares / anéis)	2
06	Travamentos, cabos, espinha, terças	2
07	Conferência de esquadro e liberação	2
08	Lona externa	3
09	Isolamento e refletiva	3
10	Forro interno	3
11	Portas e vidros	3
12	Elétrica	1
13	Hidráulica	1
14	Banho (louças, metais, banheira)	4
15	Marcenaria e móveis	4
16	Acabamentos e enxoval	4
17	Testes e entrega	todos

LÓGICA INVERSA · O QUE NÃO PODE ACONTECER

ERRO	CONSEQUÊNCIA	ANTÍDOTO
Estrutura fora de geometria antes da lona	rugos, sobretensão, lona reprovada	etapa 7 obrigatória com estação total; liberação assinada
Peça que não cabe no 4x4	kit parado na estrada	regra ≤ 4,80 m / ≤ 400 kg por volume aplicada nas listas de peças
Solda em campo	galvanização destruída, corrosão	todas as ligações parafusadas; peças chegam prontas
Lona cortada sem compensação / sem form-finding	lona curta ou frouxa	confeccionista entrega padronagem e laudo biaxial antes de cortar
Vidro medido no projeto e não na estrutura	vidro não encaixa	medição após fit test ou no sitio, ± 3 mm
Cooktop e forno sem circuito dedicado	disjuntor geral desarma	C13 e C14 dedicados, ramal 16 mm2, geral 50 A
Marcenaria fixada na membrana	furos, infiltração	só cantoneiras nos arcos; gabarito da seção
Vento durante içamento / lona	acidente	limite 30 km/h; anemômetro no sitio
Concreto em montanha	custo e prazo	estacas helicoidais ou sapatas pré-moldadas

VALIDAÇÃO DE ENGENHARIA E PRÓXIMOS PASSOS

o que precisa de engenheiro antes de contratar · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

Cálculo estrutural (NBR 8800 / 6123): arcos, Bico em balanço, mastros e coroas, pilares e caibros, anéis, cabos; fundações por sondagem

Form-finding e análise da membrana (pré-tensão, flechas, uplift); compensação do tecido

Projeto elétrico e hidráulico executivo (NBR 5410 / 5626); climatização

Projeto legal e aprovação municipal / ambiental por sítio

Revisão REV 01: consolidar as respostas do brief (ZG-BRF-001) e os interiores dos outros 3 modelos

ÍNDICE DOS ANEXOS · 16 DOCUMENTOS DE LOTE

DOCUMENTO	MODELO	LOTE	PÁGINAS
ZC-LOT1-001	ZION CASULO	LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA	15
ZC-LOT2-001	ZION CASULO	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA	16
ZC-LOT3-001	ZION CASULO	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS	35
ZC-LOT4-001	ZION CASULO	LOTE 4 · MOBÍLIAS	12
ZS-LOT1-001	ZION SAFARI	LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA	15
ZS-LOT2-001	ZION SAFARI	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA	13
ZS-LOT3-001	ZION SAFARI	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS	25
ZS-LOT4-001	ZION SAFARI	LOTE 4 · MOBÍLIAS	8
ZL-LOT1-001	ZION LODGE 38	LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA	14
ZL-LOT2-001	ZION LODGE 38	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA	14
ZL-LOT3-001	ZION LODGE 38	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS	15
ZL-LOT4-001	ZION LODGE 38	LOTE 4 · MOBÍLIAS	8
ZK-LOT1-001	ZION CÁPSULA	LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA	9
ZK-LOT2-001	ZION CÁPSULA	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA	11
ZK-LOT3-001	ZION CÁPSULA	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS	21
ZK-LOT4-001	ZION CÁPSULA	LOTE 4 · MOBÍLIAS	8

Arquivos separados em 06_LOTES/ (HTML e PDF por lote) e anexados a seguir, na ordem Casulo → Safari → Lodge 38 → Cápsula, lotes 1 a 4.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CASULO · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZC-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO Sem preços: PREÇO A COTAR Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picafe 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

44 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-3,30	-2,60
F02	-3,30	-1,30
F03	-3,30	0,00
F04	-3,30	1,30
F05	-3,30	2,60
F06	-1,10	-2,60
F07	-1,10	-1,30
F08	-1,10	0,00
F09	-1,10	1,30
F10	-1,10	2,60
F11	0,90	-1,30
F12	0,90	0,00
F13	0,90	1,30
F14	2,10	-2,60
F15	2,10	-1,30
F16	2,10	0,00
F17	2,10	1,30
F18	2,10	2,60
F19	3,30	-2,60
F20	3,30	-1,30
F21	3,30	0,00
F22	3,30	1,30

PONTO	X (M)	Y (M)
F23	3,30	2,60
F24	4,50	-2,60
F25	4,50	-1,30
F26	4,50	0,00
F27	4,50	1,30
F28	4,50	2,60
F29	5,70	-2,60
F30	5,70	-1,30
F31	5,70	0,00
F32	5,70	1,30
F33	5,70	2,60
F34	6,90	-2,60
F35	6,90	-1,30
F36	6,90	0,00
F37	6,90	1,30
F38	6,90	2,60
F39	8,10	-1,30
F40	8,10	0,00
F41	8,10	1,30
F42	9,00	-1,30
F43	9,00	0,00
F44	9,00	1,30

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	5	4,60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	29,9	150	Corte + furação Ø14	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02
A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A02 por D06 + 4 M12
A04	Viga transversal T1 a T10	10	6,50	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	42,2	422	Corte + furação Ø14	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos
A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Idem A05
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
A08	Trilho de base direito	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Idem A07 em A06
A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	1	2,10	U 150 x 60 x 3,0 calandrado	ZAR-230 galv. Z275	13,7	14	Calandra + furação	Cantoneira D07 + M12
F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	44	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	809	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	44	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	97	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (malha 2,4 m, piso + deck)	m	128	832	PREÇO A COTAR
Vigotas 50 x 150 tratadas a cada 400 mm	m	195	732	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	48	101	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	48	576	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	35	313	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	13	390	PREÇO A COTAR
Deck cumaru 20 x 140 com fixação oculta	m2	30	598	PREÇO A COTAR

Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes	un	44	827	PREÇO A COTAR
---	----	----	-----	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 12k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	95	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 23 L/min (ou bomba de calor 200 L)	un	1	25	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico, cabos, fitas LED, luminárias, tomadas	cj	1	70	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação / caixa de gordura	cj	1	45	PREÇO A COTAR
Exaustor com recuperação de calor + respiro de cumeeira	cj	1	15	PREÇO A COTAR


ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m - 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01

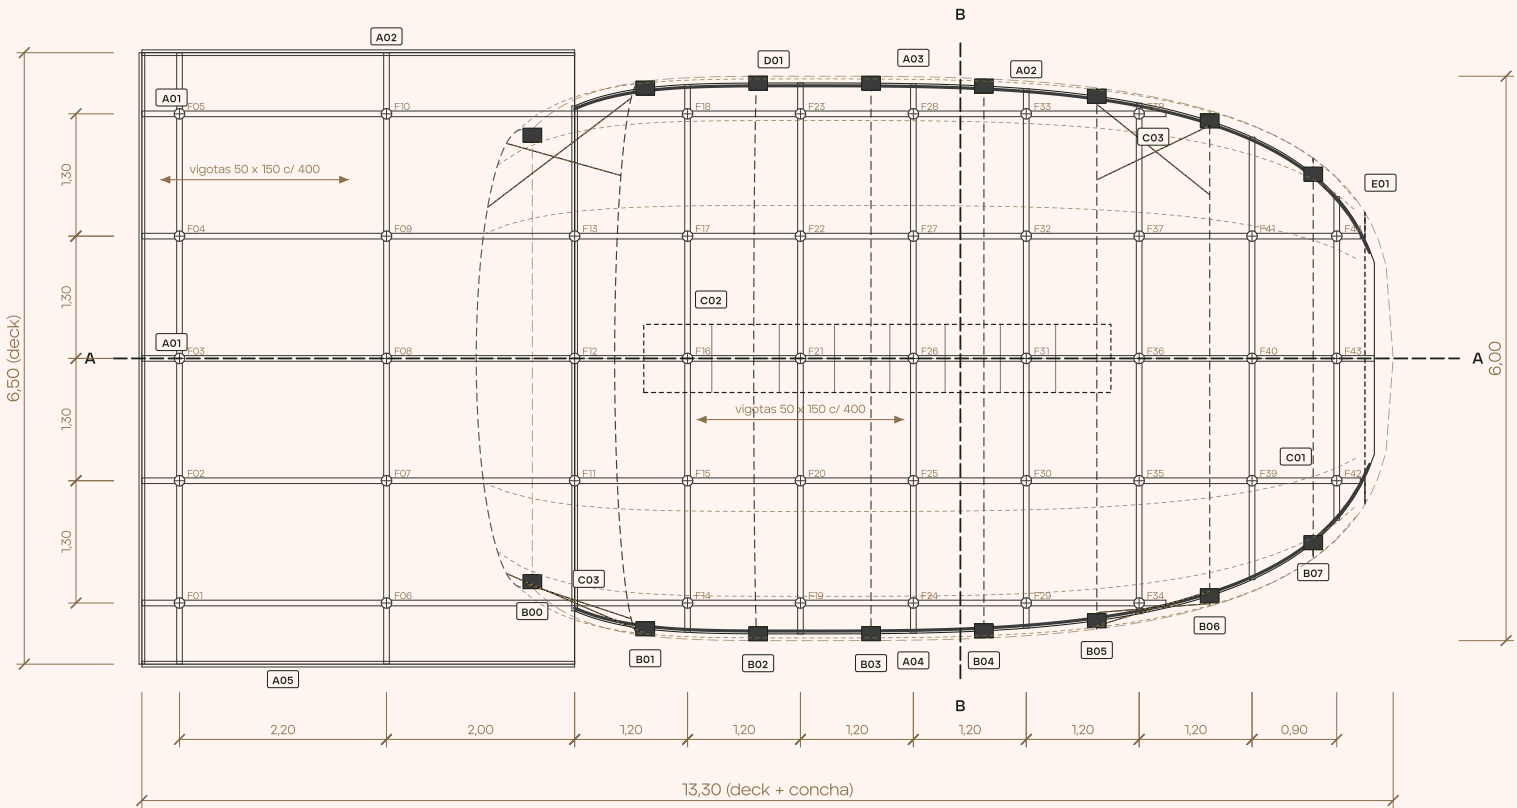

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03b/27 SET 2026



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO


Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

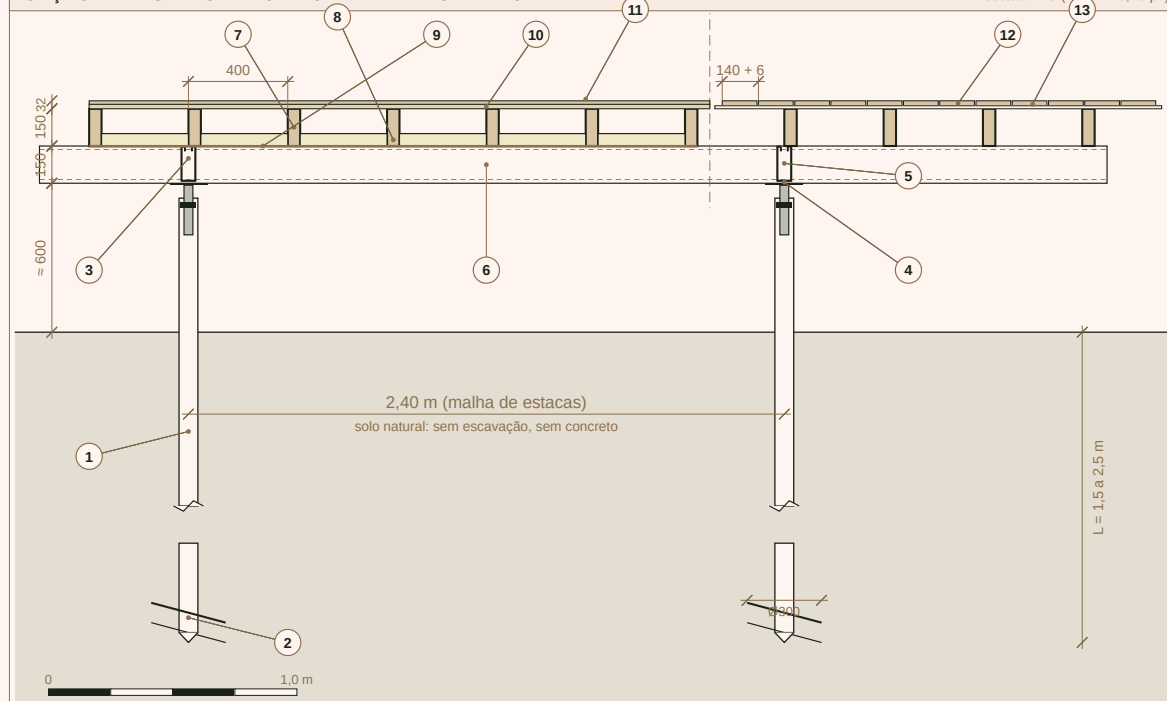

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EJEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

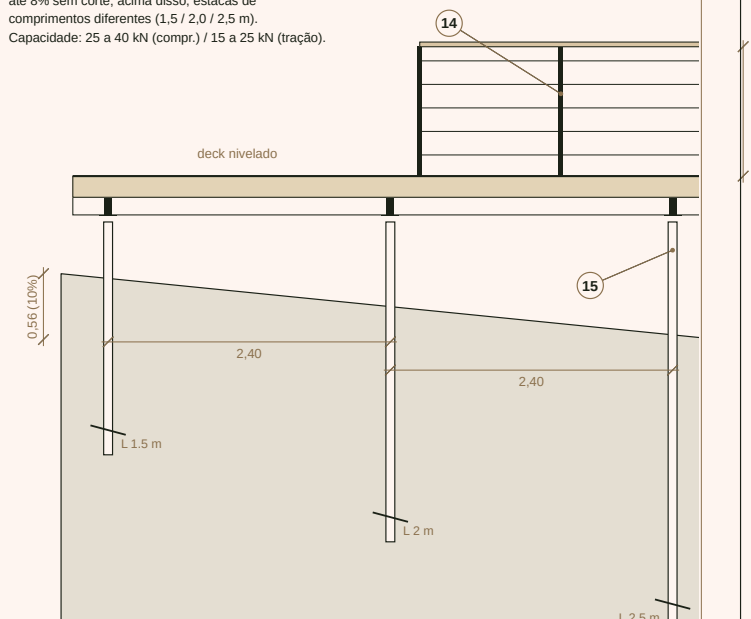

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico | 9 | Manta de fechamento inferior (respirável, anti-odores) grampeada às vigotas |
| 2 | Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica: L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem | 10 | Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas |
| 3 | Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento | 11 | Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato |
| 4 | Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U | 12 | Deck externo: cumaru ou termotratado 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta |
| 5 | Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas) | 13 | Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno) |
| 6 | Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari) | 14 | Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira |
| 7 | Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto) | 15 | Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado |
| 8 | Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado | | |



ESCALA
1:20 / 1:50




FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

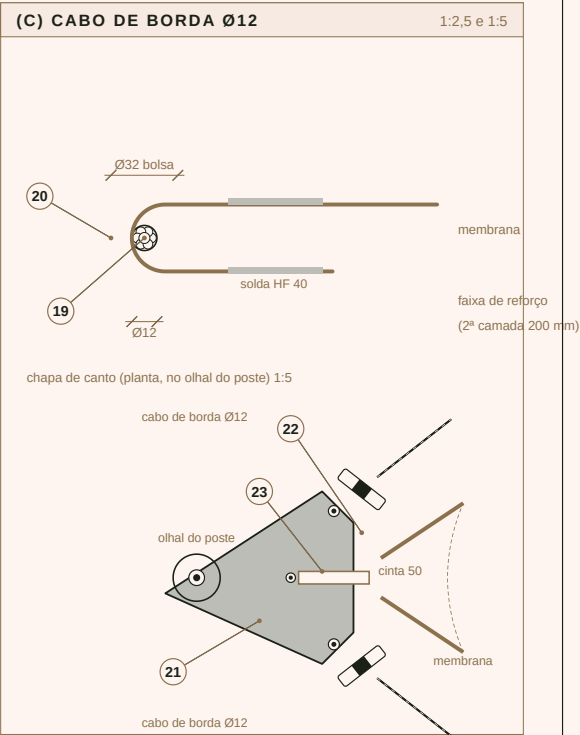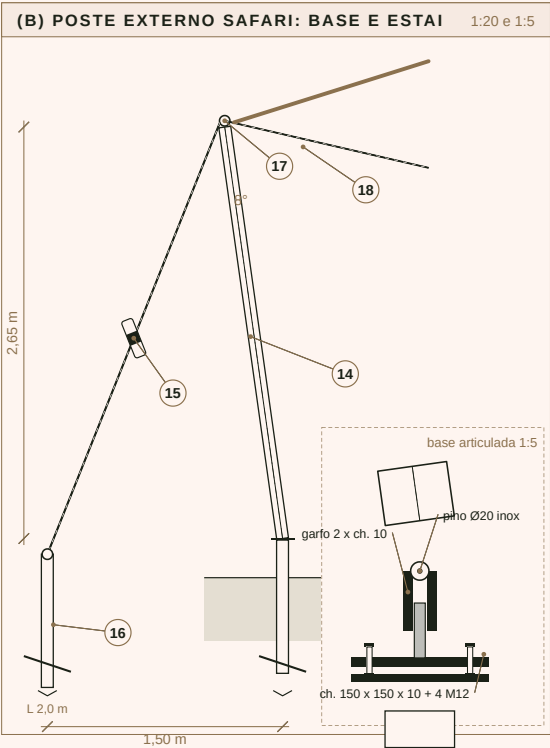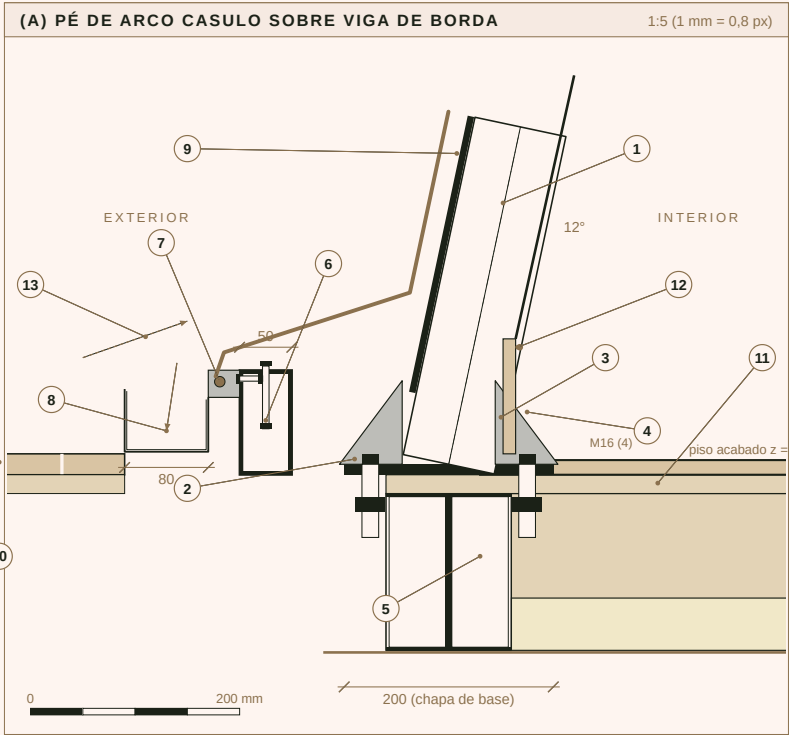

LEGENDA




- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL
Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

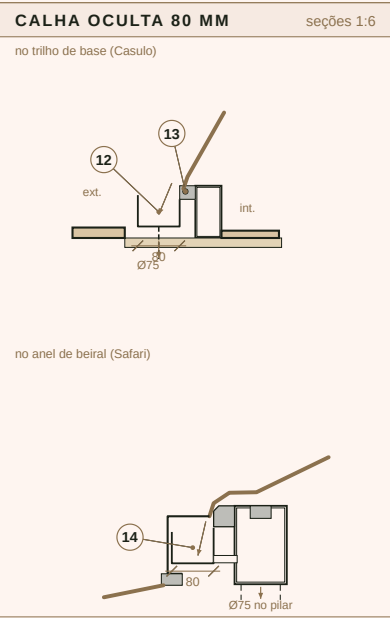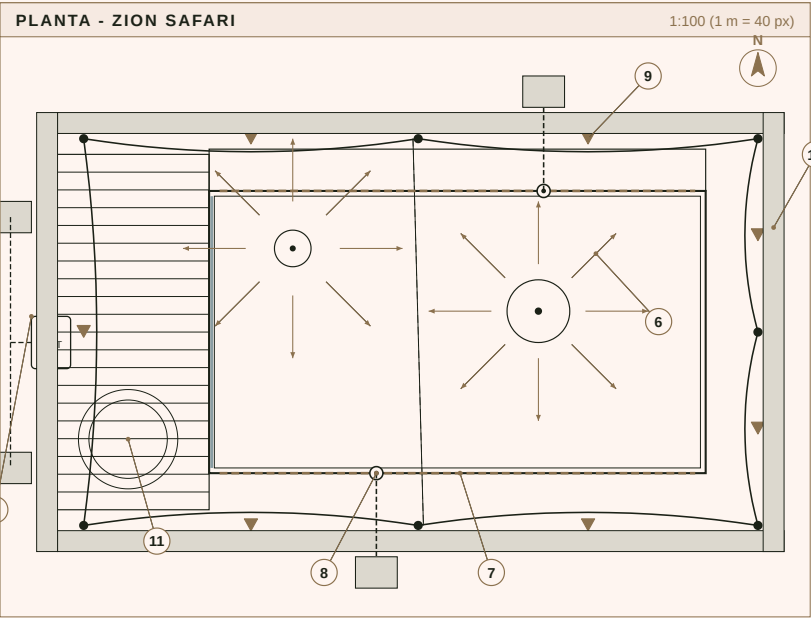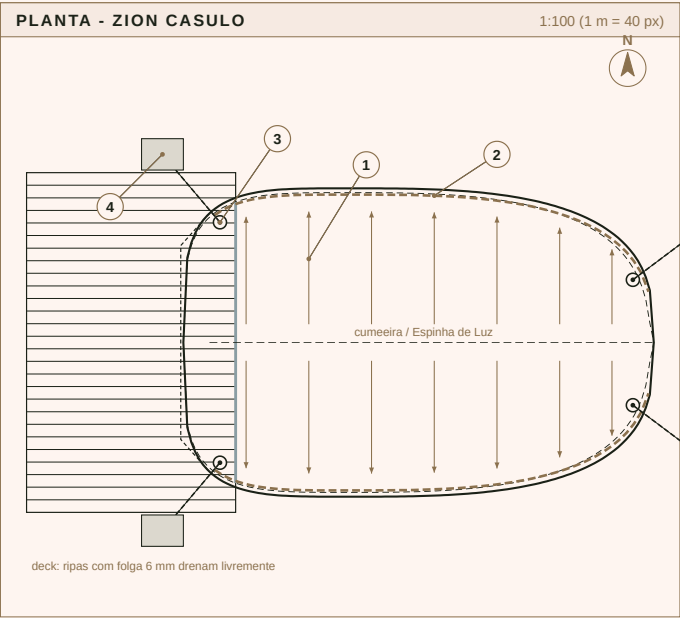

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026


INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08


PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

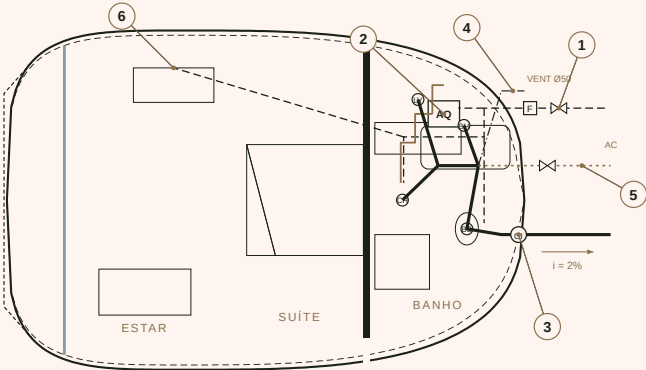


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100

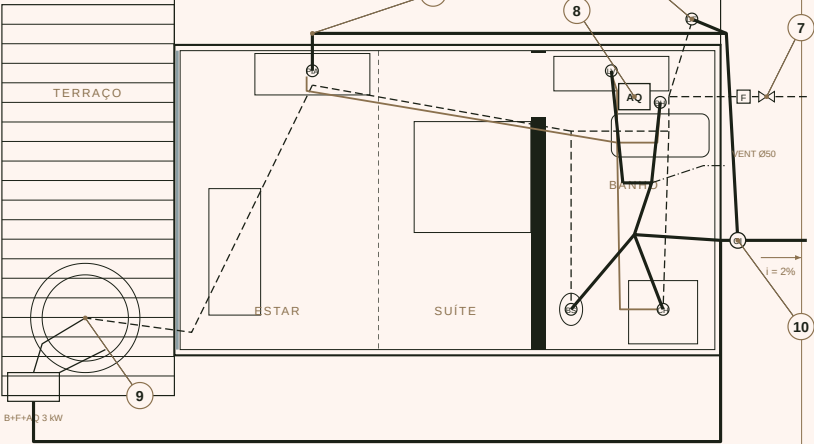

ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)

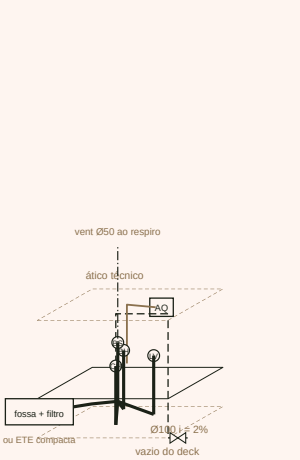

ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com siões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1

Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2

Aquecedor no ático técnico
- 3

Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4

Coluna de ventilação Ø50
- 5

Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6

Ponto de água do minibar (estar)
- 7

Entrada AF Safari pelos fundos
- 8

Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9

Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10

CI e saída do coletor pelos fundos
- 11

Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12

Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
-

águas cinzas (opcional)
- ⊗

registro / válvula

- LV

lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS

bacia PIA ilha do café DE ducha ext.
- CI

caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA DET-08	DATA SET 2026




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100

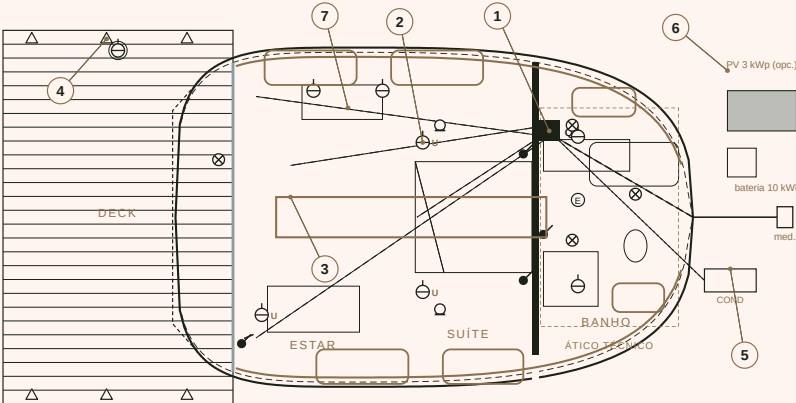

PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100


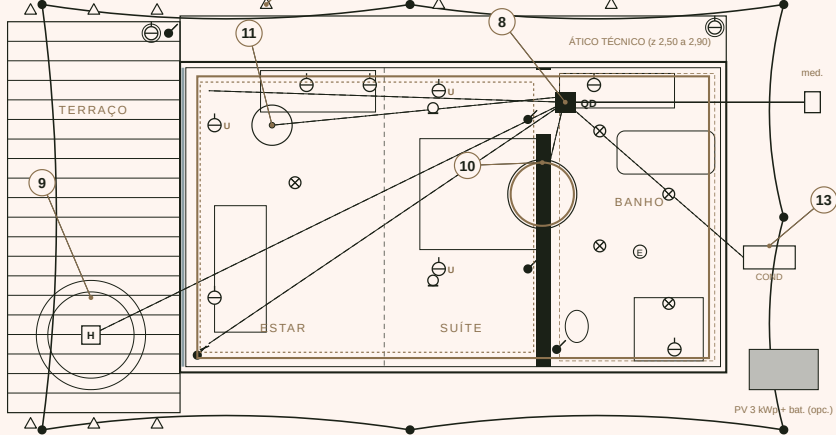


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO SAFARI)

sem escala

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



- C1 Climatização (evaporadora + condensadora)
- C2 Aquecedor de água / bomba de calor
- C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB
- C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V
- C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)
- C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)
- C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)
- C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)

disj.	cabo	curva / proteção
20 A	4 mm²	C
25 A	6 mm²	C
20 A	2,5 mm²	B
10 A	1,5 mm²	B
20 A	2,5 mm²	B + DR 30 mA
32 A	6 mm²	C + DR 30 mA
10 A	1,5 mm²	B + DR 30 mA
20 A	4 mm²	C

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- 1 Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- 2 Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- 3 Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- 4 Balizadores de deck 12 V
- 5 Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- 6 Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- 7 Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- 8 QD 16 módulos no ático do banho
- 9 Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- 10 Fita LED no anel do forro do Óculo
- 11 Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- 12 Balizadores no terraço e na passarela
- 13 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 14 DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMUM

ESCALA
1:100 / sem escala

FOLHA
DET-07

DATA
SET 2026


 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09


PLANTA - ZION CASULO (12.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100

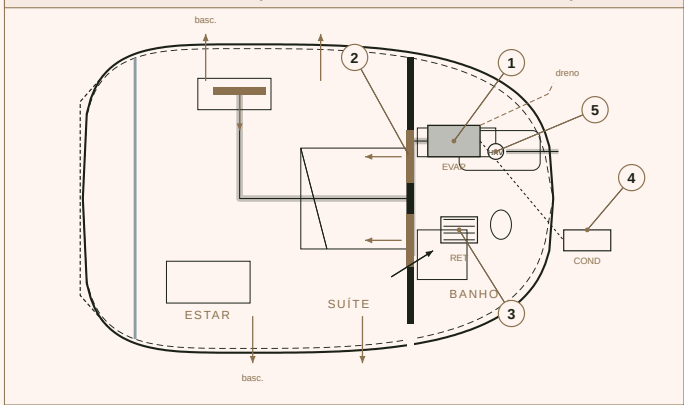

PLANTA - ZION SAFARI (18.000 BTU INVERTER, DUTADO)


1:100

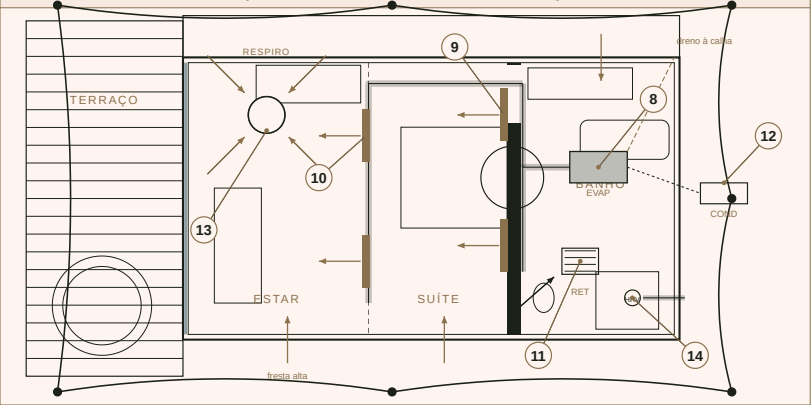


LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura

SEÇÃO LONGITUDINAL - CASULO (VENTILAÇÃO E AR) 1:75 (1 m = 50 px)

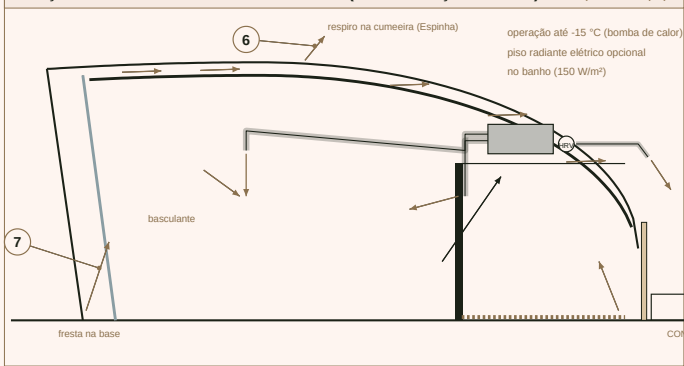

SEÇÃO LONGITUDINAL - SAFARI (VENTILAÇÃO E AR) ≈ 1:95 (1 m = 40 px)

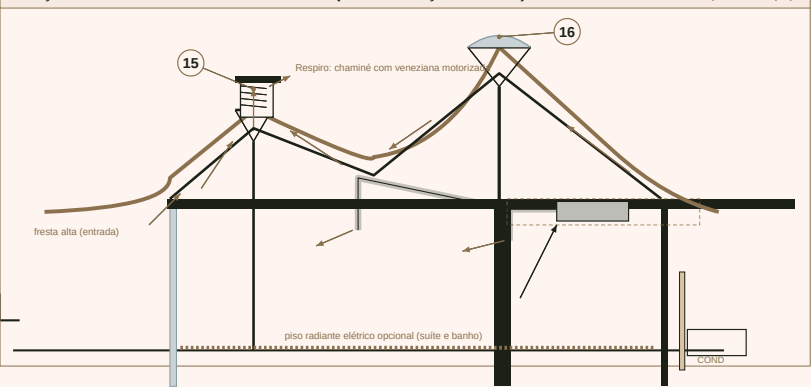

Notas

Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

ZION GLAMPING COLLECTION
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os MT2 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 18 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.

Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.

Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.

Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.

Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.

Prazo por etapa e equipe proposta
4.

Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
- Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
- Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
- Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CASULO · LOTE 2 DE 4

LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZC-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes $\leq 2,4 \times 1,2 \times 1,2$ m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

48 tipos de peça · peso total ≈ 1.602 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)
B00-D	Anel frontal A0, metade direita	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Idem	Idem
B09	Bico: cumeeira em balanço (de A1 à ponta, 2,40 m além de A0)	1	3,89	Tubo Ø114,3 x 4,0 curvado (ponta erguida 0,30 m)	ASTM A500 Gr. B galv.	45,4	45	Calandra suave + chapas de engaste soldadas	Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm + 4 M16 cada (nó de momento) ⚠️
B10-E	Bico: tubo de borda esquerdo (ponta → anel A0)	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Curvamento CNC por gabarito 3D + ponteiros	Nó soldado na ponta (B09) + chapa D01-B no anel A0 (2 M12)
B10-D	Bico: tubo de borda direito	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Idem	Idem
B11	Bico: costela intermediária (a 50 % do balanço)	1	6,98	Tubo Ø48,3 x 3,0 curvado	ASTM A500 Gr. B galv.	24,0	24	Curvamento CNC + ponteiros M16	Talão D03 na cumeeira e nas bordas
B12	Bico: tirante Ø12 inox (cumeeira a 60 % → anel A0 a ±0,80 rad)	2	2,58	Cabo inox AISI 316 Ø12 7 x 19	inox 316	2,4	5	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M16 inox
B01-E	Arco A1, perna esquerda	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	1	3,70	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,0	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B01-D	Arco A1, perna direita	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Idem perna esquerda	Idem
B02-E	Arco A2, perna esquerda	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	1	3,73	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B02-D	Arco A2, perna direita	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Idem perna esquerda	Idem
B03-E	Arco A3, perna esquerda	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	1	3,72	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B03-D	Arco A3, perna direita	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Idem perna esquerda	Idem
B04-E	Arco A4, perna esquerda	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	1	3,64	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,6	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B04-D	Arco A4, perna direita	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Idem perna esquerda	Idem
B05-E	Arco A5, perna esquerda	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	1	3,46	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	26,2	26	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B05-D	Arco A5, perna direita	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Idem perna esquerda	Idem
B06-E	Arco A6, perna esquerda	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	1	3,12	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	23,6	24	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B06-D	Arco A6, perna direita	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Idem perna esquerda	Idem
B07-E	Arco A7, perna esquerda	1	2,69	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	1	2,53	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	19	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas

B07-D	Arco A7, perna direita	1	2,69	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Idem perna esquerda	Idem
B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	1	7,50	Tubo Ø60,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	31,8	32	Solda em gabarito	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7
C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	49	1,20	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,4	217	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca
C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	14	0,98	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,7	52	Idem	Idem
C03	Espinha de Luz (treliça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	2	2,35	Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	38	Solda em gabarito; berços de vidro D08	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada
C04	Cabo de contraventamento em X	8	6,00	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	2,2	17	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox
D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	18	0,20	Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8	ASTM A36 galv.	2,6	47	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	16	0,20	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	1,3	21	Corte + furação; soldada dentro da perna	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6
D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	56	0,06	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,1	8	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Recebe a ponteira M16 das terças
D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	44	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	62	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	4 M12 8.8 na mesa da viga U
D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	8	0,08	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,3	2	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Manilha inox
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	20	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	16	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	60	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	54	Corte + furação	2 M12 em cada aba
D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	8	0,12	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	0,2	2	Corte + dobra + solda na treliça	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	10,68	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	alumínio	9,6	77	Extrusão + calandra	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	3,00	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	4,8	29	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	0,04	Inox 304	inox 304	0,0	9	Estampada	M8 inox rosqueado em inserto no arco
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	23	Extrusão + corte	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	1,60	Lâminas de eucalipto colado	madeira laminada	9,0	54	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	4,20	Chapa A36 curvada	ASTM A36 galv.	6,0	36	Corte laser + calandra + solda nas terças	Solda de fábrica
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	5,10	Alumínio 6063-T6 calandrado	alumínio	12,8	26	Calandra + usinagem	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00

GEOMETRIA DOS ARCOS · TABELA PARA A CALANDRA

todos os arcos são elipses com centro a 0,75 m do piso (um gabarito com ajuste de raio) · A0 é inclinado 8° e recebe o engaste da cumeeira do Bico

ARCO	X (M)	TUBO	A (M)	B (M)	TOPO Z (M)	VÃO NO PISO (M)	L DESENV. (M)	SEGMENTOS E / C / D (M)	PLANO
A0	0,45	Ø101,6 x 4,0	2,434	3,375	4,12	4,75	10,69	3,63 / 3,42 / 3,63	inclinado 8° (topo avança 0,60 m)
A1	1,65	Ø88,9 x 3,6	2,946	3,424	4,17	5,75	11,53	3,92 / 3,69 / 3,92	no plano vertical
A2	2,85	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,447	4,20	5,86	11,65	3,96 / 3,73 / 3,96	no plano vertical
A3	4,05	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,433	4,18	5,85	11,62	3,95 / 3,72 / 3,95	no plano vertical
A4	5,25	Ø88,9 x 3,6	2,973	3,309	4,06	5,79	11,38	3,87 / 3,64 / 3,87	no plano vertical
A5	6,45	Ø88,9 x 3,6	2,876	3,049	3,80	5,58	10,82	3,68 / 3,46 / 3,68	no plano vertical
A6	7,65	Ø88,9 x 3,6	2,635	2,607	3,36	5,05	9,76	3,32 / 3,12 / 3,32	no plano vertical
A7	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,129	1,917	2,67	3,92	7,91	2,69 / 2,53 / 2,69	no plano vertical

Segmentação: perna esquerda 34 %, coroa 32 %, perna direita 34 % do comprimento desenvolvido, luvas internas Ø76,1 x 200 (D02) nas emendas; pés com chapa 200 x 150 x 10 (D01). Marcação: A3-E / A3-C / A3-D. Tolerância de calandra: ± 5 mm no gabarito de bancada, ± 15 mm no topo montado.

COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO

pontos (y; z) no plano do arco a cada 0,50 m de comprimento desenvolvido, da base direita (y < 0) ao topo e à base esquerda · origem no eixo do piso

ARCO A0			ARCO A1			ARCO A2			ARCO A3		
S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z
0,00	2,373	0,000	0,00	2,874	0,000	0,00	2,928	0,000	0,00	2,926	0,000
0,50	2,427	0,497	0,50	2,938	0,496	0,50	2,991	0,496	0,50	2,991	0,496
1,00	2,427	0,997	1,00	2,938	0,995	1,00	2,992	0,995	1,00	2,991	0,995
1,50	2,374	1,493	1,50	2,876	1,491	1,50	2,929	1,491	1,50	2,928	1,491
2,00	2,266	1,981	2,00	2,751	1,975	2,00	2,804	1,975	2,00	2,802	1,974
2,50	2,101	2,453	2,50	2,563	2,438	2,50	2,616	2,437	2,50	2,612	2,436
3,00	1,876	2,899	3,00	2,313	2,870	3,00	2,365	2,870	3,00	2,360	2,868
3,50	1,588	3,307	3,50	2,002	3,261	3,50	2,055	3,261	3,50	2,048	3,258
4,00	1,234	3,659	4,00	1,634	3,599	4,00	1,688	3,600	4,00	1,679	3,594
4,50	0,815	3,930	4,50	1,214	3,869	4,50	1,270	3,873	4,50	1,259	3,865
5,00	0,343	4,091	5,00	0,753	4,060	5,00	0,811	4,069	5,00	0,799	4,059
5,50	-0,154	4,118	5,50	0,264	4,160	5,50	0,323	4,177	5,50	0,311	4,164
6,00	-0,640	4,006	6,00	-0,236	4,163	6,00	-0,176	4,191	6,00	-0,188	4,176
6,50	-1,081	3,773	6,50	-0,726	4,068	6,50	-0,669	4,111	6,50	-0,680	4,093
7,00	-1,461	3,449	7,00	-1,189	3,882	7,00	-1,138	3,940	7,00	-1,149	3,921
7,50	-1,774	3,060	7,50	-1,612	3,616	7,50	-1,569	3,688	7,50	-1,580	3,668
8,00	-2,023	2,627	8,00	-1,983	3,282	8,00	-1,952	3,368	8,00	-1,962	3,347
8,50	-2,210	2,164	8,50	-2,297	2,893	8,50	-2,280	2,991	8,50	-2,288	2,969
9,00	-2,339	1,681	9,00	-2,551	2,463	9,00	-2,548	2,569	9,00	-2,555	2,547
9,50	-2,413	1,187	9,50	-2,742	2,002	9,50	-2,755	2,114	9,50	-2,761	2,091
10,00	-2,434	0,687	10,00	-2,871	1,519	10,00	-2,899	1,636	10,00	-2,903	1,612
10,50	-2,400	0,189	10,50	-2,936	1,023	10,50	-2,980	1,143	10,50	-2,981	1,119
			11,00	-2,939	0,524	11,00	-2,998	0,644	11,00	-2,997	0,619
			11,50	-2,880	0,028	11,50	-2,953	0,146	11,50	-2,948	0,122

COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO

pontos (y; z) no plano do arco a cada 0,50 m de comprimento desenvolvido, da base direita (y < 0) ao topo e à base esquerda · origem no eixo do piso

ARCO A4			10,50	-2,971	0,880	9,00	-2,701	1,796	8,00	-2,446	1,721
S	Y	Z	11,00	-2,955	0,381	9,50	-2,826	1,313	8,50	-2,588	1,243
0,00	2,896	0,000	ARCO A5			10,00	-2,875	0,816	9,00	-2,635	0,746
0,50	2,964	0,495	S	Y	Z	10,50	-2,847	0,317	9,50	-2,586	0,249
1,00	2,965	0,995	0,00	2,788	0,000	ARCO A6			ARCO A7		
1,50	2,898	1,490	0,50	2,866	0,493	S	Y	Z	S	Y	Z
2,00	2,763	1,971	1,00	2,867	0,993	0,00	2,524	0,000	0,00	1,959	0,000
2,50	2,562	2,428	1,50	2,791	1,487	0,50	2,622	0,489	0,50	2,107	0,476
3,00	2,297	2,851	2,00	2,639	1,962	1,00	2,624	0,989	1,00	2,115	0,974
3,50	1,970	3,229	2,50	2,413	2,408	1,50	2,530	1,479	1,50	1,980	1,454
4,00	1,586	3,549	3,00	2,119	2,811	2,00	2,344	1,942	2,00	1,720	1,879
4,50	1,154	3,799	3,50	1,761	3,160	2,50	2,072	2,361	2,50	1,360	2,224
5,00	0,685	3,970	4,00	1,349	3,442	3,00	1,726	2,720	3,00	0,929	2,475
5,50	0,193	4,052	4,50	0,894	3,648	3,50	1,318	3,008	3,50	0,452	2,623
6,00	-0,307	4,041	5,00	0,410	3,768	4,00	0,863	3,213	4,00	-0,045	2,666
6,50	-0,795	3,938	5,50	-0,089	3,797	4,50	0,377	3,330	4,50	-0,540	2,604
7,00	-1,257	3,748	6,00	-0,584	3,735	5,00	-0,122	3,354	5,00	-1,010	2,437
7,50	-1,679	3,481	6,50	-1,060	3,584	5,50	-0,616	3,285	5,50	-1,431	2,169
8,00	-2,050	3,147	7,00	-1,501	3,351	6,00	-1,089	3,124	6,00	-1,775	1,808
8,50	-2,363	2,758	7,50	-1,895	3,043	6,50	-1,523	2,878	6,50	-2,014	1,371
9,00	-2,614	2,326	8,00	-2,231	2,674	7,00	-1,903	2,554	7,00	-2,124	0,885
9,50	-2,800	1,862	8,50	-2,502	2,254	7,50	-2,214	2,164	7,50	-2,091	0,387
10,00	-2,919	1,377									

BICO · CUMEEIRA EM BALANÇO, TUBOS DE BORDA, COSTELA E TIRANTES

coordenadas 3D (x; y; z) dos eixos dos tubos · cumeeira Ø114,3 x 4,0 (3,89 m) · borda Ø60,3 x 3,0 (4,24 m cada) · costela Ø48,3 (6,98 m) · tirantes Ø12 inox (2,58 m cada) · ⚠
VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CUMEEIRA B09 (de A1 à ponta)

X	Y	Z
1,332	0,000	4,089
-0,134	0,000	4,040
-0,284	0,000	4,044
-0,434	0,000	4,053
-0,584	0,000	4,064
-0,734	0,000	4,077
-0,884	0,000	4,092
-1,034	0,000	4,109
-1,184	0,000	4,127
-1,334	0,000	4,146
-1,484	0,000	4,166
-1,634	0,000	4,188
-1,784	0,000	4,211
-1,934	0,000	4,235
-2,084	0,000	4,259
-2,234	0,000	4,285
-2,384	0,000	4,312
-2,534	0,000	4,340

Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm com 4 M16 (nó de momento); ponta com tampão e olhal; presilhas da lona a cada 300 mm.

TUBO DE BORDA B10 (da lateral direita à esquerda, passando pela ponta)

X	Y	Z
0,147	2,144	2,094
-0,455	1,930	2,672
-0,944	1,642	3,193
-1,389	1,292	3,635
-1,800	0,891	3,980
-2,181	0,455	4,217
-2,534	0,000	4,340
-2,181	-0,455	4,217
-1,800	-0,891	3,980
-1,389	-1,292	3,635
-0,944	-1,642	3,193
-0,455	-1,930	2,672
0,147	-2,144	2,094
0,147	-2,144	2,094

Curvamento 3D por gabarito de bancada impresso 1:1 a partir do DXF; nó soldado na ponta; chapa D01-B no anel A0.
Tirantes: da cumeeira a 60 % do balanço ao anel A0 a ± 0,80 rad do topo.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 μ m) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira $\leq 2,4 \times 1,2$ m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)

volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4


VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: arcos A0 a A3 em segmentos	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	907
Estrado de estrutura 2: arcos A4 a A7, quadro da cauda, espinha	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	721
Estrado 3: terças, trilhos de base, chapas, keder, cabos	2,4 x 1,2 x 0,6 m	3,5	605
Caixa da membrana + isolamento + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	488
Cavaletes de vidro (fachada, Olhos, espinha) x 4	2,2 x 0,6 x 2,4 m	12,7	1221
Paletes de piso (módulos) x 2	2,4 x 1,2 x 1,0 m	5,8	1918
Palete de deck	2,0 x 1,0 x 1,2 m	2,4	930
Palete de instalações + louças + marcenaria	2,4 x 1,2 x 1,4 m	8,1	1046
Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	849

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.



ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha

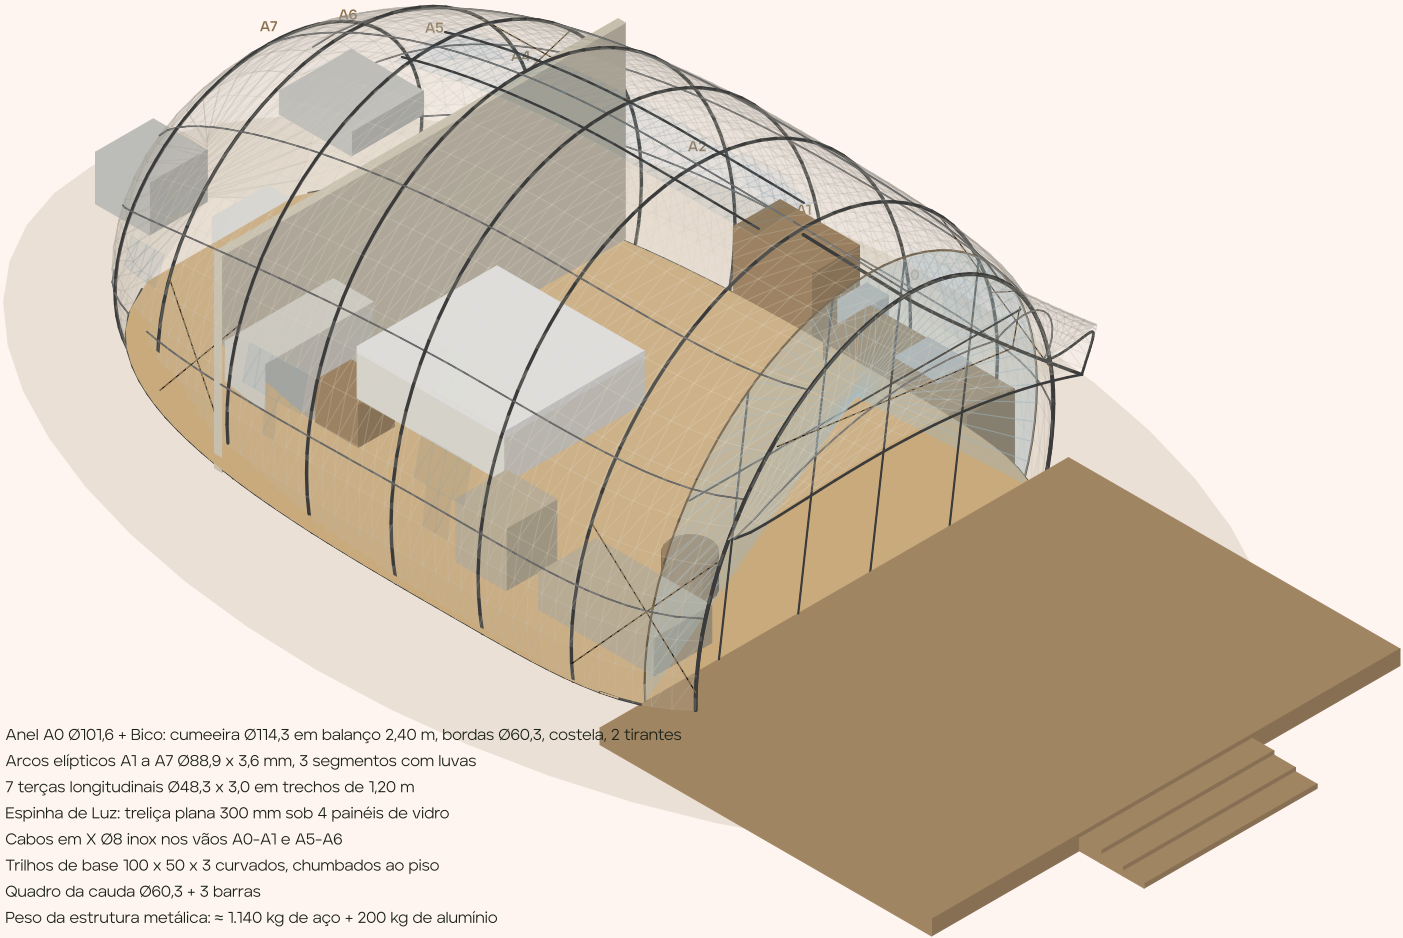

- ① Anel A0 Ø101,6 + Bico: cumeeira Ø114,3 em balanço 2,40 m, bordas Ø60,3, costela, 2 tirantes
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 12/27
SET 2026


ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m - 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01

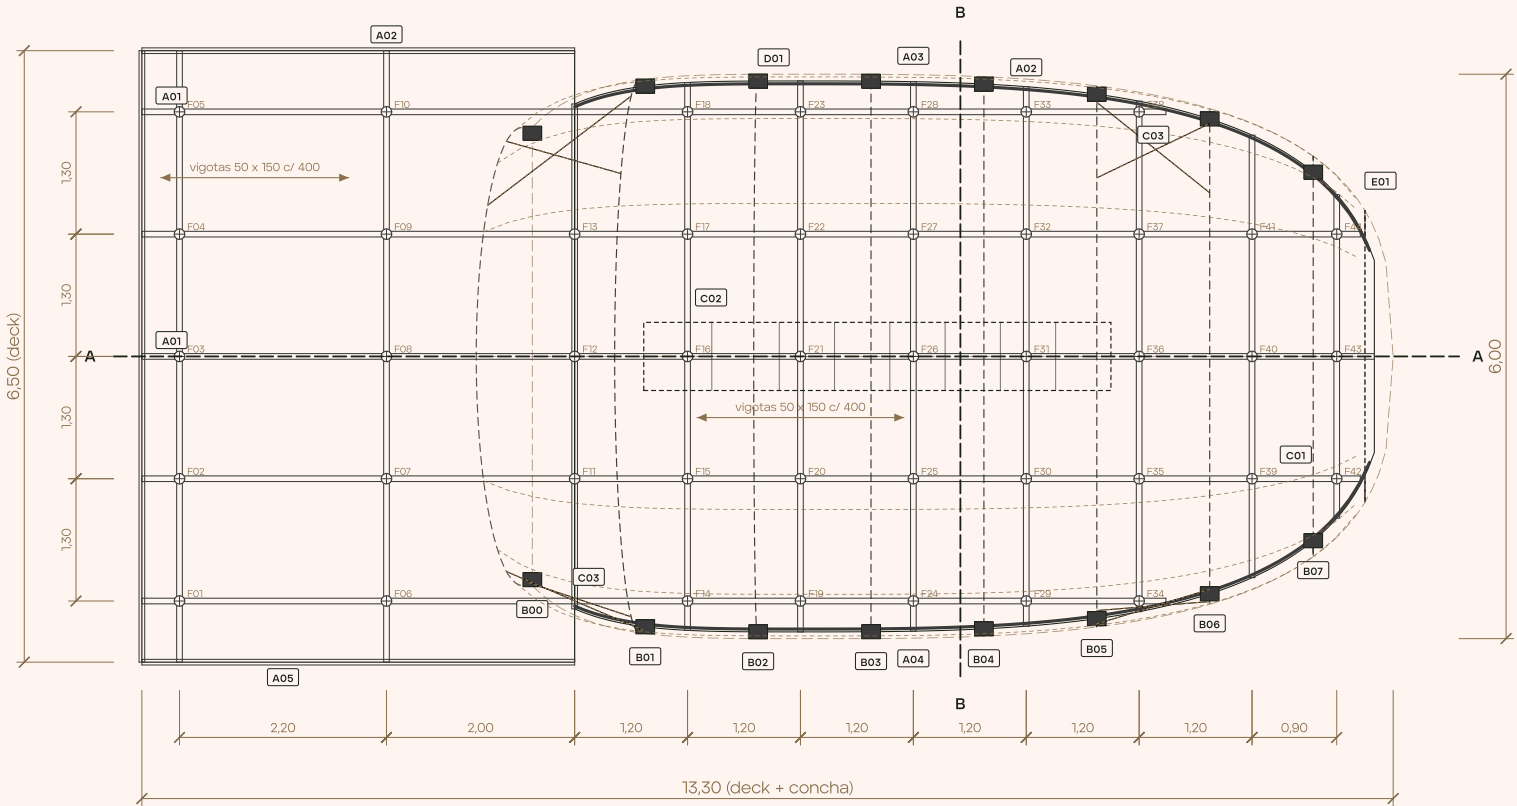

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03b/27 SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

ELEVAÇÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (1 m = 95 px)

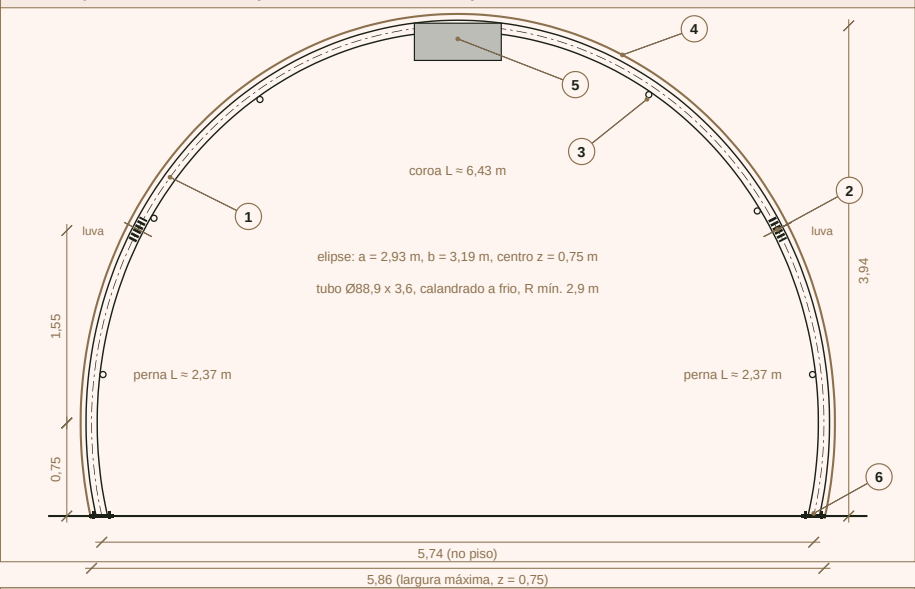



TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L. desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m. Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

DETALHES - LUVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (1 mm = 0,8 px)

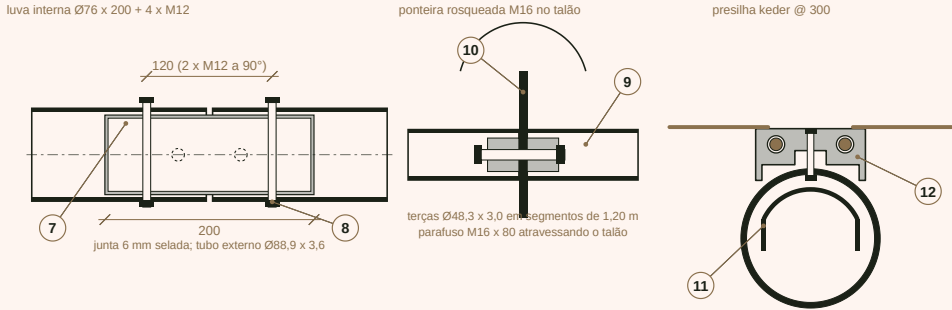

CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural

- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60


SISTEMA DE ARCOS
ZION CASULO

ESCALA
1:40 / 1:5 / sem escala

FOLHA DET-10	DATA SET 2026
------------------------	------------------

ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

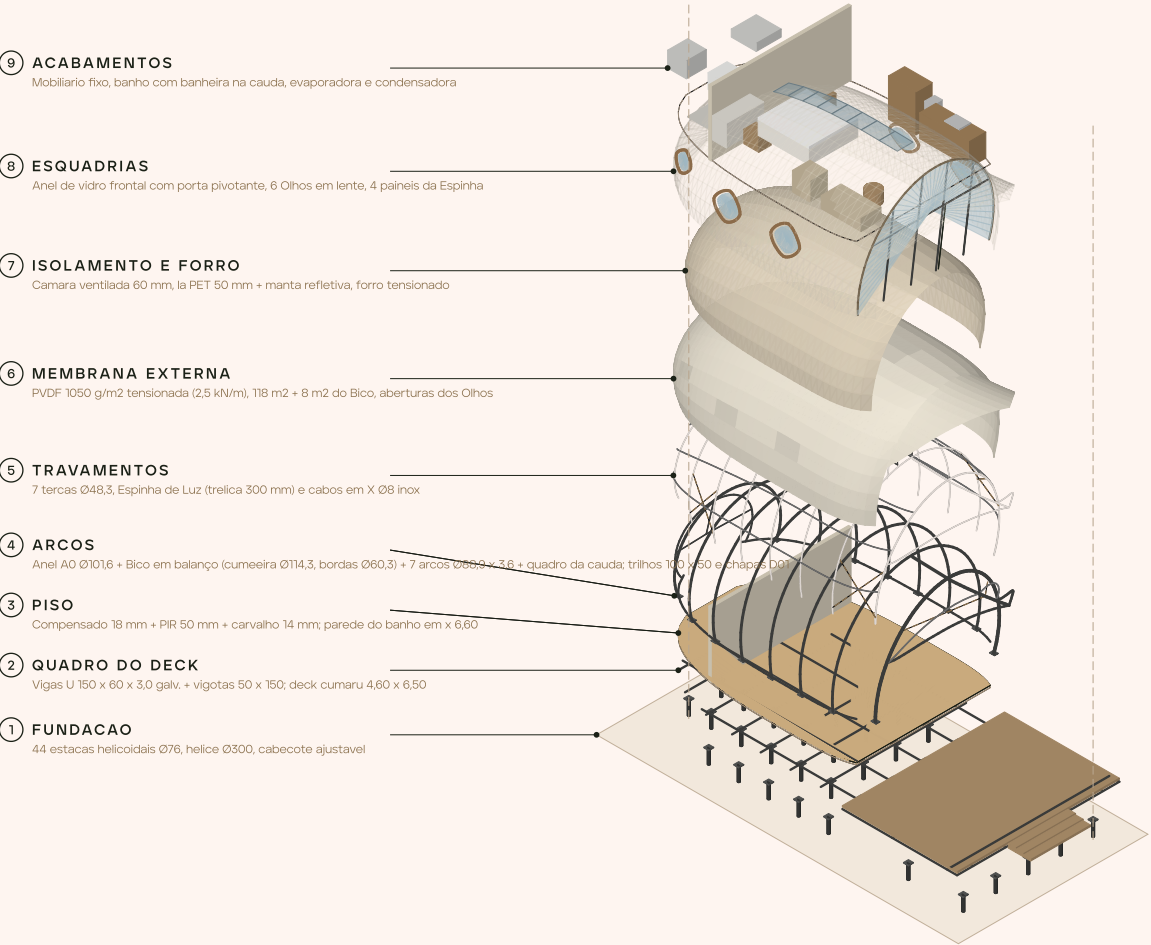

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem dos arcos 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular	Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho	☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino) ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca ☐ Espinha C03 fixada nos berços ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobreensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.

DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.

Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.

Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.

Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.

Proposta de fit test e de embalagem
4.

Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
- Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
- Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
- Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS

ZC-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Lona externa (membrana PVDF tipo II) confeccionada por painéis conforme os padrões de corte deste lote, com keder, bolsas e reforços
Forro interno tensionado (Trevira CS) por painéis, com harpão
Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada
Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores
Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes
Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2
Fundação, piso e instalações: lote 1
Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Confeccionista de membranas tensionadas (corte CNC, solda HF, form-finding) + vidraceiro com vidro insulado / laminado + instaladores de membrana.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTE

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval
Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados
Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

12 padrões externos = 111,2 m2 · 8 internos = 89,2 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
P1	1	Lona Externa	Painel P1 · entre A0 (x 0.45) e A1 (x 1.65)	1,72 x 11,46	15,64	15,6	KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P2	1	Lona Externa	Painel P2 · entre A1 (x 1.65) e A2 (x 2.85) · com entalhe da Espinha de Luz	1,48 x 11,64	15,15	15,1	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P3D	1	Lona Externa	Painel P3D · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado direito da Espinha	1,29 x 5,51	6,75	6,8	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P3E	1	Lona Externa	Painel P3E · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado esquerdo da Espinha	1,29 x 5,51	6,75	6,8	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4D	1	Lona Externa	Painel P4D · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado direito da Espinha	1,61 x 5,48	6,54	6,5	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4E	1	Lona Externa	Painel P4E · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado esquerdo da Espinha	1,61 x 5,48	6,54	6,5	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5D	1	Lona Externa	Painel P5D · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado direito da Espinha	2,06 x 5,30	6,35	6,4	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5E	1	Lona Externa	Painel P5E · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado esquerdo da Espinha	2,06 x 5,30	6,35	6,4	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P6	1	Lona Externa	Painel P6 · entre A5 (x 6.45) e A6 (x 7.65) · com entalhe da Espinha de Luz	2,57 x 10,32	12,72	12,7	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P7	1	Lona Externa	Painel P7 · entre A6 (x 7.65) e A7 (x 8.75)	2,99 x 8,49	11,02	11	KEDER Ø10, KEDER Ø13	2
P8	1	Lona Externa	Painel P8 · cauda: de A7 (x 8.75) à ponta (x 9,56)	3,13 x 5,02	9,37	9,4	BOLSA, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P0	1	Lona Externa	Painel P0 · BICO · do anel A0 (Ø ± 1,15 rad do topo) à borda livre em balanço	2,93 x 6,32	7,99	8	BOLSA, BORDA LIVRE, KEDER Ø10	0
F1	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F1 · entre x 0.90 e x 1.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	0,98 x 10,70	9,07	9,1	HARPÃO	0
F2	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F2 · entre x 1.65 e x 2.85 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,47 x 10,82	14,72	14,7	HARPÃO	2
F3	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F3 · entre x 2.85 e x 4.05 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,29 x 10,82	13,27	13,3	HARPÃO	2
F4	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F4 · entre x 4.05 e x 5.25 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,58 x 10,76	12,84	12,8	HARPÃO	2
F5	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F5 · entre x 5.25 e x 6.45 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,99 x 10,40	12,47	12,5	HARPÃO	2
F6	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F6 · entre x 6.45 e x 7.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,45 x 9,54	11,8	11,8	HARPÃO	1
F7	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F7 · entre x 7.65 e x 8.75 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,80 x 7,81	10,01	10	HARPÃO	2
F8	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F8 · entre x 8.75 e x 9.30 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,40 x 5,06	5,01	5	HARPÃO	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Alumínio e requadros

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Perfil duplo keder de alumínio sobre arcos	un	8	77	PREÇO A COTAR
Anel curvo da fachada 120 x 60	un	1	26	PREÇO A COTAR
Montantes e travessa da fachada	un	5	25	PREÇO A COTAR
Trilho do forro tensionado	un	1	21	PREÇO A COTAR
Requadros das Janelas Olho (madeira laminada)	un	6	54	PREÇO A COTAR

Envelope: membrana, isolamento, forro

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 (+15% emendas/bolsas)	m2	127	133	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3	m2	110	138	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de alumínio (bolha)	m2	110	28	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS	m2	105	31	PREÇO A COTAR
Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14	126	PREÇO A COTAR

ESPECIFICAÇÃO DA LONA

LONA EXTERNA	PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster HT 1100 dtex, PVC + laca PVDF bifacial), cor creme Zion, resistência ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos; opção: PTFE-vidro 800 g/m2 (30 anos, custo maior)
FORRO	Trevira CS 210 g/m2 (ou lona translúcida 350 g/m2 sob claraboias), harpão de PVC soldado
ISOLAMENTO	lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros + manta refletiva com face para a câmara; PIR 60 mm na Cápsula
KEDER E PERFIS	cordão keder Ø10 / Ø13 PVC; perfil duplo keder alu 6060-T5; barras de clamp 40 x 6; harpão 40 x 20; presilhas inox 304
COSTURAS	solda de alta frequência 40 mm; nenhuma costura com linha na face externa; reforços de 150 mm em recortes e cantos
CABOS	inox 316 7 x 19 Ø8 / Ø10 / Ø12 com terminais prensados, esticadores M12 a M20, manilhas



ZION CASULO · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

12 padrões externos · 8 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

-  KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
-  KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
-  CLAMP - barra de aluminio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
-  BOLSA - lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
-  BORDA LIVRE - bainha dupla 30 mm
-  HARRÃO - perfil de aluminio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
P1	1	1,72 x 11,46	15,64	Lona Externa
P2	1	1,48 x 11,64	15,15	Lona Externa
P3D	1	1,29 x 5,51	6,75	Lona Externa
P3E	1	1,29 x 5,51	6,75	Lona Externa
P4D	1	1,61 x 5,48	6,54	Lona Externa
P4E	1	1,61 x 5,48	6,54	Lona Externa
P5D	1	2,06 x 5,30	6,35	Lona Externa
P5E	1	2,06 x 5,30	6,35	Lona Externa
P6	1	2,57 x 10,32	12,72	Lona Externa
P7	1	2,99 x 8,49	11,02	Lona Externa
P8	1	3,13 x 5,02	9,37	Lona Externa
P9	1	2,93 x 6,32	7,99	Lona Externa
F1	1	0,98 x 10,70	9,07	Forro
F2	1	1,47 x 10,82	14,72	Forro
F3	1	1,29 x 10,82	13,27	Forro
F4	1	1,58 x 10,76	12,64	Forro
F5	1	1,99 x 10,40	12,47	Forro
P8	1	2,45 x 9,54	11,80	Forro
F7	1	2,80 x 7,81	10,01	Forro
F8	1	2,40 x 5,06	5,01	Forro

Total lona externa: 111,2 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Total forro / revestimento interno: 89,2 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

trilho de base 100 x 50 com perfil de arremate E02 (keder Ø13 + calha)

Vista lateral direita · costuras sobre os arcos A0 a A7 (perfil duplo keder) · painéis externos P0 a P8 · forros F1 a F8 (harpão)

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA

Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA s/ escala

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA LN-01

SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P1

Painel P1 · entre A0 (x 0.45) e A1 (x 1.65) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,371	1,247	0,000	1,300
0,500	0,098	0,861	1,379	0,486	1,334
1,000	0,177	1,354	1,488	0,977	1,364
1,500	0,236	1,851	1,574	1,473	1,390
2,000	0,277	2,349	1,638	1,977	1,412
2,500	0,300	2,849	1,684	2,489	1,430
3,000	0,306	3,349	1,711	3,012	1,444
3,500	0,299	3,849	1,723	3,549	1,456
4,000	0,281	4,348	1,724	4,103	1,464
4,500	0,260	4,848	1,719	4,677	1,469
5,000	0,243	5,347	1,712	5,269	1,472
5,500	0,239	5,847	1,711	5,872	1,472
6,000	0,250	6,347	1,715	6,471	1,471
6,500	0,270	6,847	1,722	7,056	1,467
7,000	0,290	7,346	1,725	7,620	1,460
7,500	0,304	7,846	1,719	8,166	1,451
8,000	0,305	8,346	1,700	8,696	1,438
8,500	0,292	8,846	1,665	9,213	1,422
9,000	0,260	9,345	1,611	9,721	1,402
9,500	0,211	9,843	1,536	10,221	1,378
10,000	0,143	10,338	1,440	10,714	1,350
10,500	0,055	10,830	1,319	11,203	1,319
10,764	0,000	11,088	1,246	11,459	1,300

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P1)
ÁREA DE FORMA FINAL
15,64 m2
COMPRIMENTO L / R
10,76 / 11,55 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,72 x 11,46 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P1 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-11 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P2

Painel P2 · entre A1 (x 1.65) e A2 (x 2.85) · com entalhe da Espinha de Luz · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,190	0,052	1,390	0,000	1,201
0,500	0,176	0,552	1,409	0,501	1,234
1,000	0,159	1,051	1,426	1,003	1,267
1,500	0,140	1,551	1,439	1,504	1,300
2,000	0,119	2,051	1,450	2,006	1,332
2,500	0,097	2,550	1,459	2,508	1,363
3,000	0,075	3,050	1,466	3,012	1,392
3,500	0,054	3,549	1,471	3,516	1,417
4,000	0,035	4,049	1,474	4,021	1,440
4,500	0,019	4,549	1,477	4,528	1,458
5,000	0,007	5,048	1,478	5,035	1,471
5,500	0,001	5,548	1,478	5,544	1,477
6,000	0,001	6,048	1,478	6,052	1,478
6,500	0,006	6,548	1,478	6,561	1,472
7,000	0,017	7,048	1,477	7,068	1,459
7,500	0,033	7,548	1,475	7,575	1,442
8,000	0,052	8,048	1,471	8,080	1,420
8,500	0,073	8,547	1,466	8,585	1,394
9,000	0,095	9,047	1,460	9,088	1,366
9,500	0,117	9,546	1,451	9,591	1,335
10,000	0,138	10,046	1,440	10,092	1,303
10,500	0,157	10,545	1,427	10,594	1,270
11,000	0,175	11,045	1,411	11,095	1,237
11,500	0,189	11,545	1,392	11,597	1,204

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P2)
- ÁREA DE FORMA FINAL
15,15 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,55 / 11,65 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,48 x 11,64 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P2 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-12 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P3D

Painel P3D · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

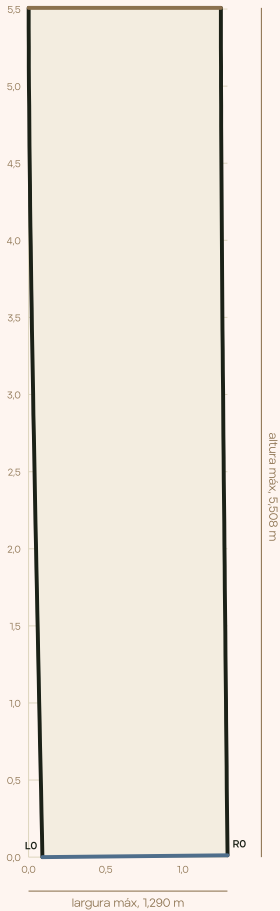


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,090	0,000	1,290	0,012	1,200
0,500	0,080	0,500	1,285	0,510	1,206
1,000	0,069	1,000	1,280	1,008	1,211
1,500	0,059	1,500	1,275	1,506	1,217
2,000	0,049	2,000	1,271	2,004	1,222
2,500	0,039	2,499	1,266	2,503	1,227
3,000	0,029	2,999	1,261	3,001	1,232
3,500	0,021	3,499	1,257	3,500	1,236
4,000	0,013	3,999	1,254	4,000	1,240
4,500	0,007	4,499	1,250	4,499	1,243
5,000	0,003	4,999	1,248	4,999	1,245
5,500	0,000	5,499	1,247	5,499	1,247
6,000	0,000	5,999	1,247	5,999	1,247
6,500	0,002	6,499	1,248	6,499	1,246
7,000	0,006	6,999	1,250	6,999	1,244
7,500	0,011	7,499	1,253	7,499	1,241
8,000	0,019	7,999	1,256	7,998	1,237
8,500	0,027	8,499	1,260	8,497	1,233
9,000	0,036	8,999	1,265	8,996	1,229
9,500	0,046	9,499	1,269	9,494	1,224
10,000	0,056	9,999	1,274	9,993	1,218
10,500	0,066	10,499	1,279	10,491	1,213
11,000	0,077	10,999	1,284	10,989	1,207
11,500	0,087	11,498	1,289	11,487	1,202
11,647	0,090	11,645	1,290	11,634	1,200

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P3D)
- ÁREA DE FORMA FINAL
6,75 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,65 / 11,62 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,29 x 5,51 m
- MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P3D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-13 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE

ORTE P3E

Painel P3E · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,090	0,000	1,290	0,012	1,200
0,500	0,080	0,500	1,285	0,510	1,206
1,000	0,069	1,000	1,280	1,008	1,211
1,500	0,059	1,500	1,275	1,506	1,217
2,000	0,049	2,000	1,271	2,004	1,222
2,500	0,039	2,499	1,266	2,503	1,227
3,000	0,029	2,999	1,261	3,001	1,232
3,500	0,021	3,499	1,257	3,500	1,236
4,000	0,013	3,999	1,254	4,000	1,240
4,500	0,007	4,499	1,250	4,499	1,243
5,000	0,003	4,999	1,248	4,999	1,245
5,500	0,000	5,499	1,247	5,499	1,247
6,000	0,000	5,999	1,247	5,999	1,247
6,500	0,002	6,499	1,248	6,499	1,246
7,000	0,006	6,999	1,250	6,999	1,244
7,500	0,011	7,499	1,253	7,499	1,241
8,000	0,019	7,999	1,256	7,998	1,237
8,500	0,027	8,499	1,260	8,497	1,233
9,000	0,036	8,999	1,265	8,996	1,229
9,500	0,046	9,499	1,269	9,494	1,224
10,000	0,056	9,999	1,274	9,993	1,218
10,500	0,066	10,499	1,279	10,491	1,213
11,000	0,077	10,999	1,284	10,989	1,207
11,500	0,087	11,498	1,289	11,487	1,202
11,647	0,090	11,645	1,290	11,634	1,200

BORDAS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P3E)

ÁREA DE FORMA FINAL
6,75 m2

COMPRIMENTO L / R
11,65 / 11,62 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,29 x 5,51 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P3E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-14 SET 2026

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.



ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P4D

Painel P4D · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

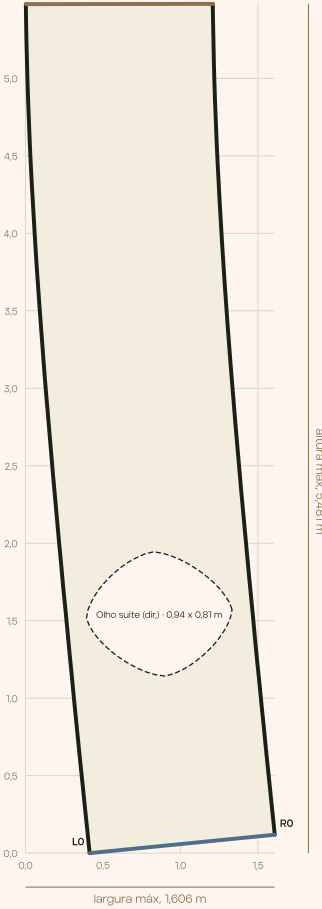


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,414	0,000	1,608	0,119	1,200
0,500	0,363	0,497	1,559	0,600	1,200
1,000	0,313	0,995	1,511	1,082	1,201
1,500	0,265	1,493	1,464	1,564	1,201
2,000	0,218	1,990	1,418	2,048	1,202
2,500	0,173	2,488	1,375	2,532	1,202
3,000	0,131	2,987	1,334	3,018	1,203
3,500	0,093	3,485	1,297	3,507	1,204
4,000	0,060	3,984	1,265	3,998	1,205
4,500	0,032	4,483	1,238	4,491	1,206
5,000	0,013	4,983	1,219	4,987	1,206
5,500	0,002	5,483	1,208	5,484	1,206
6,000	0,001	5,983	1,207	5,982	1,206
6,500	0,009	6,483	1,215	6,480	1,206
7,000	0,027	6,982	1,233	6,976	1,206
7,500	0,062	7,482	1,257	7,470	1,205
8,000	0,085	7,981	1,289	7,961	1,204
8,500	0,122	8,479	1,325	8,450	1,203
9,000	0,163	8,978	1,365	8,937	1,203
9,500	0,207	9,476	1,408	9,422	1,202
10,000	0,253	9,973	1,453	9,905	1,201
10,500	0,301	10,471	1,499	10,388	1,201
11,000	0,351	10,969	1,547	10,870	1,200
11,500	0,401	11,466	1,596	11,351	1,200
11,622	0,414	11,588	1,608	11,469	1,200

BORDAS E RECORTES

- QUANTIDADE
1 (códigos: P4D)
- ÁREA DE FORMA FINAL
6,54 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,62 / 11,38 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,61 x 5,48 m
- MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- KEDER Ø10 : desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - CLAMP : barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - KEDER Ø13 : perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

	HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P4D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-15 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTES

FORTE P4E

Painel P4E · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

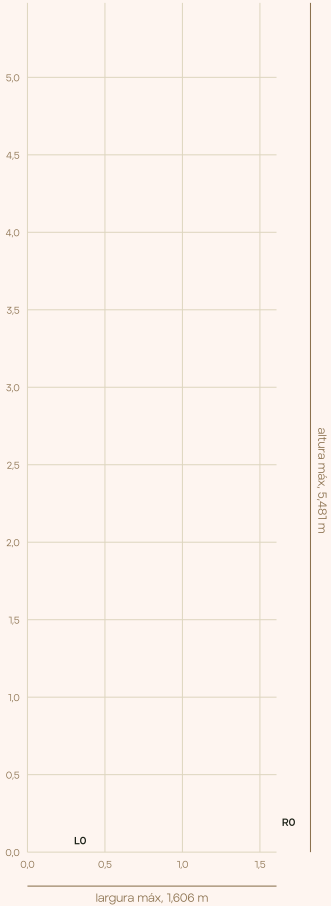


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,414	0,000	1,608	0,119	1,200
0,500	0,363	0,497	1,559	0,600	1,200
1,000	0,313	0,995	1,511	1,082	1,201
1,500	0,265	1,493	1,464	1,564	1,201
2,000	0,218	1,990	1,418	2,048	1,202
2,500	0,173	2,488	1,375	2,532	1,202
3,000	0,131	2,987	1,334	3,018	1,203
3,500	0,093	3,485	1,297	3,507	1,204
4,000	0,060	3,984	1,265	3,998	1,205
4,500	0,032	4,483	1,238	4,491	1,206
5,000	0,013	4,983	1,219	4,987	1,206
5,500	0,002	5,483	1,208	5,484	1,206
6,000	0,001	5,983	1,207	5,982	1,206
6,500	0,009	6,483	1,215	6,480	1,206
7,000	0,027	6,982	1,233	6,976	1,206
7,500	0,062	7,482	1,257	7,470	1,205
8,000	0,085	7,981	1,289	7,961	1,204
8,500	0,122	8,479	1,325	8,450	1,203
9,000	0,163	8,978	1,365	8,937	1,203
9,500	0,207	9,476	1,408	9,422	1,202
10,000	0,253	9,973	1,453	9,905	1,201
10,500	0,301	10,471	1,499	10,388	1,201
11,000	0,351	10,969	1,547	10,870	1,200
11,500	0,401	11,466	1,596	11,351	1,200
11,622	0,414	11,588	1,608	11,469	1,200

BORDAS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P4E)

ÁREA DE FORMA FINAL
6,54 m2

COMPRIMENTO L / R
11,62 / 11,38 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,61 x 5,48 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P4E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-16 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P5D

Painel P5D · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

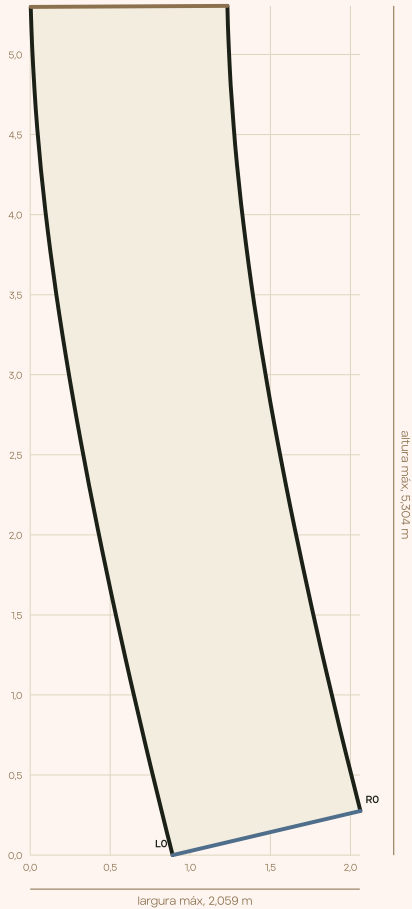


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,890	0,000	2,063	0,276	1,205
0,500	0,769	0,485	1,949	0,728	1,205
1,000	0,654	0,972	1,841	1,181	1,206
1,500	0,544	1,460	1,739	1,636	1,207
2,000	0,440	1,949	1,641	2,094	1,210
2,500	0,343	2,439	1,550	2,555	1,213
3,000	0,254	2,931	1,467	3,020	1,216
3,500	0,175	3,425	1,392	3,490	1,219
4,000	0,108	3,920	1,329	3,966	1,222
4,500	0,055	4,417	1,279	4,447	1,225
5,000	0,019	4,916	1,246	4,932	1,227
5,500	0,002	5,416	1,229	5,420	1,228
6,000	0,004	5,916	1,231	5,909	1,228
6,500	0,026	6,415	1,252	6,396	1,226
7,000	0,068	6,914	1,290	6,881	1,224
7,500	0,122	7,410	1,343	7,360	1,222
8,000	0,192	7,905	1,409	7,835	1,219
8,500	0,274	8,399	1,485	8,304	1,215
9,000	0,365	8,890	1,571	8,768	1,212
9,500	0,464	9,380	1,663	9,228	1,209
10,000	0,569	9,869	1,762	9,685	1,207
10,500	0,680	10,357	1,866	10,139	1,205
11,000	0,797	10,843	1,975	10,592	1,205
11,384	0,890	11,215	2,063	10,939	1,205

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P5D)
ÁREA DE FORMA FINAL
6,35 m2
COMPRIMENTO L / R
11,38 / 10,82 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,06 x 5,30 m
MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P5D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-17 SET 2026

ZION CASULO · PA

CORTE P5E

Painel P5E · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

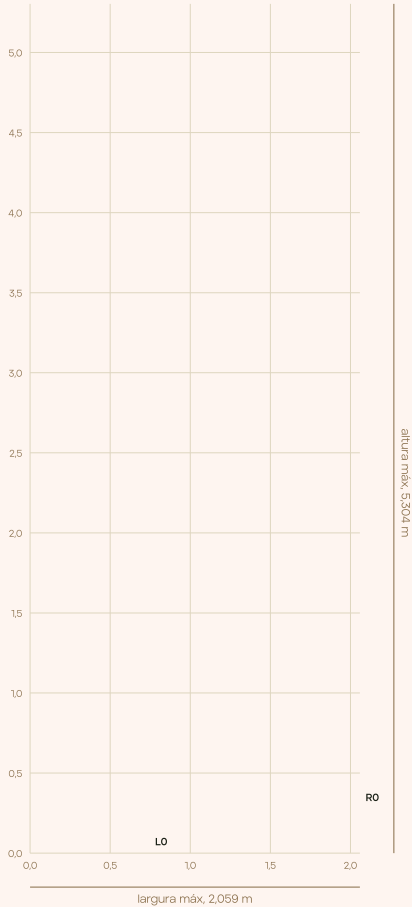


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,890	0,000	2,063	0,276	1,205
0,500	0,769	0,485	1,949	0,728	1,205
1,000	0,654	0,972	1,841	1,181	1,206
1,500	0,544	1,460	1,739	1,636	1,207
2,000	0,440	1,949	1,641	2,094	1,210
2,500	0,343	2,439	1,550	2,555	1,213
3,000	0,254	2,931	1,467	3,020	1,216
3,500	0,175	3,425	1,392	3,490	1,219
4,000	0,108	3,920	1,329	3,966	1,222
4,500	0,055	4,417	1,279	4,447	1,225
5,000	0,019	4,916	1,246	4,932	1,227
5,500	0,002	5,416	1,229	5,420	1,228
6,000	0,004	5,916	1,231	5,909	1,228
6,500	0,026	6,415	1,252	6,396	1,226
7,000	0,068	6,914	1,290	6,881	1,224
7,500	0,122	7,410	1,343	7,360	1,222
8,000	0,192	7,905	1,409	7,835	1,219
8,500	0,274	8,399	1,485	8,304	1,215
9,000	0,365	8,890	1,571	8,768	1,212
9,500	0,464	9,380	1,663	9,228	1,209
10,000	0,569	9,869	1,762	9,685	1,207
10,500	0,680	10,357	1,866	10,139	1,205
11,000	0,797	10,843	1,975	10,592	1,205
11,384	0,890	11,215	2,063	10,939	1,205

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P5E)
- ÁREA DE FORMA FINAL
6,35 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,38 / 10,82 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
2,06 x 5,30 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 : desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - CLAMP : barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - KEDER Ø13 : perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

	HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P5E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-18 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P6

Painel P6 · entre A5 (x 6.45) e A6 (x 7.65) · com entalhe da Espinha de Luz · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

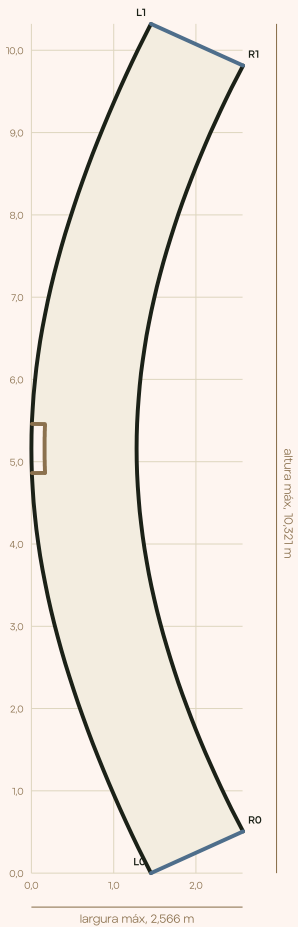


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,453	0,000	2,572	0,507	1,229
0,500	1,232	0,448	2,374	0,898	1,228
1,000	1,024	0,903	2,189	1,295	1,229
1,500	0,830	1,364	2,017	1,698	1,233
2,000	0,651	1,831	1,859	2,109	1,239
2,500	0,489	2,304	1,715	2,529	1,247
3,000	0,345	2,782	1,587	2,960	1,255
3,500	0,222	3,267	1,477	3,400	1,262
4,000	0,124	3,757	1,390	3,851	1,269
4,500	0,053	4,252	1,326	4,310	1,275
5,000	0,011	4,750	1,289	4,776	1,278
5,500	0,001	5,250	1,280	5,245	1,279
6,000	0,022	5,749	1,299	5,713	1,277
6,500	0,075	6,247	1,346	6,176	1,273
7,000	0,156	6,740	1,418	6,633	1,267
7,500	0,263	7,228	1,514	7,090	1,260
8,000	0,394	7,711	1,630	7,517	1,252
8,500	0,545	8,187	1,764	7,943	1,244
9,000	0,713	8,658	1,914	8,360	1,237
9,500	0,898	9,123	2,077	8,768	1,232
10,000	1,096	9,582	2,253	9,169	1,228
10,500	1,309	10,034	2,443	9,564	1,228
10,821	1,453	10,321	2,572	9,814	1,229

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P6)
ÁREA DE FORMA FINAL
12,72 m²
COMPRIMENTO L / R
10,82 / 9,76 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,57 x 10,32 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (triño 100 x 50)
- CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P6 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-19 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P7

Painel P7 · entre A6 (x 7.65) e A7 (x 8.75) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

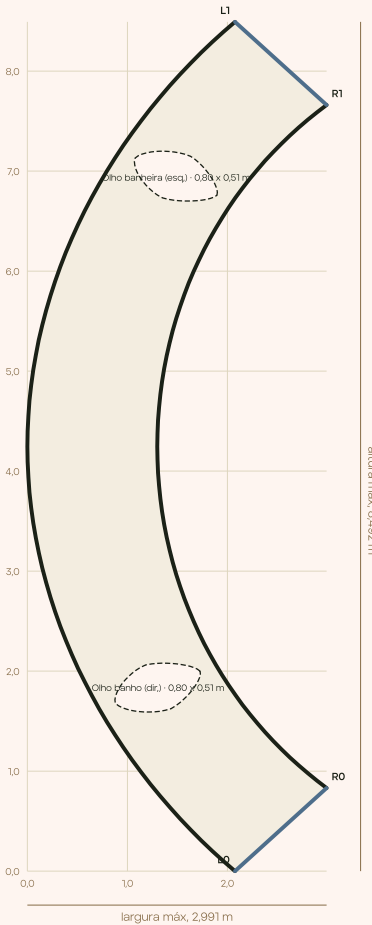


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0.000	2,076	0,000	2,991	0,831	1,236
0.500	1,707	0,338	2,687	1,080	1,229
1.000	1,367	0,704	2,410	1,354	1,228
1.500	1,058	1,097	2,159	1,653	1,233
2.000	0,782	1,514	1,936	1,977	1,243
2.500	0,543	1,953	1,743	2,325	1,256
3.000	0,344	2,411	1,581	2,697	1,270
3.500	0,187	2,886	1,452	3,091	1,282
4.000	0,077	3,373	1,362	3,502	1,292
4.500	0,015	3,869	1,311	3,924	1,297
5.000	0,002	4,369	1,300	4,351	1,299
5.500	0,039	4,867	1,331	4,777	1,295
6.000	0,125	5,359	1,402	5,194	1,287
6.500	0,258	5,841	1,511	5,597	1,276
7.000	0,438	6,308	1,655	5,981	1,263
7.500	0,655	6,757	1,833	6,341	1,250
8.000	0,913	7,186	2,042	6,678	1,238
8.500	1,205	7,591	2,278	6,989	1,230
9.000	1,530	7,971	2,541	7,276	1,228
9.500	1,884	8,324	2,832	7,537	1,232
9.755	2,076	8,492	2,991	7,661	1,236

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P7)
- ÁREA DE FORMA FINAL
11,02 m2
- COMPRIMENTO L / R
9,76 / 7,91 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
2,99 x 8,49 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
 - KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trinco 100 x 50)
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	HOTEL GROUP INTERNATIONAL PADRÃO DE CORTE P7 Lona Externa
ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-20 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P8

Painel P8 · cauda: de A7 (x 8,75) à ponta (x 9,56) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

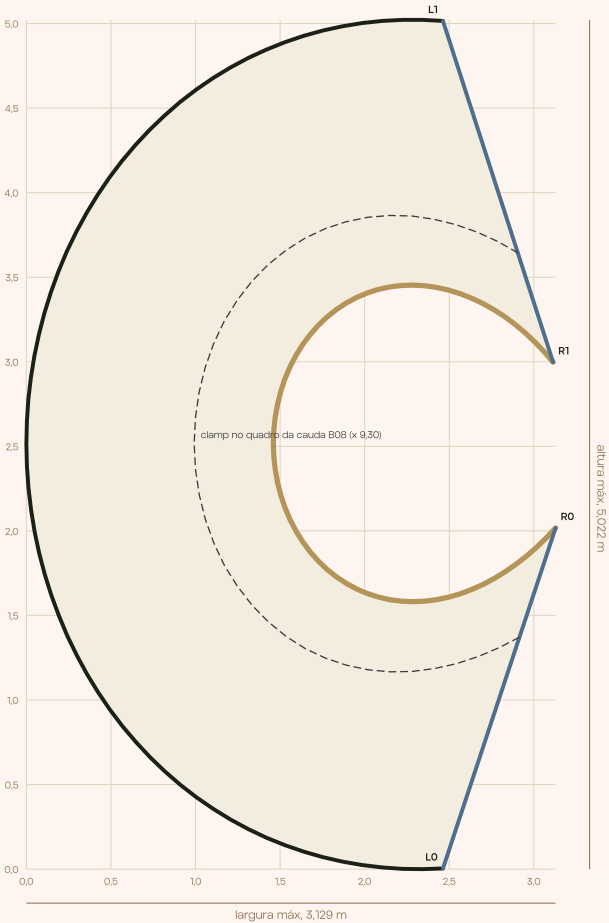


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,463	0,004	3,129	2,017	2,121
0,500	1,964	0,028	2,886	1,797	1,995
1,000	1,483	0,160	2,607	1,644	1,861
1,500	1,045	0,398	2,313	1,583	1,736
2,000	0,670	0,727	2,033	1,624	1,632
2,500	0,373	1,128	1,791	1,762	1,553
3,000	0,162	1,581	1,607	1,978	1,499
3,500	0,038	2,064	1,495	2,249	1,469
4,000	0,001	2,562	1,461	2,545	1,460
4,500	0,052	3,059	1,509	2,840	1,473
5,000	0,191	3,538	1,634	3,103	1,507
5,500	0,418	3,983	1,830	3,307	1,565
6,000	0,730	4,373	2,081	3,428	1,649
6,500	1,118	4,696	2,366	3,448	1,758
7,000	1,567	4,903	2,657	3,365	1,885
7,500	2,054	5,010	2,927	3,199	2,019
7,909	2,463	5,016	3,114	2,997	2,121

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P8)

ÁREA DE FORMA FINAL
9,37 m2

COMPRIMENTO L / R
7,91 / 4,73 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
3,13 x 5,02 m

MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 : desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- BOLSA : lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
- KEDER Ø13 : perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Ponta: a lona fecha em cone sobre o quadro da cauda; a borda R vira bolsa de cinta com olhal e o excedente é dobrado e clampado no anel Ø60,3.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P8 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-21 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P0

Painel P0 · BICO · do anel A0 ($\theta \pm 1,15$ rad do topo) à borda livre em balanço · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

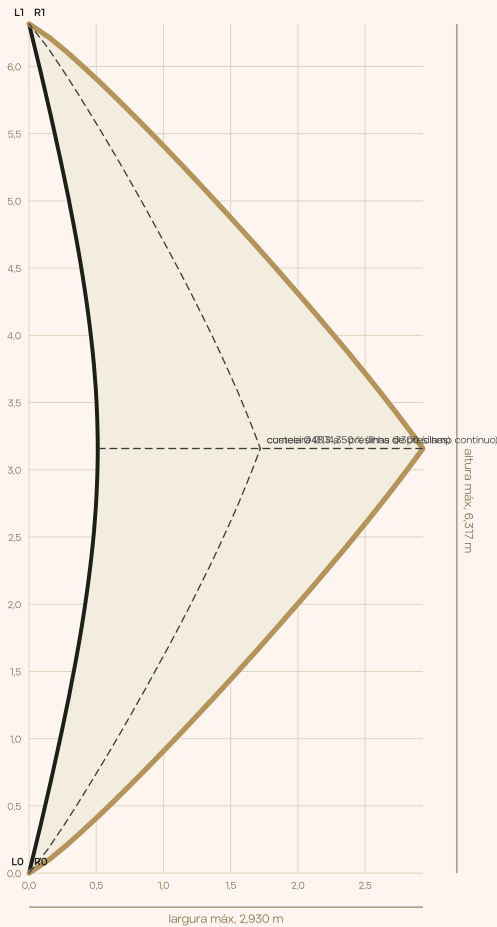


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,500	0,116	0,486	0,555	0,461	0,439
1,000	0,226	0,974	1,033	0,941	0,807
1,500	0,326	1,464	1,490	1,432	1,165
2,000	0,411	1,957	1,936	1,930	1,525
2,500	0,475	2,453	2,367	2,436	1,892
3,000	0,508	2,951	2,773	2,947	2,265
3,500	0,505	3,451	2,705	3,458	2,201
4,000	0,466	3,950	2,294	3,968	1,828
4,500	0,398	4,445	1,860	4,473	1,462
5,000	0,310	4,937	1,413	4,970	1,103
5,500	0,208	5,427	0,952	5,459	0,745
6,000	0,097	5,914	0,469	5,937	0,373
6,414	0,000	6,317	0,000	6,317	0,000

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P0)
ÁREA DE FORMA FINAL
799 m2
COMPRIMENTO L / R
6,41 / 8,64 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,93 x 6,32 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

— KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
— BOLSA - lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
— BORDA LIVRE - bainha dupla 30 mm

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas laterais ($\theta = \pi/2 \pm 1,15$) coincidem com o encontro da borda livre com o anel; reforço triangular 300 mm e olhal do tirante.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P0 Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-22 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · entre x 0.90 e x 1.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,150	0,765	0,000	0,760
0,500	0,054	0,646	0,841	0,497	0,800
1,000	0,089	1,145	0,895	0,996	0,820
1,500	0,110	1,645	0,935	1,497	0,838
2,000	0,118	2,145	0,961	2,001	0,855
2,500	0,116	2,645	0,975	2,509	0,870
3,000	0,104	3,145	0,979	3,021	0,884
3,500	0,087	3,644	0,976	3,538	0,895
4,000	0,067	4,144	0,968	4,063	0,904
4,500	0,051	4,644	0,960	4,593	0,911
5,000	0,042	5,143	0,955	5,128	0,914
5,500	0,043	5,643	0,956	5,665	0,913
6,000	0,053	6,143	0,961	6,200	0,910
6,500	0,071	6,643	0,970	6,729	0,903
7,000	0,090	7,143	0,977	7,252	0,893
7,500	0,107	7,642	0,979	7,769	0,881
8,000	0,117	8,142	0,973	8,280	0,867
8,500	0,118	8,642	0,957	8,787	0,852
9,000	0,107	9,142	0,929	9,290	0,835
9,500	0,084	9,642	0,887	9,791	0,816
10,000	0,047	10,140	0,829	10,289	0,797
10,410	0,000	10,548	0,765	10,697	0,780

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F1)
ÁREA DE FORMA FINAL
9,07 m2
COMPRIMENTO L / R
10,41 / 10,72 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,98 x 10,70 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-23 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F2

Forro F2 · entre x 1.65 e x 2.85 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,176	0,053	1,386	0,000	1,211
0,500	0,163	0,552	1,405	0,502	1,244
1,000	0,145	1,052	1,421	1,004	1,277
1,500	0,125	1,552	1,434	1,505	1,310
2,000	0,103	2,051	1,444	2,008	1,341
2,500	0,081	2,551	1,452	2,511	1,371
3,000	0,060	3,050	1,458	3,015	1,398
3,500	0,040	3,550	1,462	3,520	1,423
4,000	0,022	4,050	1,465	4,026	1,442
4,500	0,009	4,549	1,466	4,534	1,457
5,000	0,002	5,049	1,467	5,043	1,465
5,500	0,000	5,549	1,467	5,552	1,467
6,000	0,005	6,049	1,467	6,061	1,461
6,500	0,016	6,549	1,465	6,569	1,449
7,000	0,032	7,049	1,463	7,076	1,432
7,500	0,051	7,549	1,460	7,582	1,410
8,000	0,072	8,048	1,455	8,086	1,383
8,500	0,094	8,548	1,448	8,590	1,355
9,000	0,116	9,047	1,439	9,092	1,324
9,500	0,136	9,547	1,427	9,594	1,291
10,000	0,155	10,046	1,413	10,096	1,258
10,500	0,171	10,546	1,396	10,597	1,225
10,721	0,176	10,767	1,386	10,819	1,211

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F2)
ÁREA DE FORMA FINAL
14,72 m2
COMPRIMENTO L / R
10,72 / 10,82 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,47 x 10,82 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F2 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-24 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F3

Forro F3 · entre x 2.85 e x 4.05 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,083	0,000	1,285	0,012	1,202
0,500	0,073	0,500	1,280	0,510	1,207
1,000	0,062	1,000	1,275	1,008	1,213
1,500	0,052	1,500	1,270	1,506	1,218
2,000	0,042	2,000	1,266	2,004	1,223
2,500	0,032	2,499	1,261	2,502	1,229
3,000	0,023	2,999	1,257	3,001	1,233
3,500	0,015	3,499	1,253	3,500	1,237
4,000	0,009	3,999	1,249	3,999	1,241
4,500	0,004	4,499	1,247	4,499	1,243
5,000	0,001	4,999	1,245	4,999	1,244
5,500	0,000	5,499	1,245	5,499	1,245
6,000	0,002	5,999	1,246	5,999	1,244
6,500	0,005	6,499	1,248	6,499	1,242
7,000	0,011	6,999	1,250	6,999	1,239
7,500	0,018	7,499	1,254	7,498	1,236
8,000	0,027	7,999	1,258	7,997	1,232
8,500	0,036	8,499	1,263	8,496	1,227
9,000	0,046	8,999	1,267	8,994	1,222
9,500	0,056	9,499	1,272	9,492	1,216
10,000	0,066	9,999	1,277	9,990	1,211
10,500	0,077	10,499	1,282	10,488	1,205
10,821	0,083	10,820	1,285	10,808	1,202

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F3)
ÁREA DE FORMA FINAL
13,27 m2
COMPRIMENTO L / R
10,82 / 10,80 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,28 x 10,82 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F3 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-25 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F4

Forro F4 · entre x 4.05 e x 5.25 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,383	0,000	1,577	0,118	1,200
0,500	0,332	0,497	1,528	0,597	1,200
1,000	0,282	0,995	1,480	1,078	1,201
1,500	0,235	1,493	1,434	1,560	1,201
2,000	0,189	1,991	1,389	2,043	1,202
2,500	0,145	2,489	1,347	2,527	1,203
3,000	0,105	2,987	1,308	3,014	1,204
3,500	0,069	3,486	1,273	3,503	1,205
4,000	0,039	3,985	1,244	3,995	1,205
4,500	0,017	4,484	1,223	4,489	1,206
5,000	0,003	4,984	1,210	4,986	1,206
5,500	0,000	5,484	1,207	5,484	1,206
6,000	0,008	5,984	1,214	5,981	1,206
6,500	0,025	6,484	1,230	6,477	1,206
7,000	0,050	6,983	1,255	6,970	1,205
7,500	0,083	7,482	1,287	7,461	1,204
8,000	0,121	7,981	1,323	7,949	1,203
8,500	0,162	8,479	1,364	8,435	1,202
9,000	0,207	8,977	1,407	8,919	1,202
9,500	0,254	9,475	1,453	9,401	1,201
10,000	0,302	9,972	1,499	9,882	1,201
10,500	0,352	10,470	1,548	10,363	1,200
10,796	0,383	10,765	1,577	10,647	1,200

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F4)
ÁREA DE FORMA FINAL
12,84 m2
COMPRIMENTO L / R
10,90 / 10,56 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,58 x 10,76 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F4 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-26 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F5

Forro F5 · entre x 5.25 e x 6.45 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

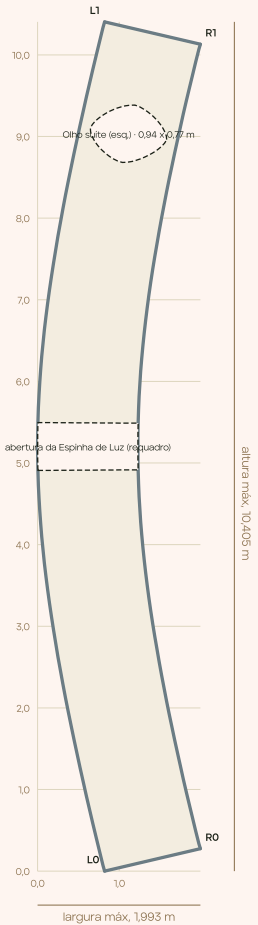


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,820	0,000	1,993	0,275	1,205
0,500	0,699	0,485	1,880	0,722	1,205
1,000	0,585	0,972	1,774	1,173	1,206
1,500	0,477	1,460	1,674	1,627	1,208
2,000	0,376	1,950	1,579	2,084	1,211
2,500	0,282	2,441	1,492	2,545	1,214
3,000	0,198	2,934	1,413	3,011	1,218
3,500	0,125	3,428	1,345	3,483	1,221
4,000	0,067	3,925	1,290	3,960	1,224
4,500	0,025	4,423	1,252	4,443	1,226
5,000	0,003	4,923	1,231	4,930	1,228
5,500	0,002	5,423	1,230	5,417	1,228
6,000	0,022	5,922	1,248	5,904	1,227
6,500	0,081	6,421	1,285	6,387	1,224
7,000	0,118	6,918	1,338	6,866	1,222
7,500	0,189	7,412	1,405	7,338	1,218
8,000	0,272	7,905	1,482	7,805	1,215
8,500	0,365	8,397	1,569	8,266	1,211
9,000	0,465	8,887	1,663	8,724	1,208
9,500	0,572	9,375	1,762	9,178	1,206
10,000	0,685	9,862	1,868	9,630	1,205
10,500	0,804	10,348	1,979	10,079	1,205
10,559	0,820	10,405	1,993	10,130	1,205

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F5)
ÁREA DE FORMA FINAL
12,47 m2
COMPRIMENTO L / R
10,56 / 10,00 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,99 x 10,40 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F5 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-27 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F6

Forro F6 · entre x 6.45 e x 7.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

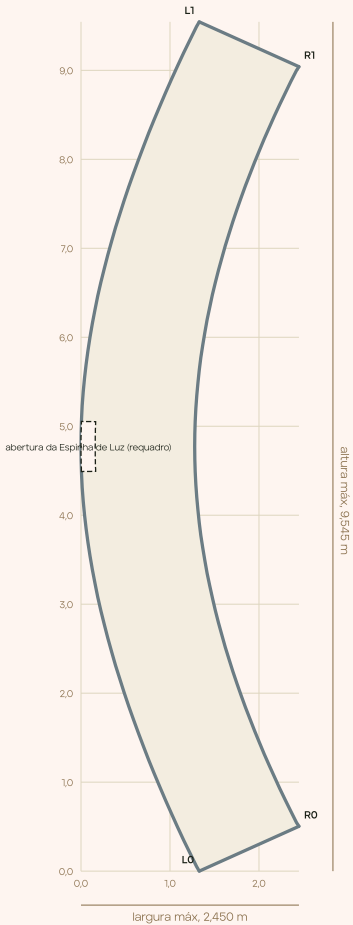


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,330	0,000	2,450	0,503	1,228
0,500	1,108	0,448	2,254	0,888	1,227
1,000	0,904	0,904	2,075	1,282	1,230
1,500	0,716	1,367	1,909	1,684	1,235
2,000	0,543	1,837	1,758	2,095	1,242
2,500	0,389	2,312	1,623	2,516	1,250
3,000	0,256	2,794	1,506	2,949	1,259
3,500	0,148	3,282	1,410	3,392	1,267
4,000	0,067	3,776	1,338	3,846	1,273
4,500	0,017	4,273	1,284	4,307	1,277
5,000	0,000	4,773	1,279	4,773	1,279
5,500	0,017	5,272	1,284	5,238	1,277
6,000	0,067	5,770	1,338	5,700	1,273
6,500	0,148	6,263	1,410	6,153	1,267
7,000	0,257	6,751	1,506	6,597	1,259
7,500	0,389	7,233	1,623	7,029	1,250
8,000	0,543	7,709	1,758	7,450	1,242
8,500	0,716	8,178	1,909	7,861	1,235
9,000	0,905	8,641	2,075	8,263	1,230
9,500	1,108	9,098	2,254	8,658	1,227
9,999	1,330	9,545	2,450	9,042	1,228

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F6)
ÁREA DE FORMA FINAL
11,80 m2
COMPRIMENTO L / R
10,00 / 8,94 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,45 x 9,54 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

- HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F6 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-28 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F7

Forro F7 · entre x 7.65 e x 8.75 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

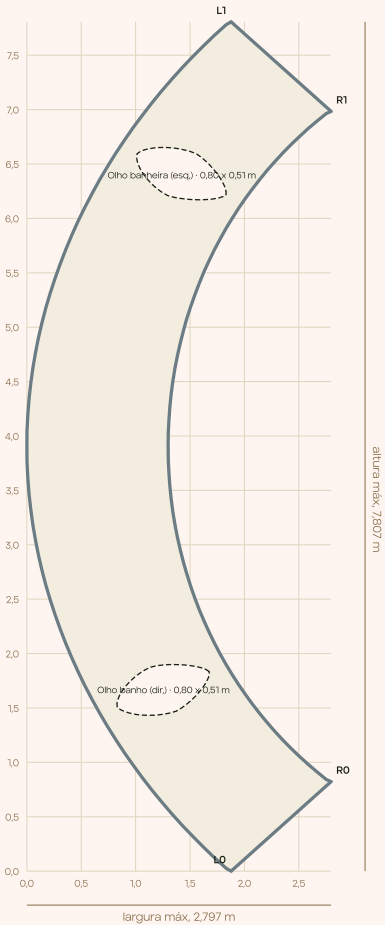


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,878	0,000	2,797	0,823	1,234
0,500	1,510	0,336	2,494	1,065	1,226
1,000	1,179	0,710	2,232	1,340	1,227
1,500	0,891	1,112	1,998	1,640	1,235
2,000	0,621	1,539	1,793	1,967	1,247
2,500	0,402	1,988	1,620	2,320	1,262
3,000	0,227	2,456	1,481	2,698	1,277
3,500	0,100	2,939	1,379	3,096	1,288
4,000	0,024	3,433	1,318	3,508	1,296
4,500	0,000	3,933	1,299	3,928	1,299
5,000	0,030	4,431	1,323	4,347	1,296
5,500	0,112	4,924	1,389	4,758	1,287
6,000	0,245	5,406	1,495	5,154	1,275
6,500	0,425	5,872	1,638	5,529	1,260
7,000	0,649	6,319	1,815	5,879	1,246
7,500	0,914	6,743	2,023	6,203	1,234
8,000	1,215	7,142	2,261	6,501	1,226
8,500	1,550	7,515	2,527	6,772	1,226
8,942	1,878	7,807	2,797	6,984	1,234

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE: 1 (códigos: F7)
- ÁREA DE FORMA FINAL: 10,01 m2
- COMPRIMENTO L / R: 8,94 / 7,11 m
- CAIXA (LARG. X ALT.): 2,80 x 7,81 m
- MATERIAL: Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

- HARPÃO: perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
- RECORTE: com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F7 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-29 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F8

Forro F8 · entre x 8.75 e x 9.30 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

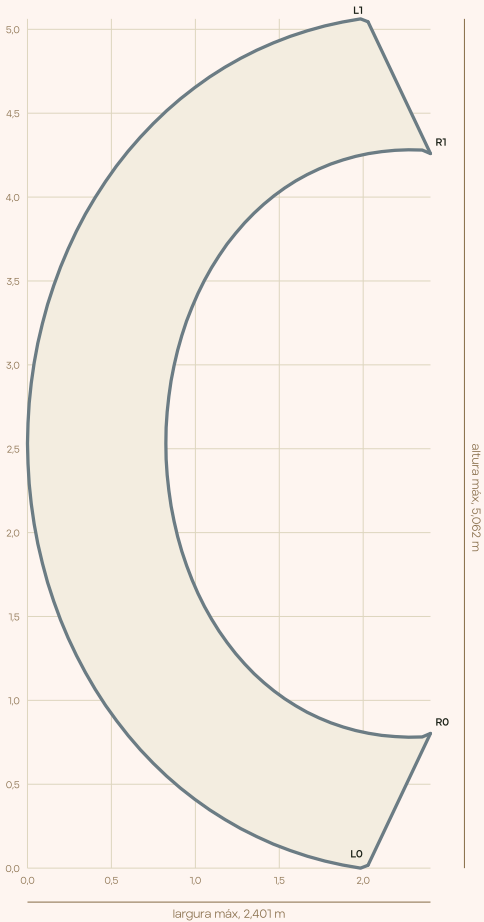


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,029	0,017	2,401	0,803	0,870
0,500	1,547	0,112	2,019	0,807	0,840
1,000	1,102	0,337	1,679	0,923	0,823
1,500	0,719	0,657	1,386	1,126	0,816
2,000	0,413	1,051	1,149	1,402	0,816
2,500	0,190	1,498	0,975	1,733	0,819
3,000	0,053	1,978	0,867	2,101	0,823
3,500	0,001	2,475	0,825	2,487	0,824
4,000	0,034	2,973	0,851	2,876	0,823
4,500	0,151	3,458	0,944	3,249	0,820
5,000	0,354	3,914	1,103	3,590	0,816
5,500	0,642	4,322	1,327	3,880	0,815
6,000	1,008	4,661	1,608	4,101	0,820
6,500	1,441	4,909	1,938	4,238	0,835
7,000	1,919	5,051	2,302	4,281	0,860
7,113	2,029	5,045	2,401	4,259	0,870

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F8)
ÁREA DE FORMA FINAL
5,01m2
COMPRIMENTO L / R
7,11 / 5,33 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,40 x 5,06 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.


ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F8 Forro / Revestimento Interno
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-30 SET 2026




ZION CASULO · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento


1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

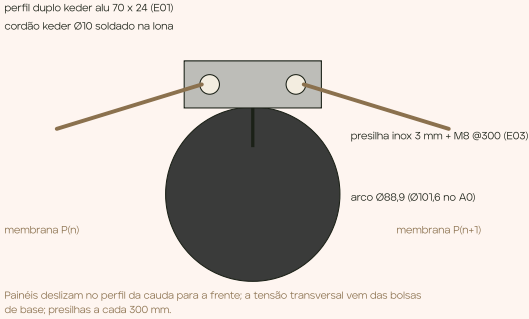


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

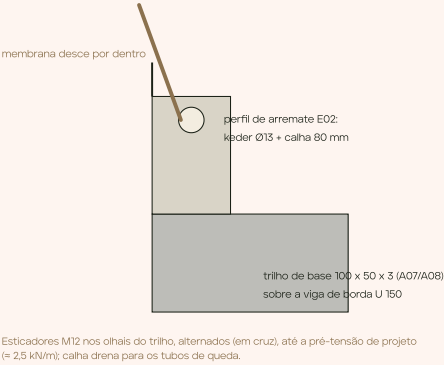


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)

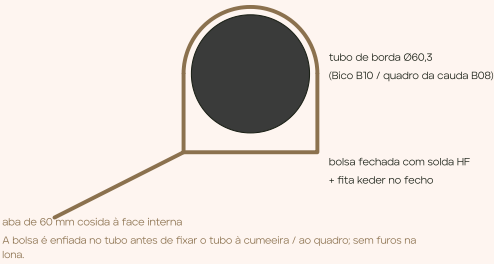

4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

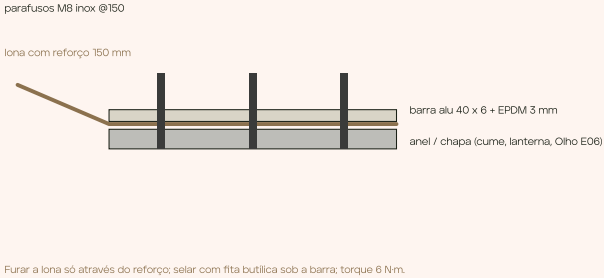

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

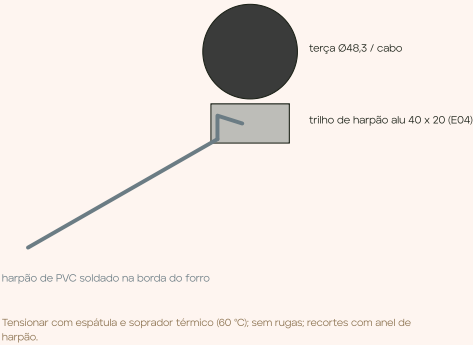

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA




Casulo: painéis P1 a P8 no keder dos arcos (1) e nas bolsas de base (2); Bico P0 no keder do A0 e na bolsa do tubo de borda (3); presilhas na cumeeira e na costela; Espinha e Olhos em clamp (4); forro F1 a F8 em harpão (5).

SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-90 SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).

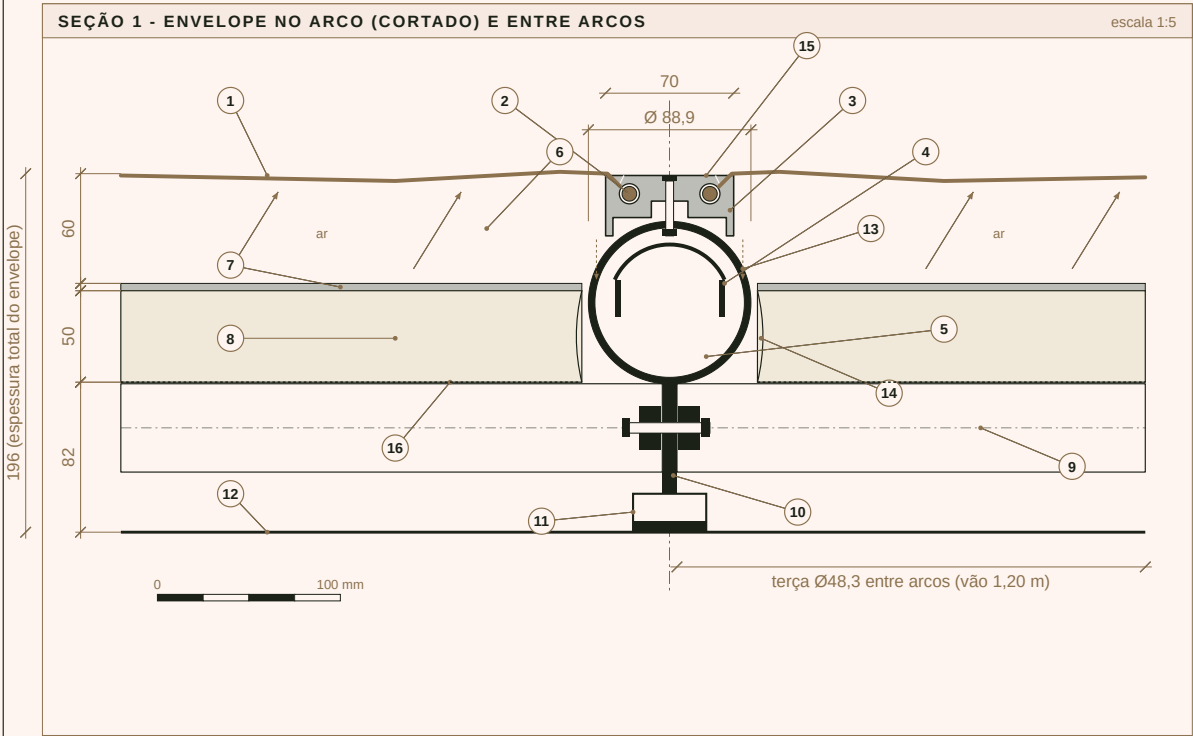

LEGENDA

- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1

2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking

3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze

4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco

5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)

6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira

7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas

8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, λ = 0,040 W/mK (R = 1,25)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueados M16

10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)

11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão

12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6


13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta

14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)

15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)

16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-01

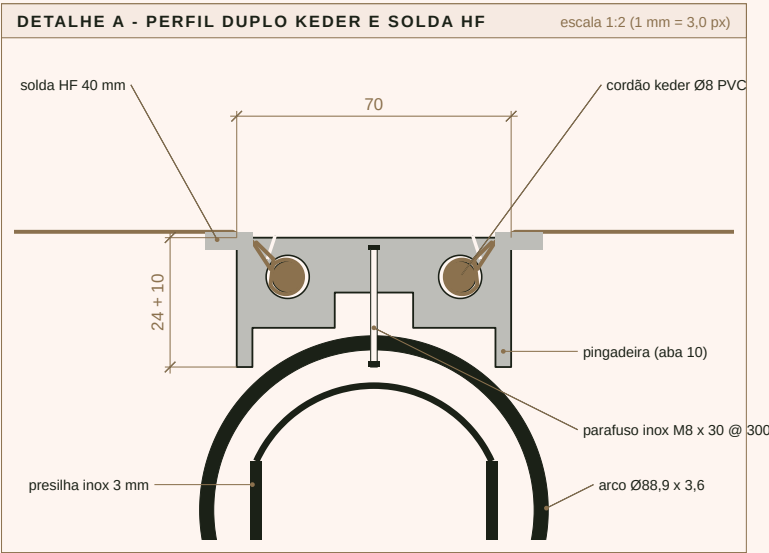

RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.
Especificação: U ≈ 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U ≈ 1,6 W/m²K.

 SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO ZION CASULO	ESCALA 1:5 (1 mm = 1,4 px)	
	FOLHA DET-01	DATA SET 2026



ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

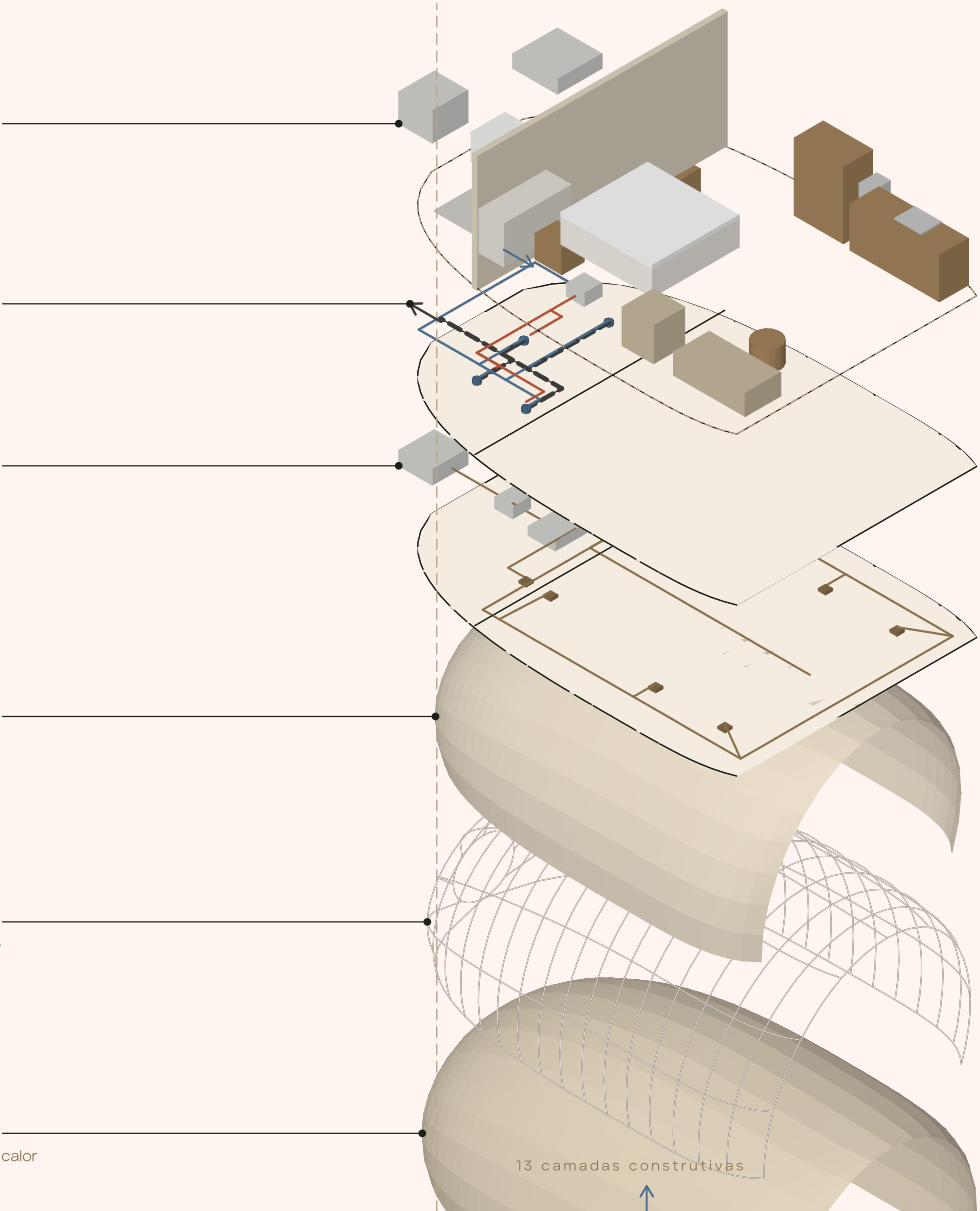


ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05


(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40

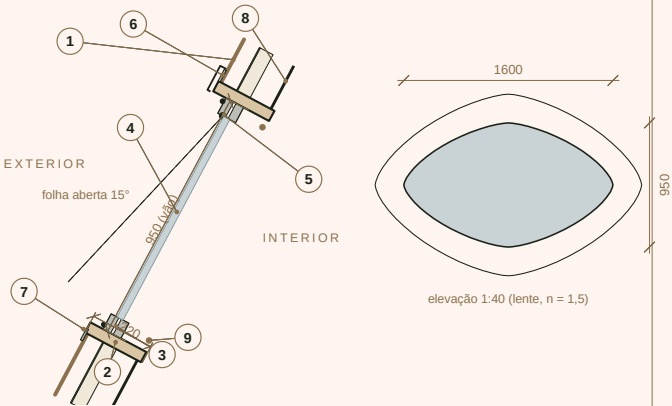


(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5

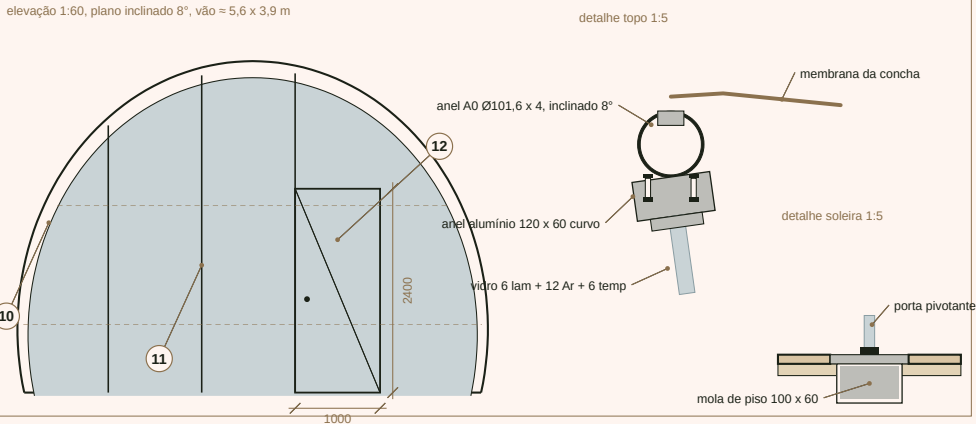

(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5

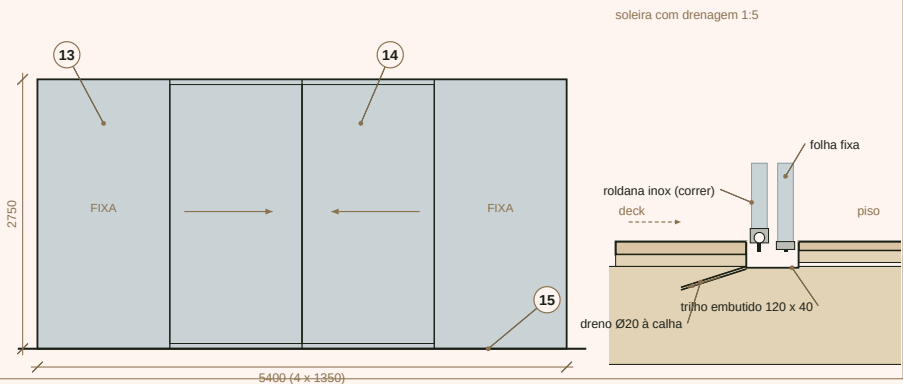


- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)

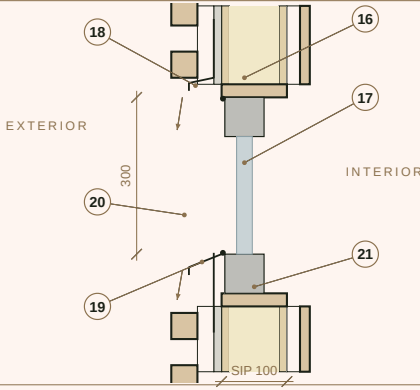

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM


ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

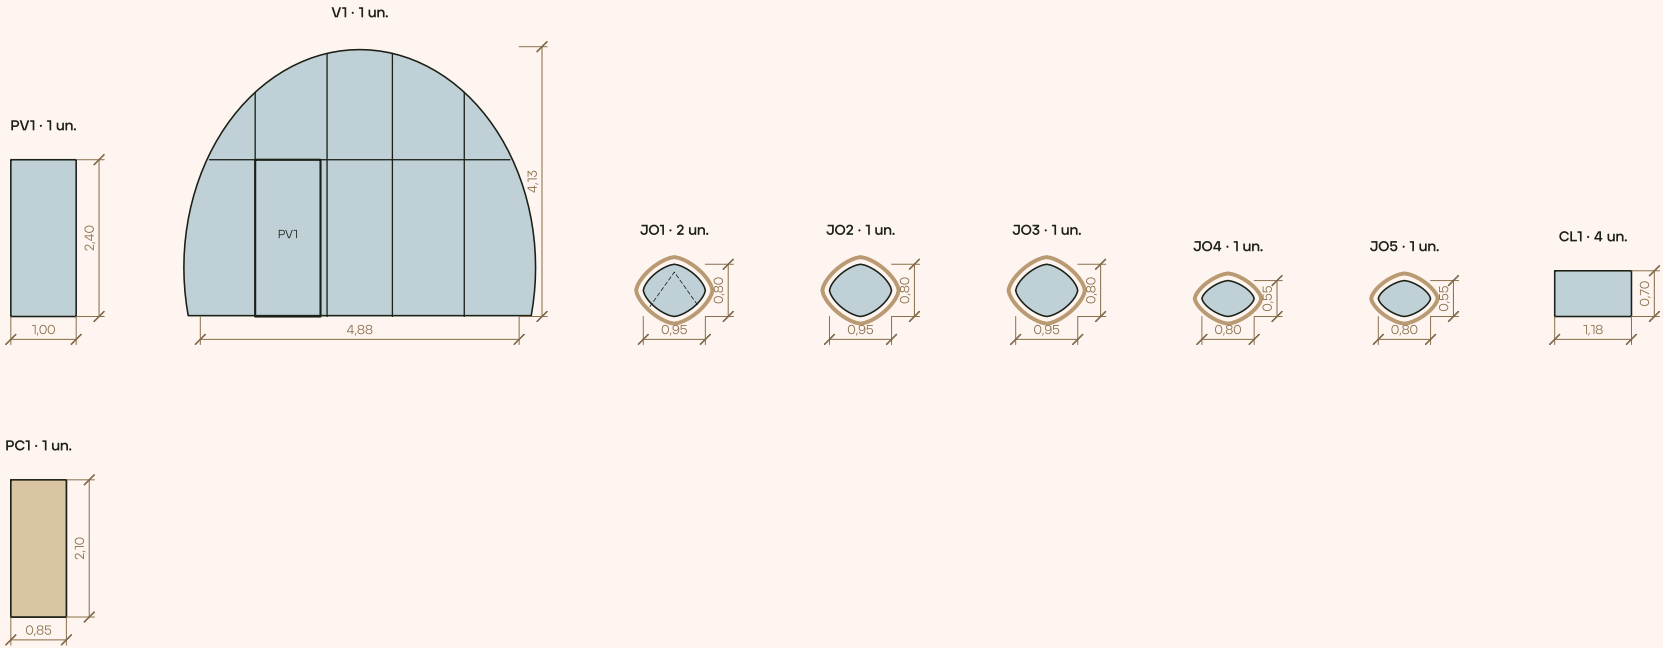

CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95 x 0,80	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suite dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Suite esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL

ZION CASULOZION GLAMPING COLLECTION

QUADRO DE ESQUADRIAS

9 tipos · 13 unidades


ESCALA 1:50 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA PA-09

SET 2026

ZION CASULO · PLANTA DE COBERTURA
Membrana PVDF em 7 painéis entre arcos + tampas; Espinha de Luz; calhas ocultas nos rodapés; tubos de queda Ø75 nas extremidades

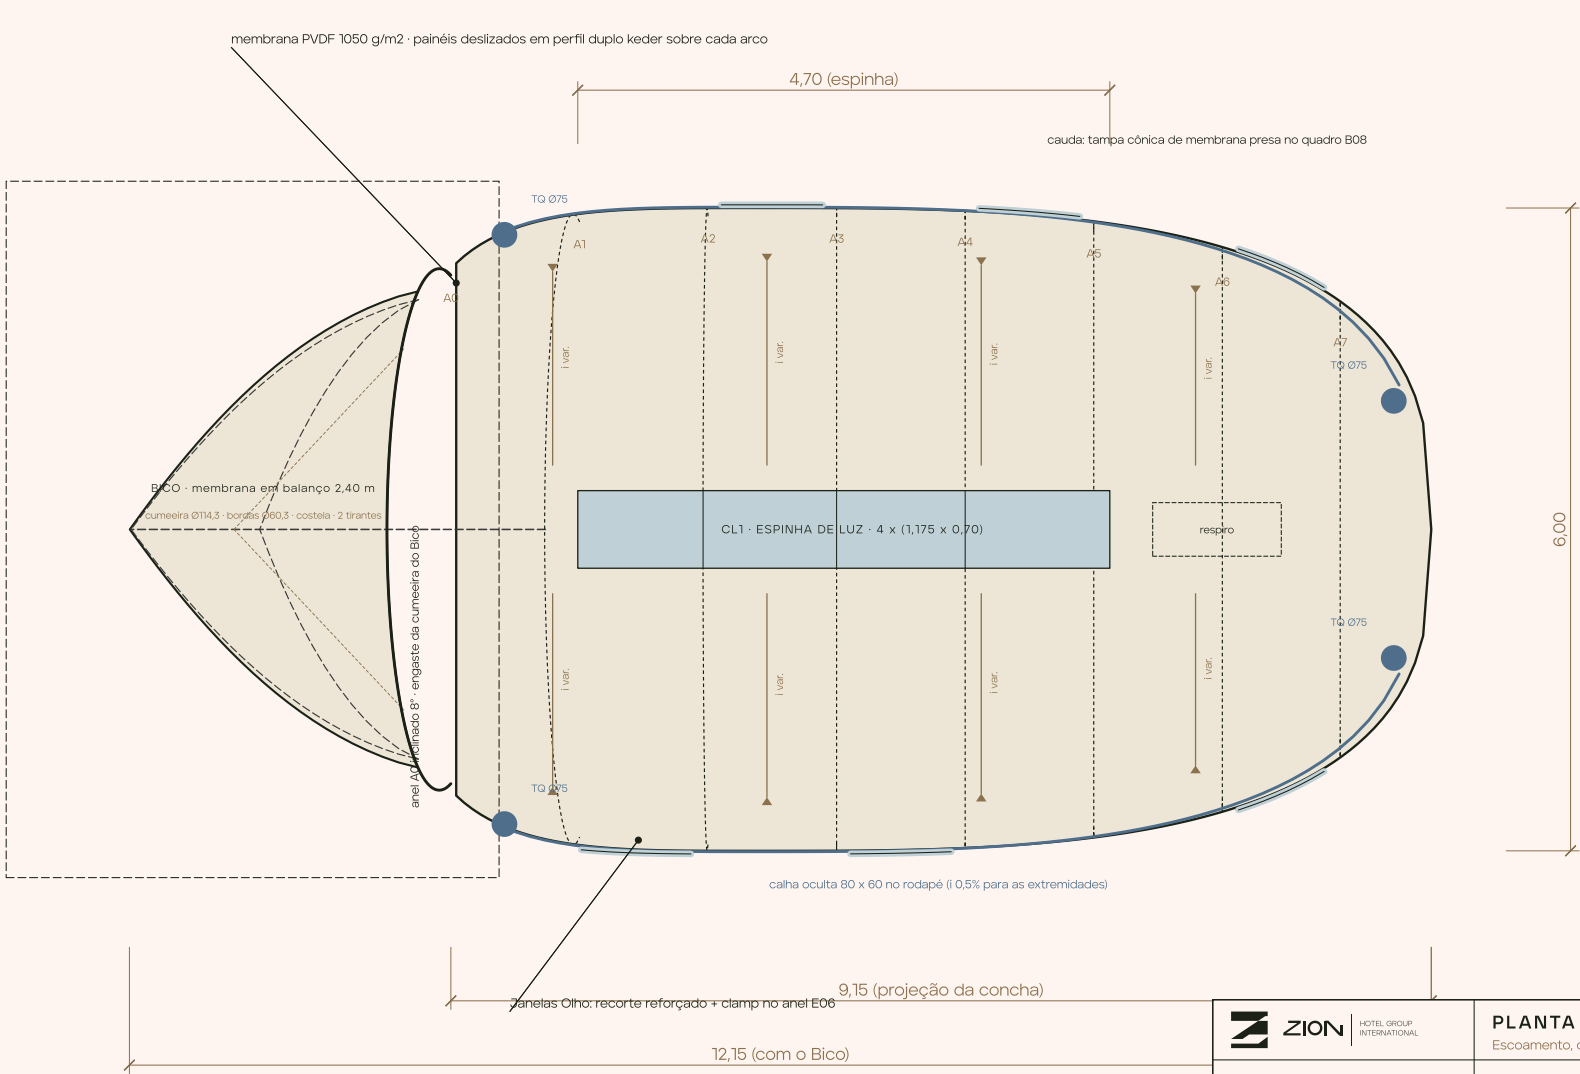

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE COBERTURA Escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo e respiros	
	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA PA-04 SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

31,5 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00	2,40	1	2,4	72	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88	4,13	1	20,15	605	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95	0,80	2	0,76	23	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suíte dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Suíte esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18	0,70	4	0,82	25	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85	2,10	1	1,78	54	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros; tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado) ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias)
2.

Padrões de corte: ZC-LON-001_padroes.dxf e ZC-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90
3.

Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding
4.

Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe
2.

Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido)
3.

Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra
4.

Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração
- Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido
- Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água
- Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado)

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CASULO · LOTE 4 DE 4

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZC-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque

Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte

Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador

Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)

Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Piso, deck e instalações: lote 1

Estrutura: lote 2

Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha

Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos

Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

MARCENARIA ACOPLADA · MA-01 A MA-08

peças fixas fabricadas com a cabana; fundos recortados conforme a seção da concha (gabarito dos arcos A1 a A4); fixação por cantoneiras nos arcos, nunca na membrana

CÓD.	PEÇA	DIMENSÕES (M)	AMB.	FF&E	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
MA-01	Mini cozinha acoplada	2,00 x 0,65 x h 0,90	Estar	M18 · E13 · E14 · E15 · E16 · E17 · E02	Gabinete de 2,00 m acoplado à curva da concha (fundo recortado conforme a seção), em 4 módulos de 0,60 / 0,60 / 0,40 / 0,40; geladeira 120 L sob bancada · forno elétrico compacto 45 L sob o cooktop de indução 2 bocas · cuba 0,40 x 0,35 com torneira gourmet sobre gaveteiro · bancada de preparo com air fryer em nicho e lixeira embutida; tampo em quartzito 30 mm; prateleira flutuante 2,00 x 0,25 a 1,45 m com fita LED e depurador slim 60 cm (filtro de carvão) sob a prateleira; cafeteira e chaleira sobre o tampo	Carvalho natural (portas ripadas) · quartzito · latão escovado · inox
MA-02	Armário baixo / closet embutido	1,10 x 0,65 x h 1,50	Estar / suite	M10 · E03	Armário de 1,10 m com 2 portas ripadas, cabideiro 0,80 m, 3 prateleiras, gaveta e cofre; tampo em pedra com bandeja; tampo posterior inclinado acompanhando a concha	Carvalho natural · ripado termotratado · quartzito
MA-03	Cabeceira acoplada com criados suspensos	0,18 x 3,10 x h 1,30	Suite	M02 · M03 · M16 · F01	Painel curvo estofado em linho 2,60 x 1,30 m fixado à parede do banho, criados suspensos 0,60 x 0,50 a 0,15 m do piso (gaveta com toque), arandelas de leitura, USB e LED de retroiluminação; ripado termotratado da cabeceira até o forro (2,60 m)	Estofado linho · madeira laminada · ripado termotratado · latão
MA-04	Bancada do banho	0,55 x 1,50 x h 0,85	Banho	M12 · M13 · B01	Tampo em pedra 30 mm com cuba esculpida, saia 60 mm, gabinete ripado suspenso (base a 0,25 m) com 2 portas e nicho aberto; espelho Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante; nicho lateral em pedra	Quartzito · ripado termotratado · latão escovado
MA-05	Prateleira e nicho da banheira	1,10 x 0,36 x h 0,60	Banho	B02	Prateleira em pedra 1,10 x 0,36 m a 0,60 m, acoplada à curva da cauda sobre a banheira; nicho para velas e amenities; banquetta e bandeja	Quartzito · madeira
MA-06	Divisória da bacia e painel ripado	0,05 x 0,95 x h 1,20	Banho	M16	Painel ripado de 1,20 m que separa a bacia da circulação, com nicho de papel e apoio; painel ripado contínuo na face do banho da parede divisória	Ripado termotratado sobre placa cimentícia
MA-07	Rodapé técnico removível	8,50 x — x h 0,15	Todos	—	Rodapé de 150 mm em ripado ao longo de toda a concha, removível (fixação por cliques) para acesso a eletrodutos, PEX e caixas de passagem; admissão da câmara ventilada	Ripado termotratado · cliques inox
MA-08	Tampa do ático técnico	0,60 x 0,60 x h 0,00	Banho (forro)	E11	Alçapão 0,60 x 0,60 no forro do banho (2,40 m) com escada retrátil: acesso a QDC, evaporadora e boiler	Compensado naval + ripado

MOBILIÁRIO SOLTO · MS-01 A MS-09

entregue montado; passa pela porta PV1 (1,00 x 2,40): módulos ≤ 0,95 m de largura

CÓD.	PEÇA	DIMENSÕES (M)	AMB.	FF&E	POSIÇÃO
MS-01	Cama king box	1,93 x 2,03 x 0,55	Suíte	M01 · O01	pés para a fachada, cabeceira em MA-03
MS-02	Banco aos pés da cama	1,40 x 0,40 x 0,45	Suíte	M11	x 4,05
MS-03	Chaise de contemplação	1,60 x 0,80 x 0,45	Estar	M06	junto à fachada de vidro, lado direito
MS-04	Poltrona de leitura	0,70 x 0,70 x 0,75	Estar	M07	sob o Olho do estar (dir.)
MS-05	Mesa lateral	Ø0,56 x 0,45	Estar	M08	entre a chaise e a poltrona
MS-06	Luminária de piso · de mesa	—	Estar	F02 · F03	ao lado da poltrona · sobre MA-02
MS-07	Tapetes de lã	2,00 x 3,00 · 1,60 x 2,30	Estar · suíte	F04 · F05	sob a chaise/poltrona · sob a cama
MS-08	Lareira ecológica	0,60 x 0,30 x 0,35	Estar	E08	sobre MA-02 (opcional)
MS-09	Banqueta e bandeja da banheira	0,45 x 0,30 x 0,45	Banho	B02	ao lado da banheira

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

50 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M01	Cama king box + colchão	Box 1,93 x 2,03 revestido em linho, colchão molas ensacadas 32 cm, pillow top	un	1	Suíte
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte · cabeceira curva sob a Espinha de Luz
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M11	Banco aos pés da cama	Banco 1,40 m em madeira e couro	un	1	Suíte
M16	Ripado da cabeceira	Painel ripado termotratado com fitas LED (parede da cabeceira)	m2	12	Suíte / banho · parede da cabeceira
M06	Chaise de contemplação	Chaise 1,60 x 0,80 em madeira e corda náutica, almofada impermeável	un	1	Estar · junto à fachada de vidro
M07	Poltrona de leitura	Poltrona giratória em couro natural e madeira	un	1	Estar
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa lateral Ø0,56
M18	Mini cozinha acoplada	Marcenaria sob medida 2,00 m acoplada à concha: tampo em quartzito, cuba, módulos para geladeira, forno, gaveteiro e lixeira, prateleira com LED (Casulo)	un	1	Estar · mini cozinha 2,00 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Estar · armário baixo embutido 1,10 m
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada 1,50 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	1	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	2	Suíte
F02	Luminária de piso	Luminária de piso em madeira e linho, 2700 K	un	1	Estar
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	1	Estar
F04	Tapete de lã	Tapete de lã tecido à mão 2,00 x 3,00	un	1	Estar
F05	Tapete de lã (pequeno)	Tapete de lã 1,60 x 2,30	un	1	Suíte
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	6,5	Fachada · 6,50 m de fachada de vidro
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Espinha de Luz · tela de sombreamento 0,70 x 4,70
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E16	Geladeira sob bancada	Refrigerador 120 L sob bancada com congelador, classe A, silencioso (< 40 dB), porta com painel ripado	un	1	Mini cozinha · sob bancada
E13	Cooktop de indução 2 bocas	Cooktop de indução 2 zonas, 30 x 52 cm, 3,5 kW, 220 V, embutido no tampo	un	1	Mini cozinha · circuito dedicado C13
E14	Forno elétrico compacto	Forno elétrico de embutir 45 L, 60 cm, 1,8 kW, porta de vidro duplo, 220 V	un	1	Mini cozinha · circuito dedicado C14

E15	Air fryer	Fritadeira sem óleo 5 L, 1,5 kW, em nicho ventilado sobre o tampo	un	1	Mini cozinha
E17	Depurador de ar slim	Depurador 60 cm com filtro de carvão ativado, 2 velocidades, LED, recirculação	un	1	Mini cozinha
E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganso	cj	1	Mini cozinha
E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Armário
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E08	Aquecedor / lareira ecológica	Lareira a etanol de mesa ou de piso (inverno)	un	1	Estar
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Porta PV1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Ático técnico
E07	Hidromassagem externa	Hot tub de 4 lugares, fibra, aquecimento a gás/elétrico, cobertura térmica	un	1	Deck · opcional: hot tub Ø1,90 no deck

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Mini cozinha
O09	Utensílios de cozinha	Jogo de panelas para indução, frigideira, tábua, facas, utensílios, escorredor, potes	cj	1	Mini cozinha
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papeleria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR


CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D01	Espreguiçadeiras	Par de espreguiçadeiras em madeira teca e corda náutica, almofadas outdoor	par	1	Deck
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Deck
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Deck
D05	Ducha externa	Ducha de deck em aço inox com base de cumaru	un	1	Deck

BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B02	Banqueta e bandeja da banheira	Banqueta de teca e bandeja para banheira	cj	1	Banho · banheira 1,60
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho

ZION CASULO · PLANTA DE LAYOUT DE INTERIORES

Marcenaria acoplada (MA) e mobiliário solto (MS) · cotas de mobiliário e circulação · 1:50

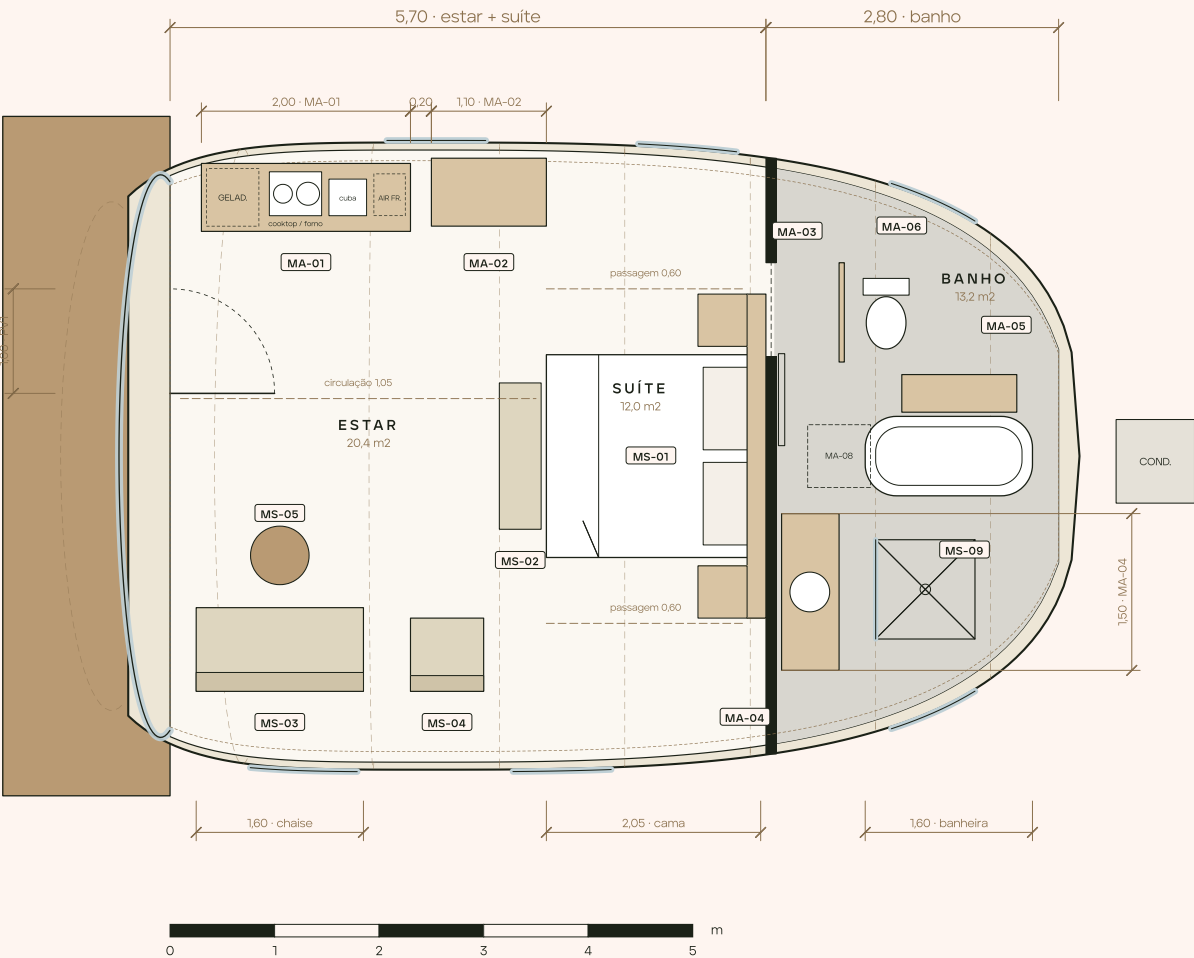

LEGENDA

- MA - marcenaria acoplada (fixa, fabricada com a cabana)
- MS - mobiliário solto (FF&E, entregue montado)
- MA-07 - rodapé técnico removível 150 mm

MARCENARIA ACOPLADA

- MA-01 - Mini cozinha acoplada - Estar
- MA-02 - Armário baixo / closet embutido - Estar / suite
- MA-03 - Cabeceira acoplada com criados suspensos - Suite
- MA-04 - Bancada do banho - Banho
- MA-05 - Prateleira e nicho da banheira - Banho
- MA-06 - Divisória da bacia e painel ripado - Banho
- MA-07 - Rodapé técnico removível - Todos
- MA-08 - Tampa do ático técnico - Banho (forro)

MOBILIÁRIO SOLTO

- MS-01 - Cama king box - 1,95 x 2,03 x 0,55
- MS-02 - Banco aos pés da cama - 1,40 x 0,40 x 0,45
- MS-03 - Chaise de contemplação - 1,60 x 0,80 x 0,45
- MS-04 - Poltrona de leitura - 0,70 x 0,70 x 0,75
- MS-05 - Mesa lateral - Ø0,56 x 0,45
- MS-06 - Luminária de piso - de mesa -
- MS-07 - Tapetes de lã - 2,00 x 3,00 - 1,60 x 2,30
- MS-08 - Lareira ecológica - 0,60 x 0,30 x 0,35
- MS-09 - Banqueta e bandeja da banheira - 0,45 x 0,30 x 0,45

5,86 · largura útil

1,50 · MA-04

COND.

1,50 · MA-04

1,50 · MA-04

1,50 · MA-04

1,50 · MA-04

1,50 · MA-04


1,50 · MA-04

1,50 · MA-04


 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA DE LAYOUT DE INTERIORES Marcenaria acoplada MA-01 a MA-08 · mobiliário solto MS-01 a MS-09	
	ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA IN-01 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION CASULO · ELEVAÇÕES INTERNAS A E B
A · parede da cabeceira (olhar +x) · B · lateral esquerda: mini cozinha, armário e Olhos (olhar +y) · 1:40

ELEVAÇÃO A · CABECEIRA · x = 6,60

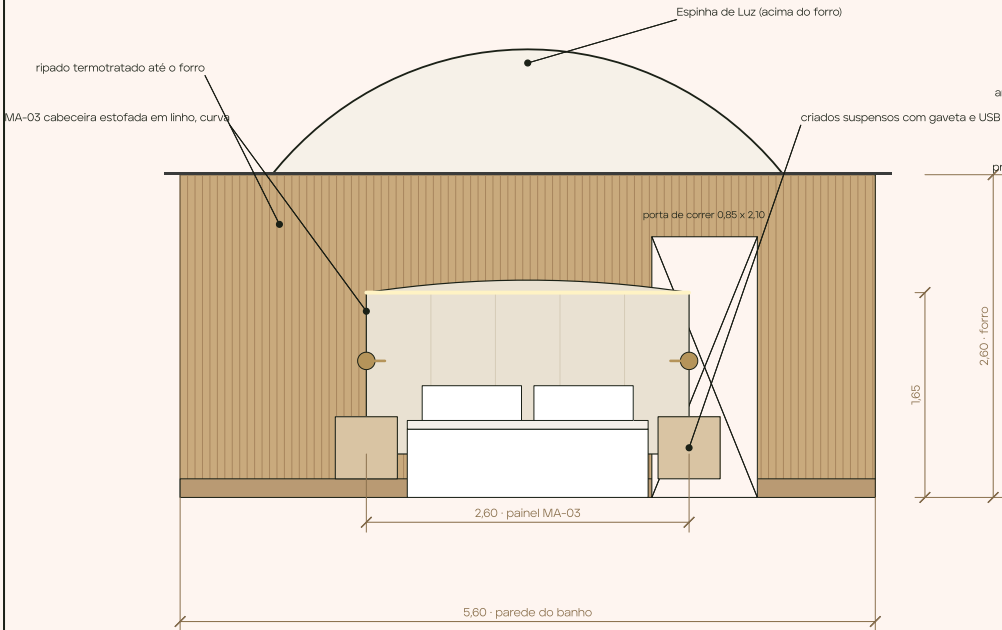

ELEVAÇÃO B · LATERAL ESQUERDA · y = +2,90

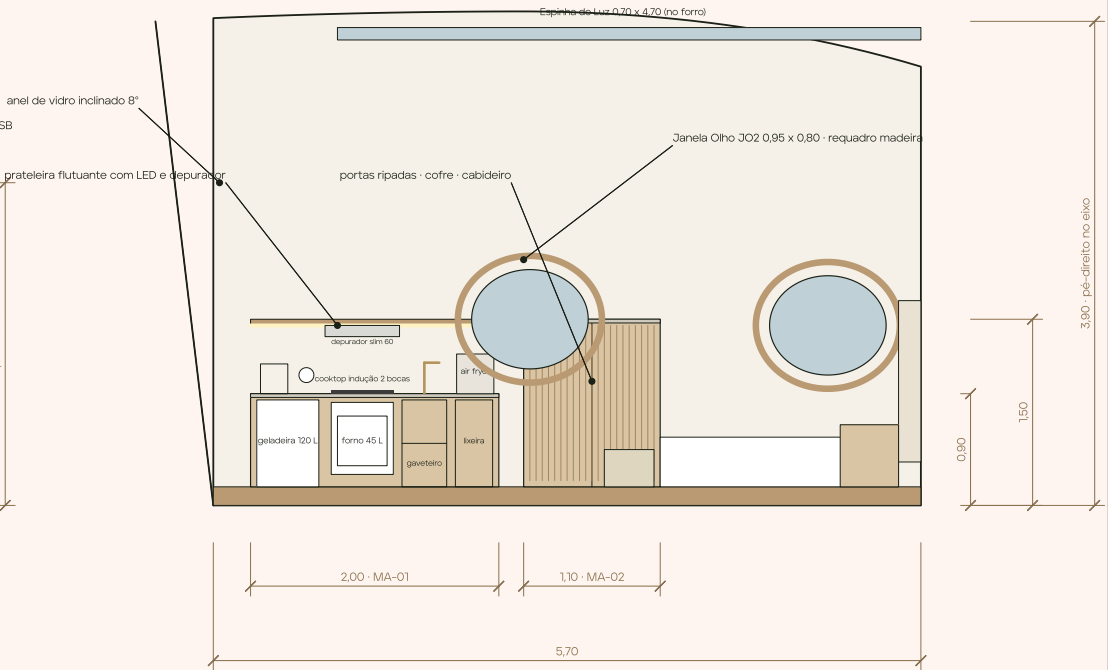



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ELEVAÇÕES INTERNAS A E B Cabeceira acoplada MA-03 · mini cozinha MA-01 · armário MA-02	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:40 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA IN-03 SET 2026





ZION CASULO · DETALHES DA MARCENARIA ACOPLADA

MA-01 mini cozinha · MA-03 cabeceira e criados · MA-04 bancada do banho · MA-02 armário na curva · 1:20 e 1:10


MA-01 · MINI COZINHA · CORTE 1:20 (módulo forno + c. MoA-101) MINI COZINHA · VISTA FRONTAL 1:20

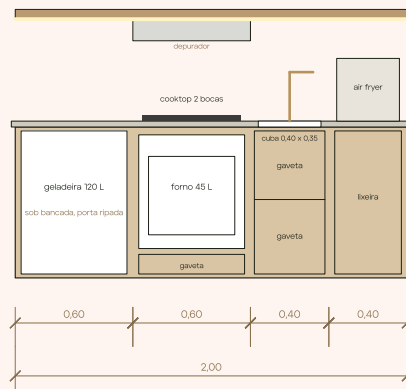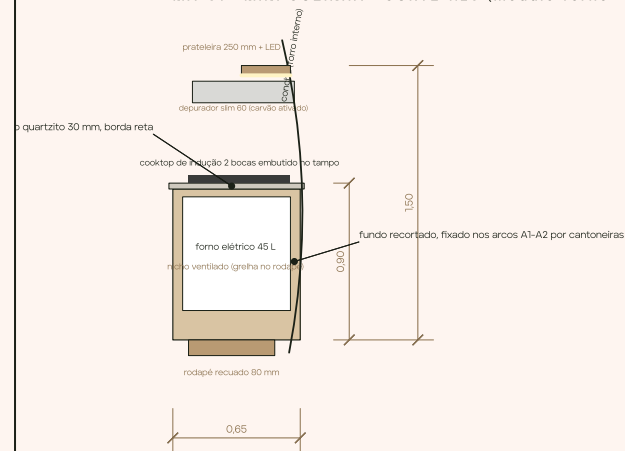

MA-03 · CABECEIRA E C ADO SUSPENSO · CORTE 1:15 MA-04 · BANCADA · CORTE 1:15

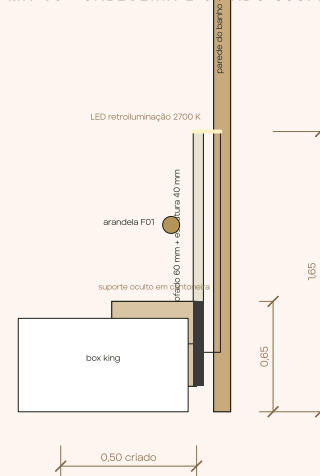

MA-02 · ARMÁRIO ACOPLADO À CURVA · CORTE 1:20

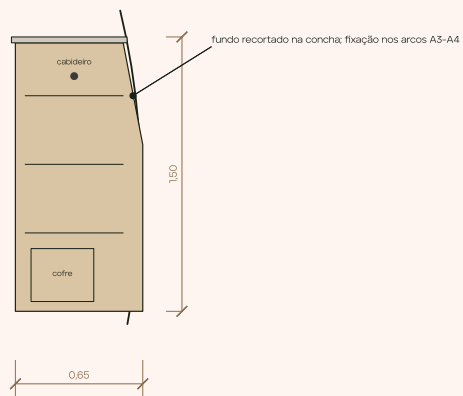

NOTAS DE MARCENARIA ACOPLADA

- Toda a marcenaria MA é fabricada em fábrica, montada e acabada antes do embarque; em campo só se nivela e se fixa.
- Fixação à estrutura: cantoneiras de aço galvanizado parafusadas aos arcos (nunca à membrana); fundos recortados com folga de 15 mm para a concha e fechados com perfil de EPDM.
- Madeira: quartzo natural em lâmina sobre MDF naval 18 mm; ripado: termotratado 20 x 40; verniz PU fosco 2 demãos.
- Pedra: curatizo 30 mm, bordas retas polidas; cubas esculpidas com impermeabilização de fábrica.
- Ferragens: dobradiças e corredeiras com amortecimento; puxadores cava ou em latão escovado; fitas LED 2700 K IP20 (IP65 no banheiro) com perfil difusor.
- Elétrica embutida na marcenaria: cooktop (C13, 20 A) e forno (C14, 16 A) em circuitos dedicados, tomadas da mini cozinha (C3, USB nos cráteis; passagem pelo rodapé técnico MA-07; cuba com AF/AQ 020 e sifão 050).
- Tolerâncias: ± 3 mm nas dimensões; conferência com gabarito da seção da concha antes da fabricação (arcos A1 a A4).

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

DETALHES DA MARCENARIA ACOPLADA

MA-01 mini cozinha · MA-02 · MA-03 · MA-04

ESCALA 1:20 / 1:10 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA IN-05

SET 2026

ZION CASULO · QUADRO DE MOBILIÁRIO E MARCENARIA

Marcenaria acoplada (MA) com descrição, dimensões, materiais e FF&E relacionado · mobiliário solto (MS) · 1:50 na planta IN-01

MARCENARIA ACOPLADA

CÓD.	PEÇA	DIMENSÕES (M)	AMB.	FF&E	DESCRIÇÃO	MATERIAIS / ACABAMENTO
MA-01	Mini cozinha acoplada	2,00 x 0,65 x h 0,90	Estar	M18 · E13 · E14 · E15 · E16 · E17 · E02	Gabinete de 2,00 m acoplado à curva da concha (fundo recortado conforme a seção), em 4 módulos de 0,60 / 0,60 / 0,40 / 0,40; geladeira 120 L sob bancada · forno elétrico compacto 45 L sob o cooktop de indução 2 bocas · cuba 0,40 x 0,35 com torneira gourmet sobre gaveteiro · bancada de preparo com air fryer em nicho e lixeira embutida; tampo em quartzito 30 mm; prateleira flutuante 2,00 x 0,25 a 1,45 m com fita LED e depurador slim 60 cm (filtro de carvão) sob a prateleira; cafeteira e chaleira sobre o tampo	Carvalho natural (portas ripadas) · quartzito · latão escovado · inox
MA-02	Armário baixo / closet embutido	1,10 x 0,65 x h 1,50	Estar / suíte	M10 · E03	Armário de 1,10 m com 2 portas ripadas; cabideiro 0,80 m, 3 prateleiras; gaveta e cofre; tampo em pedra com bandeja; tampo posterior inclinado acompanhando a concha	Carvalho natural · ripado termotratado · quartzito
MA-03	Cabeceira acoplada com criados suspensos	0,18 x 3,10 x h 1,30	Suíte	M02 · M03 · M16 · F01	Palmei curvo estofado em linho 2,60 x 1,30 m fixado à parede do banho; criados suspensos 0,60 x 0,50 a 0,15 m do piso (gaveta com toque), arandelas de leitura, USB e LED de retroiluminação; ripado termotratado da cabeceira até o forro (2,60 m)	Estofado linho · madeira laminada · ripado termotratado · latão
MA-04	Bancada do banho	0,55 x 1,50 x h 0,85	Banho	M12 · M13 · B01	Tampo em pedra 30 mm com cuba esculpida, sala 60 mm; gabinete ripado suspenso (base a 0,25 m) com 2 portas e nicho aberto; espelho Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante; nicho lateral em pedra	Quartzito · ripado termotratado · latão escovado
MA-05	Prateleira e nicho da banheira	1,10 x 0,36 x h 0,60	Banho	B02	Prateleira em pedra 1,10 x 0,36 m a 0,60 m; acoplada à curva da cauda sobre a banheira; nicho para velas e amenities; banqueta e bandeja	Quartzito · madeira
MA-06	Divisória da bacia e painel ripado	0,05 x 0,95 x h 1,20	Banho	M16	Painel ripado de 1,20 m que separa a bacia da circulação; com nicho de papel e apoio; painel ripado contínuo na face do banho da parede divisória	Ripado termotratado sobre placa cimentícia
MA-07	Rodapé técnico removível	8,50 m lineares x h 0,15	Todos	—	Rodapé de 160 mm em ripado ao longo de toda a concha, removível (fixação por cliques) para acesso a eletrodutos, PEX e caixas de passagem; admissão da câmara ventilada	Ripado termotratado · cliques inox
MA-08	Tampa do ático técnico	0,60 x 0,60	Banho (forro)	E11	Alçapão 0,60 x 0,60 no forro do banho (2,40 m) com escada retrátil: acesso a QDC, evaporadora e boiler	Compensado naval + ripado

MOBILIÁRIO SOLTO (FF&E)

CÓD.	PEÇA	DIMENSÕES (M)	AMB.	FF&E	POSIÇÃO
MS-01	Cama king box	1,93 x 2,03 x 0,55	Suíte	M01 · O01	pés para a fachada, cabeceira em MA-03
MS-02	Banco aos pés da cama	1,40 x 0,40 x 0,45	Suíte	M11	x 4,05
MS-03	Chaise de contemplação	1,60 x 0,80 x 0,45	Estar	M06	junto à fachada de vidro, lado direito
MS-04	Poltrona de leitura	0,70 x 0,70 x 0,75	Estar	M07	sob o Olho do estar (dir.)
MS-05	Mesa lateral	00,56 x 0,45	Estar	M08	entre a chaise e a poltrona
MS-06	Luminária de piso · de mesa	—	Estar	F02 · F03	ao lado da poltrona · sobre MA-02
MS-07	Tapetes de lã	2,00 x 3,00 · 1,60 x 2,30	Estar · suíte	F04 · F05	sob a chaise/poltrona · sob a cama
MS-08	Lareira ecológica	0,60 x 0,30 x 0,35	Estar	E08	sobre MA-02 (opcional)
MS-09	Banqueta e bandeja da banheira	0,45 x 0,30 x 0,45	Banho	B02	ao lado da banheira

Itens de FF&E não posicionados na planta (enxoval, amenities, papelaria, kit de segurança, luminárias de deck) constam da lista completa em ffe.py / Catálogo da Linha.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL

ZION CASULOZION GLAMPING COLLECTION

QUADRO DE MOBILIÁRIO E MARCENARIA

MA-01 a MA-08 · MS-01 a MS-09

ESCALA s/ escala (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA IN-06

SET 2026

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntas e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Console café, armário baixo, criados fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos $\leq 0,95 \times 2,10$ m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas

FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega

Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação

Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.

Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.

Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.

Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).

Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION SAFARI · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZS-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m²

INTERNOS

28,0 m²

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picate 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

30 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-2,60	-2,60
F02	-2,60	-1,30
F03	-2,60	0,00
F04	-2,60	1,30
F05	-2,60	2,60
F06	-0,20	-2,60
F07	-0,20	-1,30
F08	-0,20	0,00
F09	-0,20	1,30
F10	-0,20	2,60
F11	2,20	-2,60
F12	2,20	-1,30
F13	2,20	0,00
F14	2,20	1,30
F15	2,20	2,60

PONTO	X (M)	Y (M)
F16	4,60	-2,60
F17	4,60	-1,30
F18	4,60	0,00
F19	4,60	1,30
F20	4,60	2,60
F21	7,00	-2,60
F22	7,00	-1,30
F23	7,00	0,00
F24	7,00	1,30
F25	7,00	2,60
F26	9,40	-2,60
F27	9,40	-1,30
F28	9,40	0,00
F29	9,40	1,30
F30	9,40	2,60

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do terraço	5	3,00	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	19,5	98	Corte + furação Ø14	Cabeçotes F02 + emenda D06
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do corpo (2 trechos de 4,75)	10	4,75	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	309	Corte + furação Ø14	Emenda D06 + 4 M12; cabeçotes F02
A03	Viga transversal T1 a T7	7	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	309	Corte + furação	Cantoneira D07 + 4 M12
A04	Viga de borda do corpo (perímetro 9,5 x 5,4, 6 trechos)	6	5,00	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo)	ZAR-230 galv. Z275	65,0	390	Corte + furação + solda dos caixões	D06 + chapas de base dos pilares D01
A05	Viga da passarela lateral 0,80 m	2	4,75	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	62	Corte + furação	D07
A06	Quadro da hidromassagem (reforço 1,9 x 1,9)	1	8,00	U 150 x 60 x 3,0 duplo	ZAR-230 galv. Z275	104,0	104	Corte + solda	D07 + 4 estacas próprias
F01	Estaca helicoidal Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m (compressão)	30	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	551	Compra	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável + chapa D04	37	0,25	Barra M30 + chapa	aço galv.	2,2	81	Compra	M30 + 4 M12
F03	Estaca helicoidal de tração Ø76, hélice Ø300, L 2,5 m, cabeça com olhal	7	2,50	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice + olhal	ASTM A500 / A36 galv.	22,6	158	Compra + olhal soldado	Esticador do estai C04

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação


ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (malha 2,4 m, piso + deck)	m	110	715	PREÇO A COTAR
Vigotas 50 x 150 tratadas a cada 400 mm	m	191	718	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	48	102	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	48	580	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	33	298	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	15	450	PREÇO A COTAR
Deck cumaru 20 x 140 (terraço + passarela)	m2	28	560	PREÇO A COTAR


Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes (30 + 7 de tração)	un	37	696	PREÇO A COTAR
--	----	----	-----	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 18k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	115	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 30 L/min (ou bomba de calor 300 L)	un	1	30	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico 16 módulos, cabos, fitas LED, luminárias, DR	cj	1	85	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação	cj	1	55	PREÇO A COTAR
Chaminé do Respiro com veneziana motorizada + exaustor com recuperador	cj	1	25	PREÇO A COTAR

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais

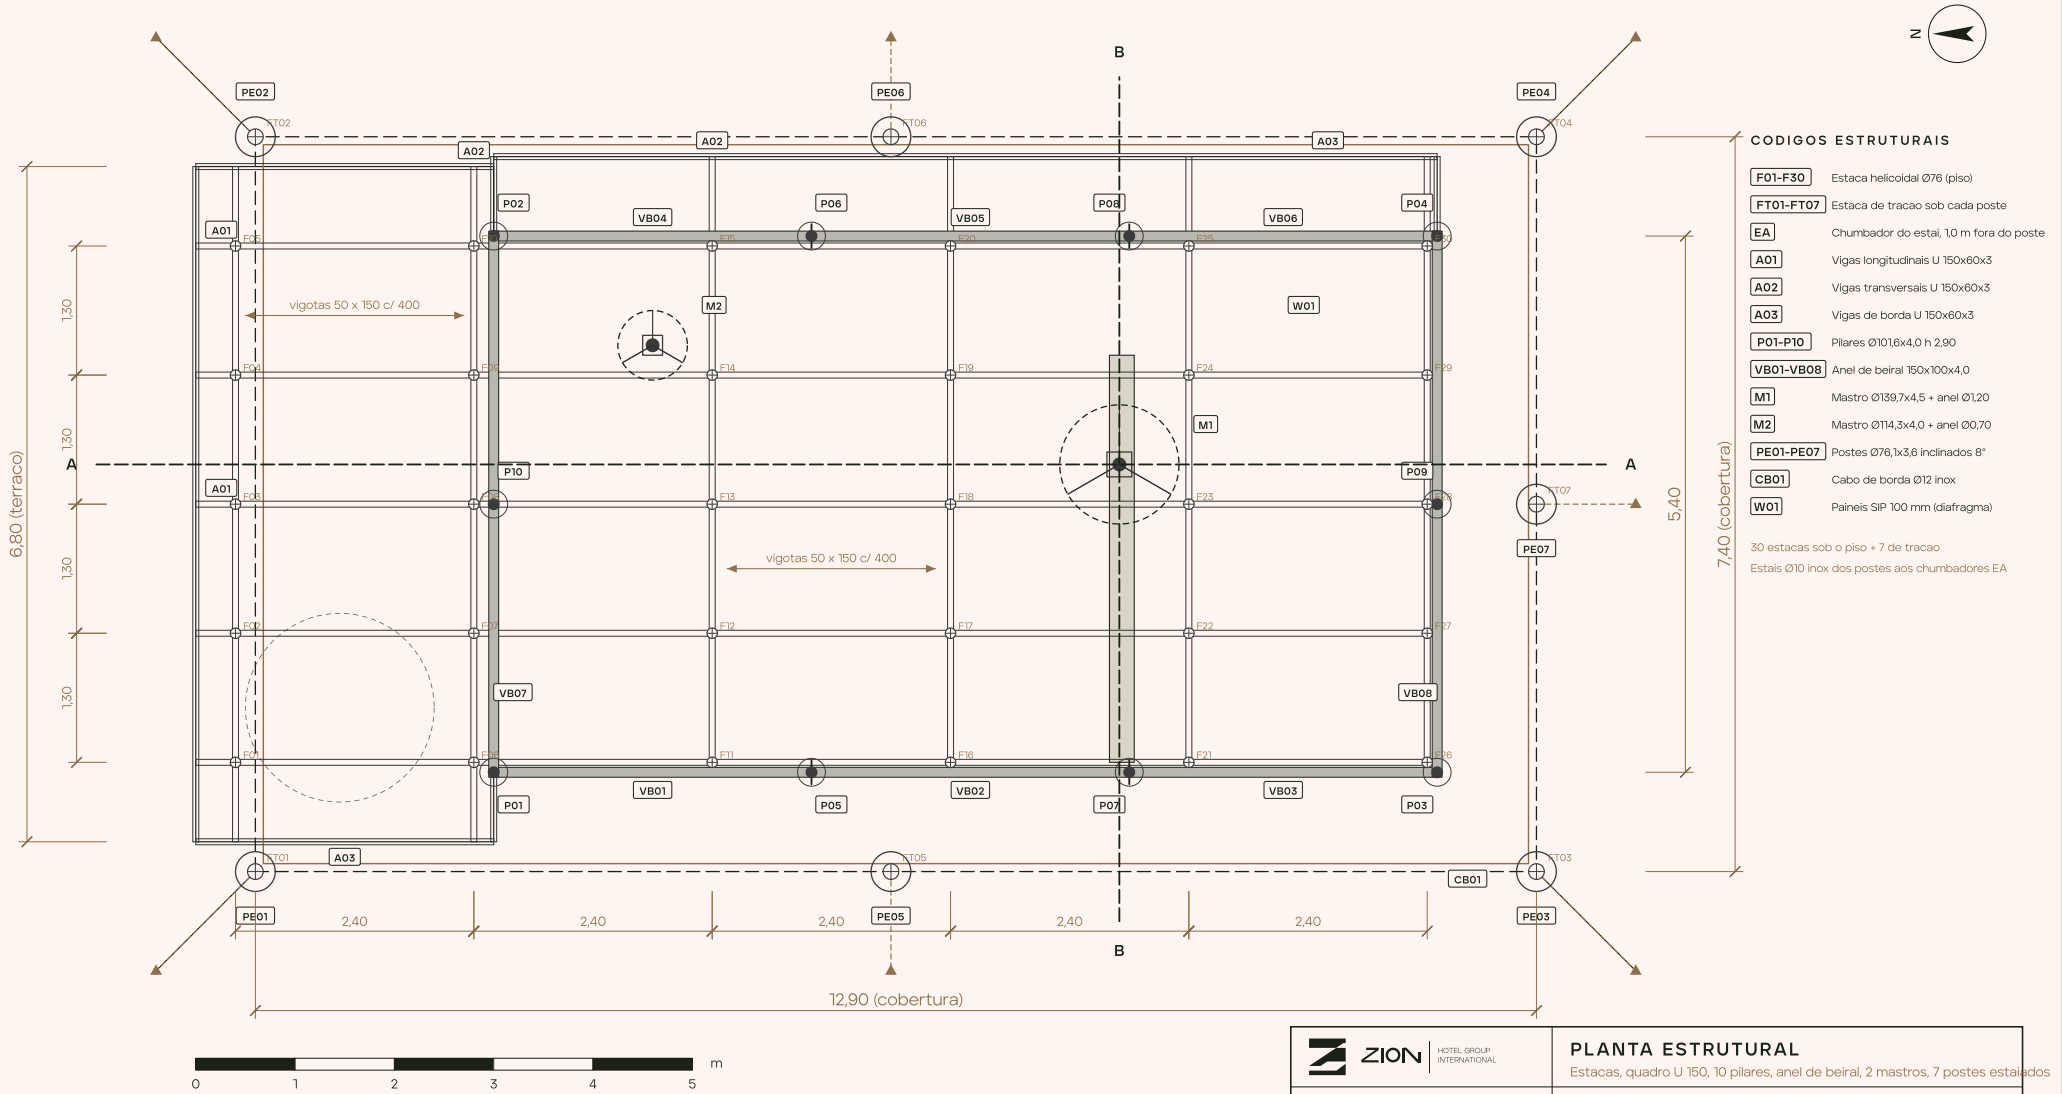

 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 03b/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO


Estacas helicoidais, cabecotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

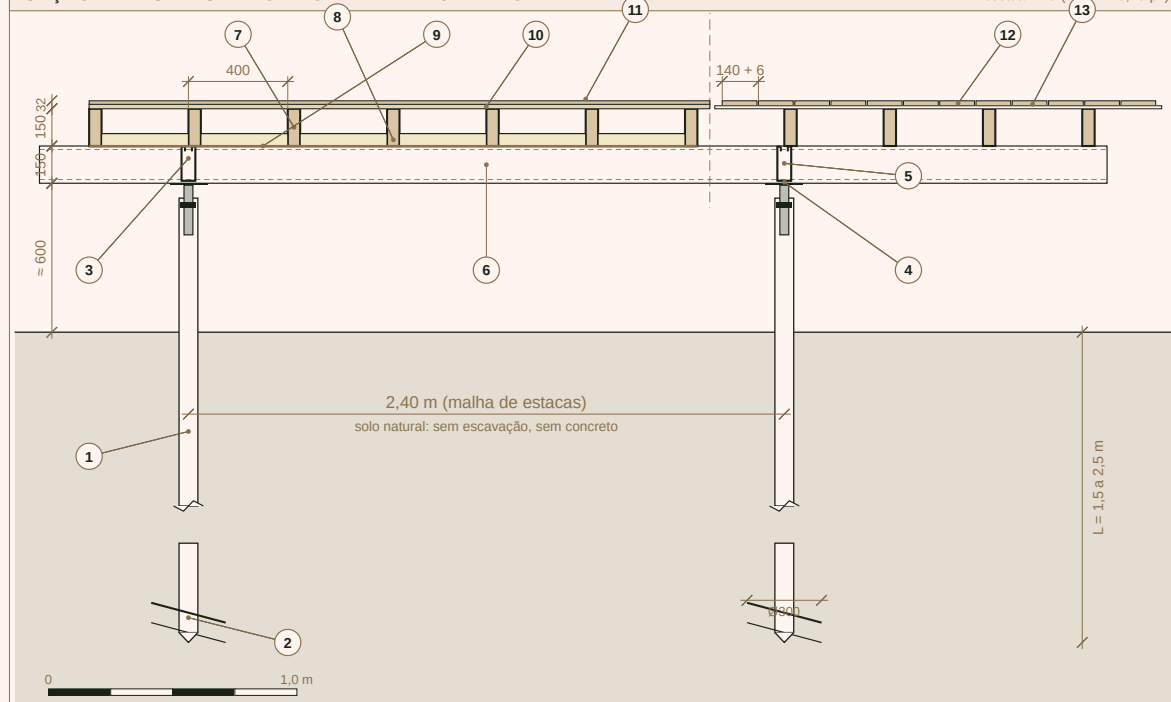

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EJEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)


) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

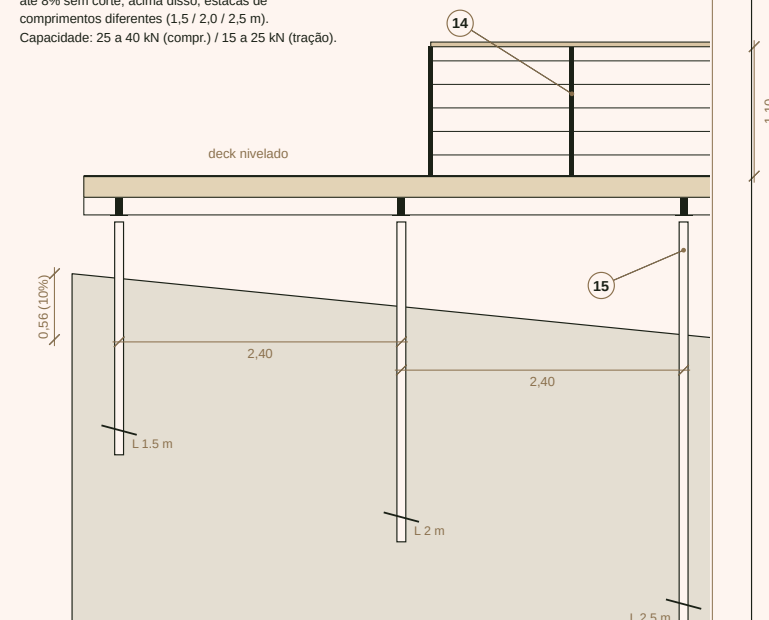

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico | 9 | Manta de fechamento inferior (respirável, anti-odor) grampeada às vigotas |
| 2 | Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem | 10 | Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas |
| 3 | Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento | 11 | Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato |
| 4 | Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U | 12 | Deck externo: cumaru ou termotrataada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta |
| 5 | Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas) | 13 | Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno) |
| 6 | Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari) | 14 | Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira |
| 7 | Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto) | 15 | Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado |
| 8 | Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado | | |



ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA




DET-04

DATA
SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

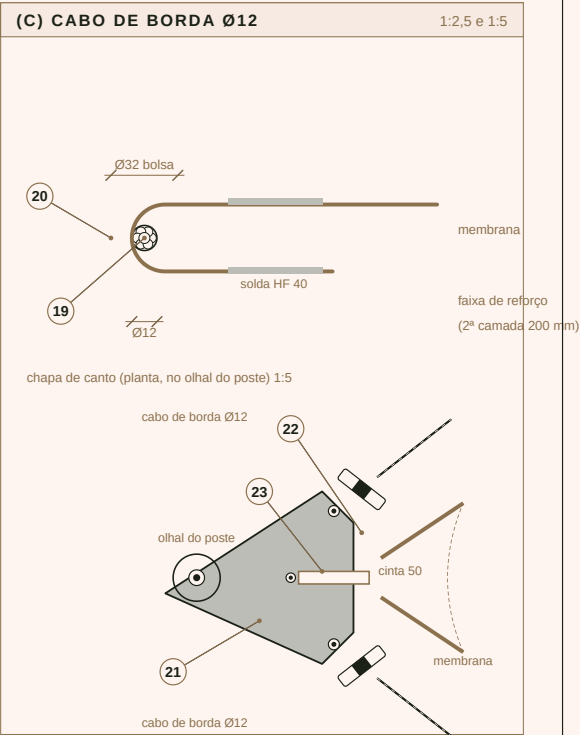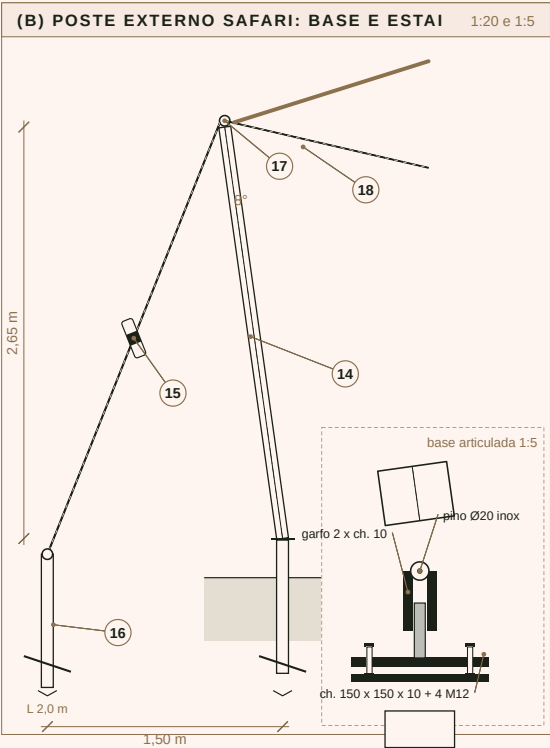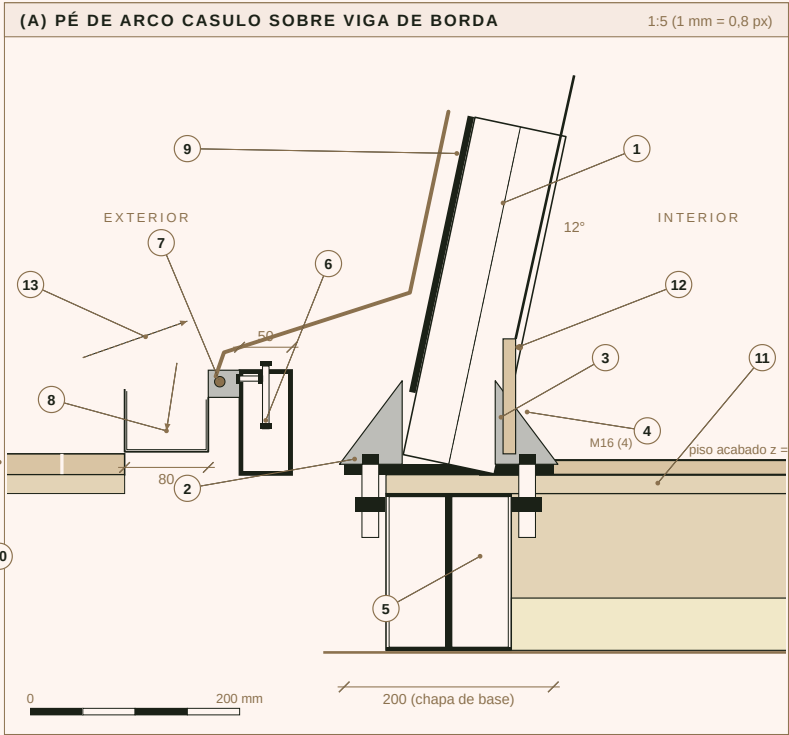

LEGENDA




- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL
Esgoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

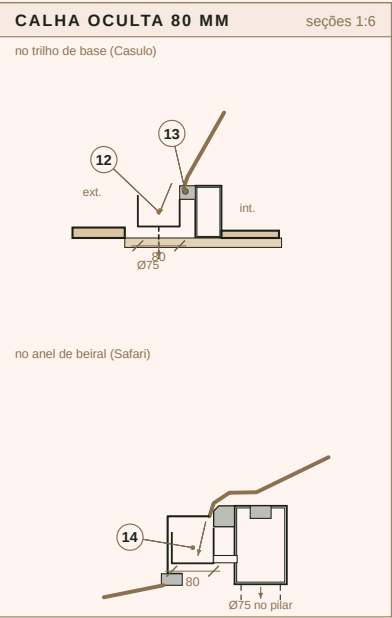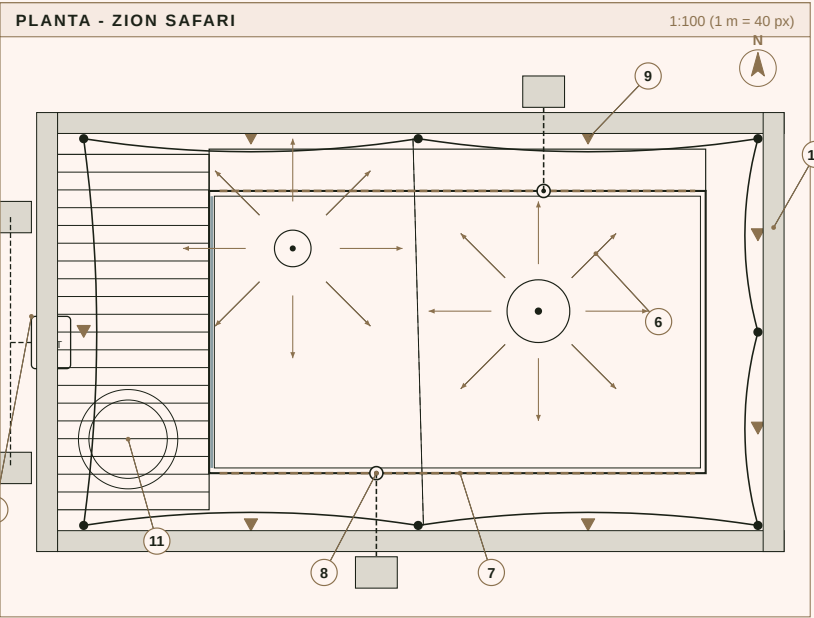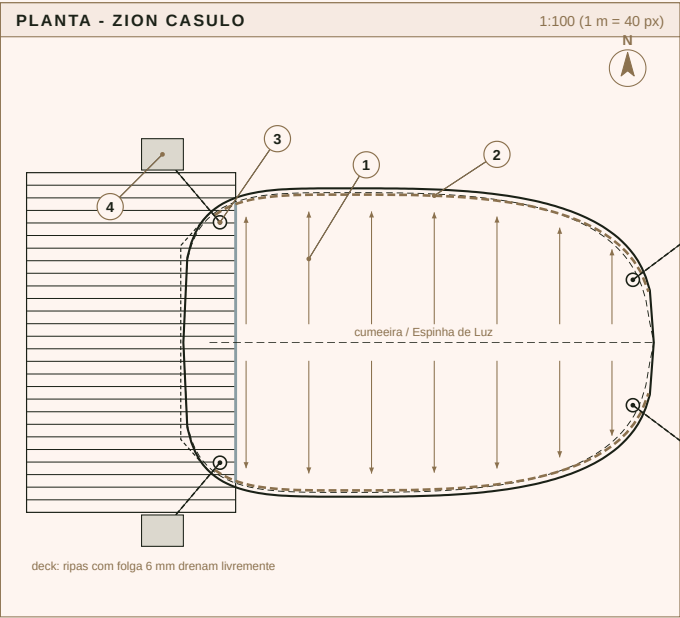

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Esgoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Esgoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026


INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08


PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

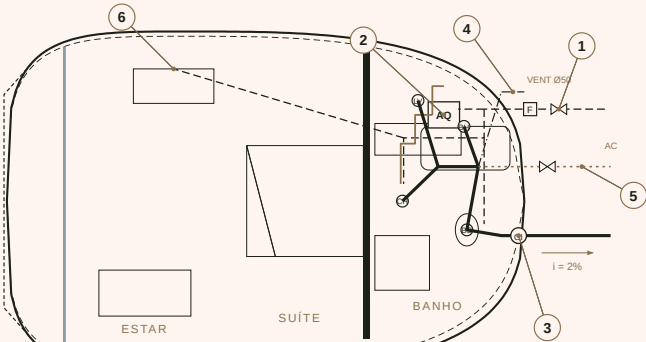


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100

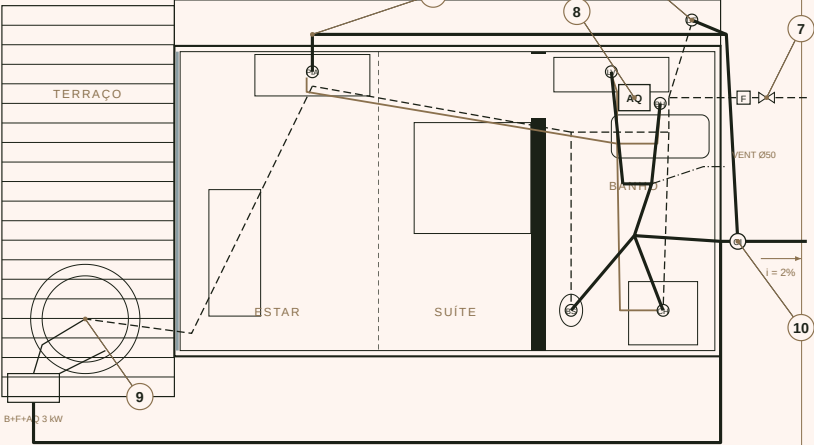

ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)

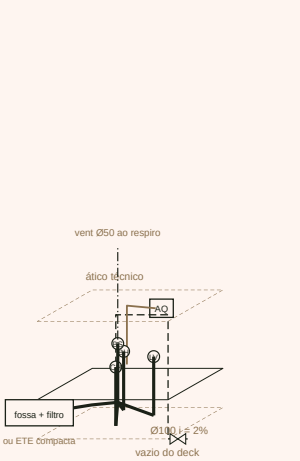

ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1

Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2

Aquecedor no ático técnico
- 3

Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4

Coluna de ventilação Ø50
- 5

Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6

Ponto de água do minibar (estar)
- 7

Entrada AF Safari pelos fundos
- 8

Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9

Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10

CI e saída do coletor pelos fundos
- 11

Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12

Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
-

águas cinzas (opcional)
- ⊗

registro / válvula

- LV

lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS

bacia PIA ilha do café DE ducha ext.
- CI

caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA DET-08	DATA SET 2026




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100

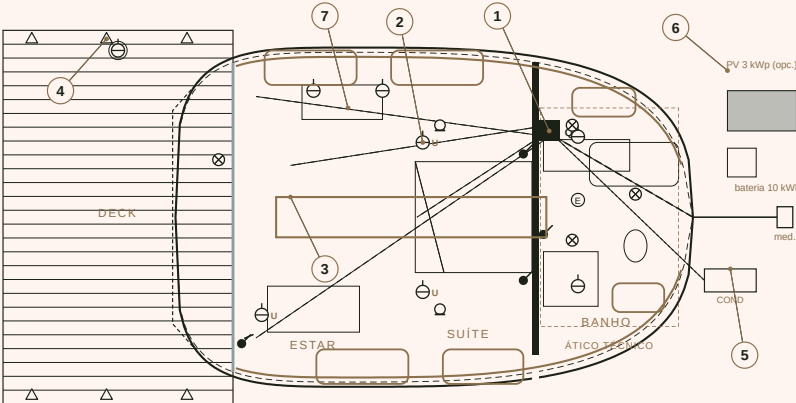

PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100


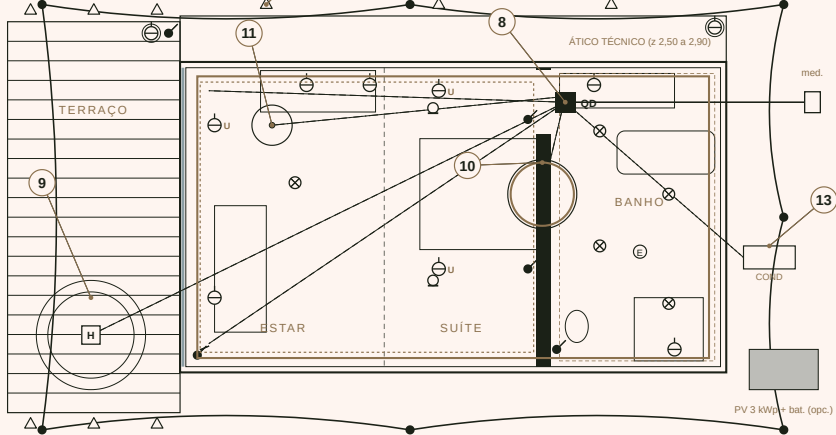


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO SAFARI)

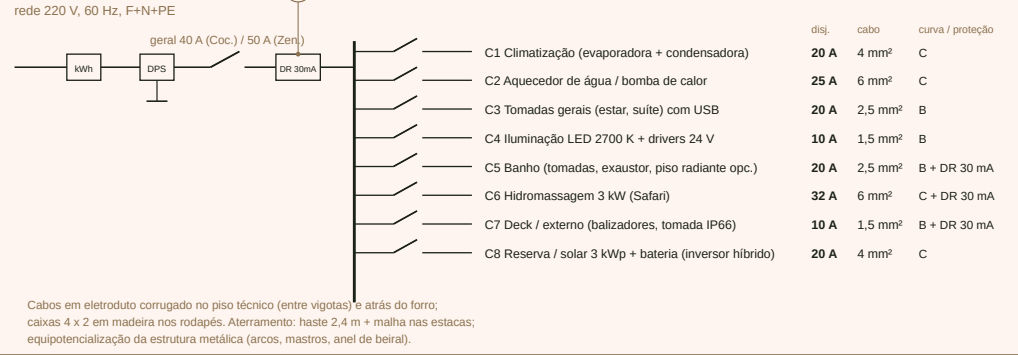

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- Balizadores de deck 12 V
- Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- QD 16 módulos no ático do banho
- Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- Fita LED no anel do forro do Óculo
- Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- Balizadores no terraço e na passarela
- Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÃO ELÉTRICA	ESCALA	
	1:100 / sem escala	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-07	SET 2026


CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09


PLANTA - ZION CASULO (12.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100

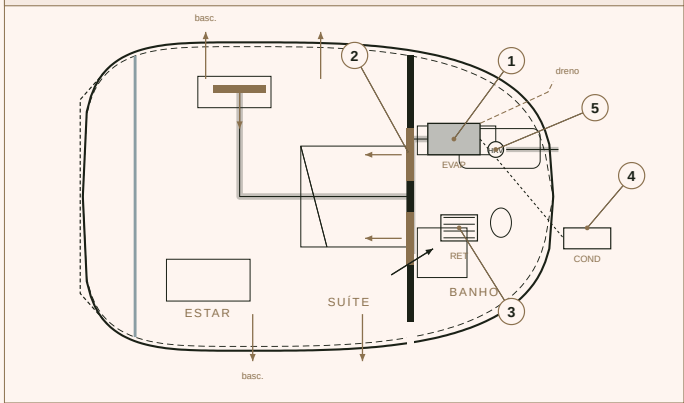

SEÇÃO LONGITUDINAL - CASULO (VENTILAÇÃO E AR)


1:75 (1 m = 50 px)

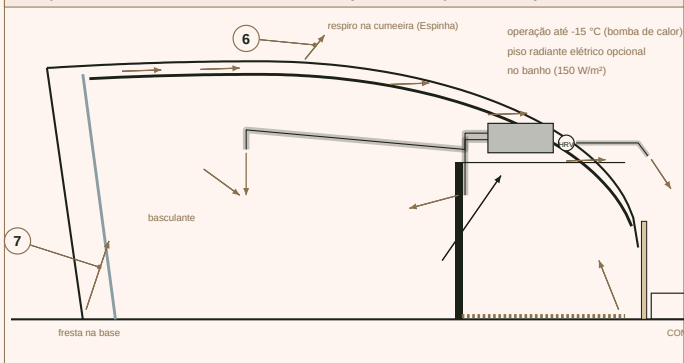

Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.


PLANTA - ZION SAFARI (18.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100

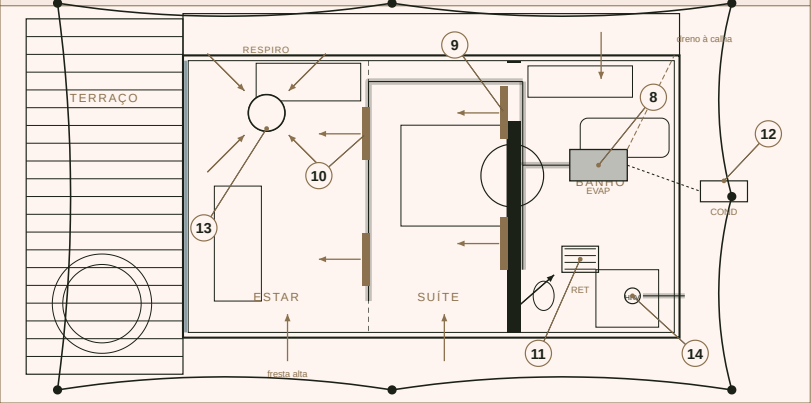

SEÇÃO LONGITUDINAL - SAFARI (VENTILAÇÃO E AR)

≈ 1:95 (1 m = 40 px)

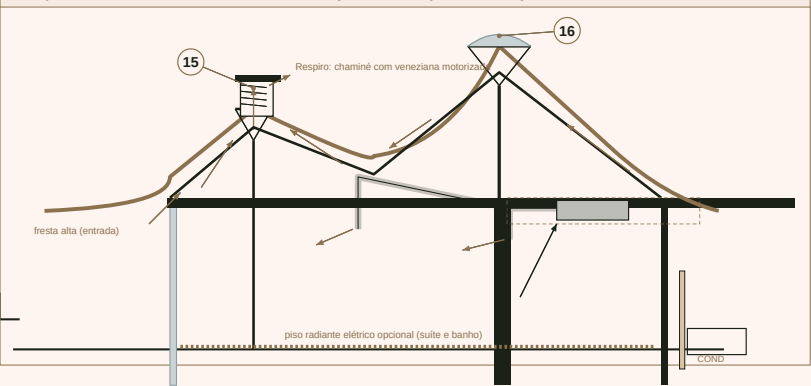

LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura

Notas

Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

ZION GLAMPING COLLECTION
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 37 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os MT2 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 16 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.	Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.	Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.	Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.	Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.	Prazo por etapa e equipe proposta
4.	Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION SAFARI · LOTE 2 DE 4

LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZS-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m²

INTERNOS

28,0 m²

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picate 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes $\leq 2,4 \times 1,2 \times 1,2$ m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm $\rightarrow$ grelha ± 10 mm $\rightarrow$ estrutura ± 15 mm no topo $\rightarrow$ lona sem rugas $\rightarrow$ marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

23 tipos de peça · peso total ≈ 1.447 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
B01	Mastro principal M1	1	5,05	Tubo Ø139,7 x 4,5	ASTM A500 Gr. B galv.	79,8	80	Corte + base articulada soldada + capitel usinado	Pino Ø30 na base D09; capitel D10 com 3 M16 para a coroa
B02	Mastro secundário M2	1	4,00	Tubo Ø114,3 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	46,6	47	Idem	Idem
B03	Coroa do Zênite: 3 braços Ø48,3 x 950 + anel Ø1.200	1	0,95	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10 calandrada	ASTM A500 / A36 galv.	39,2	39	Solda em gabarito + usinagem do capitel	Capitel D10: 3 M16 8.8; anel recebe clamp E05 e óculo
B04	Coroa do Respiro: 3 braços Ø48,3 x 700 + anel Ø700 + chaminé	1	0,70	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10	ASTM A500 / A36 galv.	28,8	29	Idem + veneziana de alumínio	Idem
B05	Pilar do corpo P1 a P10	10	2,90	Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	30,4	304	Corte + chapas de topo e base soldadas	Base D01 (4 M16) na viga de borda; topo D11 (4 M16) no anel VB
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB06 (4,75 / 2,70 m)	6	4,97	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	77,5	465	Corte + chapas de topo soldadas + perfil de borda	Chapa de topo D12 com 4 M16 8.8 entre segmentos; D11 nos pilares
C02	Poste externo PE01 a PE07 (inclinado 8°)	7	2,80	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,5	137	Corte + base articulada + olhal soldado	Pino Ø20 na base D13; olhal recebe chapa de canto D14
C03	Cabo de borda Ø12 inox (4 trechos)	4	10,50	Cabo inox AISI 316 Ø12 mm 7 x 19	inox 316	7,5	30	Terminais prensados	Esticador M20 inox nas chapas de canto D14
C04	Estai do poste Ø10 inox	7	4,20	Cabo inox AISI 316 Ø10 mm	inox 316	2,7	19	Terminais prensados	Esticador M16 + olhal da estaca de tração F03
C05	Cabo de suspensão do forro Ø4 inox	16	3,50	Cabo inox Ø4	inox 316	0,3	5	Terminais prensados	Olhais nos braços das coroas e no anel VB
D01	Chapa de base dos pilares (200 x 200 x 10)	10	0,20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	3,1	31	Corte plasma + solda	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6)	24	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	19	Corte + furação	4 M12 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	50	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	45	Corte + furação	2 M12 por aba
D09	Base articulada do mastro (chapa 250 x 250 x 12 + orelhas + pino Ø30)	2	0,25	Chapa A36 + pino SAE 1045	ASTM A36 galv.	9,5	19	Corte + solda + usinagem do pino	4 chumbadores M20 na viga A02 reforçada
D10	Capitel usinado do mastro (disco Ø200 x 20 + 3 orelhas)	2	0,20	Aço SAE 1020 usinado	SAE 1020 galv.	6,8	14	Torno + fresa + solda	3 M16 8.8 para os braços da coroa
D11	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	10	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	14	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral
D12	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10)	12	0,18	Chapa A36	ASTM A36 galv.	2,1	25	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos
D13	Base articulada do poste (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	7	0,15	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	3,4	24	Corte + solda	4 M12 no cabeçote F02
D14	Chapa de canto da membrana (inox 8 mm, 3 furos Ø18)	7	0,18	Chapa inox 304	inox 304	1,1	8	Corte laser	Olhal do poste + 2 esticadores + cinta
E01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha	8	3,75	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	6,0	48	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no anel VB
E02	Perfil de clamp do anel de cumee (alumínio 60 x 12, 2 metades)	2	3,80	Alumínio 6063 usinado	alumínio	4,6	9	Usinagem	M10 inox @150 no anel B03/B04 + EPDM
E03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	24	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	25	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos painéis e anéis internos
E04	Esquadria do óculo Ø1.200 com ruptura térmica	1	3,80	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	12,0	12	Calandra + usinagem	M8 inox no anel + selante estrutural

GEOMETRIA · MASTROS, COROAS, ANEL DE BEIRAL, PILARES E POSTES

coordenadas no sistema do projeto · alturas em metros sobre o piso

MASTROS E COROAS

CUME	X	Y	TOPO DA MEMBRANA	TOPO DO MASTRO	ANEL Ø
Cume principal (Zênite)	6,30	0,40	5,80	5,05	1,20
Cume secundário (Respiro)	1,60	1,60	4,60	4,00	0,70

PILARES DO CORPO (Ø101,6 x 4,0 · topo 2,90)

PILAR	X	Y
P01	0,00	-2,70
P02	0,00	2,70
P03	9,50	-2,70
P04	9,50	2,70
P05	3,20	-2,70
P06	3,20	2,70
P07	6,40	-2,70
P08	6,40	2,70
P09	9,50	0,00
P10	0,00	0,00

POSTES EXTERNOS INCLINADOS 8° (Ø76,1 x 3,6)

POSTE	X	Y	COTA DO CABO DE BORDA
PE01	-2,40	-3,70	2,65
PE02	-2,40	3,70	2,65
PE03	10,50	-3,70	2,65
PE04	10,50	3,70	2,65
PE05	4,00	-3,70	2,65
PE06	4,00	3,70	2,65
PE07	10,50	0,00	2,65

ANEL DE BEIRAL 150 x 100 x 4,0

6 segmentos (4,75 / 4,75 / 2,70 m por lado) com chapas de topo 150 x 180 x 10 e 4 M16 em cada emenda; perímetro 29,8 m; calha oculta no perfil de borda E01. Base articulada dos mastros (D09) e capitéis usinados (D10) conforme DET-11.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 µm) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira ≤ 2,4 x 1,2 m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)


volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: mastros, coroas, anéis, pilares	5,2 x 1,2 x 0,8 m	5	827
Estrado de estrutura 2: anel de beiral, postes, cabos, chapas	4,8 x 1,2 x 0,8 m	4,6	783
Painéis SIP em 2 pacotes	2,8 x 1,25 x 1,3 m	9,1	1828
Caixa da membrana + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	501
Cavaletes de vidro x 4 (fachada, lateral, janelas, óculo)	2,9 x 0,6 x 2,9 m	20,2	1458
Paletes de piso x 2	2,4 x 1,35 x 1,0 m	6,5	1904
Paleta de deck	2,0 x 1,0 x 1,4 m	2,8	979
Paleta de instalações + louças + marcenaria + hidromassagem	2,4 x 2,0 x 1,4 m	6,7	1795
Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	762

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

 ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes

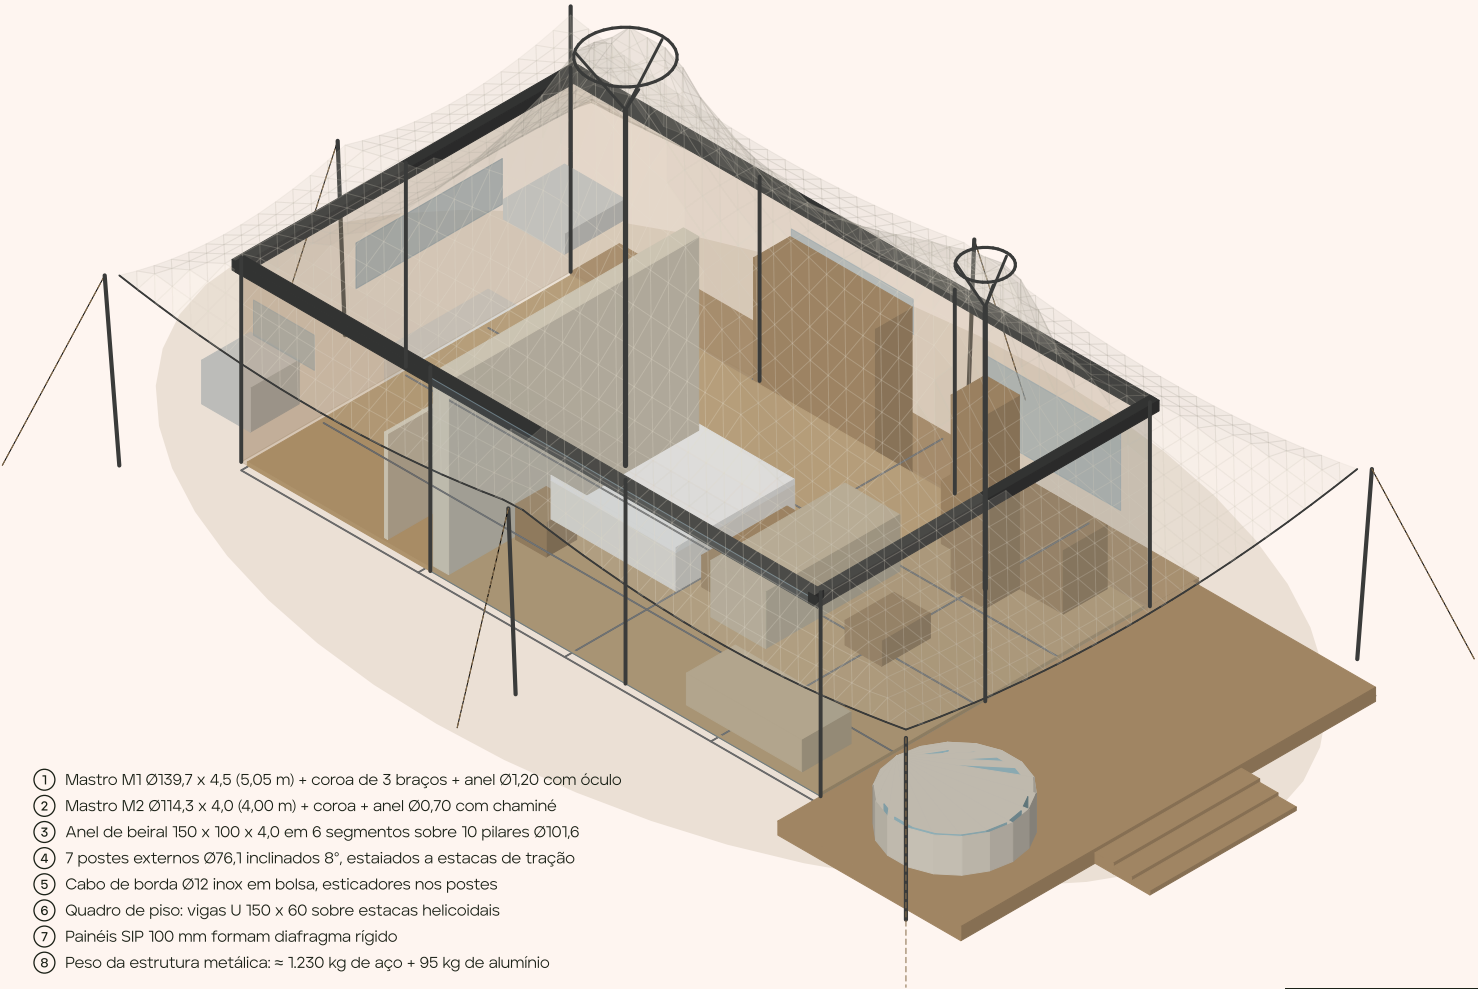



- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais

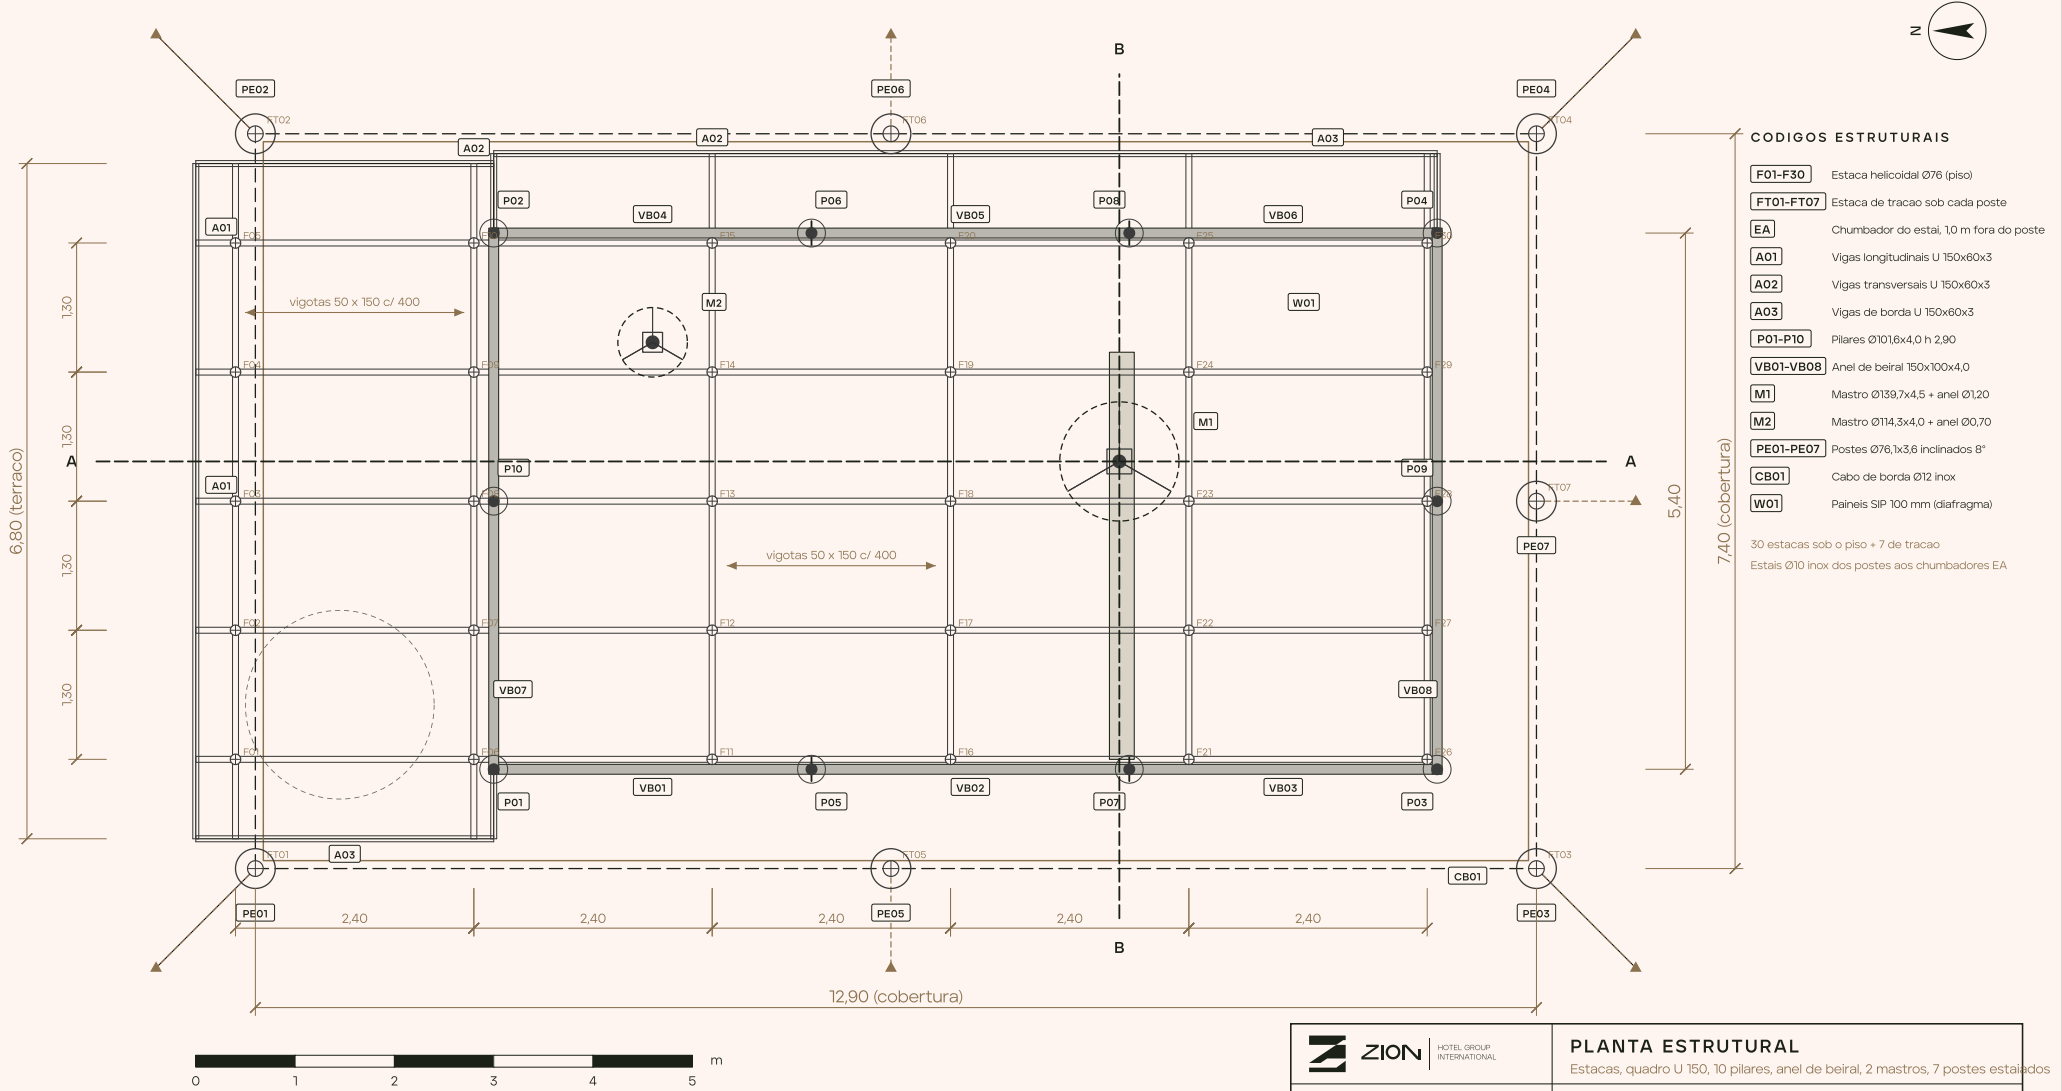

 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 03b/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026


 MASTROS E COROAS

Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cume, anel de beiral parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION SAFARI | DET-11

ELEVAÇÕES - MASTROS M1 E M2

1:47 (1 mm = 0,08 px)

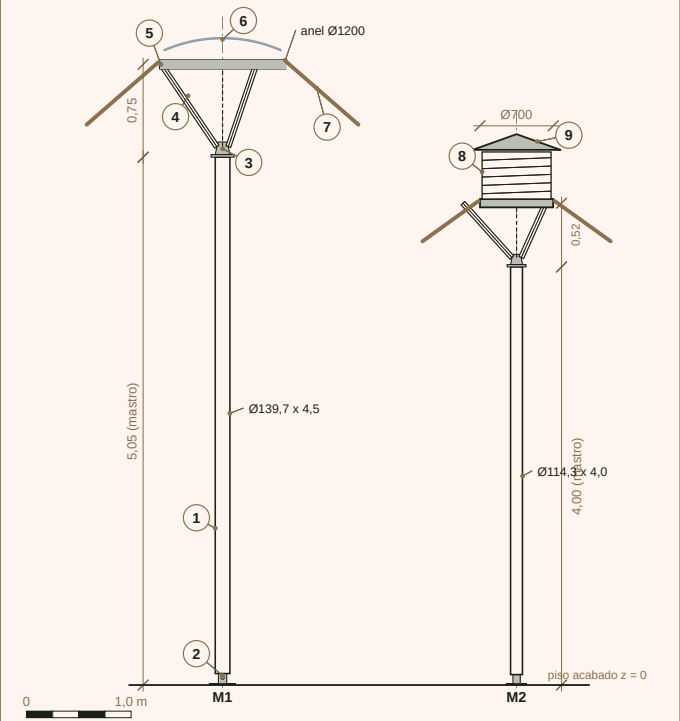


- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó
- 2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30
- 3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)
- 4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°
- 5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200

- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT
- 7 Membrana deixando o anel a = 41°
- 8 Chaminé do Respiró Ø660 com veneziana motorizada
- 9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela
- 10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base


BASE ARTICULADA DO M1

1:5 (1 mm = 0,6 px)

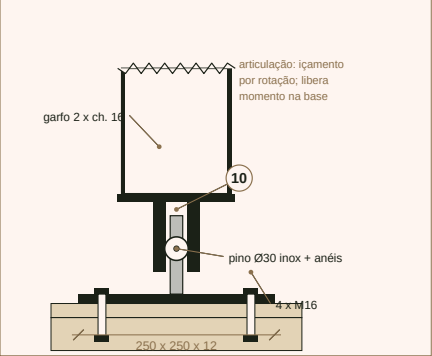

POSTE EXTERNO INCLINADO 8° E ESTAI - GEOMETRIA


1:40 (1 m = 25 px)

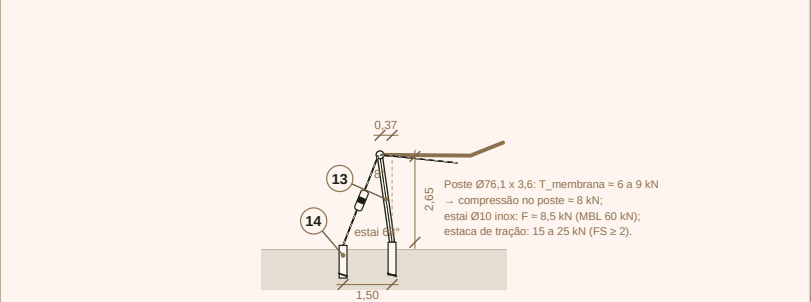

- 11 Emendas do anel de beiral sobre os pilares
- 12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)
- 13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo
- 14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ANEL DE BEIRAL 150 X 100 X 4: SEGMENTOS E EMENDA

1:60 / 1:5

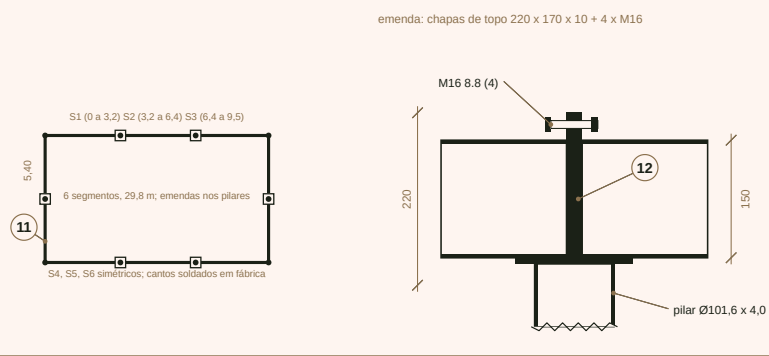

CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS

Vento V0 = 45 m/s, q = 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m² x 95 m² = 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cume (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão (M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ = 106, N_{Rd} = 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beiral: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f = 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) = 38 kN (MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

ZION GLAMPING COLLECTION
MASTROS E COROAS
ZION SAFARI


ESCALA
1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA
DET-11

DATA
SET 2026

ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

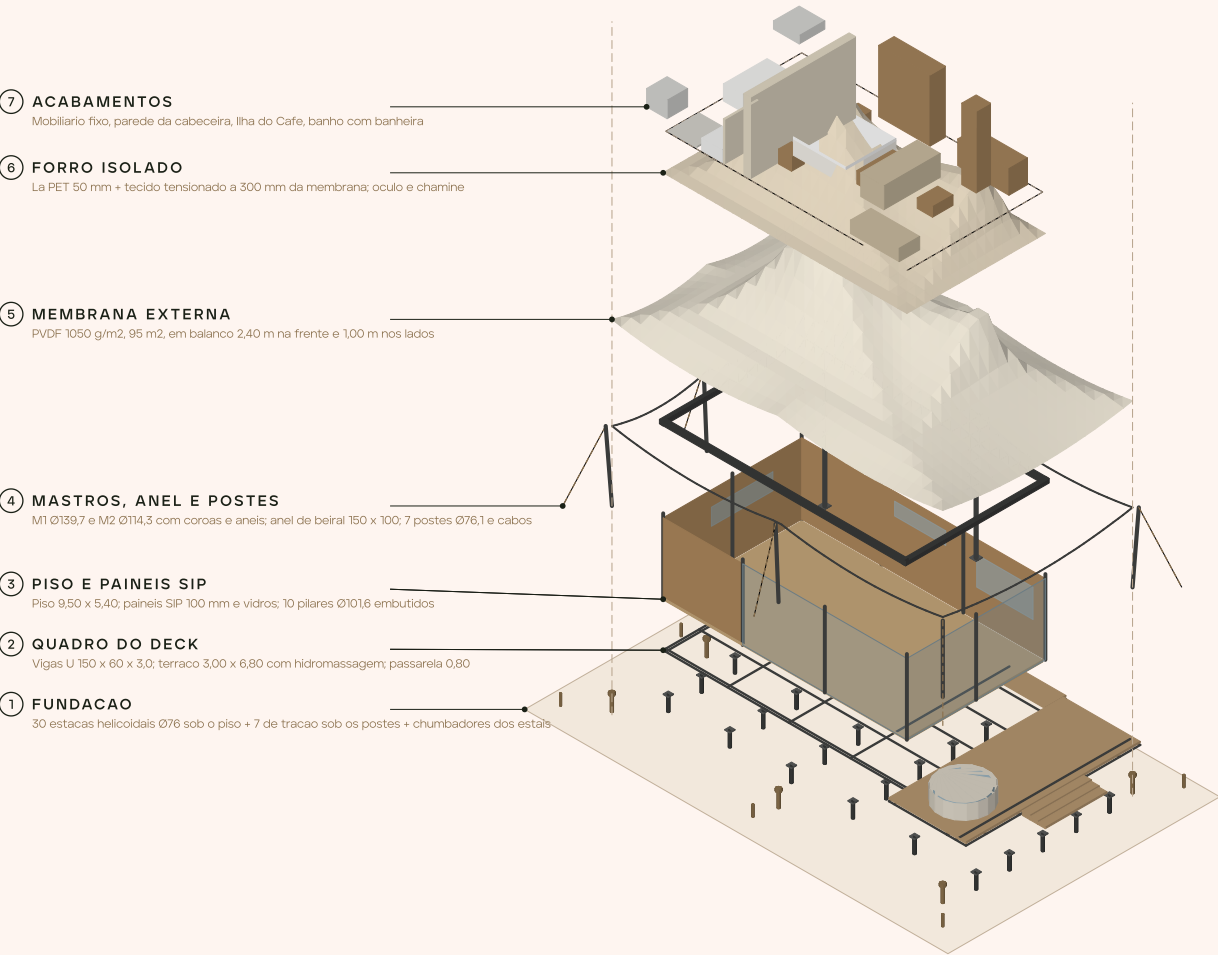

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1230 kg de aco + 95 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 10,8 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para icar os mastros
Postes estalados a 7 estacas de tracao
Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem de pilares, anel de beiral e mastros 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Talha 1 t + tripé; munck opcional para M1	Mastro sem escora antes do anel; içar somente com a base articulada travada e 3 cordas guia	☐ 10 pilares aprumados (1/500) e chumbados ☐ 6 segmentos do anel parafusados (4 M16, 120 N·m) ☐ Mastros M1 e M2 içados e pinados; coroas e anéis fixados ☐ Diagonais do anel conferidas
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 postes pinados nas bases, inclinação 8° conferida ☐ Estais passados sem tensão final ☐ Cabo de borda nas chapas de canto (frouxo)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.

DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.

Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.

Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.

Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.

Proposta de fit test e de embalagem
4.

Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
- Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
- Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
- Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E

VIDROS

ZS-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m2

INTERNOS

28,0 m2

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Lona externa (membrana PVDF tipo II) confeccionada por painéis conforme os padrões de corte deste lote, com keder, bolsas e reforços
Forro interno tensionado (Trevira CS) por painéis, com harpão
Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada
Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores
Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes
Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2
Fundação, piso e instalações: lote 1
Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Confeccionista de membranas tensionadas (corte CNC, solda HF, form-finding) + vidraceiro com vidro insulado / laminado + instaladores de membrana.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTE

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval
Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados
Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

6 padrões externos = 114,6 m2 · 4 internos = 67,1 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
S1	1	Lona Externa	Faixa S1 · y -3,70 a -2,47 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,38 x 13,05	17,06	17,1	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0
S2	1	Lona Externa	Faixa S2 · y -2,47 a -1,23 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,98 x 13,38	18,05	18	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0
S3	1	Lona Externa	Faixa S3 · y -1,23 a 0,00 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	4,15 x 13,76	20,32	20,3	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S4	1	Lona Externa	Faixa S4 · y 0,00 a 1,23 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	3,11 x 14,66	19,45	19,4	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S5	1	Lona Externa	Faixa S5 · y 1,23 a 2,47 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	3,51 x 13,61	22,33	22,3	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S6	1	Lona Externa	Faixa S6 · y 2,47 a 3,70 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,43 x 13,07	17,36	17,4	BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0
F1	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F1 · y -2,70 a -1,35 · sobre o corpo (x 0 a 9,5), 0,30 m sob a membrana	1,73 x 9,79	14,31	14,3	HARPÃO	0
F2	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F2 · y -1,35 a 0,00 · sobre o corpo (x 0 a 9,5), 0,30 m sob a membrana	3,58 x 10,56	17,41	17,4	HARPÃO	1
F3	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F3 · y 0,00 a 1,35 · sobre o corpo (x 0 a 9,5), 0,30 m sob a membrana	3,26 x 11,15	16,64	16,6	HARPÃO	2
F4	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F4 · y 1,35 a 2,70 · sobre o corpo (x 0 a 9,5), 0,30 m sob a membrana	2,69 x 10,35	18,76	18,8	HARPÃO	1

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Alumínio e perfis

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Perfil de borda arredondado do beiral + calha oculta	un	1	48	PREÇO A COTAR
Perfil de clamp dos anéis de cume	un	2	7	PREÇO A COTAR
Trilho do forro tensionado + cabos de suspensão	un	1	28	PREÇO A COTAR
Esquadria do óculo (ruptura térmica)	un	1	12	PREÇO A COTAR

Envelope: membrana, forro, painéis

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 (+15% emendas/bolsas)	m2	135	141	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm + manta refletiva (forro sobre o corpo)	m2	54	81	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS (segue os cumes)	m2	58	17	PREÇO A COTAR
Painéis SIP 100 mm (OSB/PIR/OSB) estruturais	m2	36	792	PREÇO A COTAR
Placa cimentícia externa 10 mm + membrana hidrófuga	m2	36	504	PREÇO A COTAR
Ripado de madeira termotratada 40 x 40 mm	m2	36	288	PREÇO A COTAR
Acabamento interno das paredes (painel de madeira / tecido)	m2	30	210	PREÇO A COTAR

ESPECIFICAÇÃO DA LONA

LONA EXTERNA	PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster HT 1100 dtex, PVC + laca PVDF bifacial), cor creme Zion, resistência ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos; opção: PTFE-vidro 800 g/m2 (30 anos, custo maior)
FORRO	Trevira CS 210 g/m2 (ou lona translúcida 350 g/m2 sob claraboias), harpão de PVC soldado
ISOLAMENTO	lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros + manta refletiva com face para a câmara; PIR 60 mm na Cápsula
KEDER E PERFIS	cordão keder Ø10 / Ø13 PVC; perfil duplo keder alu 6060-T5; barras de clamp 40 x 6; harpão 40 x 20; presilhas inox 304
COSTURAS	solda de alta frequência 40 mm; nenhuma costura com linha na face externa; reforços de 150 mm em recortes e cantos
CABOS	inox 316 7 x 19 Ø8 / Ø10 / Ø12 com terminais prensados, esticadores M12 a M20, manilhas

 ZION SAFARI · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

6 padrões externos · 4 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF


TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

-  BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
-  SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
-  HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
S1	1	1,38 x 13,05	17,06	Lona Externa
S2	1	1,98 x 13,38	18,05	Lona Externa
S3	1	4,15 x 13,76	20,32	Lona Externa
S4	1	3,11 x 14,66	19,45	Lona Externa
S5	1	3,51 x 13,61	22,33	Lona Externa
S6	1	1,43 x 13,07	17,36	Lona Externa
F1	1	1,73 x 9,79	14,31	Forro
F2	1	3,58 x 10,56	17,41	Forro
F3	1	3,26 x 11,15	16,64	Forro
F4	1	2,69 x 10,35	18,76	Forro

Total lona externa: 114,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 67,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

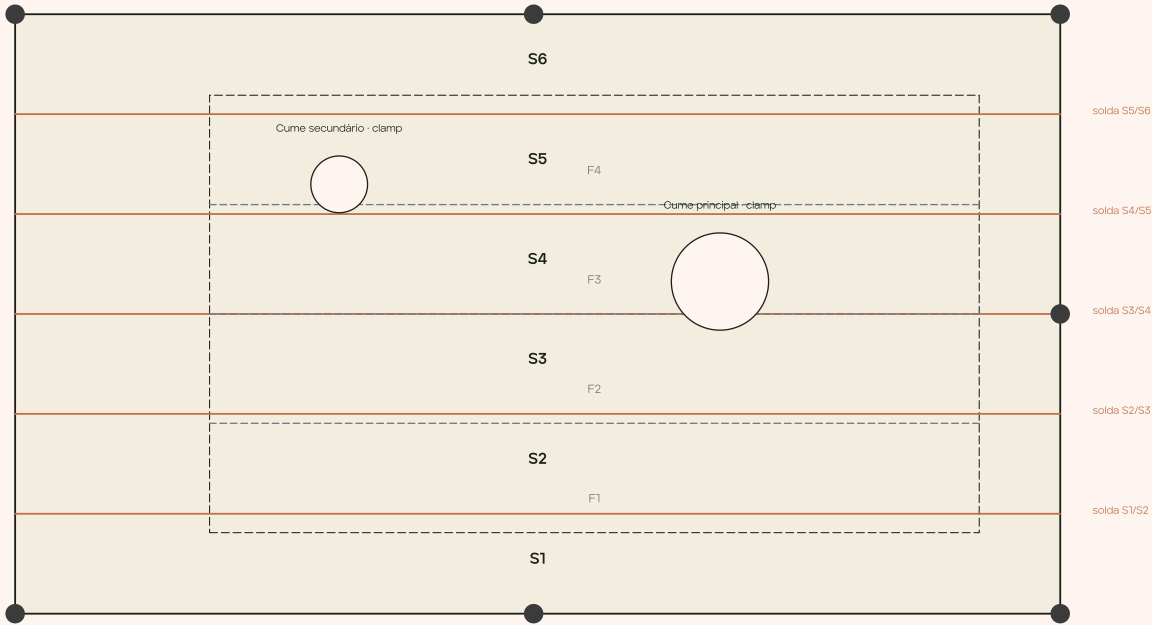

Planta da cobertura · 6 faixas longitudinais soldadas (HF) · perímetro em bolsa de cabo Ø12 com chapas de canto nos 7 postes · forro em 4 faixas sobre o corpo

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-01 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S1

Faixa S1 · y -3.70 a -2.47 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,066	0,001	1,314	0,000	1,249
0,500	0,075	0,501	1,309	0,500	1,234
1,000	0,074	1,001	1,315	1,002	1,240
1,500	0,065	1,501	1,329	1,506	1,264
2,000	0,051	2,001	1,352	2,013	1,301
2,500	0,036	2,501	1,381	2,521	1,345
3,000	0,023	3,000	1,381	3,021	1,358
3,500	0,016	3,500	1,373	3,521	1,358
4,000	0,015	4,000	1,366	4,020	1,351
4,500	0,019	4,500	1,359	4,519	1,340
5,000	0,029	5,000	1,352	5,017	1,323
5,500	0,044	5,500	1,347	5,514	1,303
6,000	0,061	6,000	1,343	6,008	1,281
6,500	0,075	6,499	1,341	6,503	1,266
7,000	0,054	6,999	1,341	6,996	1,287
7,500	0,035	7,499	1,344	7,491	1,309
8,000	0,019	7,998	1,347	7,988	1,328
8,500	0,008	8,498	1,352	8,487	1,344
9,000	0,001	8,998	1,356	8,986	1,355
9,500	0,000	9,498	1,361	9,486	1,360
10,000	0,006	9,998	1,365	9,986	1,360
10,500	0,017	10,498	1,369	10,485	1,353
11,000	0,034	10,998	1,374	10,984	1,341
11,500	0,055	11,497	1,379	11,482	1,324
12,000	0,081	11,997	1,368	11,985	1,287
12,500	0,091	12,496	1,325	12,538	1,235
12,972	0,066	12,968	1,321	13,051	1,258

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: S1)

ÁREA DE FORMA FINAL
17,06 m2

COMPRIMENTO L / R
12,97 / 13,06 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,38 x 13,05 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg)

BORDAS E RECORTES

- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Form-finding obrigatório: a superfície de dois cumes é anticiclística entre os cumes; os padrões aqui são geométricos (forma-alvo) e devem ser ajustados pelo confeccionista com compensação biaxial.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S1 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-11 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S2

Faixa S2 · y -2.47 a -1.23 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,149	1,230	0,000	1,239
0,500	0,052	0,646	1,281	0,502	1,237
1,000	0,104	1,143	1,331	1,003	1,235
1,500	0,155	1,641	1,382	1,505	1,234
2,000	0,206	2,138	1,433	2,008	1,234
2,500	0,257	2,635	1,484	2,511	1,233
3,000	0,304	3,133	1,535	3,063	1,251
3,500	0,332	3,632	1,583	3,562	1,253
4,000	0,360	4,132	1,621	4,064	1,263
4,500	0,385	4,631	1,678	4,575	1,294
5,000	0,404	5,131	1,763	5,100	1,360
5,500	0,410	5,630	1,863	5,632	1,453
6,000	0,410	6,130	1,874	6,132	1,464
6,500	0,410	6,630	1,888	6,632	1,478
7,000	0,409	7,130	1,906	7,133	1,497
7,500	0,409	7,630	1,931	7,635	1,522
8,000	0,408	8,130	1,958	8,136	1,550
8,500	0,406	8,630	1,978	8,637	1,572
9,000	0,404	9,130	1,975	9,137	1,571
9,500	0,401	9,630	1,949	9,638	1,547
10,000	0,398	10,130	1,915	10,140	1,517
10,500	0,395	10,630	1,844	10,661	1,450
11,000	0,364	11,129	1,631	11,289	1,277
11,500	0,289	11,623	1,503	11,845	1,235
12,000	0,197	12,115	1,408	12,345	1,233
12,500	0,103	12,606	1,315	12,836	1,233
13,000	0,010	13,097	1,222	13,327	1,233
13,055	0,000	13,151	1,212	13,381	1,233

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: S2)
- ÁREA DE FORMA FINAL
18,05 m2
- COMPRIMENTO L / R
13,06 / 13,51 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,98 x 13,38 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg).
- BORDAS E RECORTES
 - SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
 - BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Form-finding obrigatório: a superfície de dois cumes é anticiclástica entre os cumes; os padrões aqui são geométricos (forma-alvo) e devem ser ajustados pelo confeccionista com compensação biaxial.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S2 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-12 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S3

Faixa S3 · y -1.23 a 0.00 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

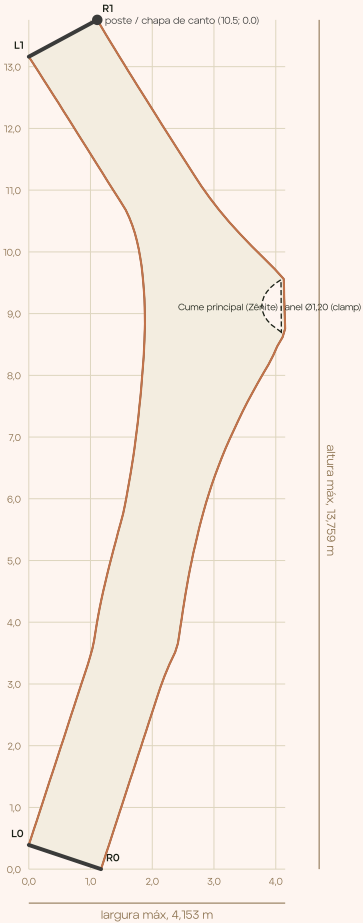


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,391	1,170	0,000	1,234
0,500	0,155	0,866	1,326	0,477	1,234
1,000	0,311	1,342	1,482	0,954	1,234
1,500	0,466	1,817	1,637	1,431	1,233
2,000	0,621	2,292	1,793	1,908	1,233
2,500	0,776	2,768	1,949	2,385	1,233
3,000	0,931	3,243	2,108	2,872	1,234
3,500	1,081	3,725	2,376	3,335	1,329
4,000	1,146	4,218	2,472	4,035	1,339
4,500	1,253	4,706	2,549	4,518	1,309
5,000	1,376	5,191	2,637	4,987	1,277
5,500	1,506	5,674	2,741	5,446	1,256
6,000	1,606	6,163	2,878	5,954	1,289
6,500	1,688	6,657	3,059	6,492	1,380
7,000	1,754	7,152	3,289	7,045	1,539
7,500	1,807	7,649	3,561	7,602	1,754
8,000	1,849	8,148	3,875	8,164	2,026
8,500	1,877	8,647	4,136	8,702	2,260
9,000	1,876	9,147	4,139	9,203	2,264
9,500	1,841	9,645	3,976	9,731	2,137
10,000	1,760	10,139	3,295	10,429	1,962
10,500	1,602	10,612	2,740	11,149	1,259
11,000	1,344	11,040	2,408	11,667	1,235
11,500	1,077	11,462	2,127	12,109	1,234
12,000	0,811	11,886	1,857	12,540	1,233
12,500	0,545	12,309	1,595	12,958	1,234
13,000	0,277	12,731	1,354	13,349	1,242
13,500	0,007	13,152	1,114	13,748	1,258

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: S3)
- ÁREA DE FORMA FINAL
20,32 m2
- COMPRIMENTO L / R
13,51 / 15,30 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
4,15 x 13,76 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg).
- BORDAS E RECORTES
 - SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
 - BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Form-finding obrigatório: a superfície de dois cumes é anticlástica entre os cumes; os padrões aqui são geométricos (forma-alvo) e devem ser ajustados pelo confeccionista com compensação biaxial.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S3 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-13 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S4

Faixa S4 · y 0.00 a 1.23 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

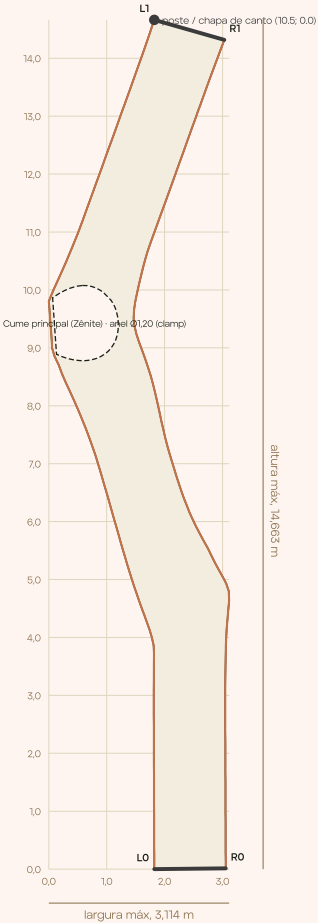


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,821	0,000	3,055	0,013	1,234
0,500	1,819	0,500	3,053	0,511	1,234
1,000	1,818	1,000	3,051	1,009	1,234
1,500	1,816	1,500	3,050	1,508	1,233
2,000	1,815	2,000	3,048	2,006	1,233
2,500	1,813	2,500	3,047	2,504	1,233
3,000	1,813	3,000	3,046	3,026	1,234
3,500	1,815	3,500	3,053	3,607	1,242
4,500	1,818	4,469	3,019	5,016	1,504
5,000	1,454	4,942	2,781	5,467	1,427
5,500	1,307	5,419	2,543	5,916	1,332
6,000	1,169	5,900	2,352	6,355	1,267
6,500	1,031	6,381	2,203	6,786	1,240
7,000	0,892	6,861	2,073	7,218	1,234
7,500	0,739	7,337	1,971	7,615	1,264
8,000	0,559	7,803	1,884	8,010	1,341
8,500	0,358	8,261	1,791	8,399	1,440
9,000	0,163	8,721	1,659	8,823	1,500
9,500	0,045	9,201	1,496	9,308	1,455
10,000	0,008	9,699	1,499	9,827	1,496
10,500	0,156	10,167	1,583	10,203	1,427
11,000	0,358	10,625	1,651	10,478	1,302
12,000	0,715	11,558	1,890	11,180	1,235
12,500	0,885	12,028	2,053	11,630	1,234
13,000	1,055	12,499	2,219	12,089	1,233
13,500	1,224	12,969	2,386	12,554	1,233
14,000	1,393	13,440	2,554	13,024	1,233
14,500	1,562	13,911	2,732	13,514	1,235
15,000	1,726	14,383	2,920	14,021	1,247
15,295	1,821	14,663	3,031	14,317	1,258

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: S4)
ÁREA DE FORMA FINAL
19,45 m2
COMPRIMENTO L / R
15,30 / 14,87 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
3,11 x 14,66 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg).

BORDAS E RECORTES

- SOLDA HF - emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- BOLSA DE CABO - cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S4 Lona Externa	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-14 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S5

Faixa S5 · y 1.23 a 2.47 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

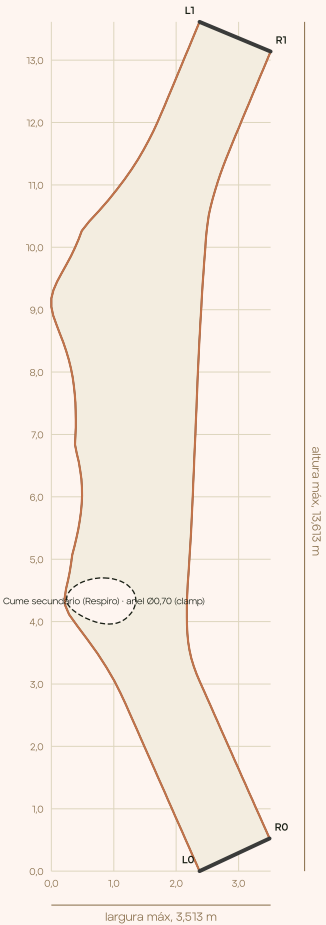


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,375	0,000	3,498	0,523	1,239
0,500	2,173	0,457	3,296	0,976	1,237
1,000	1,971	0,914	3,094	1,429	1,235
1,500	1,768	1,372	2,892	1,881	1,234
2,000	1,566	1,829	2,692	2,334	1,234
2,500	1,364	2,286	2,491	2,785	1,233
3,000	1,160	2,743	2,314	3,198	1,240
3,500	0,930	3,186	2,225	3,494	1,331
4,000	0,656	3,605	2,187	3,745	1,537
4,500	0,360	4,007	2,173	4,002	1,813
5,000	0,227	4,489	2,177	4,421	1,951
5,500	0,319	4,960	2,207	4,909	1,888
6,000	0,424	5,448	2,236	5,393	1,812
6,500	0,488	5,944	2,260	5,887	1,773
7,000	0,460	6,442	2,281	6,381	1,822
8,000	0,398	7,433	2,322	7,359	1,936
8,500	0,338	7,930	2,343	7,850	2,006
9,000	0,272	8,414	2,363	8,314	2,153
9,500	0,039	8,882	2,387	8,753	2,352
10,000	0,057	9,369	2,414	9,234	2,361
10,500	0,288	9,812	2,443	9,670	2,160
11,000	0,490	10,269	2,476	10,121	1,992
11,500	0,818	10,646	2,511	10,434	1,706
12,000	1,133	11,034	2,576	10,739	1,473
12,500	1,411	11,449	2,675	11,072	1,318
13,000	1,647	11,890	2,811	11,446	1,246
13,500	1,847	12,348	2,986	11,874	1,233
14,000	2,040	12,809	3,178	12,334	1,233
14,500	2,232	13,271	3,370	12,796	1,233
14,871	2,375	13,613	3,513	13,139	1,233

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: S5)
ÁREA DE FORMA FINAL
22,33 m2
COMPRIMENTO L / R
14,87 / 13,08 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
3,51 x 13,61 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg)

BORDAS E RECORTES

- SOLDA HF - emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- BOLSA DE CABO - cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S5 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-15 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S6

Faixa S6 · y 2,47 a 3,70 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

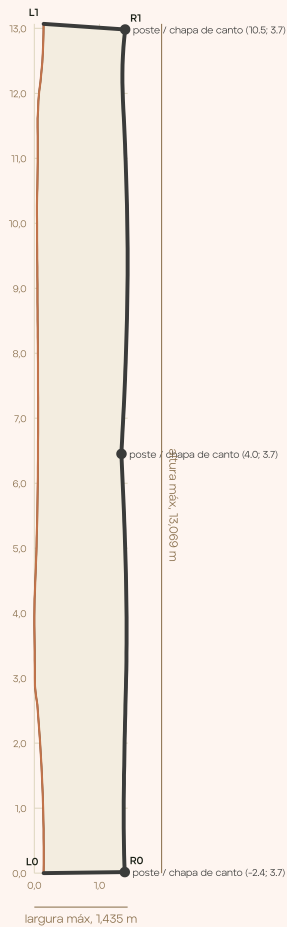


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,142	0,000	1,390	0,017	1,249
0,500	0,143	0,500	1,377	0,517	1,234
1,000	0,134	1,000	1,375	1,015	1,240
1,500	0,116	1,500	1,380	1,510	1,264
2,000	0,089	1,999	1,389	2,003	1,300
2,500	0,053	2,497	1,399	2,494	1,347
3,000	0,008	2,995	1,411	2,976	1,403
3,500	0,004	3,495	1,418	3,475	1,414
4,000	0,000	3,995	1,418	3,975	1,418
4,500	0,014	4,494	1,411	4,475	1,397
5,000	0,032	4,994	1,398	4,977	1,366
5,500	0,044	5,494	1,381	5,479	1,337
6,000	0,052	5,994	1,360	5,984	1,308
6,500	0,056	6,494	1,341	6,489	1,285
7,000	0,057	6,994	1,367	6,996	1,309
7,500	0,057	7,494	1,390	7,500	1,334
8,000	0,054	7,994	1,410	8,003	1,356
8,500	0,051	8,494	1,424	8,504	1,375
9,000	0,047	8,994	1,432	9,005	1,385
9,500	0,044	9,494	1,434	9,505	1,390
10,000	0,041	9,994	1,430	10,005	1,389
10,500	0,045	10,494	1,419	10,504	1,374
11,000	0,052	10,994	1,403	11,004	1,351
11,500	0,050	11,494	1,382	11,506	1,331
12,000	0,070	11,993	1,359	12,001	1,289
12,500	0,122	12,490	1,358	12,451	1,236
13,000	0,141	12,990	1,389	12,909	1,251
13,079	0,142	13,069	1,397	12,982	1,258

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: S6)
- ÁREA DE FORMA FINAL
17,36 m2
- COMPRIMENTO L / R
13,08 / 12,97 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,43 x 13,07 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg).
- BORDAS E RECORTES
- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
 - BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Form-finding obrigatório: a superfície de dois cumes é anticlástica entre os cumes; os padrões aqui são geométricos (forma-alvo) e devem ser ajustados pelo confeccionista com compensação biaxial.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S6 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-16 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · y -2.70 a -1.35 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,108	1,346	0,000	1,350
0,500	0,037	0,607	1,399	0,542	1,363
1,000	0,061	1,106	1,425	1,041	1,366
1,500	0,085	1,606	1,458	1,543	1,375
2,000	0,106	2,105	1,507	2,056	1,403
2,500	0,120	2,605	1,582	2,583	1,462
3,000	0,124	3,105	1,633	3,099	1,510
3,500	0,126	3,605	1,643	3,600	1,517
4,000	0,127	4,105	1,655	4,100	1,528
4,500	0,129	4,605	1,670	4,601	1,541
5,000	0,130	5,105	1,689	5,102	1,558
5,500	0,131	5,605	1,709	5,603	1,578
6,000	0,132	6,105	1,725	6,103	1,593
6,500	0,133	6,605	1,727	6,603	1,595
7,000	0,133	7,105	1,715	7,104	1,581
7,500	0,134	7,605	1,693	7,605	1,560
8,000	0,133	8,105	1,674	8,106	1,541
8,500	0,121	8,605	1,522	8,715	1,405
9,000	0,069	9,102	1,411	9,282	1,354
9,500	0,000	9,597	1,336	9,789	1,350

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F1)
ÁREA DE FORMA FINAL
14,31 m2
COMPRIMENTO L / R
9,50 / 9,85 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,73 x 9,79 m
MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos suspensos por cabos Ø4

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-17 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE F2

Forro F2 · y -1.35 a 0.00 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

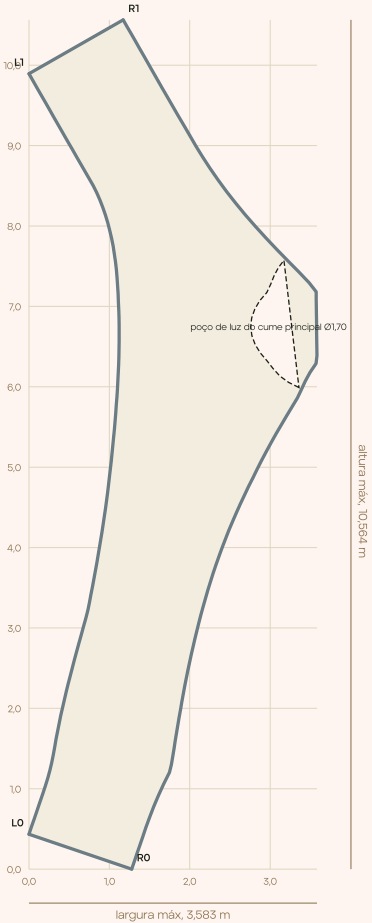


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,434	1,278	0,000	1,350
0,500	0,161	0,907	1,442	0,481	1,350
1,000	0,296	1,388	1,723	1,152	1,446
1,500	0,389	1,879	1,831	1,662	1,458
2,000	0,504	2,366	1,913	2,142	1,426
2,500	0,632	2,849	2,005	2,608	1,394
3,000	0,755	3,334	2,117	3,081	1,385
3,500	0,846	3,825	2,264	3,596	1,436
4,000	0,927	4,319	2,454	4,131	1,538
4,500	0,994	4,814	2,693	4,680	1,705
5,000	1,047	5,311	2,973	5,234	1,928
5,500	1,089	5,810	3,296	5,791	2,207
6,000	1,116	6,309	3,576	6,331	2,460
6,500	1,120	6,809	3,576	6,831	2,456
7,000	1,099	7,308	3,420	7,362	2,321
7,500	1,036	7,804	2,750	8,072	1,735
8,000	0,898	8,284	2,200	8,797	1,400
8,500	0,669	8,727	1,858	9,369	1,351
9,000	0,420	9,161	1,596	9,823	1,350
9,500	0,171	9,595	1,344	10,263	1,350
9,846	0,000	9,895	1,172	10,564	1,350

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F2)
ÁREA DE FORMA FINAL
17,41m²
COMPRIMENTO L / R
9,85 / 11,81m
CAIXA (LARG. X ALT.)
3,58 x 10,56 m
MATERIAL
Trevira CS 210 g/m² tensionado, creme; harpão nos trilhos suspensos por cabos Ø4

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F2 Forro / Revestimento Interno	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-18 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE F3

Forro F3 · y 0.00 a 1.35 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

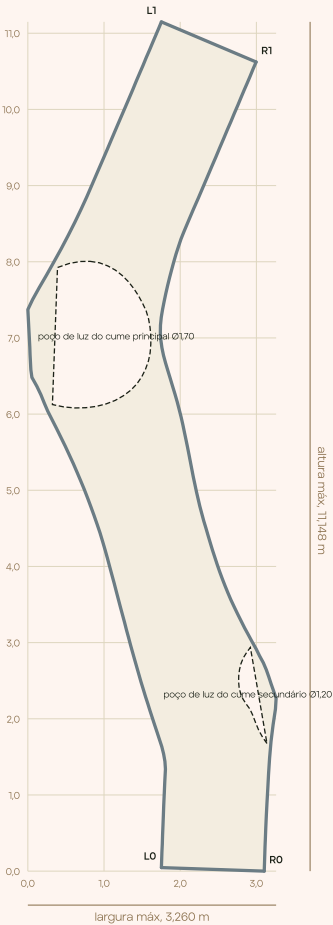


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,754	0,047	3,103	0,000	1,350
0,500	1,772	0,547	3,122	0,521	1,351
1,000	1,793	1,046	3,151	1,111	1,360
1,500	1,781	1,544	3,222	1,936	1,493
2,000	1,632	2,021	3,159	2,560	1,620
2,500	1,482	2,498	2,939	3,023	1,548
3,000	1,346	2,979	2,704	3,481	1,448
3,500	1,217	3,462	2,520	3,926	1,384
4,000	1,088	3,946	2,380	4,361	1,357
4,500	0,952	4,426	2,262	4,778	1,356
5,000	0,785	4,898	2,172	5,179	1,415
5,500	0,592	5,359	2,095	5,575	1,518
6,000	0,377	5,810	2,011	5,962	1,641
6,500	0,167	6,264	1,899	6,373	1,736
7,000	0,033	6,735	1,770	6,826	1,740
7,500	0,007	7,234	1,762	7,332	1,757
8,000	0,169	7,692	1,842	7,770	1,673
8,500	0,414	8,128	1,910	7,975	1,503
9,000	0,644	8,572	1,989	8,232	1,387
9,500	0,850	9,027	2,116	8,551	1,352
10,000	1,048	9,486	2,301	8,984	1,351
10,500	1,244	9,946	2,491	9,429	1,350
11,000	1,439	10,406	2,684	9,882	1,350
11,500	1,635	10,867	2,878	10,340	1,350
11,806	1,754	11,148	2,997	10,622	1,350

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F3)
ÁREA DE FORMA FINAL
16,64 m2
COMPRIMENTO L / R
11,81 / 11,12 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
3,26 x 11,16 m
MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos suspensos por cabos Ø4

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F3 Forro / Revestimento Interno
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-19 SET 2026

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE F4

Forro F4 · y 1.35 a 2.70 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

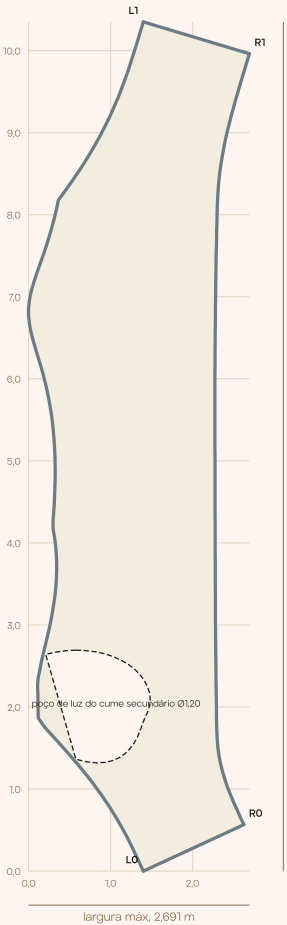


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,398	0,000	2,623	0,567	1,350
0,500	1,181	0,450	2,446	0,969	1,367
1,000	0,922	0,878	2,350	1,264	1,479
1,500	0,621	1,276	2,307	1,506	1,702
2,000	0,289	1,651	2,293	1,731	2,005
2,500	0,114	2,090	2,287	2,118	2,174
3,000	0,163	2,586	2,281	2,609	2,119
3,500	0,275	3,073	2,278	3,085	2,003
4,000	0,340	3,568	2,275	3,576	1,936
4,500	0,316	4,067	2,274	4,073	1,958
5,000	0,317	4,565	2,272	4,569	1,956
5,500	0,321	5,064	2,271	5,069	1,951
6,000	0,279	5,562	2,271	5,565	1,992
6,500	0,178	6,052	2,271	6,046	2,093
7,000	0,039	6,532	2,274	6,512	2,235
7,500	0,024	7,027	2,279	7,003	2,255
8,000	0,176	7,503	2,286	7,466	2,110
8,500	0,319	7,962	2,296	7,934	1,978
9,000	0,537	8,420	2,311	8,310	1,777
9,500	0,805	8,842	2,346	8,630	1,556
10,000	1,031	9,288	2,414	8,984	1,416
10,500	1,212	9,754	2,519	9,386	1,358
11,000	1,362	10,231	2,655	9,842	1,350
11,125	1,398	10,351	2,691	9,961	1,350

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F4)
ÁREA DE FORMA FINAL
18,76 m2
COMPRIMENTO L / R
11,12 / 9,50 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,69 x 10,35 m
MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos suspensos por cabos Ø4

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro


ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F4 Forro / Revestimento Interno
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-20 SET 2026




ZION SAFARI · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

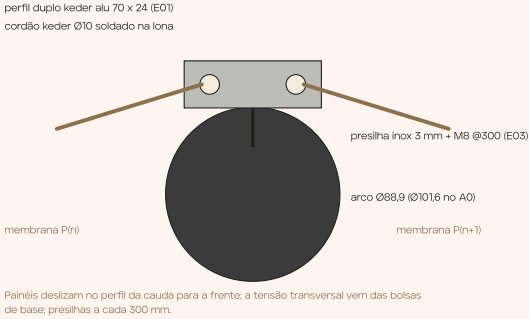


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

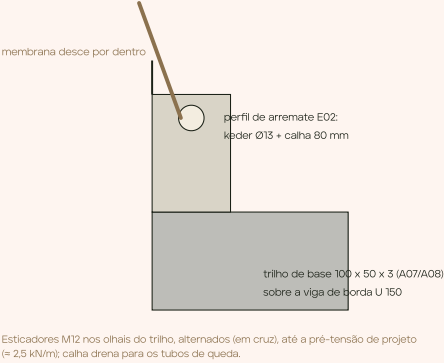


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)



4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

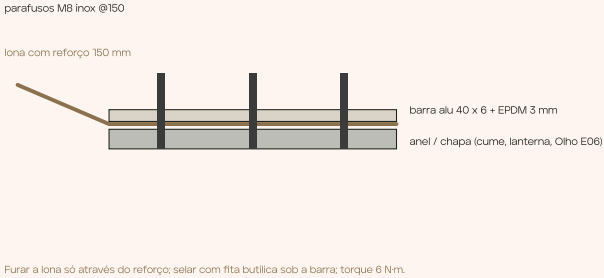

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

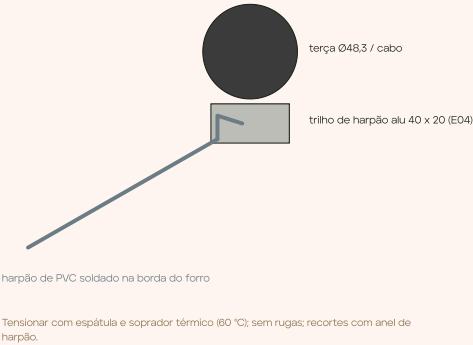

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Safari: peça única içada pelos anéis dos cumes e presa nos clamps (4); perímetro em bolsa de cabo Ø12 (6) com chapas de canto nos 7 postes; forro F1 a F4 em harpão (5) nos trilhos suspensos.
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água · vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-90 SET 2026


COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL

Seção vertical pelo mastro principal M1 e anel do Zênite; seção pelo anel de beiral sobre pilar.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION SAFARI | DET-02

SEÇÃO A - ANEL DO ZÊNITE Ø1200 COM ÓCULO DE VIDRO

escala 1:10 (1 mm = 0,34 px)

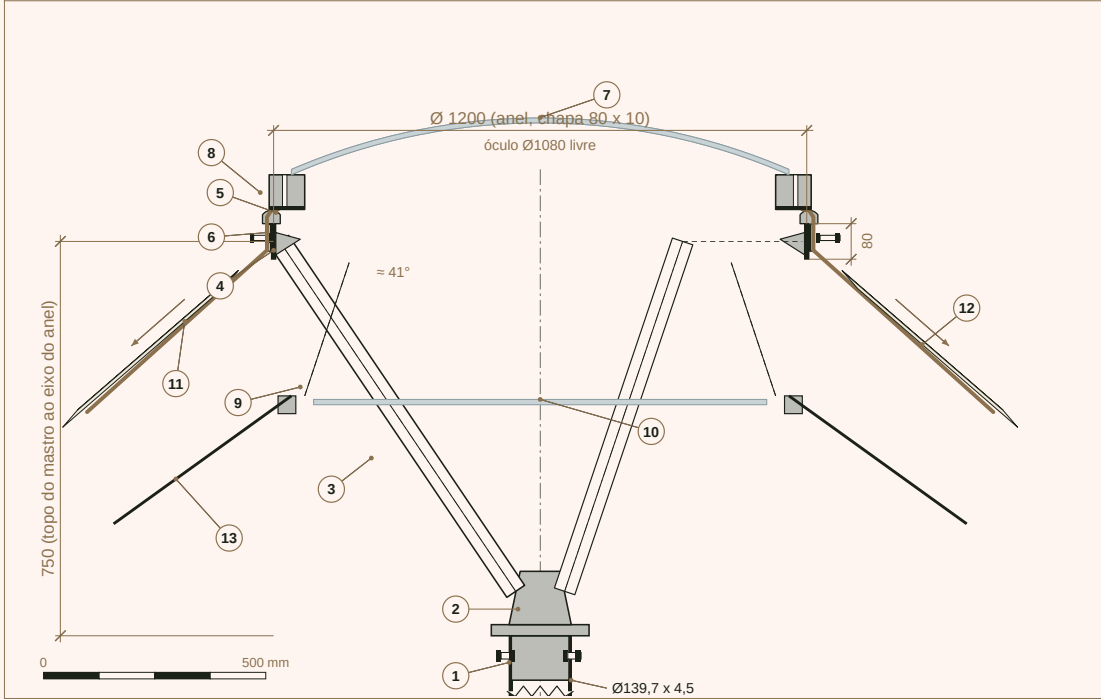

LEGENDA

- 1

Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m (topo em z = 5,05)
- 2

Capitel usinado: bujão Ø130 x 100 + flange Ø220 x 25, 2 x M12 radiais
- 3

Braço da coroa Ø48,3 x 3,0 mm, L = 0,95 m (3 a 120°)
- 4

Anel do cume: chapa curvada 80 x 10 mm, Ø1200, gusset ao braço
- 5

Perfil arredondado de alumínio no topo do anel (R 25)
- 6

Chapa-anel de alumínio 60 x 8, M8 @ 150 + gaxeta EPDM
- 7

Cúpula de vidro laminado 6+6 mm curvo (R 1400), low-e
- 8

Moldura da cúpula: alumínio com ruptura térmica, gaxeta EPDM
- 9

Anel do forro Ø1100 em alumínio 40 x 40, pendurado nos braços
- 10

Segundo vidro plano laminado 6+6 mm (câmara de ar entre vidros)
- 11

Membrana PVDF deixando o anel com ≈ 41°, pré-tensão 2,5 kN/m
- 12

Escoamento da chuva ao beiral e às bordas em catenária
- 13

Isolamento (manta + lâ PET 50 mm) e forro paralelos à membrana
- 14

Anel de beiral: tubo retangular 150 x 100 x 4,0 mm (viga-anel)
- 15

Pilar Ø101,6 x 4,0 mm embutido no painel, chapa de topo 150 x 150 x 8
- 16


Perfil de borda arredondado (alumínio R 40) + fascia 2 mm
- 17

Calha oculta de alumínio 80 x 60 mm, saída Ø50 ao pilar
- 18

Trilho keder da aba em balanço (membrana até os postes externos)

SEÇÃO B - ANEL DE BEIRAL SOBRE PILAR

escala 1:8 (1 mm = 0,5 px)

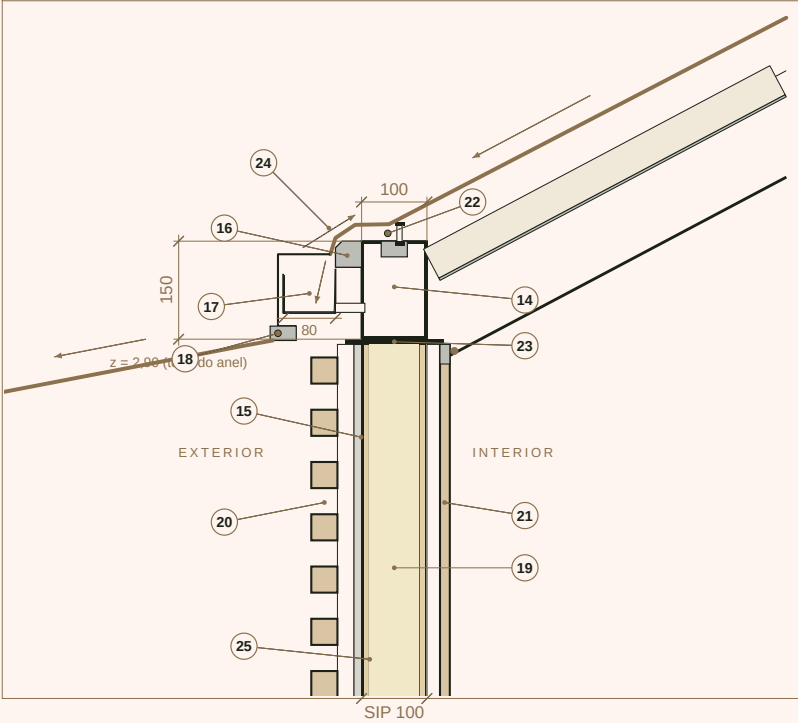

- 19

Painel SIP 100 mm (OSB 12 / PIR 76 / OSB 12)
- 20

Placa cimentícia 12 + câmara 25 + ripado termotratado 40 x 40
- 21

Acabamento interno: painel madeira/tecido 15 mm sobre ripas 20
- 22

Trilho keder da membrana principal sobre o anel (alumínio 40 x 24)
- 23

Chapa de topo do pilar soldada ao anel de beiral
- 24

Entrada de ar da câmara ventilada pela fresta alta (tela anti-inseto)
- 25

Tubo de queda Ø75 mm dentro do pilar (2 pilares)

 ZION GLAMPING COLLECTION COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL ZION SAFARI	ESCALA 1:10 (cume) / 1:8 (beiral)	
	FOLHA	DATA
	DET-02	SET 2026



ZION SAFARI · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos

CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade


CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

CAMADA 07
CAMARA DE VENTILACAO

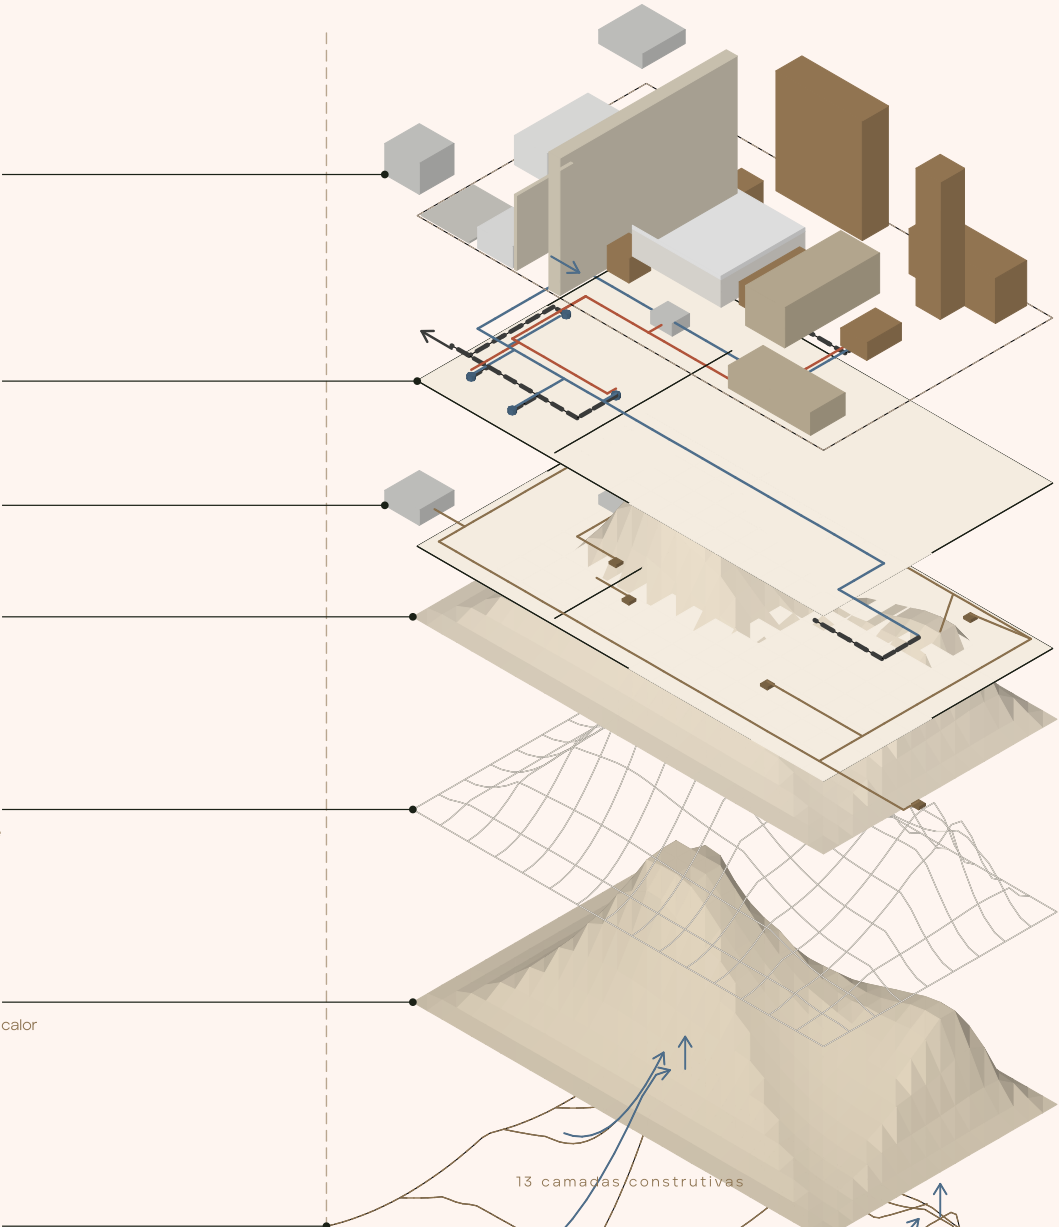


ESQUADRIAS
(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05


(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40

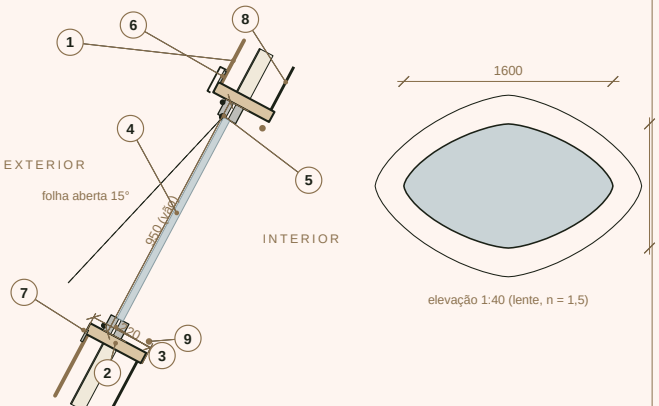


(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5

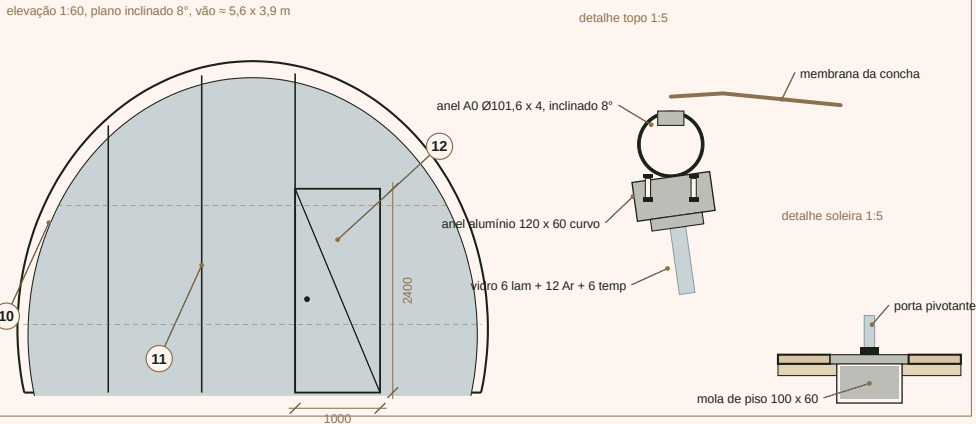

(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5

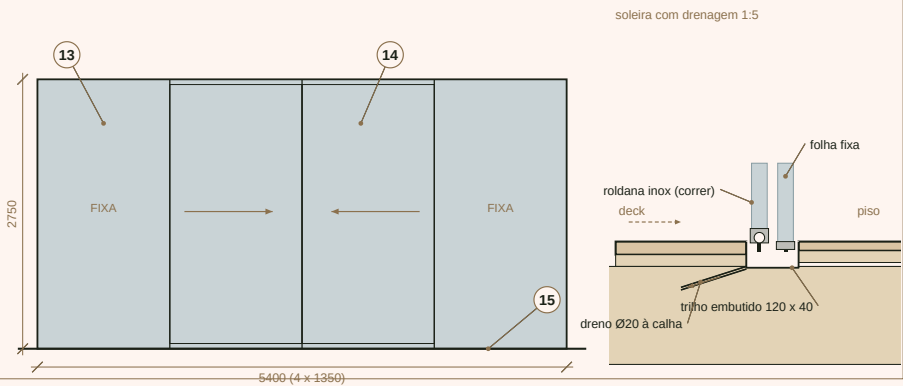


- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)

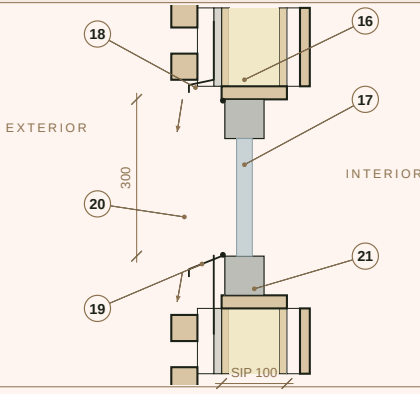

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM


ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

 ZION SAFARI · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

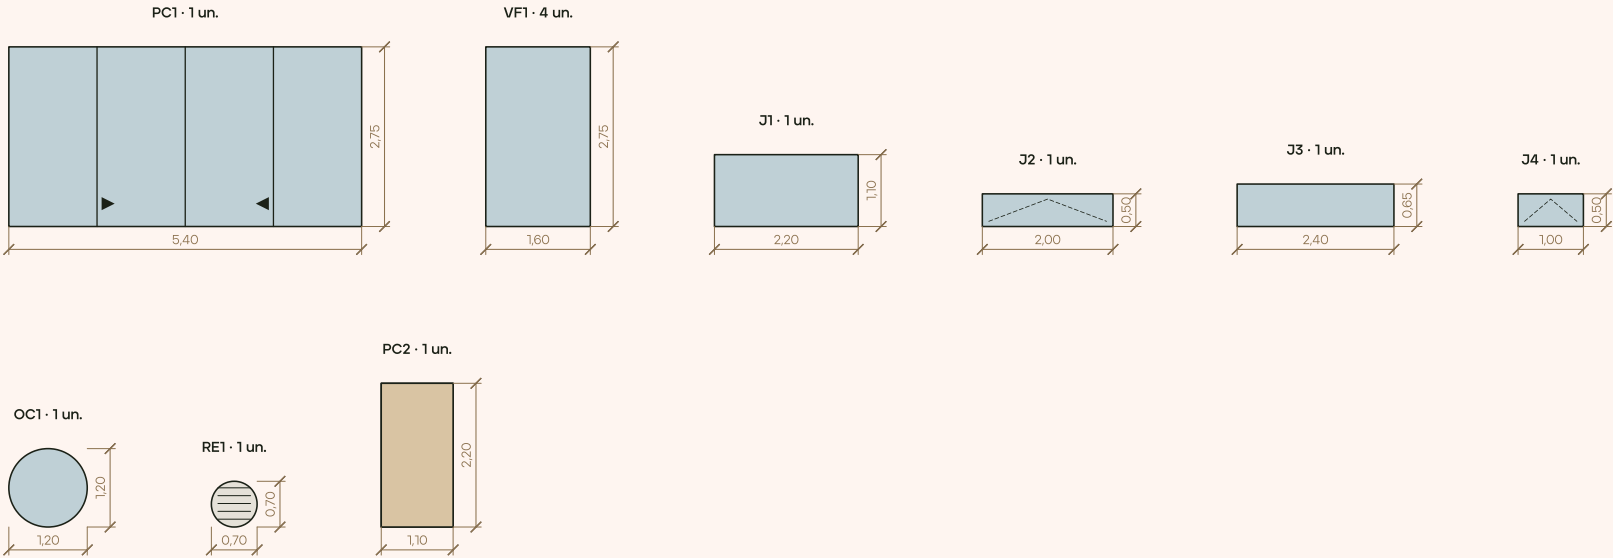


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40 x 2,75	1	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60 x 2,75	4	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20 x 1,10	1	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00 x 0,50	1	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheiro (fixa)	2,40 x 0,65	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00 x 0,50	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20 x 1,20	1	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70 x 0,70	1	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10 x 2,20	1	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 12 unidades
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

ZION SAFARI · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF de dois cumes · curvas de nível a cada 0,40 m · bordas em catenária · pingadeiras nos pontos baixos · calha oculta no anel de beiral

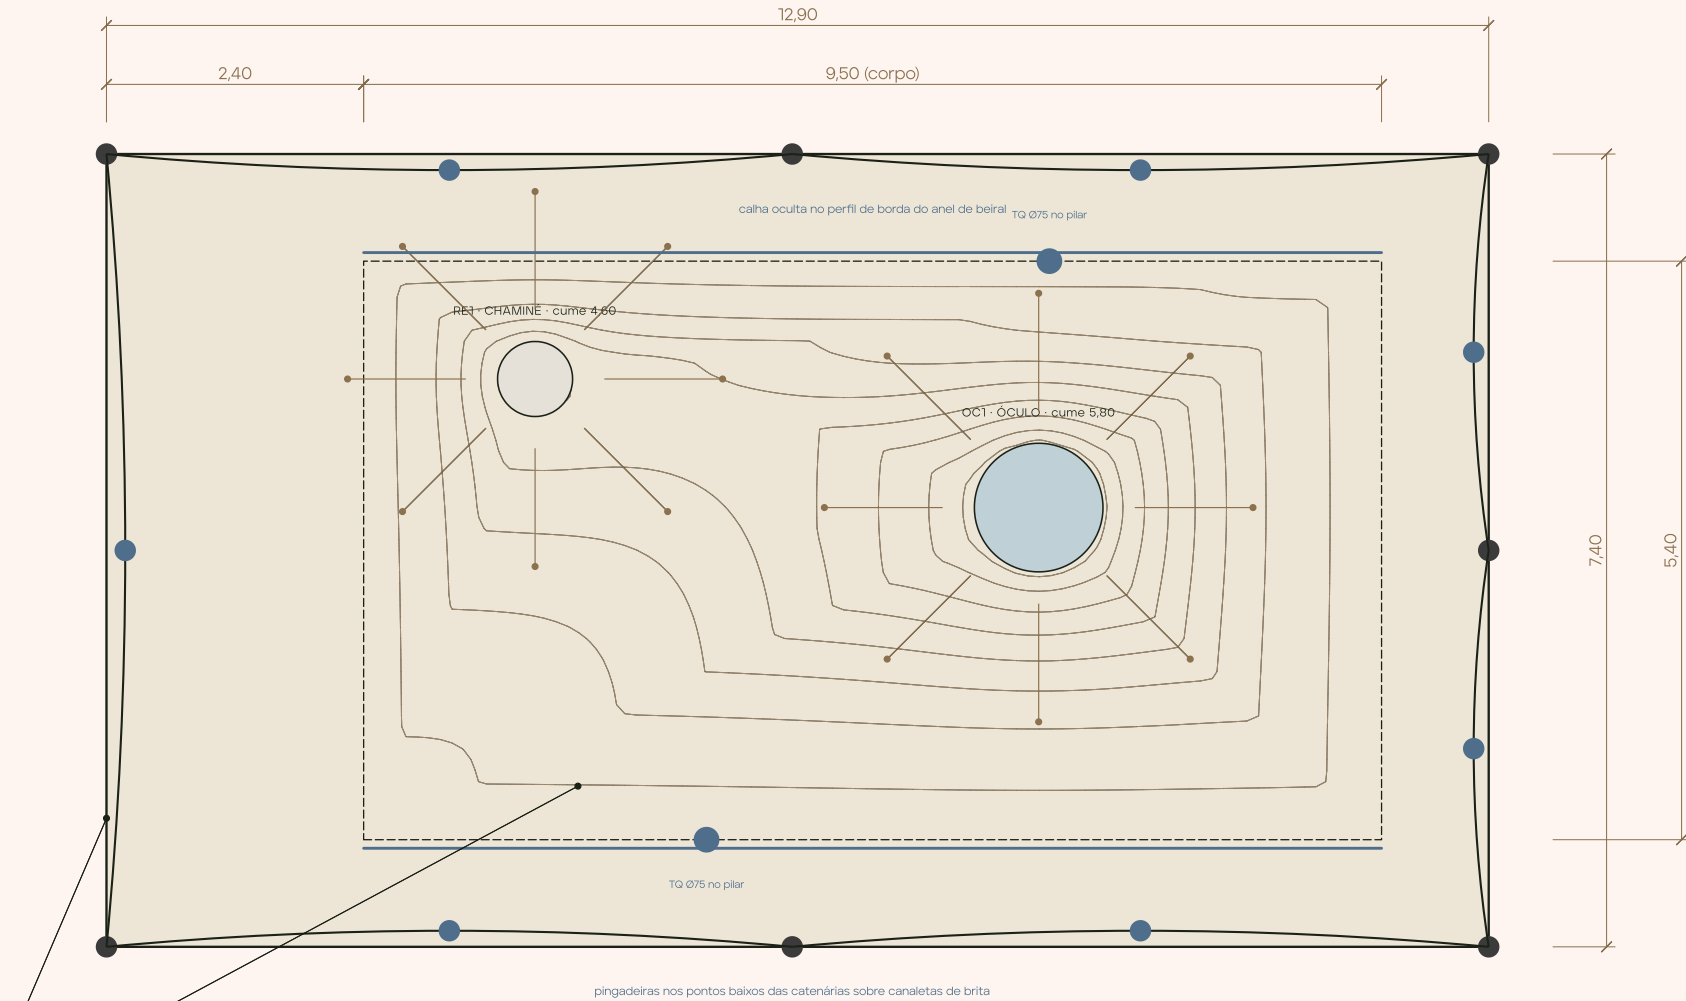

cabo de borda Ø12 inox em bolsa; postes PE inclinados 8°
membrana PVDF 1050 g/m2 em gomos radiais soldados por RF; i mín. 14° no vale



 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE COBERTURA Escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo e respiros
	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA PA-04
SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

42,3 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40	2,75	1	14,85	446	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60	2,75	4	4,4	132	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20	1,10	1	2,42	73	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00	0,50	1	1	30	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheira (fixa)	2,40	0,65	1	1,56	47	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00	0,50	1	0,5	15	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20	1,20	1	1,44	43	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70	0,70	1	0,49	15	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10	2,20	1	2,42	73	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros: tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelos anéis de cumeeira e presa nos clamps ☐ Cantos e estais tensionados em cruz, flecha das bordas ± 20 mm ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 6 painéis seguindo os cumes, anéis internos fixados ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 2 dias	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias)
2.

Padrões de corte: ZS-LON-001_padroes.dxf e ZS-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90
3.

Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding
4.

Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe
2.

Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido)
3.

Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra
4.

Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração
- Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido
- Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água
- Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado)

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION SAFARI · LOTE 4 DE 4

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZS-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m²

INTERNOS

28,0 m²

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque
Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte
Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador
Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)
Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Piso, deck e instalações: lote 1
Estrutura: lote 2
Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha
Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos
Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

PROGRAMA DE MOBILIÁRIO · ANTEPROJETO

posições e dimensões do modelo 3D · o projeto de interiores ZS-INT-001 (marcenaria acoplada, elevações, detalhes) segue o método do Casulo e é a próxima entrega desta linha

PEÇA	TIPO	DIMENSÕES (M)	POSIÇÃO	CLASSE
Cama king 1,93 x 2,03	bed	2,05 x 1,94 x h 0,55	x 4,10 a 6,15 · y -0,97 a 0,97	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,50 x 0,50 x h 0,50	x 5,65 a 6,15 · y 1,05 a 1,55	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,50 x 0,50 x h 0,50	x 5,65 a 6,15 · y -1,55 a -1,05	MS (solta)
Banco aos pés	bench	0,40 x 1,40 x h 0,45	x 3,55 a 3,95 · y -0,70 a 0,70	MA (acoplada)
Closet 2,0 x 0,6	cabinet	2,00 x 0,60 x h 2,40	x 3,80 a 5,80 · y 2,00 a 2,60	MA (acoplada)
Sofá 2,2 m	sofa	0,90 x 2,20 x h 0,80	x 2,55 a 3,45 · y -1,05 a 1,15	MS (solta)
Mesa de centro	table	0,60 x 0,80 x h 0,35	x 1,35 a 1,95 · y -0,35 a 0,45	MS (solta)
Chaise de contemplação	sofa	1,90 x 0,80 x h 0,45	x 0,50 a 2,40 · y -2,50 a -1,70	MS (solta)
Totem do mastro 2	totem	0,56 x 0,56 x h 2,75	x 1,32 a 1,88 · y 1,32 a 1,88	MA (acoplada)
Ilha do café / minibar	cabinet	2,00 x 0,72 x h 0,90	x 0,60 a 2,60 · y 1,88 a 2,60	MA (acoplada)
Bancada dupla 2,0 m	vanity	0,55 x 2,00 x h 0,85	x 6,50 a 7,05 · y -1,70 a 0,30	MA (acoplada)
Bacia sanitária	wc	0,80 x 0,80 x h 0,42	x 7,30 a 8,10 · y -2,60 a -1,80	MS (solta)
Chuveiro 1,1 x 1,2	shower	1,10 x 1,20 x h 0,02	x 8,30 a 9,40 · y -2,60 a -1,40	MS (solta)
Banheira 1,70 x 0,75	tub	0,75 x 1,70 x h 0,58	x 8,60 a 9,35 · y -0,50 a 1,20	MS (solta)

Marcenaria acoplada (MA): fixada à estrutura (mastros, pilares, anéis, parede da cabeceira) e nunca à lona; fundos e tampos recortados por gabarito:  VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO para peças que carregam nos mastros (Safari) e nos pilares (Lodge).

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

48 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M01	Cama king box + colchão	Box 1,93 x 2,03 revestido em linho, colchão molas ensacadas 32 cm, pillow top	un	1	Suíte · sob o Óculo do Zênite
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte · parede da cabeceira
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M11	Banco aos pés da cama	Banco 1,40 m em madeira e couro	un	1	Suíte
M16	Ripado da cabeceira	Painel ripado termotratado com fitas LED (parede da cabeceira)	m2	16	Cabeceira / banho
M04	Sofá 2,40 m	Estrutura em madeira, espuma D33, tecido bouclé antimancha	un	1	Estar · sofá 2,20
M06	Chaise de contemplação	Chaise 1,60 x 0,80 em madeira e corda náutica, almofada impermeável	un	1	Estar · chaise de contemplação
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa de centro
M09	Ilha do café / minibar	Marcenaria sob medida com tampo em pedra, frigobar embutido, gaveta de cápsulas	un	1	Estar · Ilha do Café 2,00 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Suíte · closet 2,00 x 0,60
M15	Totem do mastro (Safari)	Revestimento do mastro M2 em madeira com prateleiras e iluminação	un	1	Estar
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada dupla 2,00 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	2	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	3	Suíte / estar
F02	Luminária de piso	Luminária de piso em madeira e linho, 2700 K	un	1	Estar
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	2	Estar / suíte
F04	Tapete de lã	Tapete de lã tecido à mão 2,00 x 3,00	un	1	Estar
F05	Tapete de lã (pequeno)	Tapete de lã 1,60 x 2,30	un	1	Suíte
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	11,8	Fachada e lateral · 5,40 + 6,40 m de vidro
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Óculo · tela circular Ø1,20
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E01	Frigobar	Frigobar 90 L embutido, silencioso (< 38 dB), classe A	un	1	Ilha do Café
E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganso	cj	1	Ilha do Café

E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Closet
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E08	Aquecedor / lareira ecológica	Lareira a etanol de mesa ou de piso (inverno)	un	1	Estar
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Fachada PC1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Ático técnico · inclui motor da chaminé do Respiro
E07	Hidromassagem externa	Hot tub de 4 lugares, fibra, aquecimento a gás/elétrico, cobertura térmica	un	1	Terraço · hidromassagem Ø1,90 prevista em projeto

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Café
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papelaria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D01	Espreguiçadeiras	Par de espreguiçadeiras em madeira teca e corda náutica, almofadas outdoor	par	1	Terraço
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Terraço
D03	Poltrona suspensa (opcional)	Poltrona suspensa em corda náutica com suporte	un	1	Passarela · opcional
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Terraço
D05	Ducha externa	Ducha de deck em aço inox com base de cumaru	un	1	Terraço · junto à hidromassagem
D07	Fogueira / fire pit	Fire pit em aço corten com grelha e tampa	un	1	Terraço


BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B02	Banqueta e bandeja da banheira	Banqueta de teca e bandeja para banheira	cj	1	Banho · banheira 1,70
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho



ZION SAFARI · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m² · terraço 20,4 m² + passarela 7,6 m² · total 79,3 m²

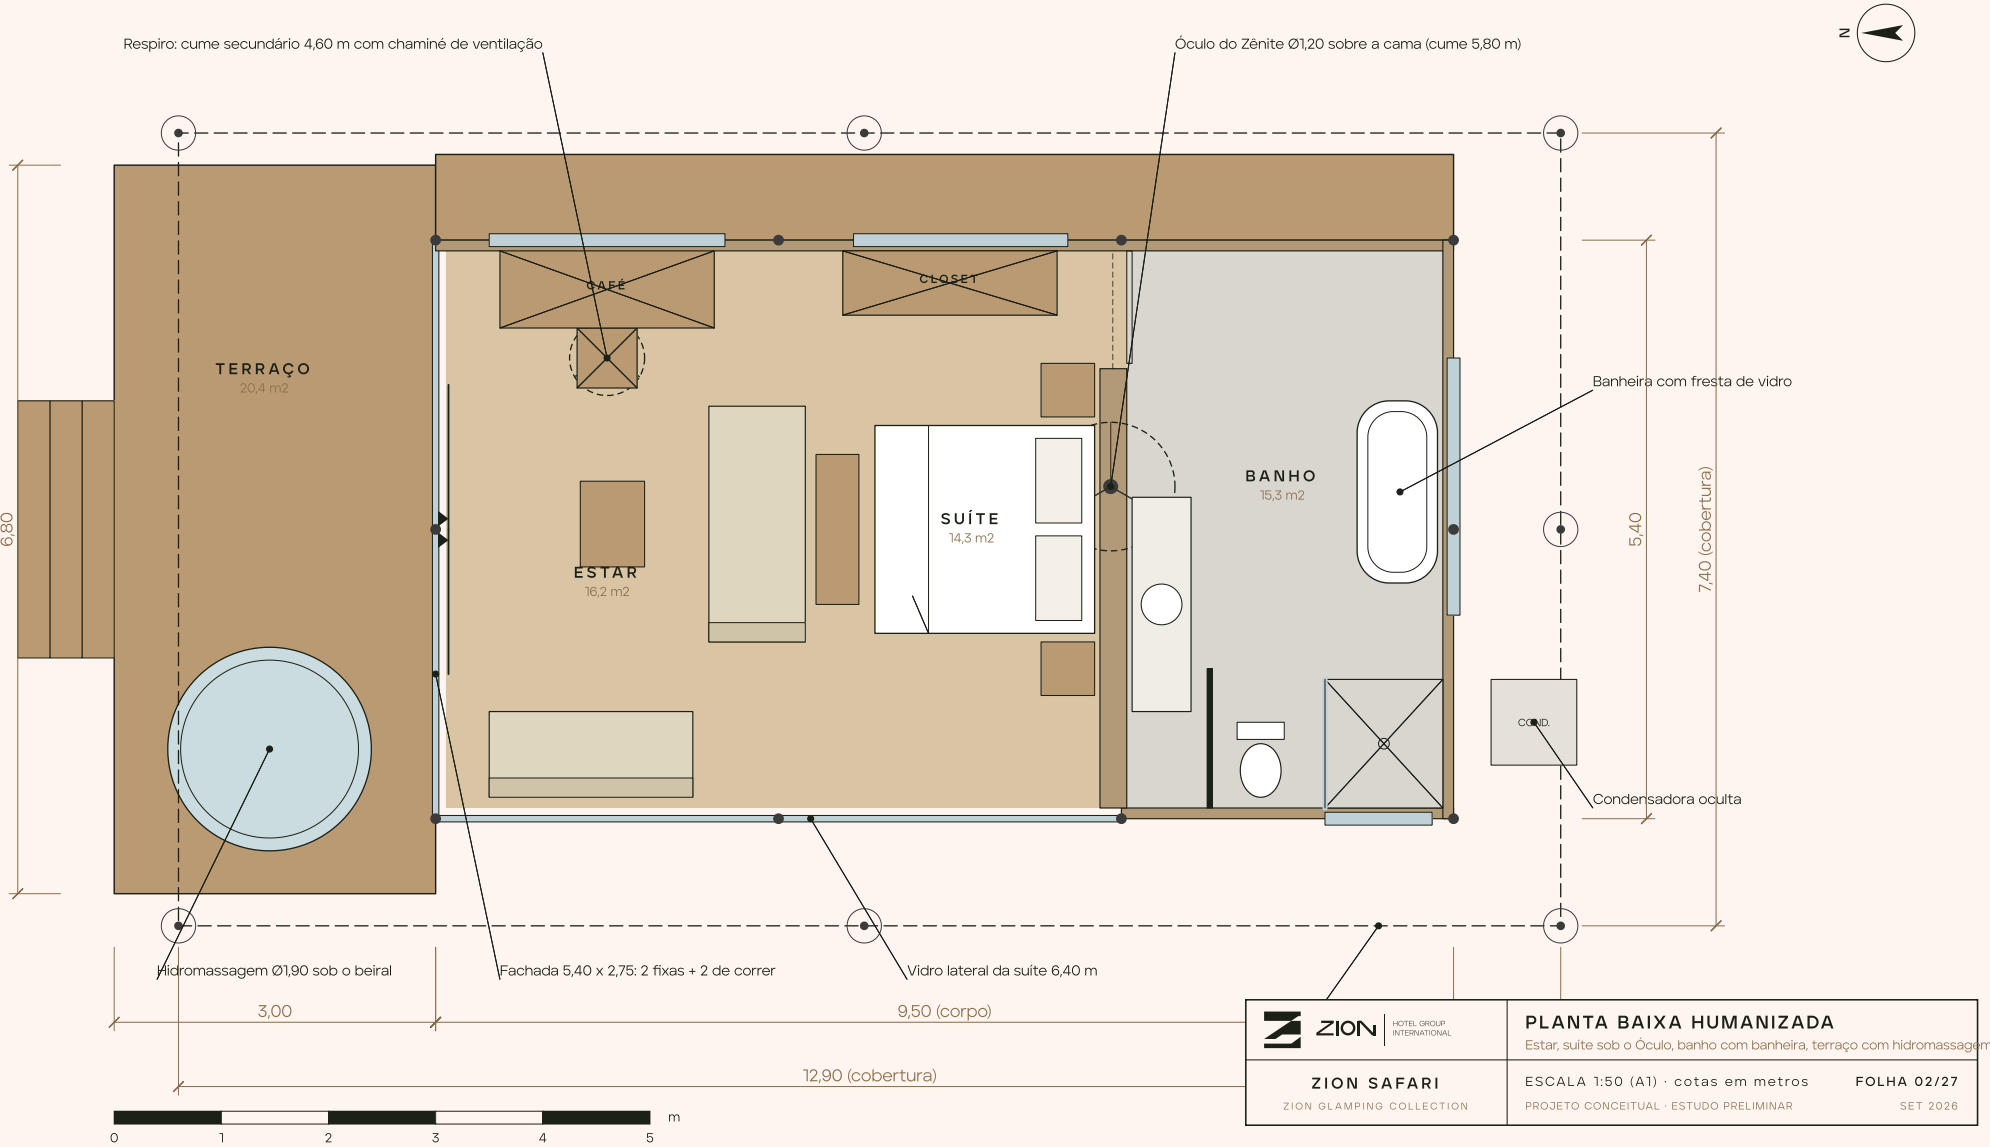

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntas e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Closet, Ilha do Café (totem do mastro) e bancada dupla fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos $\leq 0,95 \times 2,10$ m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas

FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega

Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação

Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.

Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.

Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.

Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).

Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZL-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

22 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-2,40	-2,55
F02	-2,40	-0,85
F03	-2,40	0,85
F04	-2,40	2,55
F05	0,00	-2,55
F06	0,00	-0,85
F07	0,00	0,85
F08	0,00	2,55
F09	2,40	-2,55
F10	2,40	-0,85
F11	2,40	0,85

PONTO	X (M)	Y (M)
F12	2,40	2,55
F13	-3,40	0,00
F14	3,40	0,00
F15	0,00	-3,40
F16	0,00	3,40
F17	-4,70	-3,20
F18	-4,70	-1,10
F19	-4,70	1,10
F20	-4,70	3,20
F21	-6,08	-1,80
F22	-6,08	1,80

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal central L0 (y = 0), 2 trechos	2	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	61	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06 (4 M12 por face)
A02	Viga longitudinal L1/L2 (y = ± 0,85), 2 trechos cada	4	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	122	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A03	Viga longitudinal L3/L4 (y = ± 2,55), 2 trechos cada	4	4,05	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	26,3	105	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A04	Viga transversal T0 (x = 0)	1	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	44	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga transversal T1/T2 (x = ± 2,40)	2	4,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	31,2	62	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12
A06	Anel de borda octogonal, 8 segmentos de 2,82 m	8	2,82	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo sob os pilares)	ZAR-230 galv. Z275	23,8	190	Corte a 22,5° + furação + chapas de canto	Chapa de canto H05 a 135° (6 M12); recebe as chapas de base H01 dos pilares
A07	Viga de borda do deck, 3 segmentos	3	4,97	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	32,3	97	Corte a 22,5° + furação	Chapa de canto H05 + cabeçotes J02
A08	Viga transversal do deck (x = - 4,70)	1	6,40	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	41,6	42	Corte + furação	Cantoneira H07 + cabeçotes J02
J01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	22	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	404	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote J02
J02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa 150 x 150 x 8	22	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	48	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (grelha + anel de borda octogonal + deck)	m	100	650	PREÇO A COTAR
Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 dos módulos de piso @ 400 mm	m	126	316	PREÇO A COTAR
Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 dos módulos de deck @ 400 mm (clipes do cumaru parafusados)	m	76	190	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	38	80	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	38	460	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	31	283	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	6,9	207	PREÇO A COTAR

Deck cumaru 20 x 140 com fixação oculta (3 faces)	m2	30	607	PREÇO A COTAR
Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes (20 sob piso/deck + 2 sob os postes da vela)	un	22	414	PREÇO A COTAR


Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 9k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	75	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 23 L/min (ou bomba de calor 200 L)	un	1	25	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico, cabos, fitas LED, luminárias, tomadas	cj	1	60	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação	cj	1	40	PREÇO A COTAR
Exaustor com recuperador de calor + respiro da lanterna	cj	1	12	PREÇO A COTAR

Z

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais

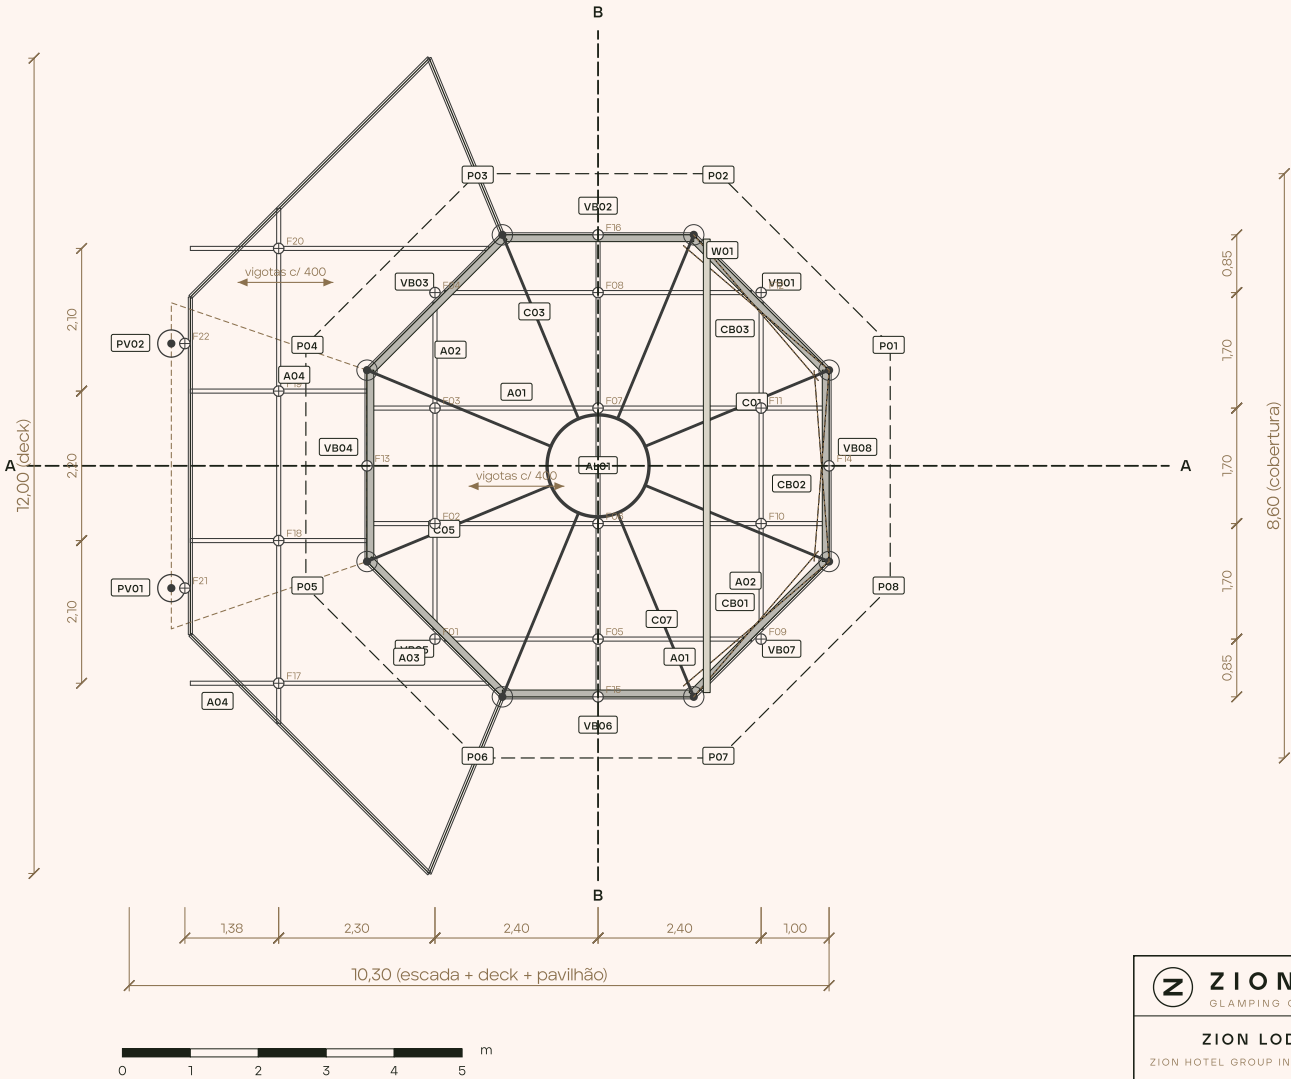

CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22** Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03** Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04** Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08** Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08** Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08** Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01** Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03** Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01** Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02** Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

Z ZION GLAMPING COLLECTION ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros	FOLHA 03b/LG
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

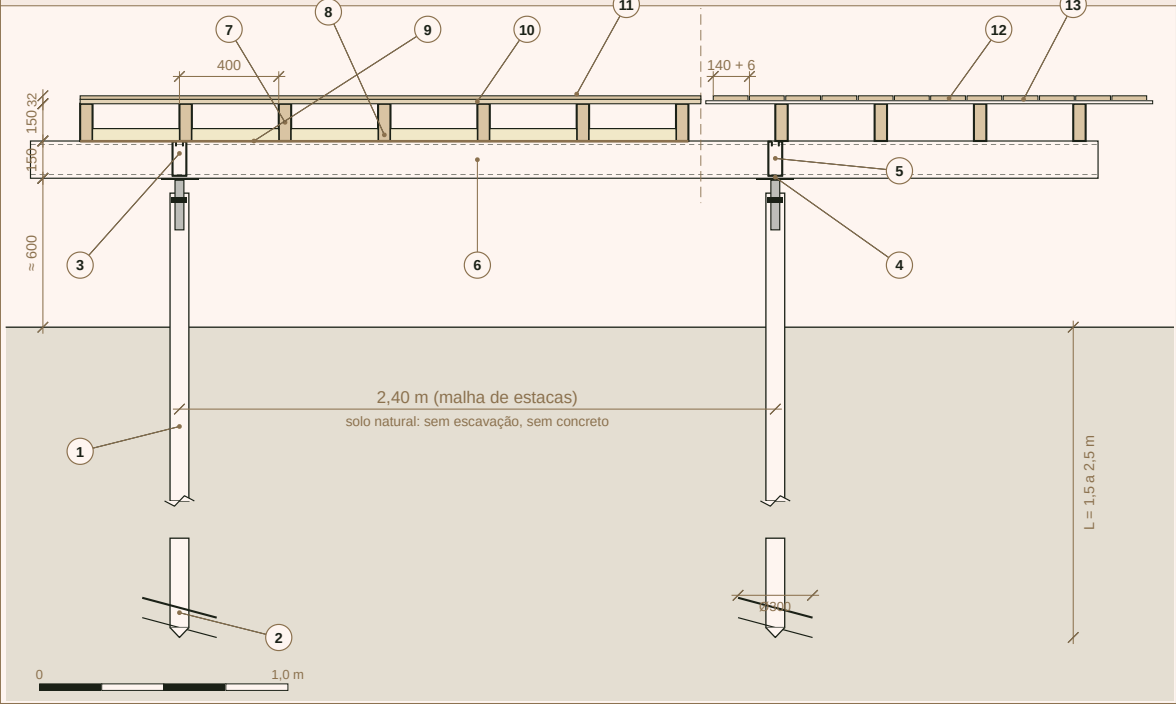

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

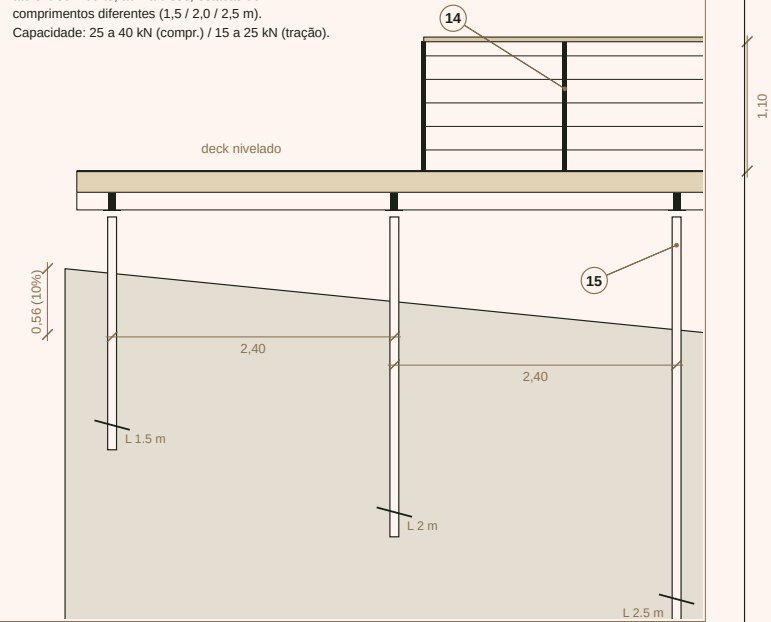

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado




- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotrada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

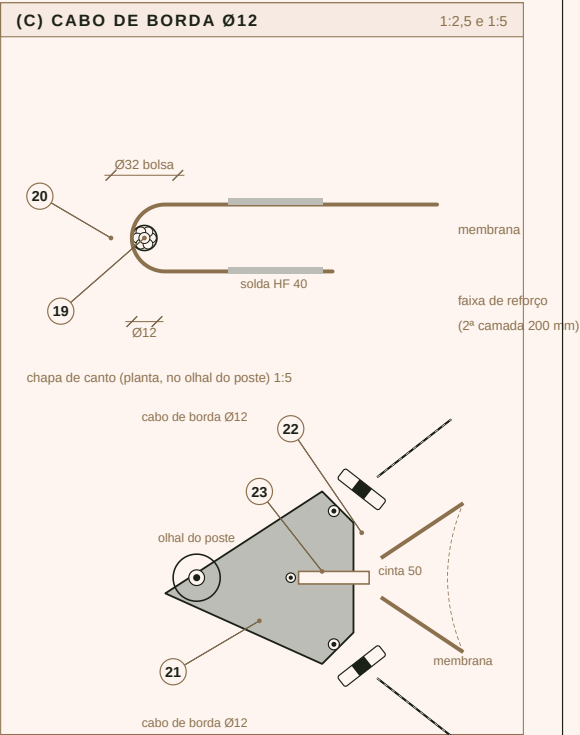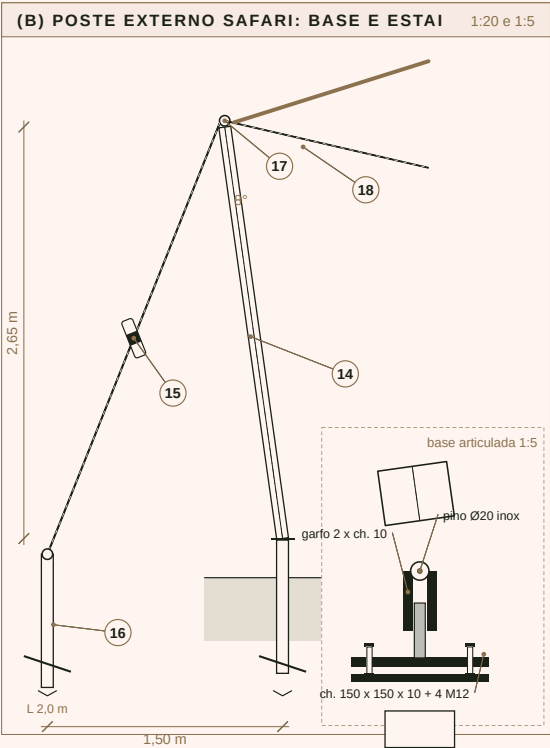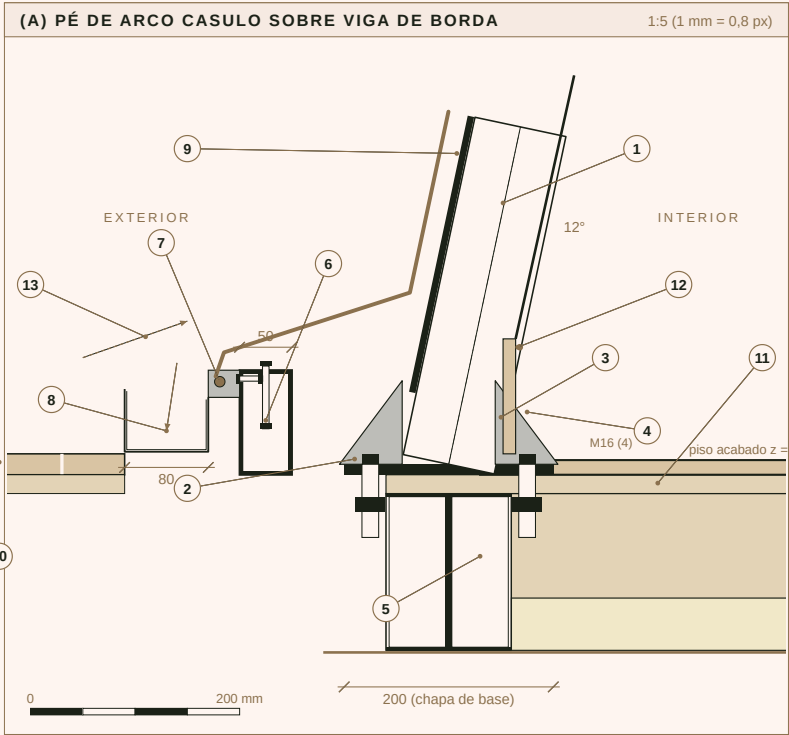

LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal




- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

 DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

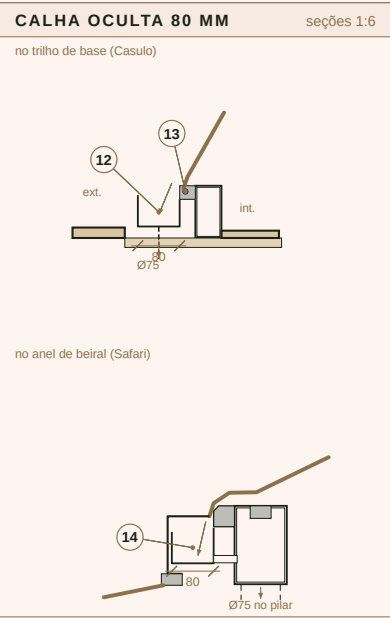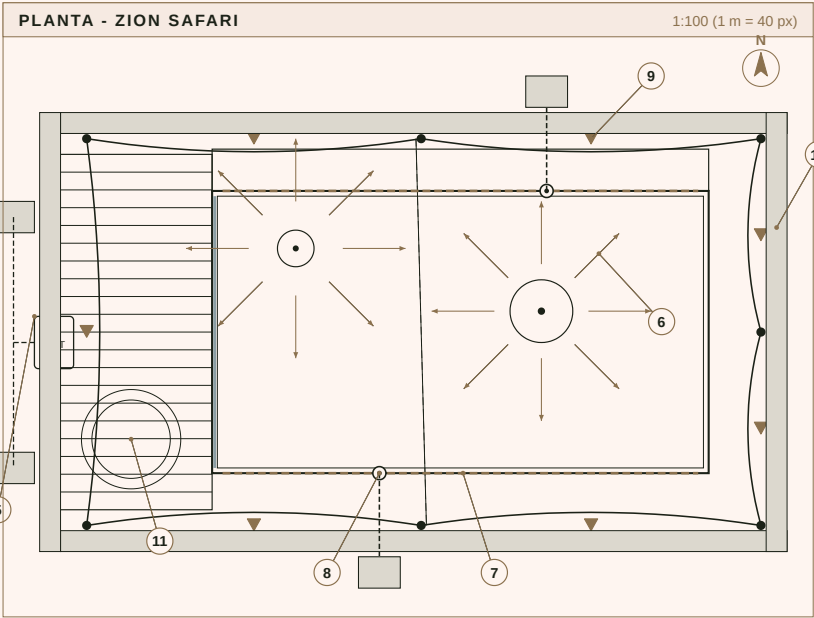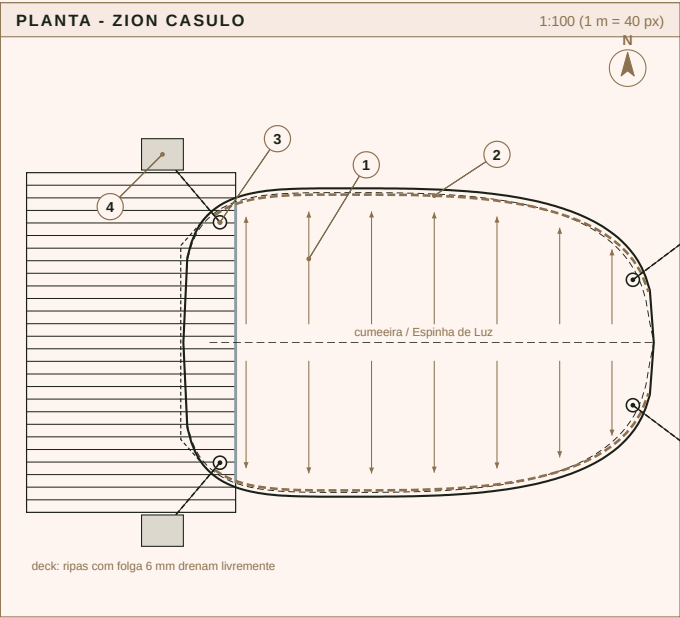

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026




INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08


PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

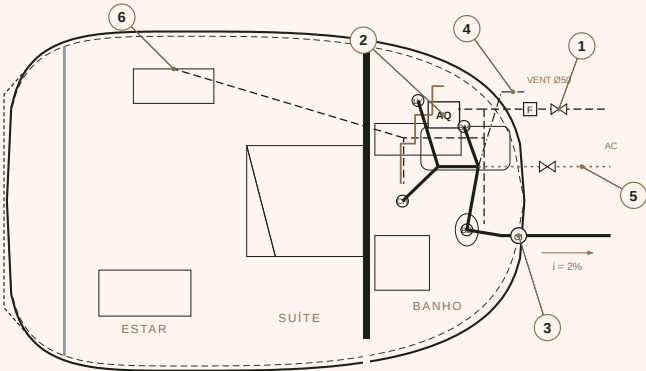


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100

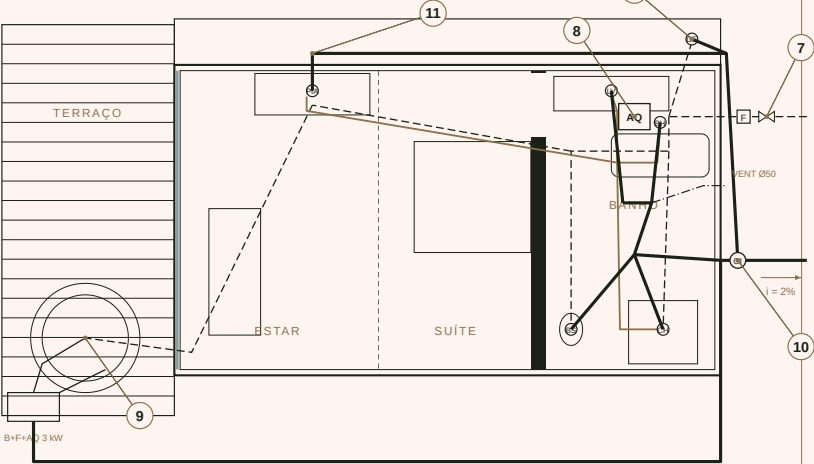

ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)

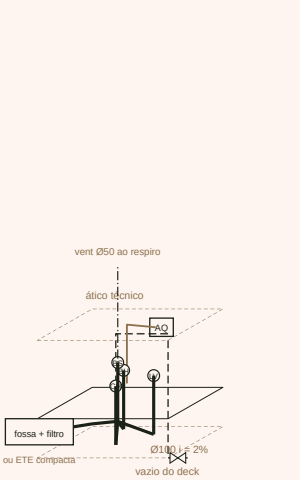

ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro

2 Aquecedor no ático técnico

3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100

4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)

6 Ponto de água do minibar (estar)

7 Entrada AF Safari pelos fundos

8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço

10 CI e saída do coletor pelos fundos

11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela

12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX

— água quente PEX isolado

— esgoto Ø40/50/100

- - - ventilação Ø50

..... águas cinzas (opcional)

⊗ registro / válvula

- LV lavatório CH chuveiro BH banheira

BS bacia PIA ilha do café DE ducha ext.

CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA	DATA
	DET-08	SET 2026




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100

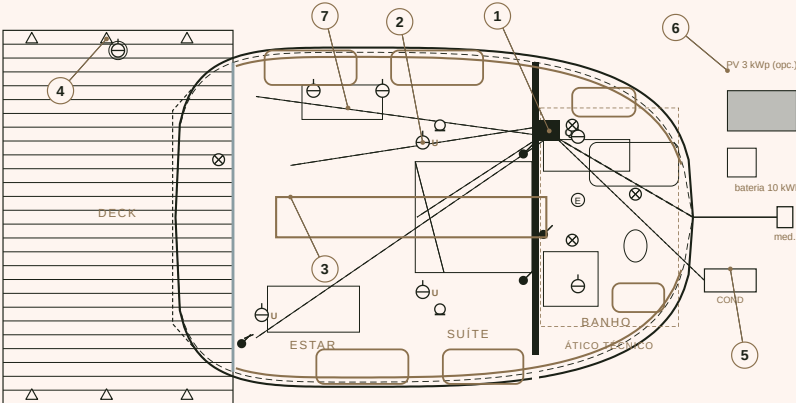

PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100


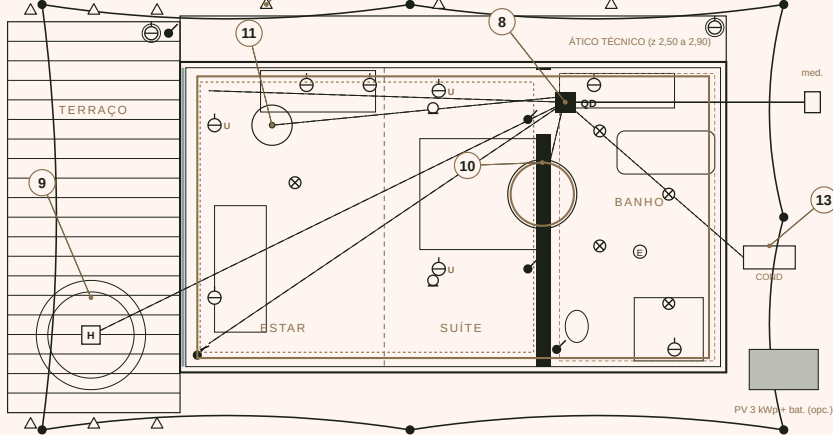


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO SAFARI)

sem escala

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



disj.	cabo	curva / proteção
C1 Climatização (evaporadora + condensadora)	20 A 4 mm²	C
C2 Aquecedor de água / bomba de calor	25 A 6 mm²	C
C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB	20 A 2,5 mm²	B
C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V	10 A 1,5 mm²	B
C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)	20 A 2,5 mm²	B + DR 30 mA
C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)	32 A 6 mm²	C + DR 30 mA
C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)	10 A 1,5 mm²	B + DR 30 mA
C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)	20 A 4 mm²	C

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- 1 Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- 2 Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- 3 Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- 4 Balizadores de deck 12 V
- 5 Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- 6 Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- 7 Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- 8 QD 16 módulos no ático do banho
- 9 Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- 10 Fita LED no anel do forro do Óculo
- 11 Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- 12 Balizadores no terraço e na passarela
- 13 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 14 DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada



ZION GLAMPING COLLECTION

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

COMUM

ESCALA

1:100 / sem escala

FOLHA

DET-07

DATA

SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminho e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 0,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 22 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ 2 estacas dos postes da vela locadas a partir do centro do octógono
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Anel de borda octogonal conferido pelos 8 raios a partir do centro (r 3,68 m ± 5 mm) ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 14 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.	Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.	Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.	Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.	Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.	Prazo por etapa e equipe proposta
4.	Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION LODGE 38 · LOTE 2 DE 4

LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZL-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m2

INTERNOS

30,4 m2

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

24 tipos de peça · peso total ≈ 1.216 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
B01	Pilar de vértice P1 a P8	8	2,70	Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	28,5	228	Corte + chapas de base H01 e de topo H02 soldadas + 2 talões dos montantes de vidro	Base H01: 4 chumbadores M16 no anel A06; topo H02: 4 M16 no anel de beiral C01
B02	Revestimento de madeira do pilar (2 meias-canais 140 mm)	8	2,70	Madeira laminada de eucalipto usinada	madeira laminada	10,0	80	Usinagem CNC + verniz	Clipes de mola + parafuso inox M5 no talão do pilar
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB08	8	2,82	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	45,2	362	Corte a 22,5° + chapas de topo H03 soldadas + talão H04 + furos do perfil de borda	Chapa de topo H03 dobrada a 135° com 4 M16 8.8 entre segmentos; H02 dos pilares
D01	Caibro radial R1 a R8	8	3,49	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	23,7	190	Corte + chapa-orelha nas duas pontas + 3 talões do trilho do forro	Pé: pino Ø16 no talão H04 do vértice + 2 M12; topo: 2 M16 na orelha do anel E01
E01	Anel de compressão da lanterna Ø1,50	1	4,71	Tubo Ø60,3 x 3,0 calandrado + 8 orelhas 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	25,0	25	Calandra + solda em gabarito + orelhas	8 orelhas: 2 M16 por caibro; clamp I02 da membrana; lanterna E02 com 8 M10
E02	Lanterna: 8 montantes 0,60 m + anel superior Ø1,50	1	9,51	Tubo Ø42,4 x 3,0 + anel Ø42,4 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Solda em gabarito	8 M10 no anel E01; esquadria E04 parafusada nos montantes
E03	Tampa da lanterna Ø1,60 (chapa de alumínio 2 mm sobre quadro + pingadeira)	1	1,60	Chapa alumínio 5052 2 mm + quadro 40 x 20	alumínio	14,0	14	Corte + dobra + solda TIG	8 M8 inox no anel superior de E02 + EPDM
E04	Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo h 0,45)	1	4,71	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	14,1	14	Calandra + usinagem	M8 inox nos montantes de E02 + selante estrutural
F01	Poste da vela PV1 / PV2	2	2,40	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	17,0	34	Corte + base articulada H08 + olhal soldado	Pino Ø20 na base H08 sobre o cabeçote J02; olhal recebe o cabo F02
F02	Cabo da vela Ø8 inox + esticador M12	4	4,00	Cabo inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	1,6	7	Terminais prensados com olhal	Manilha 3/8 + esticador M12 nos olhais dos postes (2) e do anel de beiral (2)
F03	Vela de sombra (membrana hipar ~14 m2)	1	5,20	PVDF 1050 g/m2 com bolsas de cabo	membrana PVDF	17,0	17	Corte CNC + solda RF	Bolsas de cabo Ø8 nas 4 bordas + chapas de canto inox
G01	Cabo de contraventamento em X nas 3 faces opacas	6	3,80	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	1,6	10	Terminais prensados com olhal	Olhal H09 + manilha + esticador M12 inox
H01	Chapa de base do pilar (200 x 200 x 10)	8	0,20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	3,1	25	Corte plasma + solda de fábrica no pilar	4 chumbadores M16 8.8 no anel de borda A06 (furos oblongos)
H02	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	8	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	11	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral C01
H03	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10, dobrada a 22,5°)	16	0,18	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	2,1	34	Corte + dobra + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos (emenda no vértice, sobre o pilar)
H04	Talão do caibro (chapa 8 mm com furo Ø17 + orelha)	8	0,10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,6	5	Corte laser + solda de fábrica no anel C01	Pino Ø16 + 2 M12 no pé do caibro
H05	Chapa de canto do anel de borda (135°, 2 por canto)	22	0,16	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	1,0	22	Corte + dobra + furação	6 M12 8.8 por canto
H06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	12	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	10	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
H07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	32	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	29	Corte + furação	2 M12 em cada aba
H08	Base articulada do poste da vela (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	2	0,15	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	3,4	7	Corte + solda	4 M12 no cabeçote J02
H09	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	16	0,08	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,3	5	Corte laser + solda de fábrica nos pilares e no anel	Manilha inox
I01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha oculta	8	3,00	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	4,8	38	Extrusão + corte a 22,5°	Parafuso inox M8 @400 no anel C01; grampo da bolsa de borda
I02	Perfil de clamp do anel da lanterna (alumínio 60 x 12, 2 metades)	1	4,71	Alumínio 6063 usinado	alumínio	5,7	6	Usinagem	M10 inox @150 no anel E01 + EPDM
I03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	15	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	16	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos talões dos caibros e no anel

GEOMETRIA · OCTÓGONO, PILARES, CAIBROS E LANTERNA

lado 2,817 m · raio aos vértices 3,680 m · beiral 2,70 m · lanterna Ø1,50 a 4,60 m · balanço da membrana 0,90 m

PILARES NOS VÉRTICES (Ø101,6 x 4,0)

PILAR	X	Y
P1	3,400	1,408
P2	1,408	3,400
P3	-1,408	3,400
P4	-3,400	1,408
P5	-3,400	-1,408
P6	-1,408	-3,400
P7	1,408	-3,400
P8	3,400	-1,408

CAIBROS RADIAIS R1 a R8 (Ø76,1 x 3,6)

Do talão H04 no vértice (z 2,70) à orelha do anel de compressão (r 0,75, z 4,60): comprimento 3,49 m cada, inclinação 33,0°. Anel de compressão Ø60,3 calandrado (perímetro 4,71 m) com 8 orelhas; lanterna com 8 montantes de 0,60 m e tampa de alumínio.

ANEL DE BEIRAL 150 x 100 x 4,0

8 segmentos de 2,82 m com chapas de topo dobradas a 135° (H03), 4 M16 por emenda; perfil de borda arredondado I01 com calha oculta; 22 estacas (J01).

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 µm) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira ≤ 2,4 x 1,2 m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)


volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: pilares, anel de beiral, caibros, anéis da lanterna, postes da vela	3,0 x 1,2 x 0,8 m	2,9	931
Estrado 2: vigas U, chapas, cabos, perfis de alumínio, tampa da lanterna	4,8 x 1,2 x 0,6 m	3,5	828
Painéis SIP + parede-corda do banho	2,8 x 1,25 x 0,9 m	3,2	724
Caixa da membrana + vela + isolamento + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,0 m	2,9	310
Cavaletes de vidro x 3 (5 faces, porta de correr, lanterna)	2,9 x 0,6 x 2,7 m	14,1	1345
Paletes de piso (módulos) x 2	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	1345
Paleta de deck	2,0 x 1,0 x 1,3 m	2,6	828
Paleta de instalações + louças + marcenaria + mobiliário	2,4 x 1,2 x 1,4 m	4	828
Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,5 m	0,6	435

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

 ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna

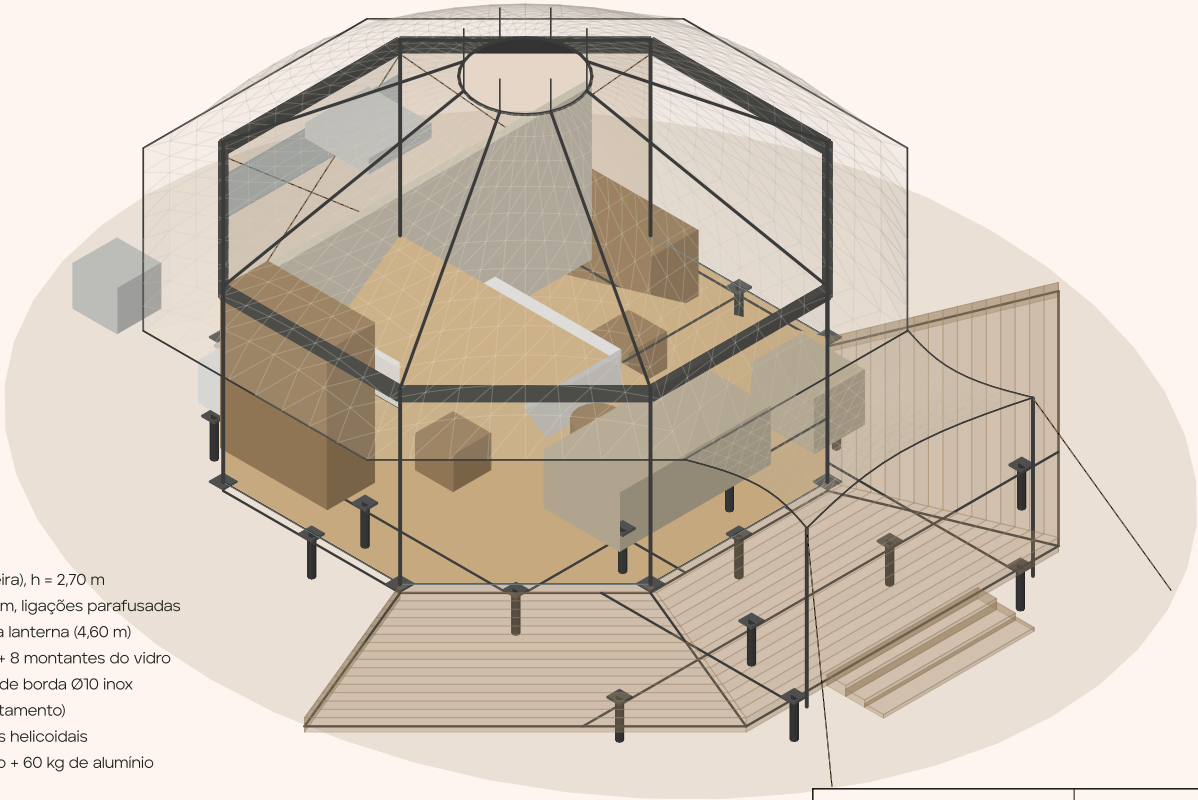


- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: = 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		FOLHA 12/27 SET 2026

Z

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais

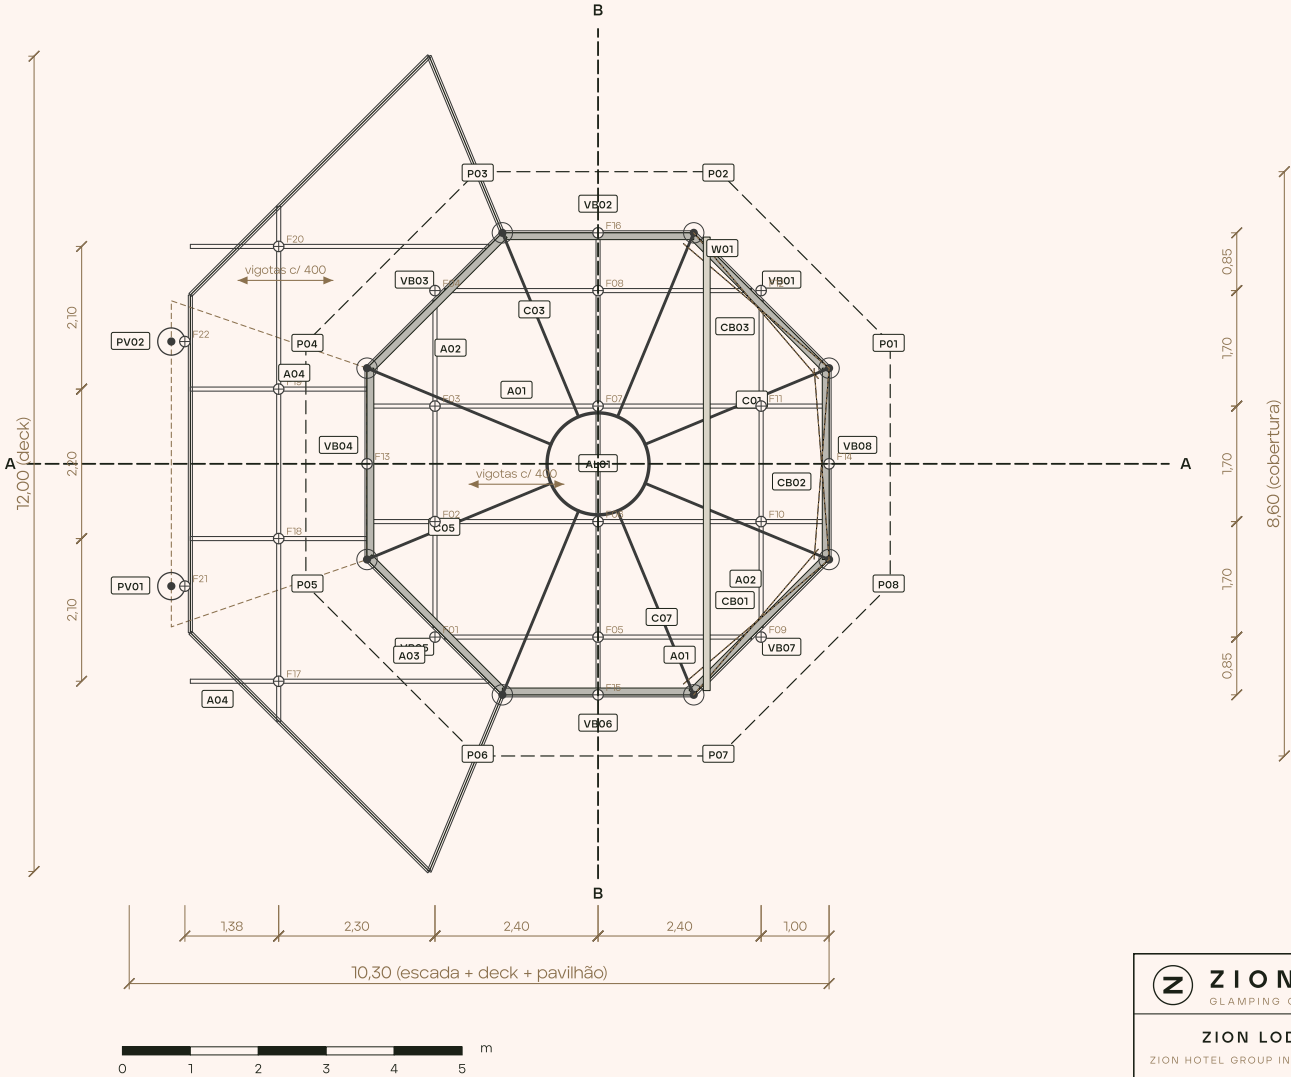

CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22

Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01

Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02

Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03

Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04

Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08

Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08

Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08

Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01

Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03

Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01

Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02

Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL		
	Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela		
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros		FOLHA 03b/LG
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		SET 2026


ZION LANTERNA ZION

Anel de compressão Ø1500, oito caibros radiais, vidro laminado curvo 450 mm, tampa ventilada e forro com anel de LED. Corte, planta do anel e ligação caibro-anel.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION LODGE | DET-12

CORTE PELA LANTERNA - EIXO VERTICAL


1:4 (1 mm = 0,25 px)

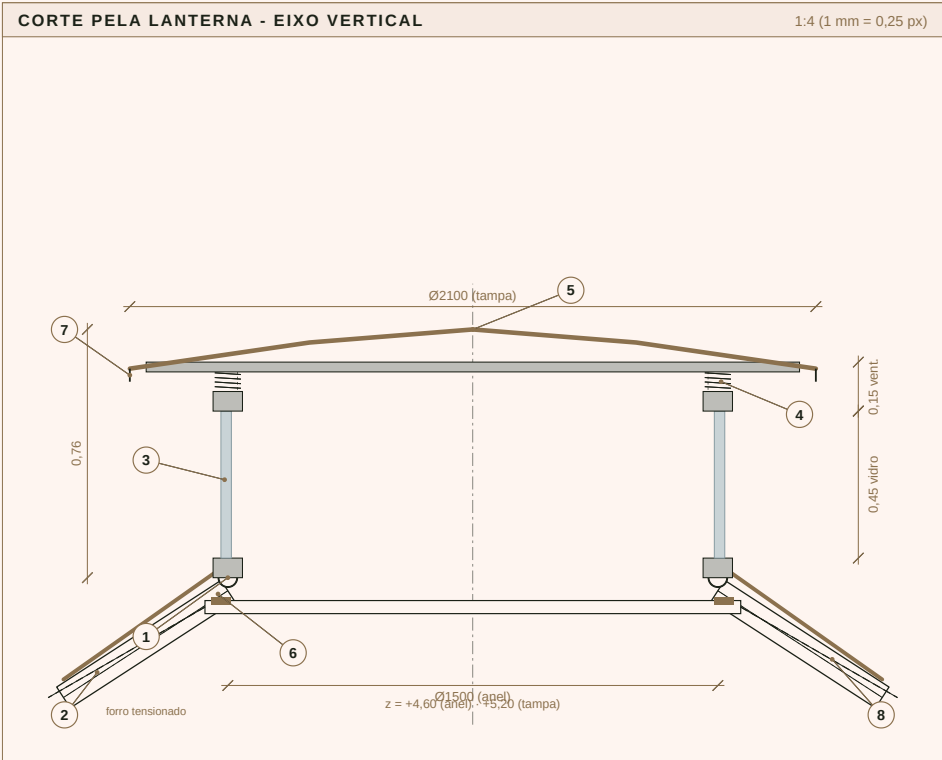

LANTERNA: por que e como
Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana a chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com N = 4 a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.

PLANTA DO ANEL DE COMPRESSÃO - 8 CAIBROS


1:15 (1 mm = 0,067 px)

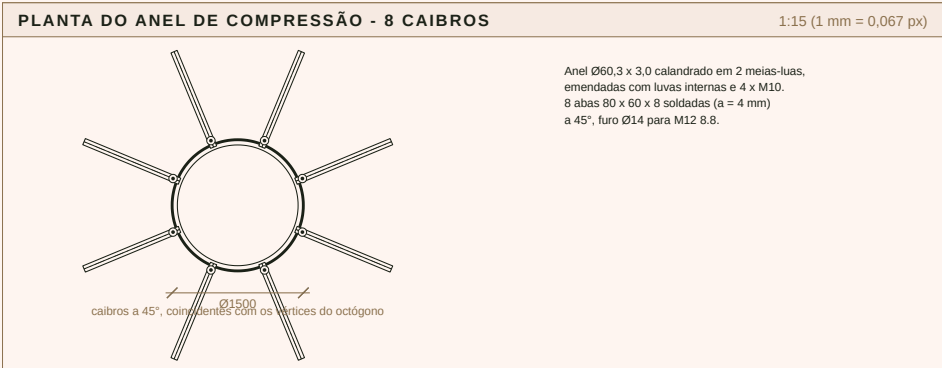

Anel Ø60,3 x 3,0 calandrado em 2 meias-luas, emendadas com luvas internas e 4 x M10. 8 abas 80 x 60 x 8 soldadas (a = 4 mm) a 45°, furo Ø14 para M12 8.8.

LIGAÇÃO CAIBRO - ANEL - CABEÇA ARTICULADA

1:1,7 (1 mm = 0,6 px)

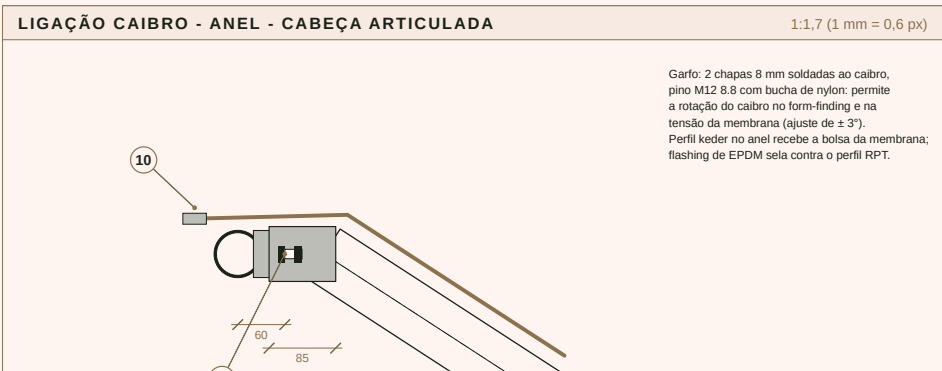

Garfo: 2 chapas 8 mm soldadas ao caibro, pino M12 8.8 com bucha de nylon: permite a rotação do caibro no form-finding e na tensão da membrana (ajuste de ± 3°). Perfil keder no anel recebe a bolsa da membrana; flashing de EPDM sela contra o perfil RPT.

- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500
- 2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.
- 3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze
- 4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira
- 5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100

- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K
- 7 Praga-de-lua e beiral de 250 mm da tampa
- 8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)
- 9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)
- 10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

 ZION GLAMPING COLLECTION LANTERNA ZION ZION LODGE	ESCALA 1:4 / 1:15 / 1:2	
	FOLHA DET-12	DATA SET 2026




CAIBROS E ANEL DE BEIRAL

Nó do vértice do octógono (pilar Ø101,6 revestido, anel de beiral 150 x 100, pé do caibro, calha oculta e pingadeira), base do pilar sobre a viga U 150 e poste da vela de sombra.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION LODGE | DET-13

NÓ DO VÉRTICE - CORTE RADIAL PELO PILAR

1:3,5 (1 mm = 0,3 px)

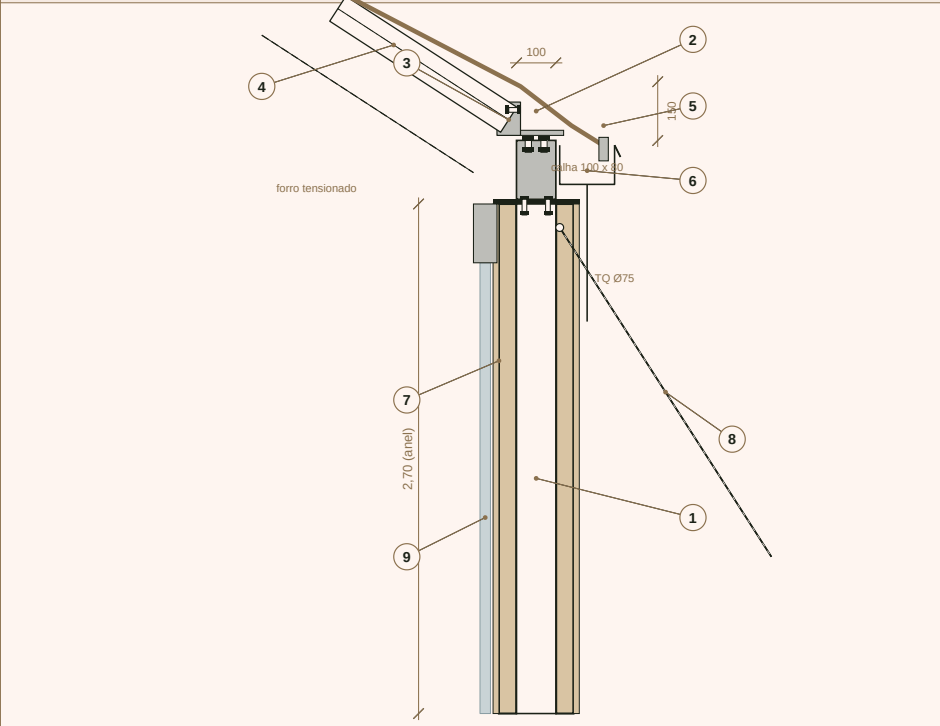

- 1 Pilar Ø101,6 x 4,0 galvanizado + revestimento de madeira 44 mm

2 Anel de beiral 150 x 100 x 4,0, 8 segmentos parafusados

3 Pé do caibro: chapa de assento 140 x 13 + orelha, pino M12

4 Caibro Ø76,1 x 3,6 a 33°

5 Perfil keder de borda + bolsa da membrana
- 6 Calha oculta 100 x 80 no anel, TQ Ø75 pelo pilar (4 un.)

7 Ripado externo termotratado 15 x 40


8 Cabo de contraventamento Ø8 nas 3 faces opacas

9 Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 em travessa RPT

10 Chapa de base 220 x 220 x 12 + 4 x M16

BASE DO PILAR SOBRE A VIGA U 150 E O DECK


1:4,5 (1 mm = 0,22 px)

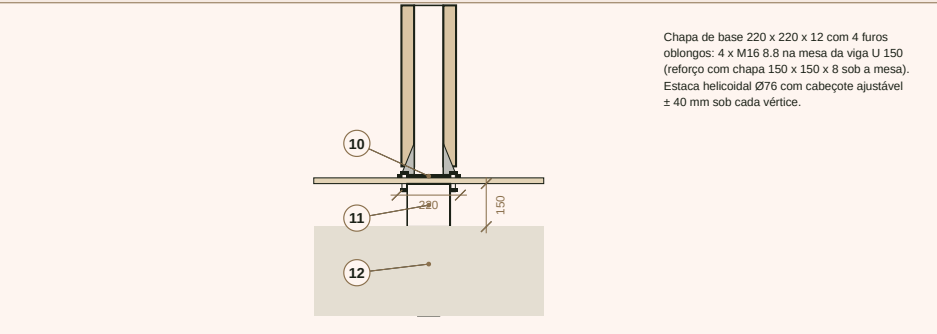

Chapa de base 220 x 220 x 12 com 4 furos oblongos: 4 x M16 8,8 na mesa da viga U 150 (reforço com chapa 150 x 150 x 8 sob a mesa). Estaca helicoidal Ø76 com cabecote ajustável ± 40 mm sob cada vértice.

POSTE DA VELA DE SOMBRA E CABOS

1:14 (1 mm = 0,07 px)

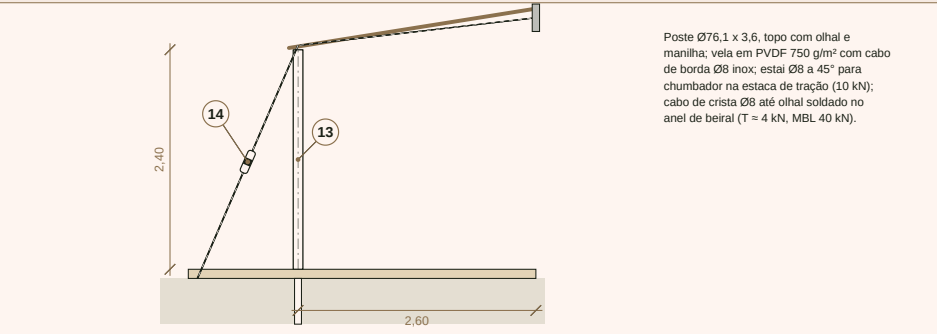

Poste Ø76,1 x 3,6, topo com olhal e manilha; vela em PVDF 750 g/m² com cabo de borda Ø8 inox; estai Ø8 a 45° para chumbador na estaca de tração (10 kN); cabo de crista Ø8 até olhal soldado no anel de beiral (T = 4 kN, MBL 40 kN).

- 11 Viga U 150 x 60 x 3,0 galvanizada

12 Cabecote ajustável + estaca helicoidal Ø76


13 Poste da vela Ø76,1 x 3,6, 2,40 m

14 Estai Ø8 inox com esticador

 CAIBROS E ANEL DE BEIRAL ZION LODGE	ESCALA 1:3,5 / 1:4,5 / 1:14	
	FOLHA DET-13	DATA SET 2026

 ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

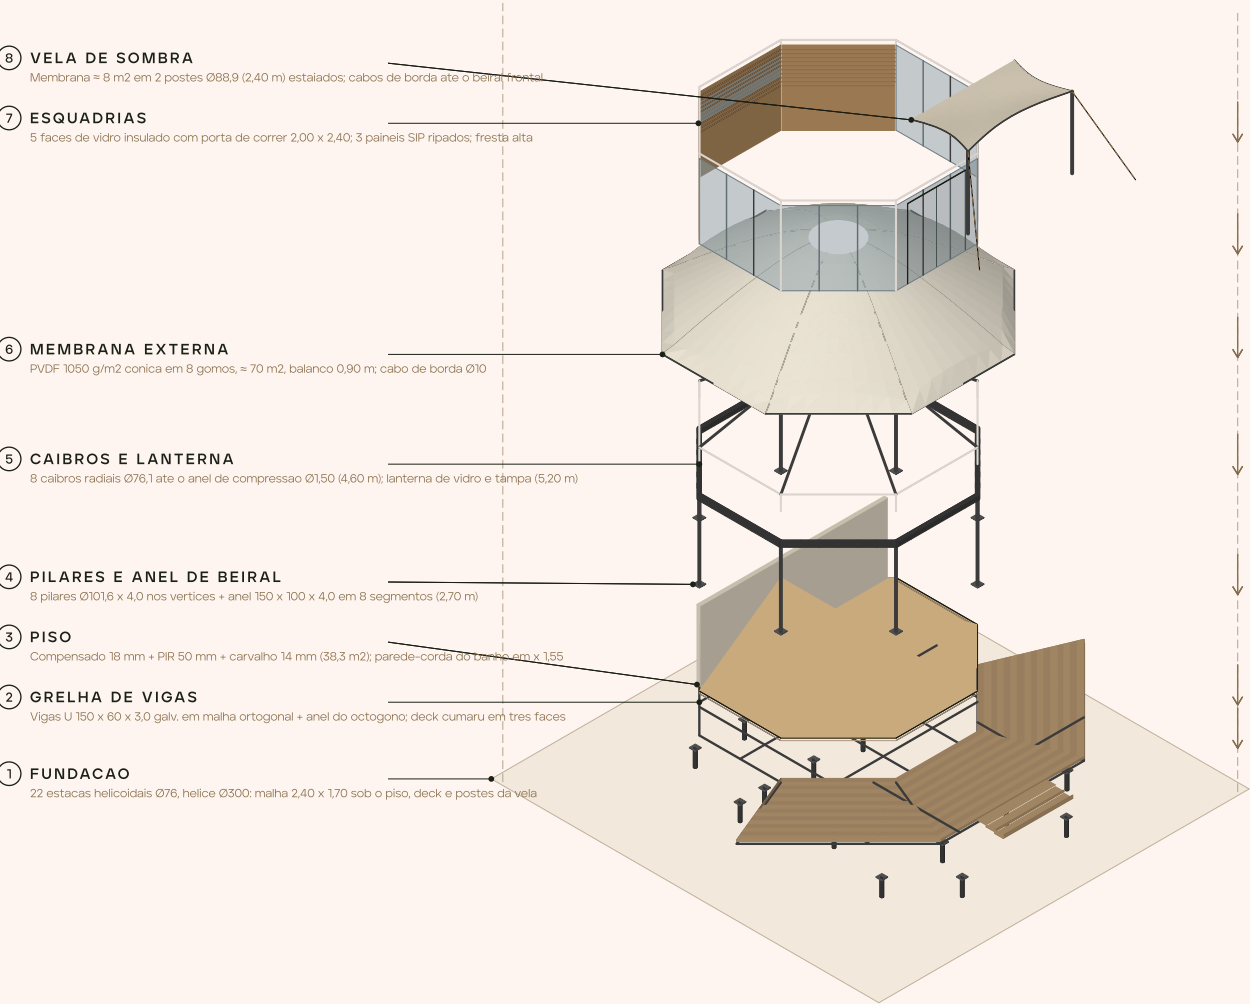

SEQUENCIA DE MONTAGEM

① Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3 Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5 Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
⑥ Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8 Vidros, paineis + vela	2 dias
Instalacoes + acabamentos	3 dias
Total (dias uteis)	11,5
Desmontagem	4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): = 1.400 kg de aco + 60 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,2 t em 1 contêiner 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 10/27 SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Tripé com talha 500 kg; escada / andaime tubular	Anel de compressão sem os 8 caibros: manter o anel no tripé e pinar os caibros em pares opostos antes de soltar	☐ 8 pilares aprumados (1/500) e chumbados nas chapas de base H01 ☐ 8 segmentos do anel de beiral parafusados nos vértices (4 M16, 120 N·m); raios do octógono conferidos ☐ Anel de compressão içado a z 4,60; 8 caibros pinados nos talões H04 e parafusados nas orelhas (2 M16) ☐ Lanterna nivelada sobre o anel (± 5 mm); tampa e esquadria só após a membrana
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas e selados ☐ Parede-corda do banho fixada no piso e no anel ☐ Cabos em X das faces opacas com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobre-tensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.	DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.	Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.	Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.	Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.	Proposta de fit test e de embalagem
4.	Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E

VIDROS

ZL-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Lona externa (membrana PVDF tipo II) confeccionada por painéis conforme os padrões de corte deste lote, com keder, bolsas e reforços
Forro interno tensionado (Trevira CS) por painéis, com harpão
Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada
Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores
Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes
Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2
Fundação, piso e instalações: lote 1
Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Confeccionista de membranas tensionadas (corte CNC, solda HF, form-finding) + vidraceiro com vidro insulado / laminado + instaladores de membrana.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTE

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval
Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados
Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

1 padrões externos = 72,0 m2 · 1 internos = 35,3 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
G1	8	Lona Externa	Gomo G1 · do anel da lanterna (r 0,75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2	3,39 x 4,72	9	72	BOLSA DE CABO, CLAMP, SOLDA HF	0
F1	8	Forro / Revestimento Interno	Forro F1 · gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana	2,43 x 3,11	4,41	35,3	HARPÃO	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Alumínio e lanterna

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Perfil de borda arredondado do beiral + calha oculta (8 lados)	un	8	38	PREÇO A COTAR
Perfil de clamp do anel da lanterna (2 metades)	un	1	6	PREÇO A COTAR
Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo 0,45 m)	un	1	14	PREÇO A COTAR
Tampa da lanterna Ø1,60 em chapa de alumínio 2 mm sobre quadro, com pingadeira	un	1	14	PREÇO A COTAR
Trilho do forro tensionado	un	1	16	PREÇO A COTAR

Envelope: membrana, vela, isolamento, painéis

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos (+15% emendas/bolsas)	m2	84	88	PREÇO A COTAR


ESPECIFICAÇÃO DA LONA

LONA EXTERNA	PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster HT 1100 dtex, PVC + laca PVDF bifacial), cor creme Zion, resistência ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos; opção: PTFE-vidro 800 g/m2 (30 anos, custo maior)
FORRO	Trevira CS 210 g/m2 (ou lona translúcida 350 g/m2 sob claraboias), harpão de PVC soldado
ISOLAMENTO	lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros + manta refletiva com face para a câmara; PIR 60 mm na Cápsula
KEDER E PERFIS	cordão keder Ø10 / Ø13 PVC; perfil duplo keder alu 6060-T5; barras de clamp 40 x 6; harpão 40 x 20; presilhas inox 304
COSTURAS	solda de alta frequência 40 mm; nenhuma costura com linha na face externa; reforços de 150 mm em recortes e cantos
CABOS	inox 316 7 x 19 Ø8 / Ø10 / Ø12 com terminais prensados, esticadores M12 a M20, manilhas

Vela de sombra: membrana PVDF 14 m2 (+15%) com bolsas de cabo	m2	16	17	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3 (sobre o forro, câmara ventilada acima)	m2	46	58	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de alumínio (bolha)	m2	46	12	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS (cone interno até o anel da lanterna)	m2	44	13	PREÇO A COTAR
Painéis SIP 100 mm (OSB/PIR/OSB) nas 3 faces opacas	m2	20,5	450	PREÇO A COTAR
Membrana hidrófuga + ripas de ventilação (câmara ventilada da parede)	m2	20,5	41	PREÇO A COTAR
Ripado de madeira termotratada 40 x 40 mm (externo)	m2	20,5	164	PREÇO A COTAR
Revestimento de madeira dos pilares (2 meias-canais 140 mm, h 2,70)	un	8	80	PREÇO A COTAR
Painéis de madeira internos das faces opacas	m2	20	140	PREÇO A COTAR

 ZION LODGE 38 · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

1 padrões externos · 1 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

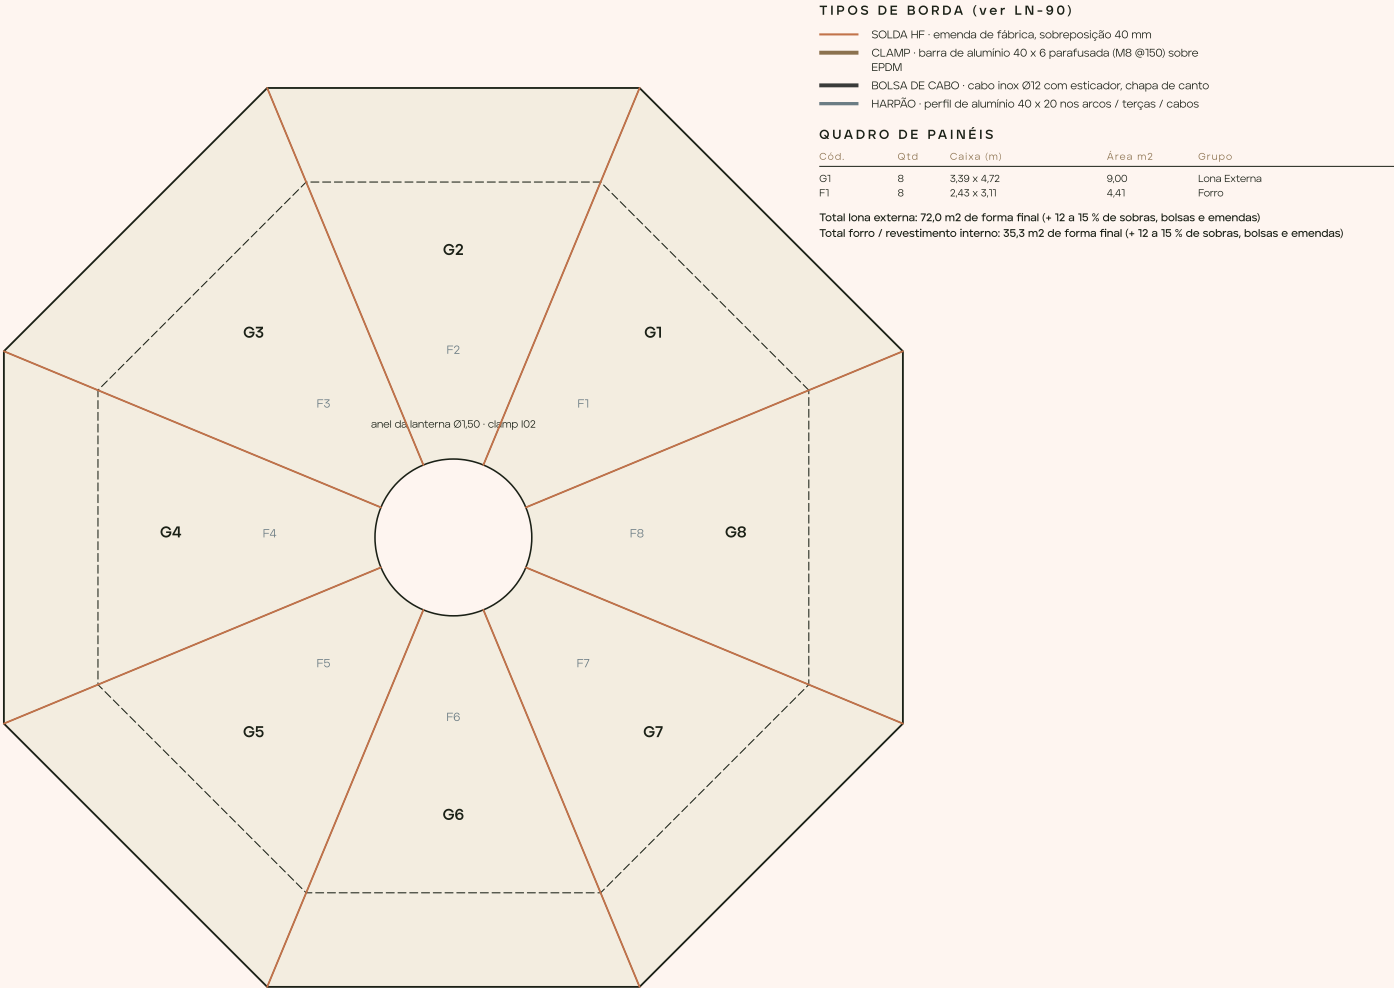

Planta da cobertura - 8 gomos iguais soldados sobre os caibros - bolsa de cabo no beiral (perfil I01) - forro em

	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
	ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA LN-01

SET 2026

ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE G1

Gomo G1 · do anel da lanterna (r 0,75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2 · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

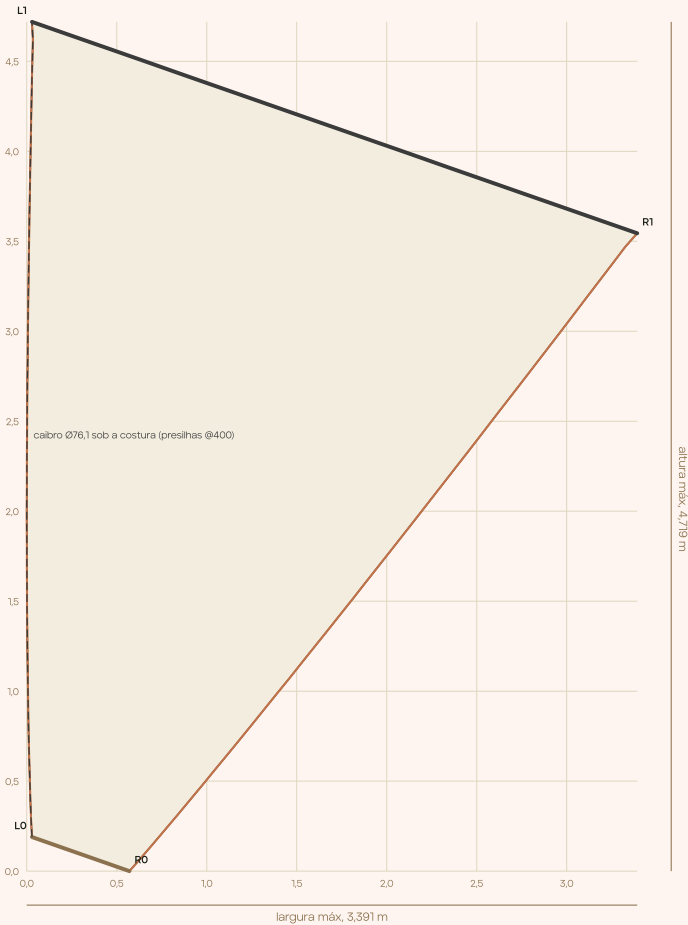


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,029	0,189	0,570	0,000	0,574
0,500	0,012	0,689	0,895	0,381	0,935
1,000	0,004	1,189	1,212	0,767	1,280
1,500	0,000	1,689	1,526	1,156	1,616
2,000	0,000	2,189	1,838	1,547	1,946
2,500	0,003	2,689	2,147	1,940	2,271
3,000	0,008	3,189	2,454	2,334	2,591
3,500	0,015	3,689	2,760	2,730	2,907
4,000	0,024	4,189	3,064	3,127	3,220
4,500	0,030	4,689	3,371	3,521	3,539

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8)

ÁREA DE FORMA FINAL
9,00 m2

COMPRIMENTO L / R
4,53 / 4,53 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
3,39 x 4,72 m

MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; 8 gomos soldados em fábrica numa peça única (= 73 m2) com abertura central Ø1,50

BORDAS E RECORTES

- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Todos os gomos são iguais (octógono regular); confeccionar 1 gabarito e 8 peças; borda com bolsa de cabo Ø10 e pingadeira no perfil de beiral I01.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE G1 Lona Externa	
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-11 SET 2026

ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

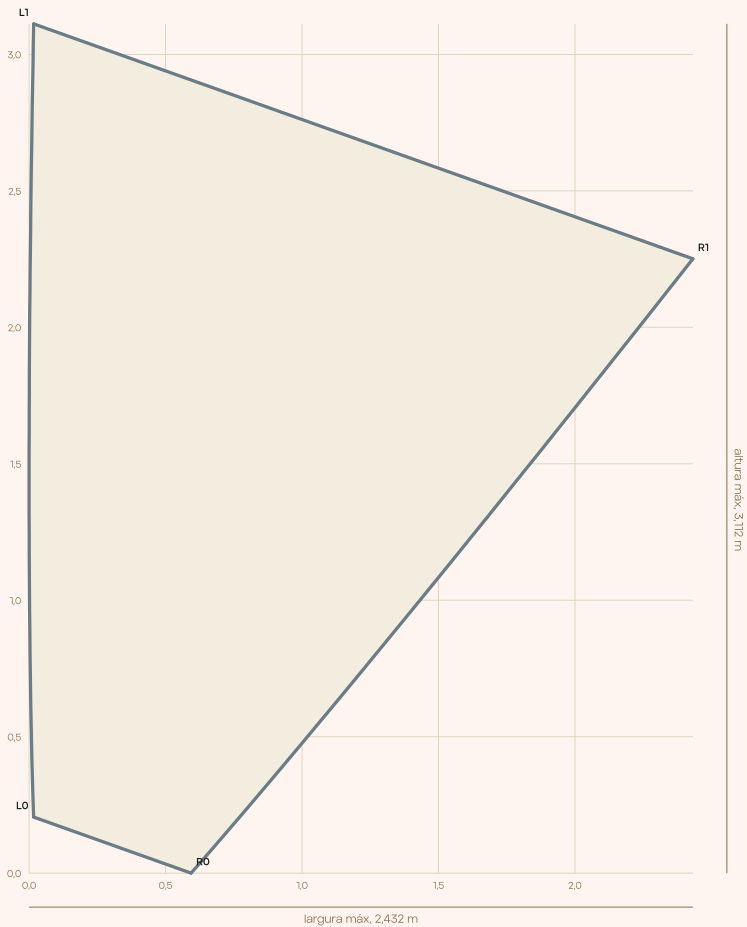


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,017	0,206	0,594	0,000	0,612
0,500	0,005	0,705	0,919	0,380	0,970
1,000	0,000	1,205	1,239	0,764	1,315
1,500	0,001	1,705	1,555	1,151	1,650
2,000	0,004	2,205	1,869	1,541	1,990
2,500	0,010	2,705	2,180	1,932	2,304
2,907	0,017	3,112	2,432	2,251	2,564

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8)
ÁREA DE FORMA FINAL
4,41 m2
COMPRIMENTO L / R
2,91 / 2,91 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,43 x 3,11 m
MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos dos calibros e no anel de beiral

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.


ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-12 SET 2026




ZION LODGE 38 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento


1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

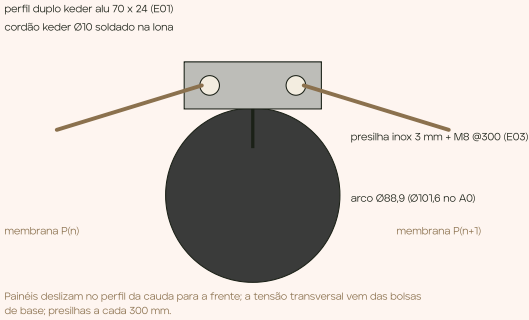


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

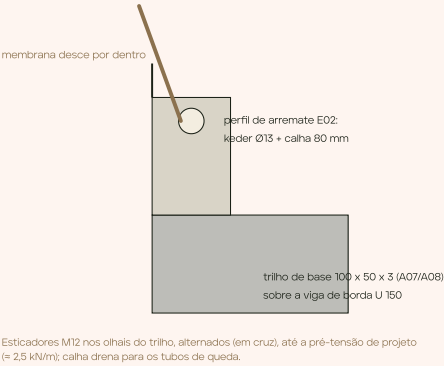


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)

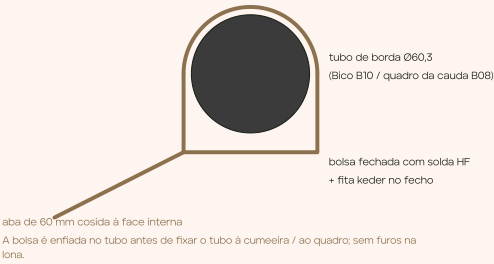

4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

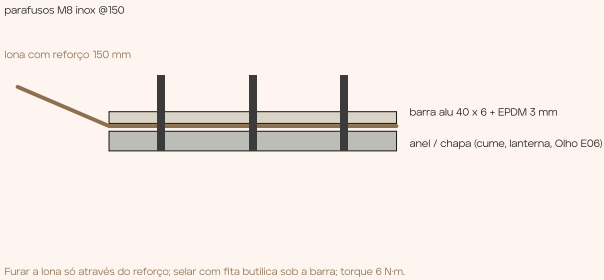

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

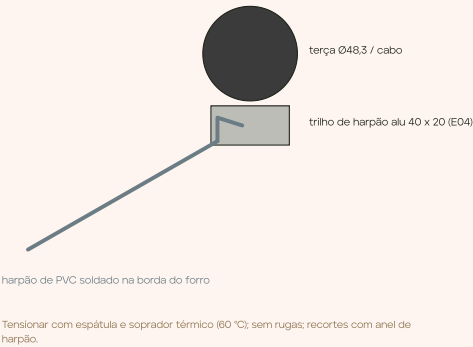

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Lodge: peça única de 8 gomos içada pelo anel da lanterna (clamp 4, perfil I02), passada sobre o anel de beiral (perfil de borda I01) e tensionada pela bolsa de cabo Ø10 (6); presilhas nos caibros; forro em harpão (5).

SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-90 SET 2026



ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

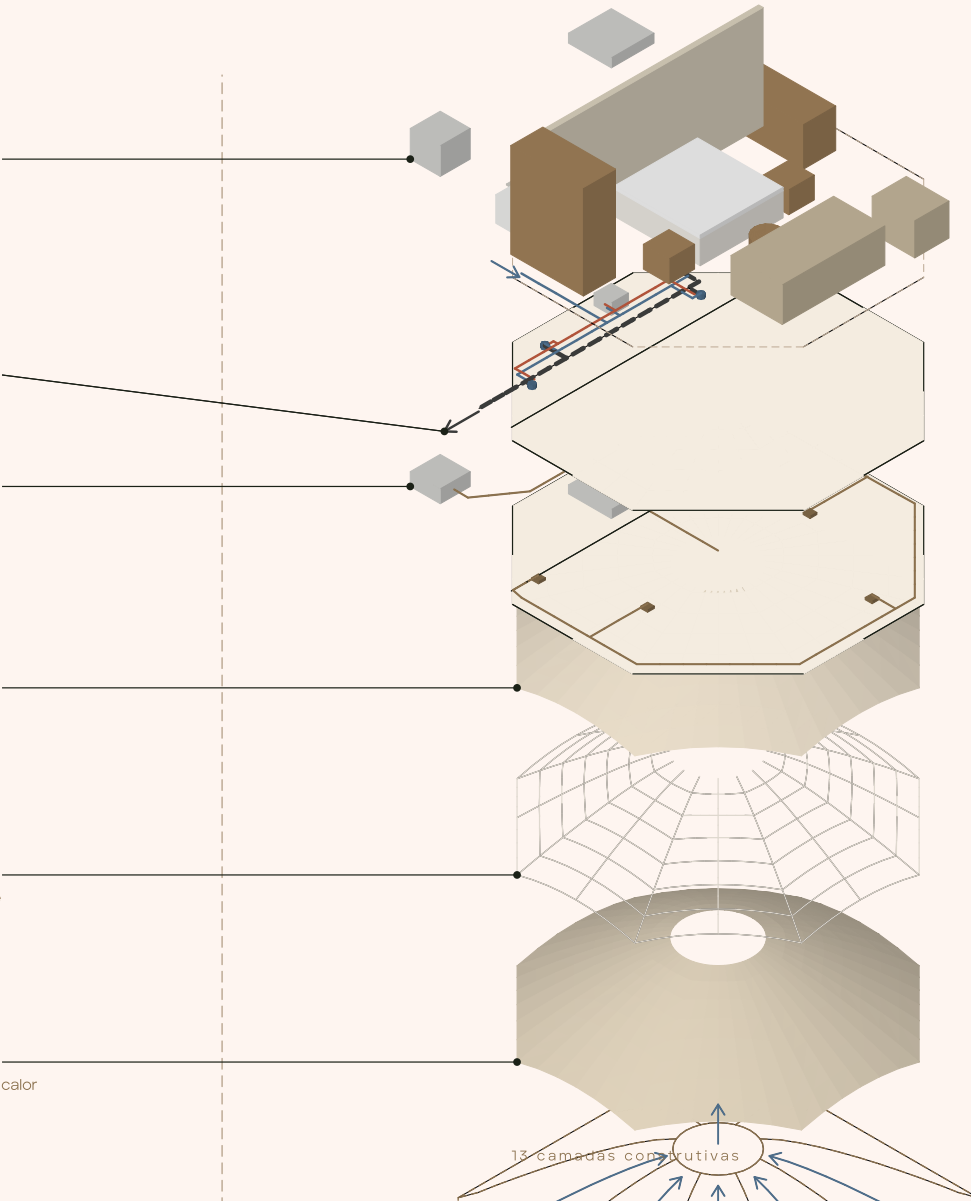

 ZION LODGE · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica





CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00 x 2,40	1	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82 x 2,55	2	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60 x 0,60	1	Vidro insulado jateado; peitoril 160	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50 x 0,45	1	Anel de vidro laminado curvo Ø150 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90 x 2,10	1	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 7 tipos · 10 unidades
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF cônica em 8 gomos radiais · Lanterna Zion no cume · calha oculta no anel de beiral com 4 TQ Ø75 nos pilares · vela de sombra sobre o deck

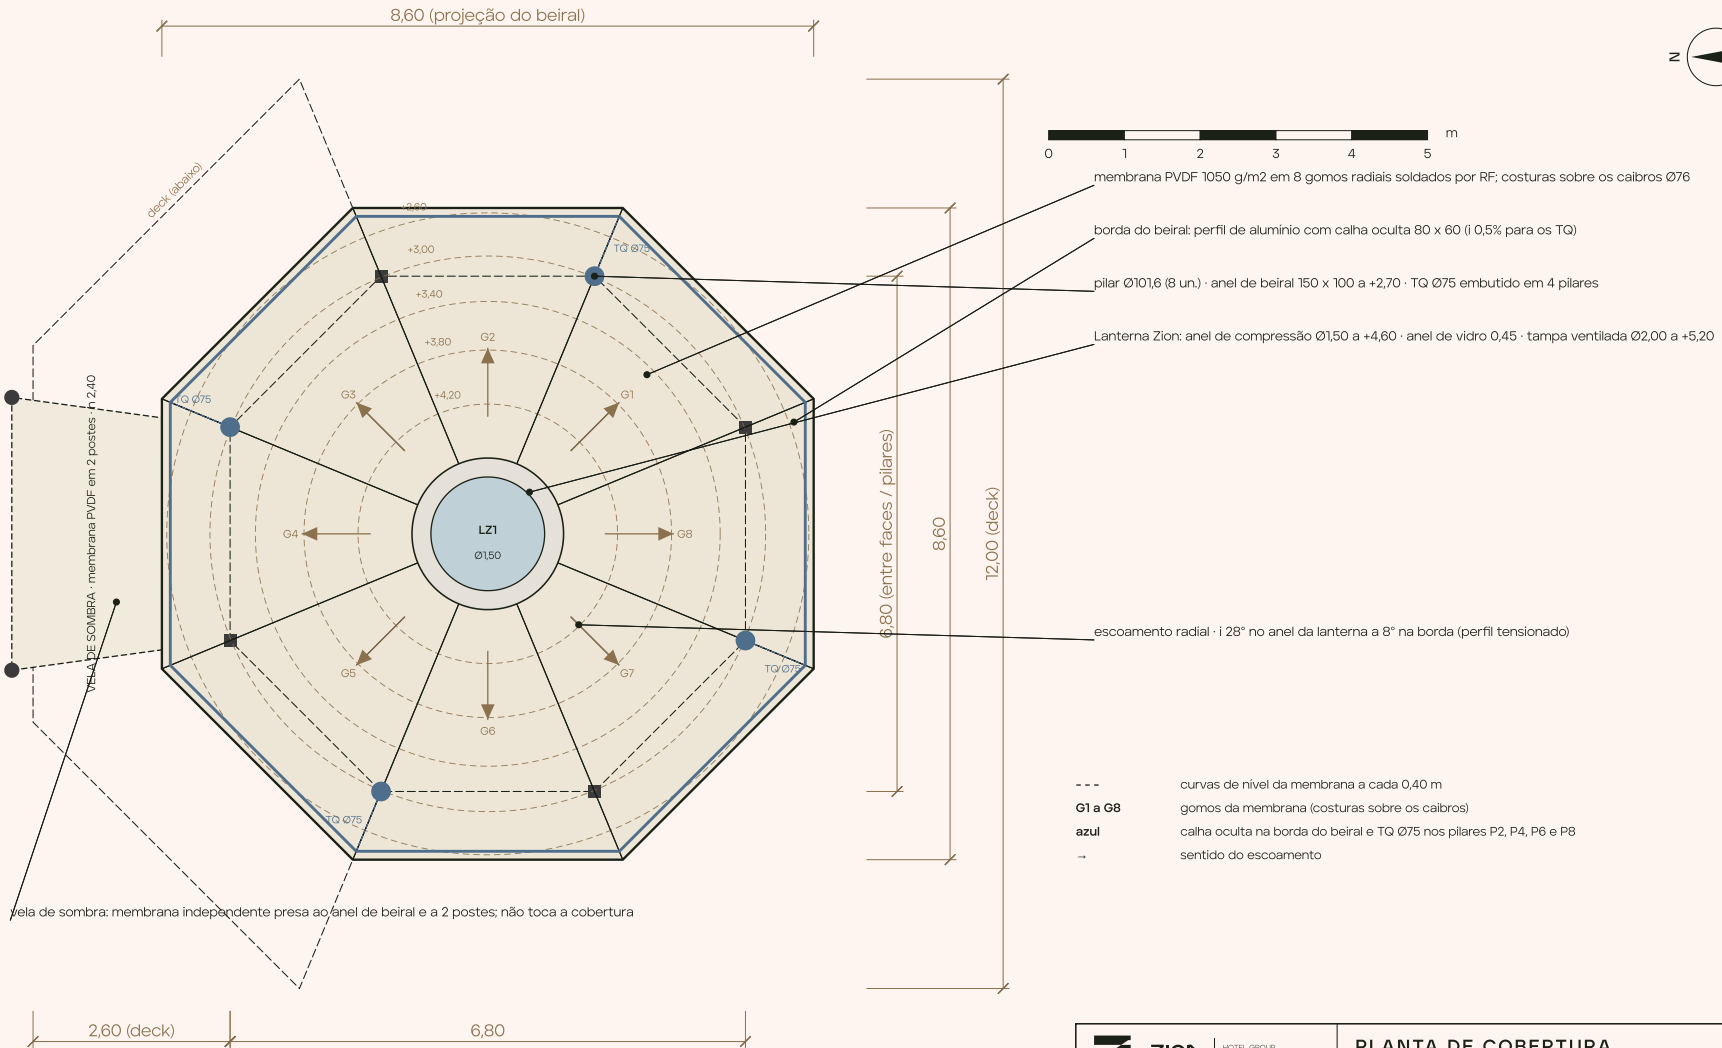

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA DE COBERTURA Escoamento radial, calha oculta, TQ Ø75, Lanterna Zion e vela de sombra	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		FOLHA PA-04 SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

39,2 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00	2,40	1	4,8	144	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41	2,55	2	1,05	31	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82	2,55	2	7,19	216	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82	2,55	2	7,19	216	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60	0,60	1	0,96	29	Vidro insulado jateado; peitoril 1,60	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50	0,45	1	0,68	20	Anel de vidro laminado curvo Ø1,50 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90	2,10	1	1,89	57	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros: tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta; proteger cantos	☐ Membrana içada pelo anel da lanterna e presa no clamp I02 ☐ Bolsa de borda tensionada em cruz sobre o perfil do beiral; balanço de 0,90 m uniforme nos 8 lados ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 8 gomos tensionados do anel de beiral ao anel da lanterna, sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Montantes RPT fixados nos talões dos pilares, no prumo ☐ 10 vidros insulados calçados e selados; porta de correr 2,00 x 2,40 regulada no trilho embutido ☐ Fresta da banheira selada; revestimento dos pilares encaixado ☐ Vidro curvo e tampa da lanterna com teste de água

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

- | | |
|----|--|
| 1. | Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias) |
| 2. | Padrões de corte: ZL-LON-001_padroes.dxf e ZL-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90 |
| 3. | Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding |
| 4. | Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05 |

O FORNECEDOR DEVOLVE

- | | |
|----|---|
| 1. | Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe |
| 2. | Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido) |
| 3. | Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra |
| 4. | Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia |

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- | |
|--|
| Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração |
| Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido |
| Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água |
| Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado) |

CONDIÇÕES GERAIS

- | |
|--|
| Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado. |
| Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição. |
| Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada. |
| Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART). |
| Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços. |

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZL-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

- Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque
- Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte
- Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador
- Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)
- Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

- Piso, deck e instalações: lote 1
- Estrutura: lote 2
- Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

- Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha
- Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos
- Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

PROGRAMA DE MOBILIÁRIO · ANTEPROJETO

posições e dimensões do modelo 3D · o projeto de interiores ZL-INT-001 (marcenaria acoplada, elevações, detalhes) segue o método do Casulo e é a próxima entrega desta linha

PEÇA	TIPO	DIMENSÕES (M)	POSIÇÃO	CLASSE
Cama king 1,93 x 2,03	bed	2,00 x 1,94 x h 0,55	x -0,55 a 1,45 · y -0,97 a 0,97	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,60 x 0,60 x h 0,50	x -0,55 a 0,05 · y 1,10 a 1,70	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,60 x 0,60 x h 0,50	x -0,55 a 0,05 · y -1,70 a -1,10	MS (solta)
Café / minibar	cabinet	1,70 x 0,75 x h 0,90	x 0,20 a 1,90 · y 2,20 a 2,95	MA (acoplada)
Closet	cabinet	1,70 x 0,75 x h 2,20	x 0,20 a 1,90 · y -2,95 a -2,20	MA (acoplada)
Sofá 2,40	sofa	1,20 x 2,40 x h 0,80	x -2,70 a -1,50 · y -1,20 a 1,20	MS (solta)
Mesa lateral	table	Ø0,60 x h 0,45	(-1,15; 0,00)	MS (solta)
Poltrona	chair	1,00 x 0,80 x h 0,75	x -2,90 a -1,90 · y 1,70 a 2,50	MS (solta)
Bancada 1,40	vanity	0,70 x 1,40 x h 0,85	x 1,75 a 2,45 · y 1,00 a 2,40	MA (acoplada)
Bacia sanitária	wc	0,70 x 0,70 x h 0,42	x 2,70 a 3,40 · y 1,60 a 2,30	MS (solta)
Chuveiro 0,95 x 0,90	shower	0,95 x 0,90 x h 0,02	x 2,40 a 3,35 · y -1,60 a -0,70	MS (solta)
Banheira 0,90 x 0,75 (sentar)	tub	0,90 x 0,75 x h 0,58	x 1,80 a 2,70 · y -2,50 a -1,75	MS (solta)

Marcenaria acoplada (MA): fixada à estrutura (mastros, pilares, anéis, parede da cabeceira) e nunca à lona; fundos e tampos recortados por gabarito:

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 para peças que carregam nos mastros (Safari) e nos pilares (Lodge).

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

42 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M01	Cama king box + colchão	Box 1,93 x 2,03 revestido em linho, colchão molas ensacadas 32 cm, pillow top	un	1	Suíte · sob a Lanterna Zion
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M16	Ripado da cabeceira	Painel ripado termotratado com fitas LED (parede da cabeceira)	m2	8	Parede-corda
M04	Sofá 2,40 m	Estrutura em madeira, espuma D33, tecido bouclé antimancha	un	1	Estar · sofá 2,40
M07	Poltrona de leitura	Poltrona giratória em couro natural e madeira	un	1	Estar
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa lateral
M09	Ilha do café / minibar	Marcenaria sob medida com tampo em pedra, frigobar embutido, gaveta de cápsulas	un	1	Estar · café / minibar 1,70 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Estar · closet 1,70 x 0,75
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada 1,40 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	1	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	2	Suíte
F02	Luminária de piso	Luminária de piso em madeira e linho, 2700 K	un	1	Estar
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	1	Estar
F04	Tapete de lã	Tapete de lã tecido à mão 2,00 x 3,00	un	1	Estar
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	14,1	Cinco faces de vidro · 5 x 2,82 m
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Lanterna · tela circular Ø1,50
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E01	Frigobar	Frigobar 90 L embutido, silencioso (< 38 dB), classe A	un	1	Estar
E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganço	cj	1	Estar

E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Closet
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Porta PC1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Ático

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 Jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 Jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Café
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papelaria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR


CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D01	Espreguiçadeiras	Par de espreguiçadeiras em madeira teca e corda náutica, almofadas outdoor	par	1	Deck
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Deck
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Deck
D05	Ducha externa	Ducha de deck em aço inox com base de cumaru	un	1	Deck
D07	Fogueira / fire pit	Fire pit em aço corten com grelha e tampa	un	1	Deck · opcional

BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B02	Banqueta e bandeja da banheira	Banqueta de teca e bandeja para banheira	cj	1	Banho · banheira de sentar
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho

ZION LODGE · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m2 (banho 6,90 m2) · deck 30,37 m2 · total 68,68 m2

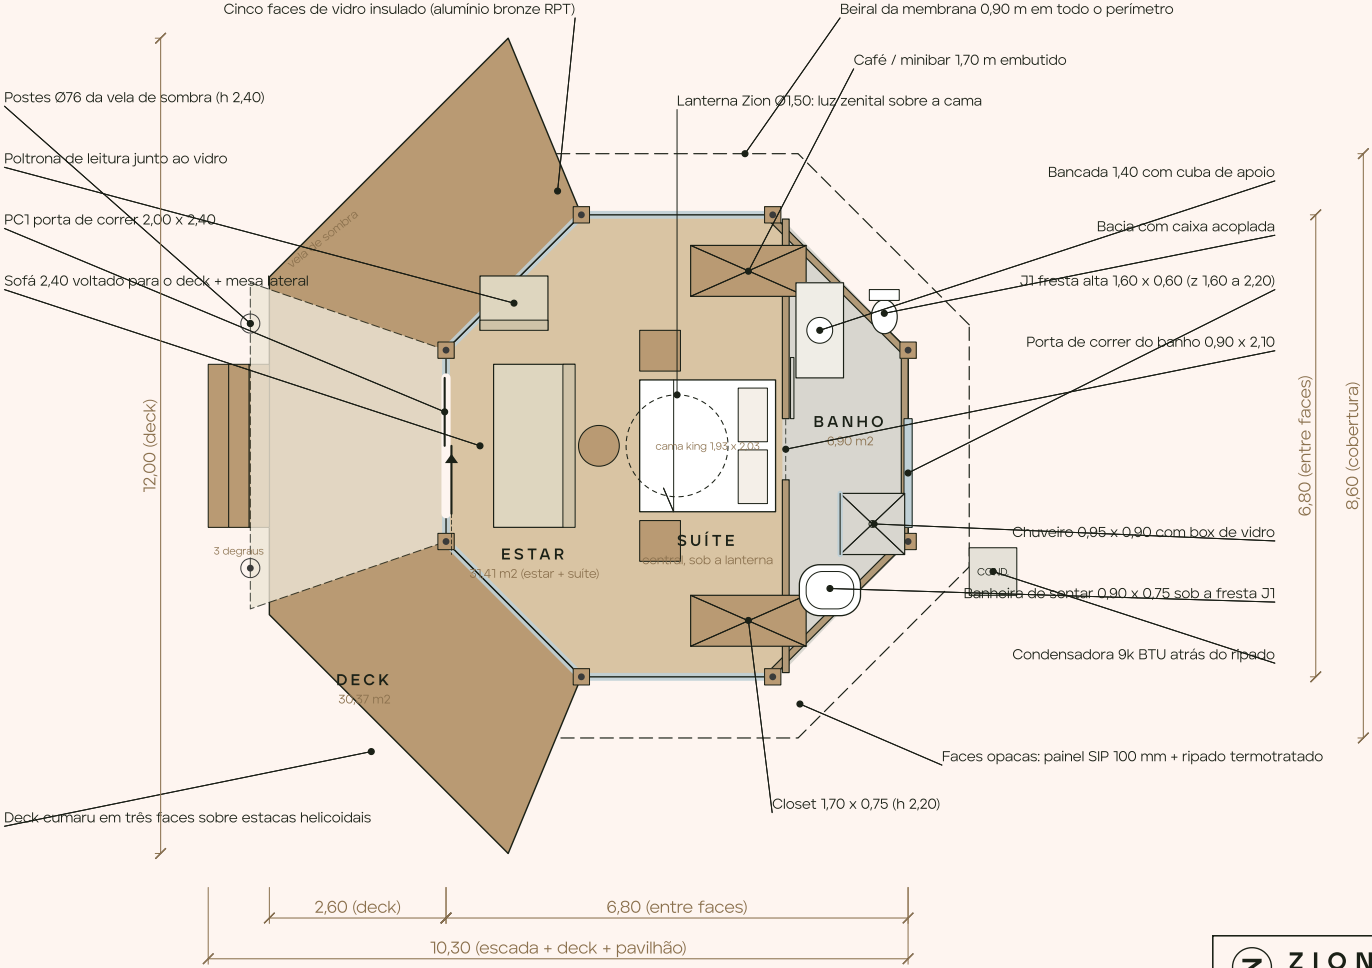

	ZION	
	GLAMPING COLLECTION	
	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
ZION LODGE	Estar e suite sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces	
	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros	
	FOLHA 02/LG	
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		SET 2026

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntos e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Closet, café/minibar, criados e bancada 1,40 fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos $\leq 0,95 \times 2,10$ m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas
- FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega
- Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação
- Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CÁPSULA · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZK-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

4 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	1,50	-1,00
F02	1,50	1,00

PONTO	X (M)	Y (M)
F03	6,90	-1,00
F04	6,90	1,00

APOIO	4 pés telescópicos Ø101,6 em Ø114,3 (curso 0,40 m) sobre 4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas 60 x 60 x 25; placa base 250 x 250 x 10
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso e acabamentos internos

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Painel de piso: OSB 18 mm + lâ de PET 50 mm + barreira de vapor	m2	20,8		PREÇO A COTAR
Piso de carvalho de engenharia 14 mm (estar e suite)	m2	16,7		PREÇO A COTAR
Porcelanato 60 x 60 no banho, com impermeabilização	m2	5,3		PREÇO A COTAR
Parede do banho: painel SIP 90 mm com porta de correr embutida 0,80 x 2,05	un	1		PREÇO A COTAR
Marcenaria fixa: closet, café/minibar, cabeceira curva, bancada do banho (ver FF&E)	vb	1		PREÇO A COTAR

Deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Deck de cumaru 20 x 140 mm sobre vigas U 100 galvanizadas (8,32 m2 + 12 %)	m2	9,3		PREÇO A COTAR
Escada de três degraus em cumaru	un	1		PREÇO A COTAR



Estacas helicoidais Ø76 galvanizadas com cabeçote ajustável (4 sob os pés + 4 sob o deck)	un	8		PREÇO A COTAR
---	----	---	--	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Elétrica: quadro 12 circuitos, 24 pontos, fita LED perimetral 2700 K, tomadas USB, iluminação do deck	vb	1		PREÇO A COTAR
Hidráulica: PEX, boiler elétrico 80 L no compartimento técnico, registros, ducha, lavatório, bacia com caixa acoplada	vb	1		PREÇO A COTAR
Climatização: split inverter 9.000 BTU dutado a partir do compartimento técnico, exaustor do banho	cj	1		PREÇO A COTAR
Ventilação: 2 grelhas de admissão nos Olhos + saída no Anel de Luz (abertura basculante motorizada)	cj	1		PREÇO A COTAR
Metais e louças do banho (latão escovado): ducha, misturador, cuba esculpida, bacia, acessórios	cj	1		PREÇO A COTAR


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

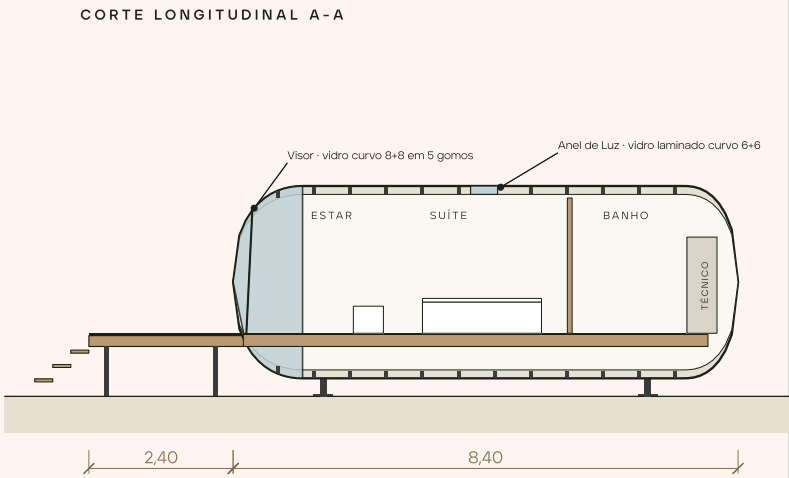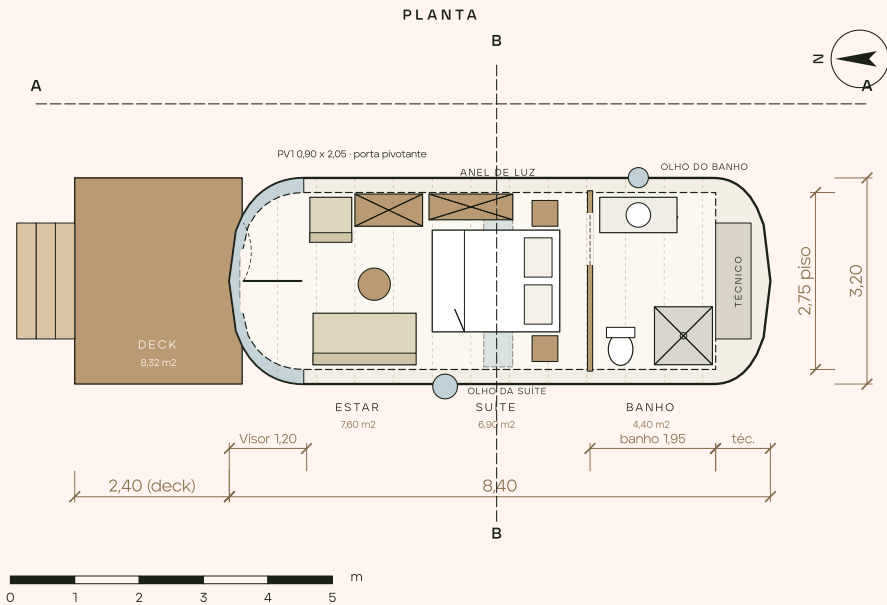

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

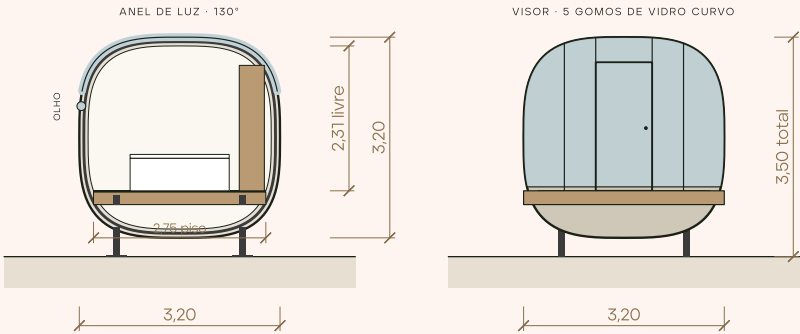

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

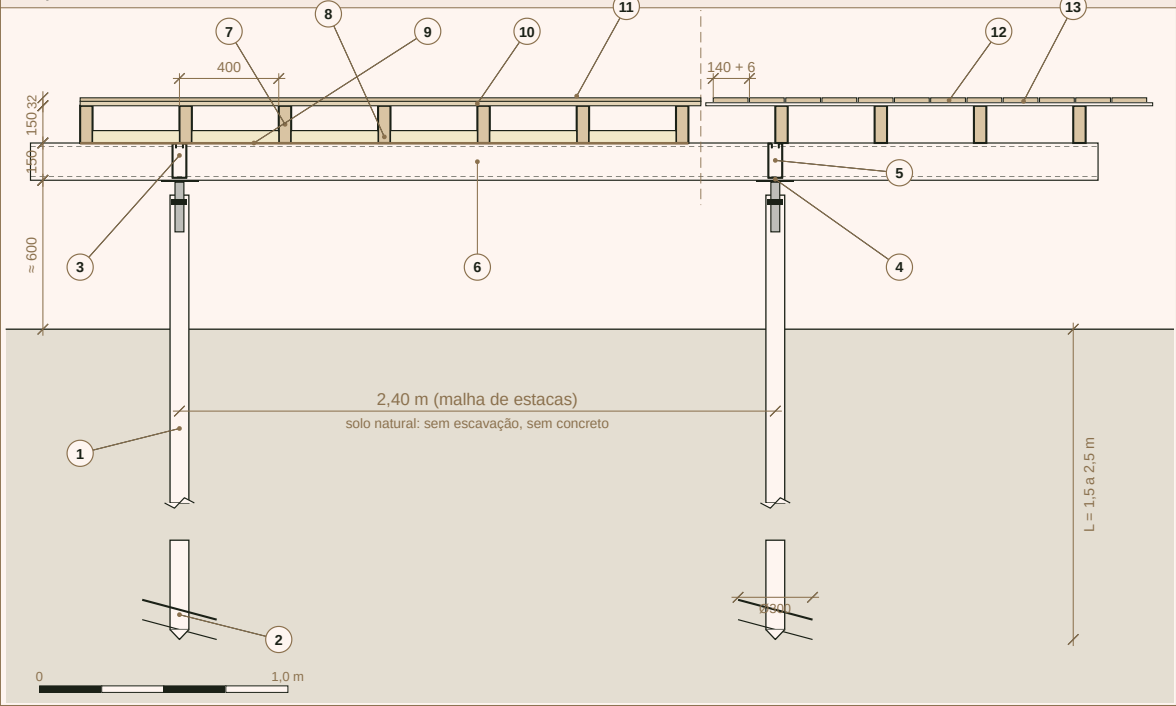

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

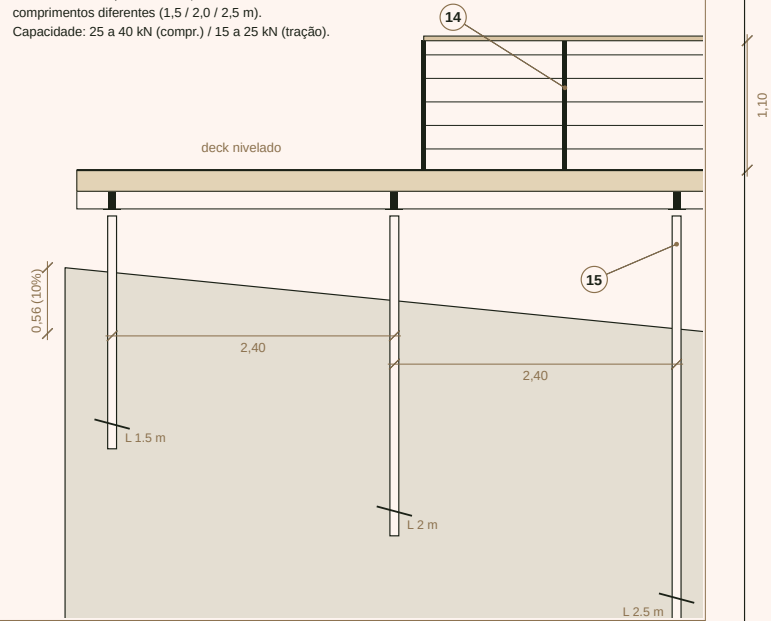

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotrada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores · 3 h	Nível a laser, trena, estacas, linha · Roçadeira	Acesso do caminhão-prancha até 30 m do ponto de pouso	☐ 4 pontos dos pés locados ± 20 mm ☐ Cota de referência definida ☐ Acesso e área de manobra confirmados
02 Fundação dos pés (4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas) Operador + 2 montadores · 0,5 dia	Chave de torque, nível · Motor de cravação ou mini-escavadeira	Solo com rocha rasa: usar sapata pré-moldada 60 x 60	☐ Torque registrado / sapatas niveladas ± 5 mm ☐ Cabeçotes ou chumbadores prontos
04 Ligações de instalações Eletricista + encanador · 0,5 dia	Ferramentas de crimpagem e teste	Conexões rápidas sem teste de estanqueidade	☐ Água, esgoto e energia conectados nos engates rápidos da cauda ☐ DR e aterramento testados ☐ Teste de pressão 6 bar / 30 min
05 Deck frontal e escada 2 carpinteiros · 0,5 dia	Parafusadeira, nível		☐ 4 módulos de deck nivelados ☐ Escada fixada ☐ Guarda-corpo em cabo

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.

Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.

Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.

Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.

Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.

Prazo por etapa e equipe proposta
4.

Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
- Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
- Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
- Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CÁPSULA · LOTE 2 DE 4

LOTE 2

ESTRUTURA METÁLICA

ZK-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picate 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes $\leq 2,4 \times 1,2 \times 1,2$ m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

8 tipos de peça · peso total ≈ 0 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA – ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
K01	Anéis da casca: tubo retangular 60 x 40 x 3,0 mm calandrado (12 un. x 10,90 m)	137,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K02	Longarinas: tubo 40 x 40 x 2,0 mm curvado nas calotas (7 un.)	57,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K03	Chassi do piso: perfil U 150 x 50 x 3,0 mm (2 longarinas)	15,1			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K04	Travessas do piso: perfil U 100 x 50 x 2,65 mm (12 un.)	31,5			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K05	Pés telescópicos: tubo Ø101,6 x 4,0 em tubo Ø114,3 x 4,5, curso 0,40 m, placa base 250 x 250 x 10	4			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K06	Chapas de nó, cantoneiras e olhais de içamento (4 un.)	46			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K07	Parafusos estruturais 8.8 galvanizados M10/M12 com porcas e arruelas	380			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K08	Aço total estimado (anéis, longarinas, chassi, pés, chapas)	1196			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12

GEOMETRIA · ANÉIS DA CASCA E LONGARINAS

seção em superelipse (n = 3,2) 3,20 x 3,20 m, centro a 0,85 m do piso · 12 anéis a cada 0,60 m em tubo retangular 60 x 40 x 3,0 calandrado · 7 longarinas 40 x 40 x 2,0 · chassi U 150 x 50 ·

SEÇÃO-TIPO DO ANEL (y; z) a cada 15° a partir de +y

ÂNGULO	Y	Z	S DESENV.
0°	1,600	0,850	0,000
15°	1,566	1,537	0,688
30°	1,462	1,887	1,053
45°	1,288	2,138	1,359
60°	1,037	2,312	1,664
75°	0,687	2,416	2,029
90°	0,000	2,450	2,717
105°	-0,687	2,416	3,406
120°	-1,037	2,312	3,770
135°	-1,288	2,138	4,076
150°	-1,462	1,887	4,381
165°	-1,566	1,537	4,746
180°	-1,600	0,850	5,434
195°	-1,566	0,163	6,123
210°	-1,462	-0,187	6,488
225°	-1,288	-0,438	6,793
240°	-1,037	-0,612	7,098
255°	-0,687	-0,716	7,463
270°	-0,000	-0,750	8,152
285°	0,687	-0,716	8,840
300°	1,037	-0,612	9,205
315°	1,288	-0,438	9,510
330°	1,462	-0,187	9,816
345°	1,566	0,163	10,181

ESCALA DOS ANÉIS NAS CALOTAS

ANEL X	FATOR S	LARGURA	ALTURA
0,75	0,953	3,05	3,05
1,35	1,000	3,20	3,20
1,95	1,000	3,20	3,20
2,55	1,000	3,20	3,20
3,15	1,000	3,20	3,20
3,75	1,000	3,20	3,20
4,35	1,000	3,20	3,20
4,95	1,000	3,20	3,20
5,55	1,000	3,20	3,20
6,15	1,000	3,20	3,20
6,75	1,000	3,20	3,20
7,35	1,000	3,20	3,20

Os anéis do corpo (s = 1) são iguais: um único gabarito de calandra; os anéis das calotas usam o mesmo gabarito com fator de escala. Longarinas nos ângulos 90°, 55°, 125°, 20°, 160°, -20°, 200° a partir de +y. Pés telescópicos e olhais de içamento (4) conforme lista.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 µm) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; rosca protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira ≤ 2,4 x 1,2 m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.


PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)

volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Cápsula completa (casca, piso, marcenaria, instalações)	8,40 x 3,20 x 3,20 m	86	4200
Módulos do deck + escada + guarda-corpo (palete)	2,6 x 1,2 x 0,8 m	2,5	420
Pés telescópicos, sapatas / estacas, chumbadores (feixe)	2,0 x 0,6 x 0,5 m	0,6	380
FF&E e enxoval (dentro da cápsula)	—	0	350

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA
Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala


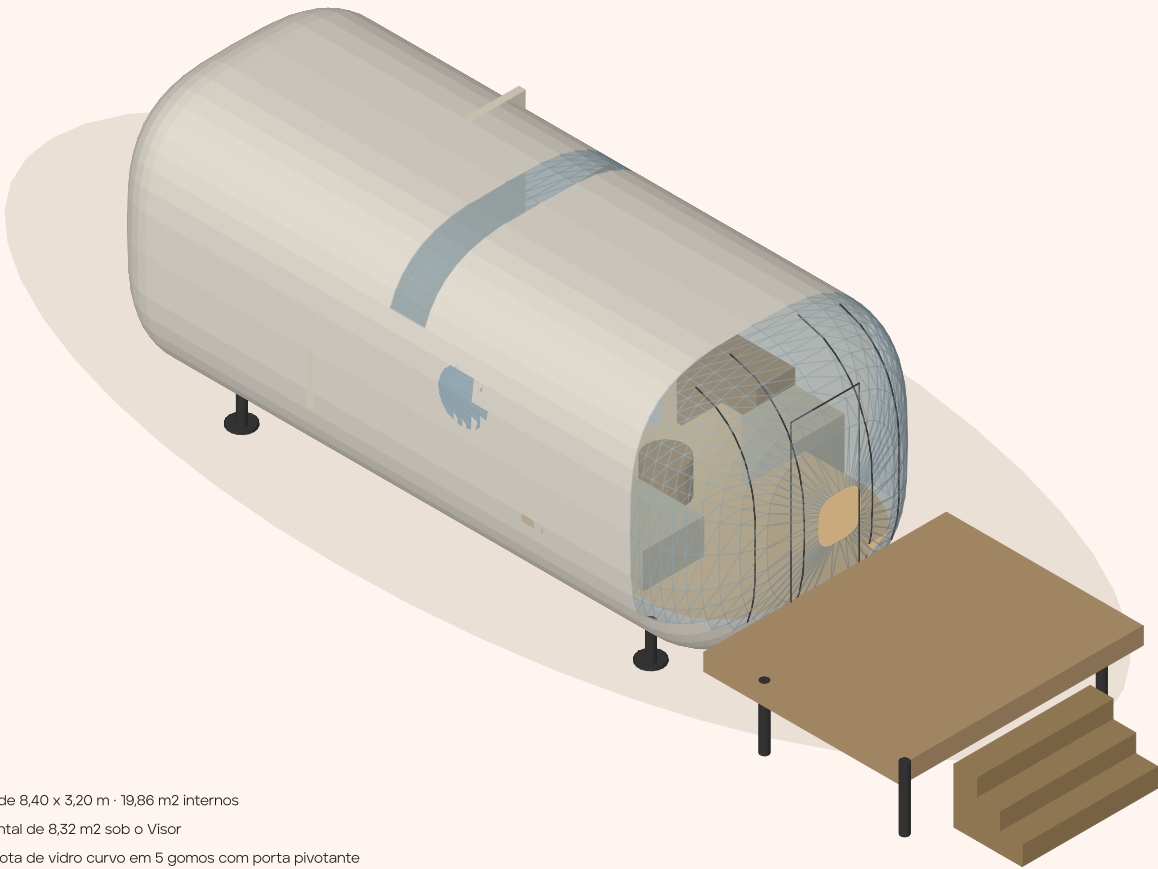


- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m2 internos
- ② Deck frontal de 8,32 m2 sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA 08/CP ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

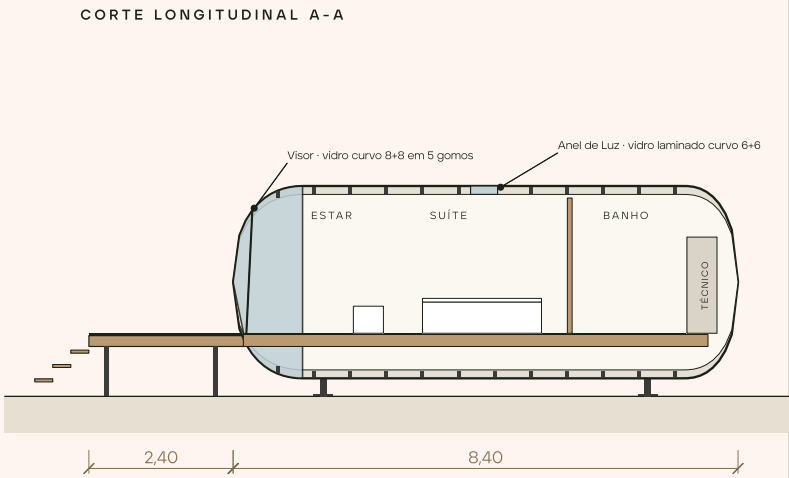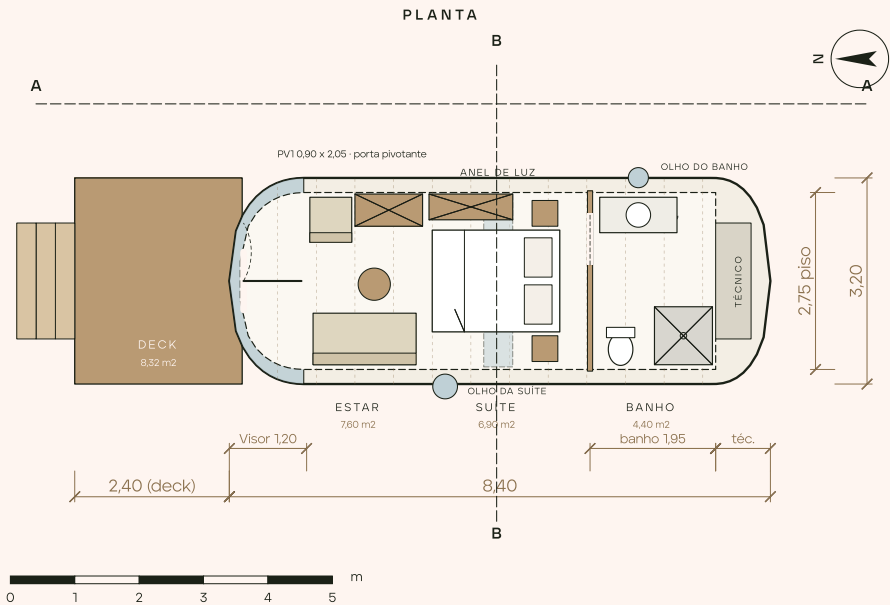

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

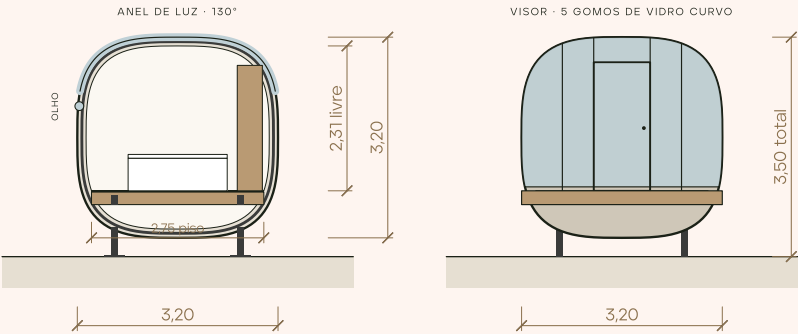

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
03 Transporte e pouso da cápsula Líder + motorista + 3 montadores · 0,5 dia	Cintas 3 t, manilhas, cordas guia · Caminhão-prancha 9 m + munck 8 t (ou guincho e trilhos em sítios sem munck)	Pouso com vento > 25 km/h; olhais de içamento não conferidos	☐ 4 olhais inspecionados ☐ Pés telescópicos travados no curso ☐ Nivelamento ± 5 mm no piso interno

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.	DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.	Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.	Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.	Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.	Proposta de fit test e de embalagem
4.	Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E

VIDROS

ZK-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Revestimento externo em ACM curvado sobre subestrutura, com padrões de corte por painel

Revestimento interno em compensado curvado

Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada

Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores

Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes

Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2

Fundação, piso e instalações: lote 1

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Fabricante de ACM / painéis curvados + vidraceiro de vidro curvo

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval

Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados

Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

5 padrões externos = 79,6 m2 · 5 internos = 75,1 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
R1T	4	Revestimento Externo	Revestimento externo R1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,65 x 2,72	1,61	6,4	JUNTA	0
R2T	36	Revestimento Externo	Revestimento externo R2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,72	1,63	58,8	JUNTA	0
R5D	1	Revestimento Externo	Revestimento externo R5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,72	1,63	1,6	JUNTA	1
R10E	1	Revestimento Externo	Revestimento externo R10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,72	1,63	1,6	JUNTA	1
R12T	4	Revestimento Externo	Revestimento externo R12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,62 x 2,64	2,77	11,1	JUNTA	0
I1T	4	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,64 x 2,48	1,47	5,9	JUNTA	0
I2T	38	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,49	1,49	56,7	JUNTA	0
I5D	1	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA	1
I10E	1	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA	1
I12T	4	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,54 x 2,41	2,4	9,6	JUNTA	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Envelope (de fora para dentro)

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Painel de alumínio composto 4 mm (ACM) curvado, cor champânhe fosco (84,02 m2 + 18 % de perdas)	m2	99,1		PREÇO A COTAR
Subestrutura do ACM: perfis ômega de alumínio 20 mm e fixadores ocultos	m	134,4		PREÇO A COTAR
Membrana de estanqueidade e barreira de vapor (manta líquida + fita butílica nas juntas)	m2	92,4		PREÇO A COTAR
Isolamento PIR 60 mm em painéis curvados entre anéis (λ 0,022)	m2	90,7		PREÇO A COTAR
Câmara de ar ventilada 40 mm com sarrafos de PVC	m2	84		PREÇO A COTAR

ESPECIFICAÇÃO DA LONA

ACM	alumínio composto 4 mm (0,5 + 3 + 0,5) PVDF, cor champânhe fosco, curvado a frio sobre perfis ômega; painéis ≤ 2,80 x 1,20 m
JUNTAS	perfil H de alumínio com EPDM e selante PU; junta de 12 mm em todos os anéis
ISOLAMENTO	PIR 60 mm em painéis curvados + barreira de vapor (manta líquida) + câmara 40 mm
INTERNO	compensado naval 2 x 6 mm colado e curvado, lâmina de carvalho, verniz fosco


Forro e paredes: compensado naval curvado 12 mm com lâmina de carvalho, verniz fosco	m2	89,6	PREÇO A COTAR
Selante de poliuretano e fita EPDM nas juntas dos gomos	m	85,8	PREÇO A COTAR

Vidros e esquadrias (laminado curvo, alumínio anodizado bronze)

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Visor: laminado curvo 8 + 8 mm low-e em 5 gomos, calandrado (11,47 m2 + 10 %)	m2	12,6		PREÇO A COTAR
Porta pivotante PV1 0,90 x 2,05 m em vidro laminado 10 + 10 com pivô e fechadura	un	1		PREÇO A COTAR
Anel de Luz: laminado curvo 6 + 6 mm com controle solar, 3 gomos (1,74 m2)	m2	1,9		PREÇO A COTAR
Olhos: vidro insulado circular Ø0,60 com aro de alumínio (1 transparente, 1 acidado)	un	2		PREÇO A COTAR
Vidro temperado 8 mm do box do chuveiro 0,90 x 2,00	m2	1,8		PREÇO A COTAR

 ZION CÁPSULA · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

5 padrões externos · 5 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

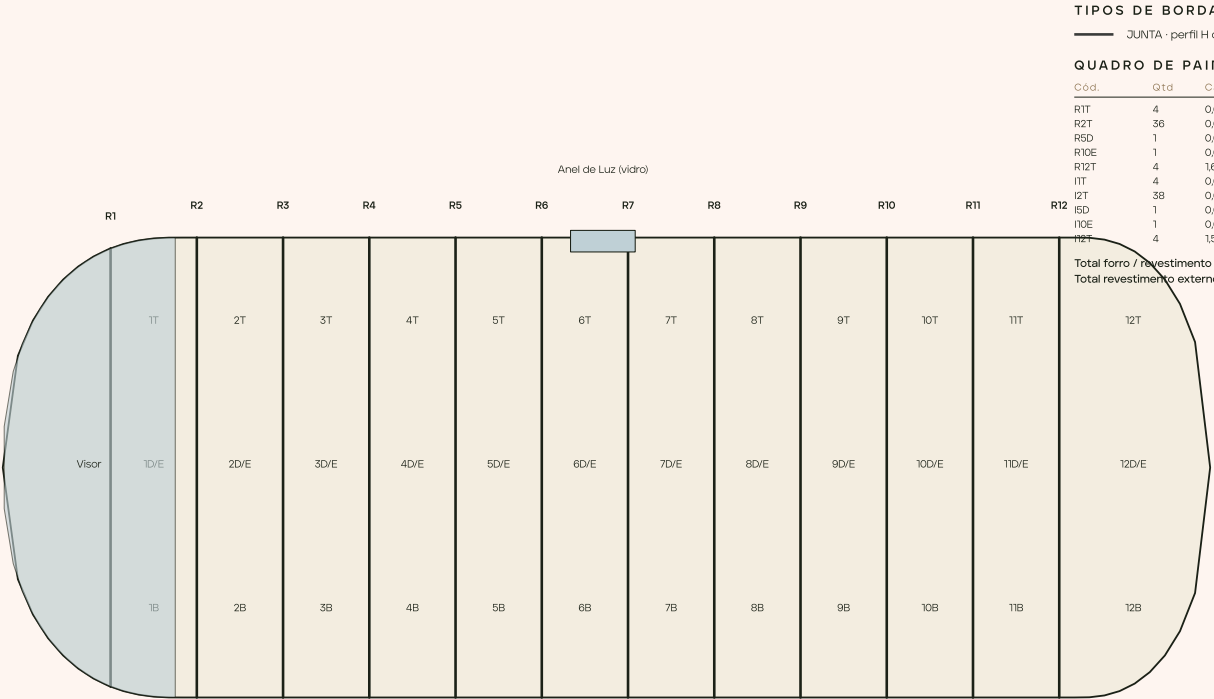

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)
— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

QUADRO DE PAINÉIS				
Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
R1T	4	0,65 x 2,72	1,61	Revestimento Externo
R2T	36	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R5D	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R10E	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R12T	4	1,62 x 2,64	2,77	Revestimento Externo
I1T	4	0,64 x 2,48	1,47	Forro
I2T	38	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I5D	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I10E	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I12T	4	1,54 x 2,41	2,40	Forro

Total forro / revestimento interno: 75,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total revestimento externo: 79,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Vista lateral · painéis de ACM entre anéis em 4 setores (T topo, D/E lados, B barriga) · juntas em perfil H · revestimento interno em compensado curvado

 **ZION** HOTEL GROUP INTERNATIONAL

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA
Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ZION CÁPSULA
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA s/ escala

FOLHA LN-01

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

SET 2026

 ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R1T

Revestimento externo R1T · topo · entre x 0.75 e x 1.35 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

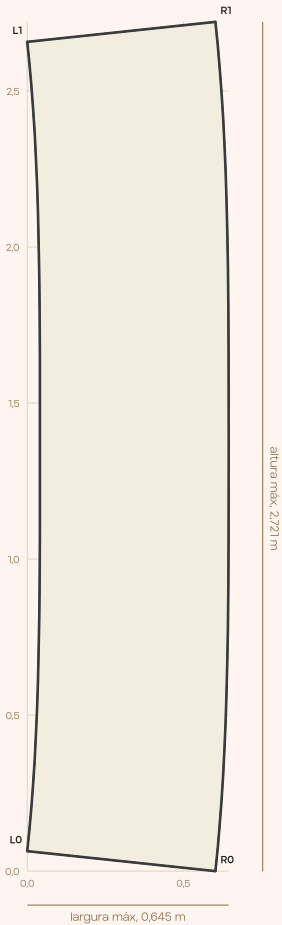


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0.000	0.000	0.064	0.603	0.000	0.606
0.250	0.021	0.313	0.625	0.261	0.606
0.500	0.033	0.563	0.637	0.523	0.606
0.750	0.038	0.813	0.643	0.786	0.605
1.000	0.040	1.063	0.645	1.048	0.605
1.250	0.040	1.313	0.645	1.310	0.605
1.500	0.040	1.563	0.645	1.573	0.605
1.750	0.039	1.813	0.644	1.835	0.605
2.000	0.035	2.063	0.640	2.097	0.605
2.250	0.026	2.312	0.630	2.359	0.606
2.500	0.009	2.562	0.612	2.621	0.606
2.596	0.000	2.657	0.603	2.721	0.606

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: R1T, R1E, R1B, R1D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,61 m2

COMPRIMENTO L / R
2,60 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,65 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)


- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0.5 a 1.5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R1T Revestimento Externo
ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		FOLHA LN-11 SET 2026



ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R2T

Revestimento externo R2T · topo · entre x 1.35 e x 1.95 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

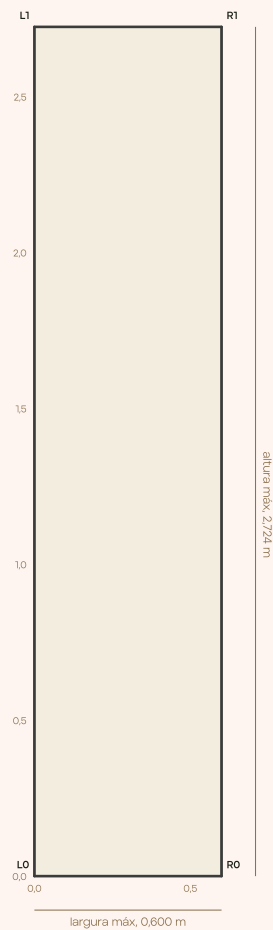

NOTAS

- Padrão e geometria de forma final da superfície entre as costuras: o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial, típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de baixa/ceder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal; y vertical; L0 – L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 – R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiquetas de tecido cosida no verso.

TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600
0.250	0.000	0.250	0.600	0.250	0.600
0.500	0.000	0.500	0.600	0.500	0.600
0.750	0.000	0.750	0.600	0.750	0.600
1.000	0.000	1.000	0.600	1.000	0.600
1.250	0.000	1.250	0.600	1.250	0.600
1.500	0.000	1.500	0.600	1.500	0.600
1.750	0.000	1.750	0.600	1.750	0.600
2.000	0.000	2.000	0.600	2.000	0.600
2.250	0.000	2.250	0.600	2.250	0.600
2.500	0.000	2.500	0.600	2.500	0.600
2.724	0.000	2.724	0.600	2.724	0.600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE

36 (códigos: R2T, R2E, R2B, R2D, R3T, R3E, R3B, R3D, R4T, R4E, R4B, R4D, R5T, R5E, R5B, R6E, R6B, R6D, R7E, R7B, R7D, R8T, R8E, R8B, R8D, R9T, R9E, R9B, R9D, R10T, R10B, R10D, R11T, R11E, R11B, R11D)

ÁREA DE FORMA FINAL

1,63 m2

COMPRIMENTO L / P

2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)

0,60 x 2,72 m

MATERIAL

ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

PADRÃO DE CORTE R2T

Revestimento Externo

ZION CÁPSULA
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA ver malha (m)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA LN-12

SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R5D

Revestimento externo R5D · lado direito · entre x 3.15 e x 3.75 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

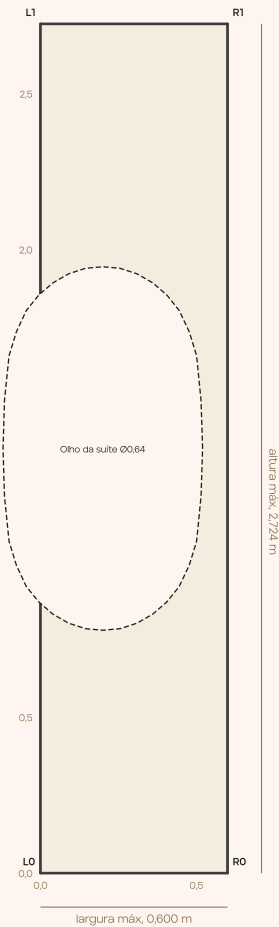


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1(códigos: R5D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,63 m2

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

- JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R5D Revestimento Externo	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-13 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R10E

Revestimento externo R10E · lado esquerdo · entre x 6.15 e x 6.75 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

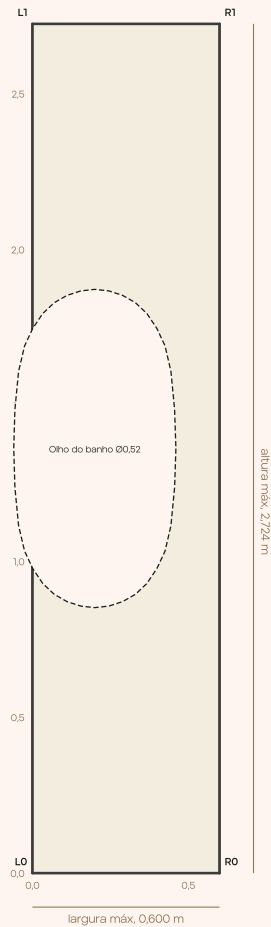


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1(códigos: R10E)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,63 m2

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

--- JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- - - - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R10E Revestimento Externo	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-14 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R12T

Revestimento externo R12T · topo · entre x 7.35 e x 8.38 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

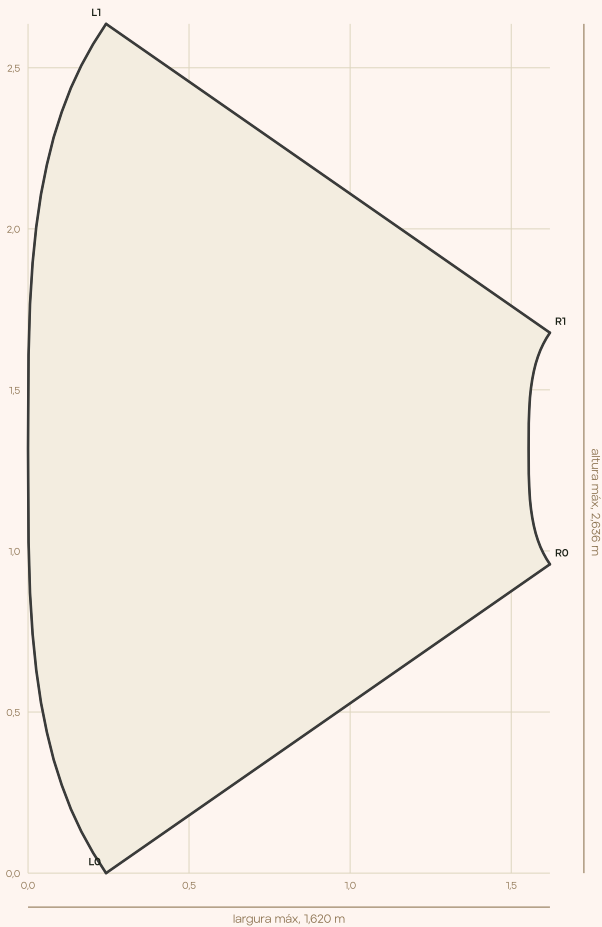


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,242	0,000	1,620	0,959	1,678
0,250	0,125	0,220	1,588	1,019	1,667
0,500	0,054	0,459	1,569	1,084	1,638
0,750	0,018	0,707	1,559	1,151	1,604
1,000	0,004	0,956	1,555	1,219	1,573
1,250	0,001	1,206	1,554	1,288	1,556
1,500	0,001	1,456	1,554	1,356	1,557
1,750	0,005	1,706	1,555	1,424	1,576
2,000	0,021	1,956	1,560	1,492	1,607
2,250	0,059	2,202	1,570	1,559	1,642
2,500	0,135	2,440	1,591	1,624	1,669
2,724	0,242	2,636	1,620	1,678	1,678

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: R12T, R12E, R12B, R12D)

ÁREA DE FORMA FINAL
2,77 m2

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 0,74 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,62 x 2,64 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R12T Revestimento Externo	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-15 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I1T

Revestimento interno I1T · topo · entre x 0.75 e x 1.35 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

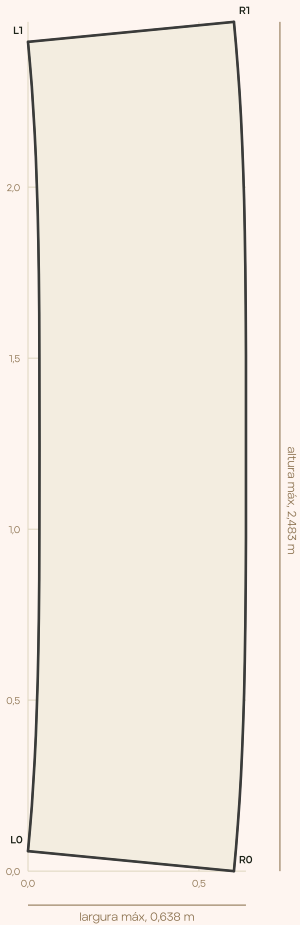


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,058	0,602	0,000	0,605
0,250	0,019	0,308	0,622	0,282	0,605
0,500	0,028	0,557	0,632	0,524	0,605
0,750	0,032	0,807	0,636	0,786	0,604
1,000	0,034	1,057	0,637	1,048	0,604
1,250	0,034	1,307	0,638	1,311	0,604
1,500	0,033	1,557	0,637	1,573	0,604
1,750	0,031	1,807	0,635	1,835	0,604
2,000	0,024	2,057	0,628	2,097	0,605
2,250	0,010	2,307	0,613	2,359	0,605
2,389	0,000	2,425	0,602	2,483	0,605

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: I1T, I1E, I1B, I1D)

ÁREA DE FORMA FINAL
147 m2

COMPRIMENTO L / R
2,37 / 2,49 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,64 x 2,48 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I1T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-16 SET 2026

 ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I2T

Revestimento interno I2T · topo · entre x 1.35 e x 1.95 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

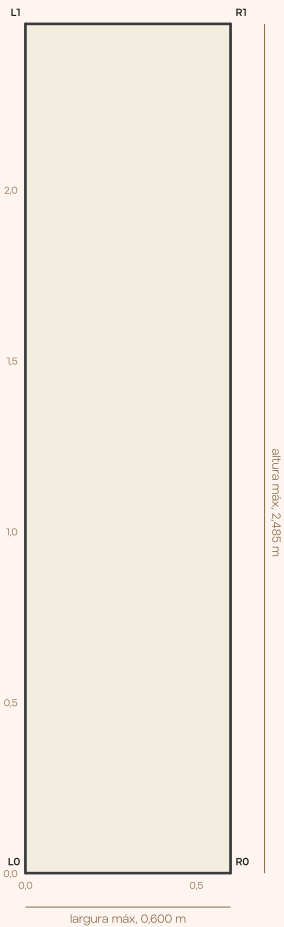


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
38 (códigos: I2T, I2E, I2B, I2D, I3T, I3E, I3B, I3D, I4T, I4E, I4B, I4D, I5T, I5E, I5B, I6T, I6E, I6B, I6D, I7T, I7E, I7B, I7D, I8T, I8E, I8B, I8D, I9T, I9E, I9B, I9D, I10T, I10B, I10D, I11T, I11E, I11B, I11D)

ÁREA DE FORMA FINAL
149 m2

COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

— JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I2T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-17 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE 15D

Revestimento interno 15D · lado direito · entre x 3.15 e x 3.75 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

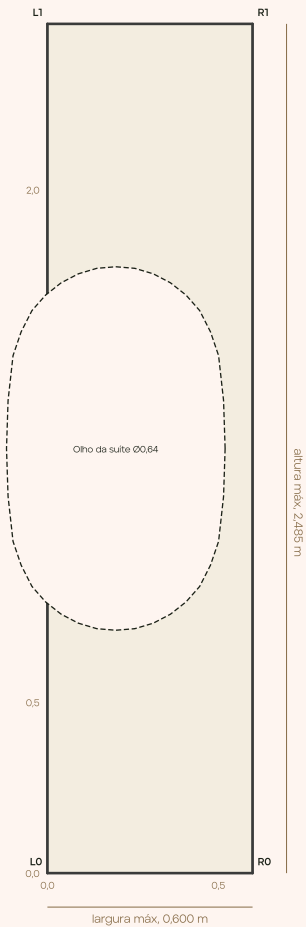


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: 15D)
ÁREA DE FORMA FINAL
149 m2
COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m
MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

- JUNTA: perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
- RECORTE: com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE 15D Forro / Revestimento Interno
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-18 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE 110E

Revestimento interno 110E · lado esquerdo · entre x 6.15 e x 6.75 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

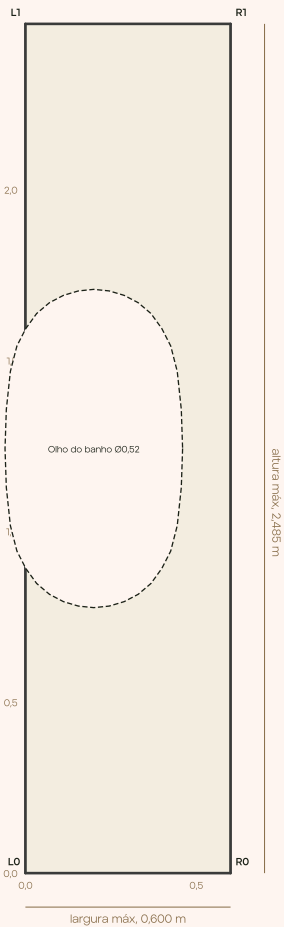


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: 110E)
ÁREA DE FORMA FINAL
149 m2
COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m
MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

- JUNTA: perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
- RECORTE: com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE 110E Forro / Revestimento Interno
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-19 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I12T

Revestimento interno I12T · topo · entre x 7.35 e x 8.38 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

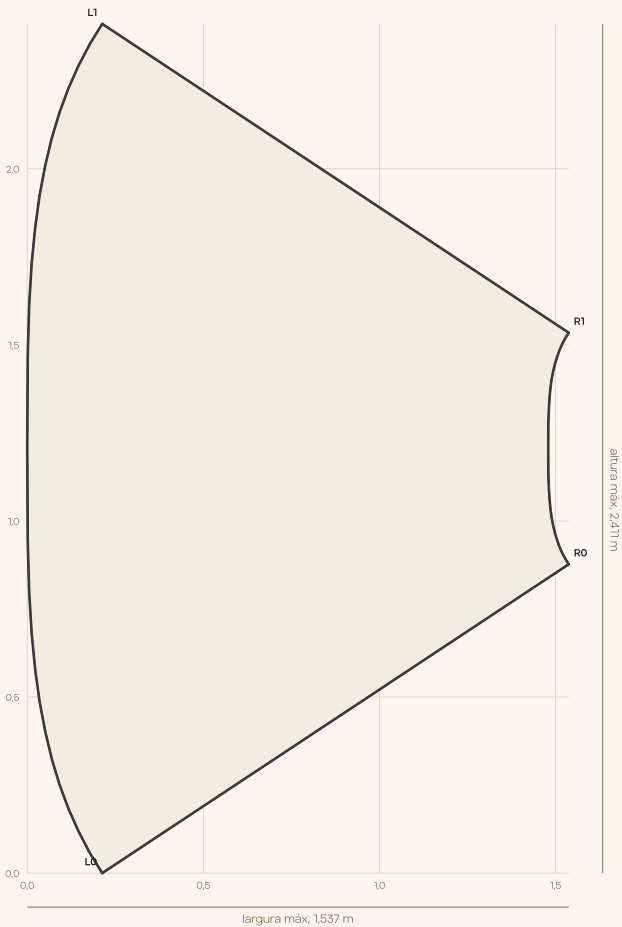


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,213	0,000	1,537	0,877	1,588
0,250	0,102	0,223	1,507	0,938	1,576
0,500	0,039	0,465	1,490	1,004	1,548
0,750	0,011	0,713	1,482	1,071	1,515
1,000	0,001	0,963	1,480	1,140	1,489
1,250	0,000	1,213	1,479	1,208	1,479
1,500	0,001	1,463	1,480	1,276	1,490
1,750	0,012	1,713	1,482	1,344	1,516
2,000	0,042	1,961	1,491	1,412	1,549
2,250	0,107	2,202	1,509	1,477	1,577
2,485	0,213	2,411	1,537	1,535	1,588

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: I12T, I12E, I12B, I12D)

ÁREA DE FORMA FINAL
2,40 m2

COMPRIMENTO L / R
2,49 / 0,68 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,54 x 2,41 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

— JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.


ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I12T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-20 SET 2026




ZION CÁPSULA · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

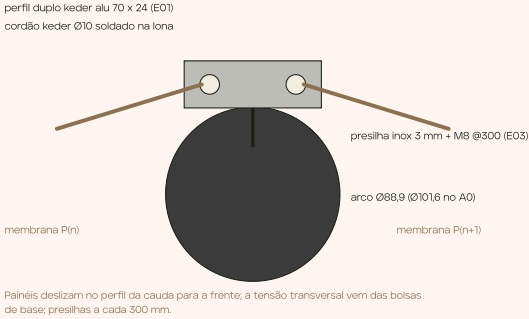


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

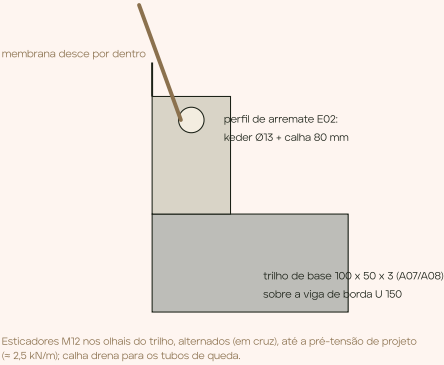


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)



4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

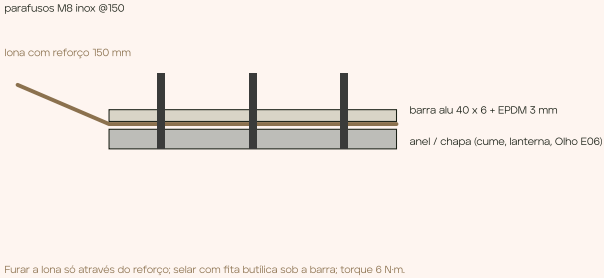

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

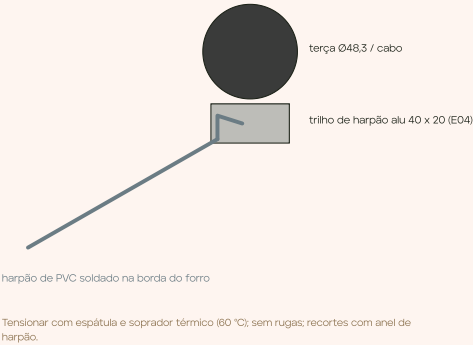

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA





Cápsula: revestimento rígido (ACM) em perflis H de alumínio com EPDM nos anéis; sem lona tensionada. Este quadro vale para a vela e para o forro têxtil opcional.
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água · vento > 30 km/h suspende.

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-90 SET 2026


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

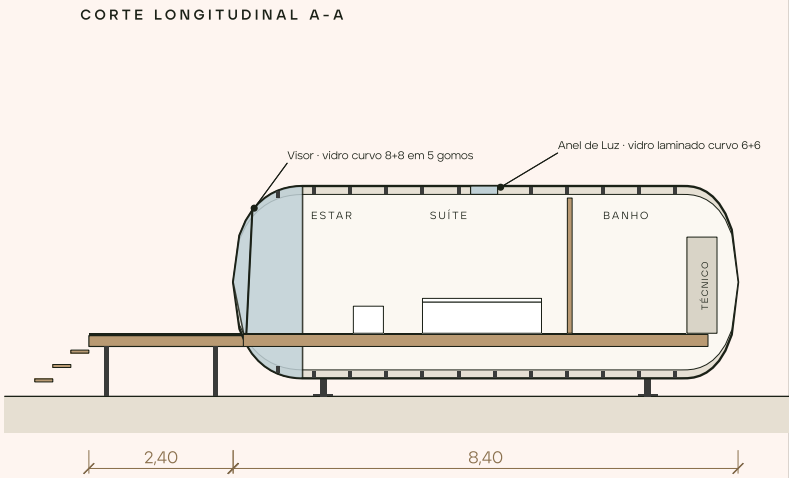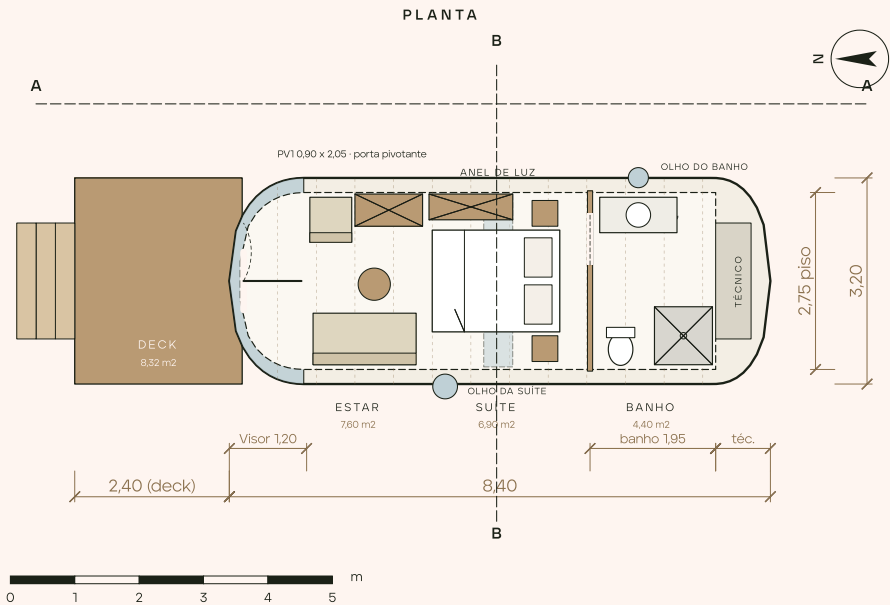

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

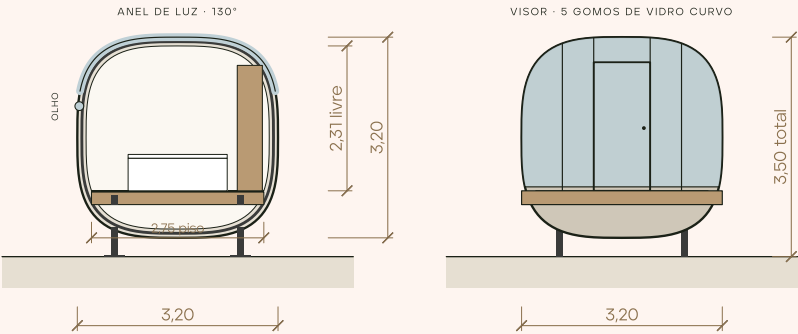

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 01/CP SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

14,3 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
VS1	Visor: calota de vidro laminado curvo em 5 gomos	3,20	3,20	1	10,24	307	Laminado curvo 8 + 8 mm low-e, calandrado; juntas verticais em -0,95 / -0,45 / +0,45 / +0,95; alumínio anodizado bronze	Calota frontal (x 0 a 1,20)
PV1	Porta pivotante do Visor	0,90	2,05	1	1,84	55	Vidro laminado 10 + 10, pivô de piso, fechadura digital	Gomo central do Visor
AL1	Anel de Luz: faixa de vidro curvo em 3 gomos	0,45	3,60	1	1,62	49	Laminado curvo 6 + 6 com controle solar, ± 65° do zênite	x 3,95 a 4,40, sobre a cama
OL1	Olho da suíte Ø0,60	0,60	0,60	1	0,36	11	Vidro insulado circular, aro de alumínio	x 3,35, lado esquerdo, z 1,35
OL2	Olho do banho Ø0,50	0,50	0,50	1	0,25	8	Vidro insulado acidado, aro de alumínio	x 6,35, lado direito, z 1,60

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros: tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
06	Vistoria e entrega Lider + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro		☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

- | | |
|----|--|
| 1. | Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias) |
| 2. | Padrões de corte: ZK-LON-001_padroes.dxf e ZK-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90 |
| 3. | Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding |
| 4. | Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05 |

O FORNECEDOR DEVOLVE

- | | |
|----|---|
| 1. | Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe |
| 2. | Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido) |
| 3. | Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra |
| 4. | Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia |

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- | |
|--|
| Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração |
| Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido |
| Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água |
| Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado) |

CONDIÇÕES GERAIS

- | |
|--|
| Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado. |
| Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição. |
| Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada. |
| Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART). |
| Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços. |

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZK-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque

Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte

Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador

Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)

Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Piso, deck e instalações: lote 1

Estrutura: lote 2

Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha

Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos

Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

PROGRAMA DE MOBILIÁRIO · ANTEPROJETO

posições e dimensões do modelo 3D · o projeto de interiores ZK-INT-001 (marcenaria acoplada, elevações, detalhes) segue o método do Casulo e é a próxima entrega desta linha

PEÇA	TIPO	DIMENSÕES (M)	POSIÇÃO	CLASSE
Cama queen 1,58 x 1,98	bed	1,98 x 1,58 x h 0,52	x 3,15 a 5,13 · y -0,79 a 0,79	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,40 x 0,40 x h 0,50	x 4,70 a 5,10 · y 0,85 a 1,25	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,40 x 0,40 x h 0,50	x 4,70 a 5,10 · y -1,25 a -0,85	MS (solta)
Closet 1,30 x 0,40	cabinet	1,30 x 0,40 x h 2,00	x 3,10 a 4,40 · y 0,95 a 1,35	MA (acoplada)
Chaise de contemplação 1,60 x 0,80	sofa	1,60 x 0,80 x h 0,45	x 1,30 a 2,90 · y -1,30 a -0,50	MS (solta)
Poltrona	chair	0,65 x 0,70 x h 0,75	x 1,25 a 1,90 · y 0,60 a 1,30	MS (solta)
Café / minibar 1,05 x 0,50	cabinet	1,05 x 0,50 x h 0,90	x 1,95 a 3,00 · y 0,85 a 1,35	MA (acoplada)
Mesa lateral	table	Ø0,50 x h 0,45	(2,25; -0,05)	MS (solta)
Bancada 1,20 m	vanity	1,20 x 0,55 x h 0,85	x 5,75 a 6,95 · y 0,75 a 1,30	MA (acoplada)
Bacia sanitária	wc	0,65 x 0,58 x h 0,42	x 5,75 a 6,40 · y -1,30 a -0,72	MS (solta)
Chuveiro 0,90 x 0,90	shower	0,90 x 0,90 x h 0,02	x 6,60 a 7,50 · y -1,30 a -0,40	MS (solta)

Marcenaria acoplada (MA): fixada à estrutura (mastros, pilares, anéis, parede da cabeceira) e nunca à lona; fundos e tampos recortados por gabarito.

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 para peças que carregam nos mastros (Safari) e nos pilares (Lodge).

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

36 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M17	Cama queen box + colchão	Box 158 x 1,98 revestido em linho, colchão molas ensacadas 30 cm, pillow top (Cápsula)	un	1	Suíte · sob o Anel de Luz, pés para o Visor
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte · cabeceira curva na parede do banho
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M06	Chaise de contemplação	Chaise 1,60 x 0,80 em madeira e corda náutica, almofada impermeável	un	1	Estar · chaise junto ao Visor
M07	Poltrona de leitura	Poltrona giratória em couro natural e madeira	un	1	Estar · poltrona
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa lateral
M09	Ilha do café / minibar	Marcenaria sob medida com tampo em pedra, frigobar embutido, gaveta de cápsulas	un	1	Estar · café / minibar 1,05 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Suíte · closet 1,30 x 0,40
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada 1,20 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	1	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	2	Suíte
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	1	Estar
F05	Tapete de lã (pequeno)	Tapete de lã 1,60 x 2,30	un	1	Suíte
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	5,2	Visor · trilho curvo no arco do Visor
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Anel de Luz · tela motorizada curva
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral · curadoria reduzida
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E01	Frigobar	Frigobar 90 L embutido, silencioso (< 38 dB), classe A	un	1	Estar

E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganso	cj	1	Estar
E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Closet
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Porta PV1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Técnico

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Café
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papeleria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR



CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Deck · mesa e 2 cadeiras
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Deck

BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

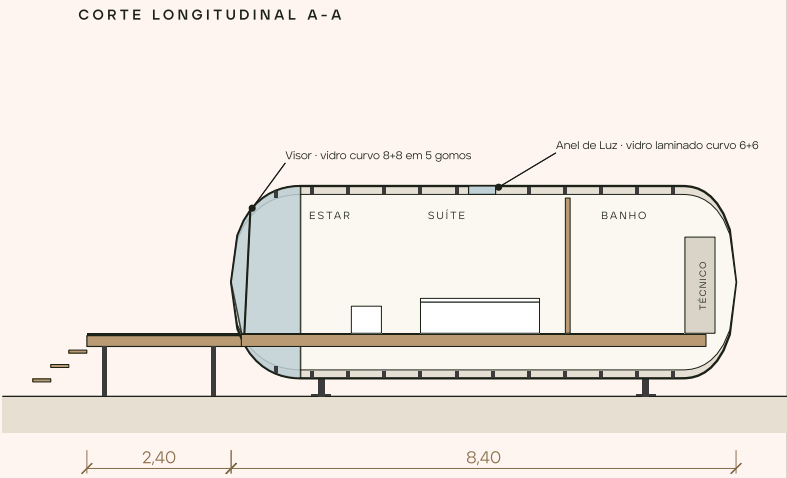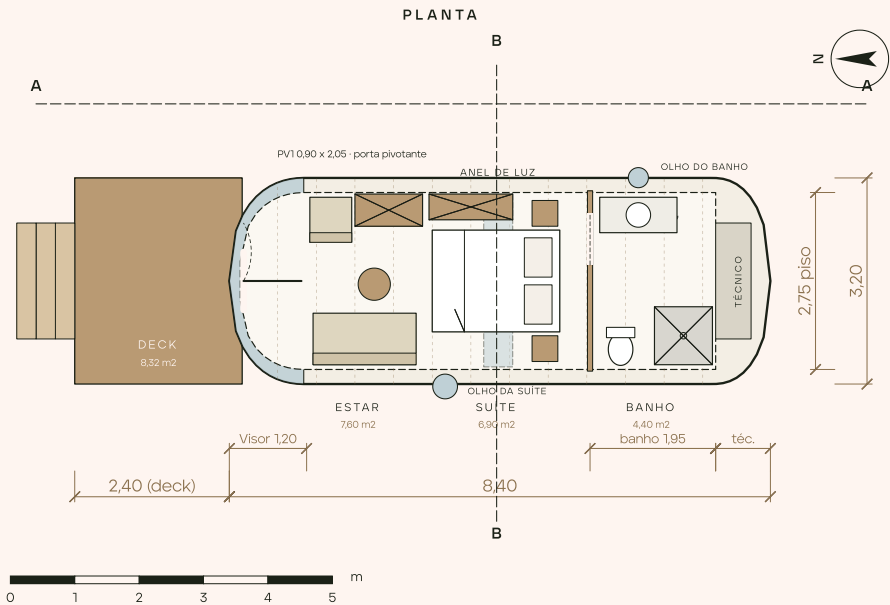

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

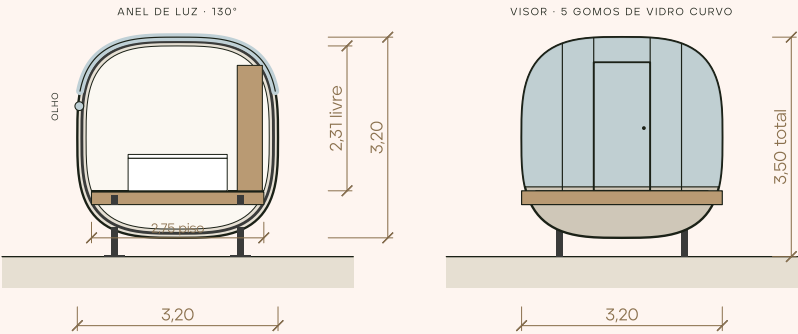

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
06	Vistoria e entrega Lider + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro		☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION CÁPULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos $\leq 0,95 \times 2,10$ m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas
- FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega
- Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação
- Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
