



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION LODGE 38 · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZL-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZL-LOT1-001	Escopo do lote 1	2
ZL-FUN-001	Fundação · quadro de estacas	3

ZL-EST-B01	Grelha e fundação · peças	4
ZL-MAT-L1	Materiais do lote 1	5
ZL-MONT-L1	Sequência do lote 1	12
ZL-LOT1-RFQ	RFQ do lote 1	13

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

22 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-2,40	-2,55
F02	-2,40	-0,85
F03	-2,40	0,85
F04	-2,40	2,55
F05	0,00	-2,55
F06	0,00	-0,85
F07	0,00	0,85
F08	0,00	2,55
F09	2,40	-2,55
F10	2,40	-0,85
F11	2,40	0,85

PONTO	X (M)	Y (M)
F12	2,40	2,55
F13	-3,40	0,00
F14	3,40	0,00
F15	0,00	-3,40
F16	0,00	3,40
F17	-4,70	-3,20
F18	-4,70	-1,10
F19	-4,70	1,10
F20	-4,70	3,20
F21	-6,08	-1,80
F22	-6,08	1,80

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal central L0 (y = 0), 2 trechos	2	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	61	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06 (4 M12 por face)
A02	Viga longitudinal L1/L2 (y = ± 0,85), 2 trechos cada	4	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	122	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A03	Viga longitudinal L3/L4 (y = ± 2,55), 2 trechos cada	4	4,05	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	26,3	105	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A04	Viga transversal T0 (x = 0)	1	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	44	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga transversal T1/T2 (x = ± 2,40)	2	4,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	31,2	62	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12
A06	Anel de borda octogonal, 8 segmentos de 2,82 m	8	2,82	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo sob os pilares)	ZAR-230 galv. Z275	23,8	190	Corte a 22,5° + furação + chapas de canto	Chapa de canto H05 a 135° (6 M12); recebe as chapas de base H01 dos pilares
A07	Viga de borda do deck, 3 segmentos	3	4,97	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	32,3	97	Corte a 22,5° + furação	Chapa de canto H05 + cabeçotes J02
A08	Viga transversal do deck (x = - 4,70)	1	6,40	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	41,6	42	Corte + furação	Cantoneira H07 + cabeçotes J02
J01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	22	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	404	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote J02
J02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa 150 x 150 x 8	22	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	48	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (grelha + anel de borda octogonal + deck)	m	100	650	PREÇO A COTAR
Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 dos módulos de piso @ 400 mm	m	126	316	PREÇO A COTAR
Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 dos módulos de deck @ 400 mm (clipes do cumaru parafusados)	m	76	190	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	38	80	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	38	460	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	31	283	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	6,9	207	PREÇO A COTAR

Deck cumaru 20 x 140 com fixação oculta (3 faces)	m2	30	607	PREÇO A COTAR
Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes (20 sob piso/deck + 2 sob os postes da vela)	un	22	414	PREÇO A COTAR


Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 9k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	75	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 23 L/min (ou bomba de calor 200 L)	un	1	25	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico, cabos, fitas LED, luminárias, tomadas	cj	1	60	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação	cj	1	40	PREÇO A COTAR
Exaustor com recuperador de calor + respiro da lanterna	cj	1	12	PREÇO A COTAR

Z

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais

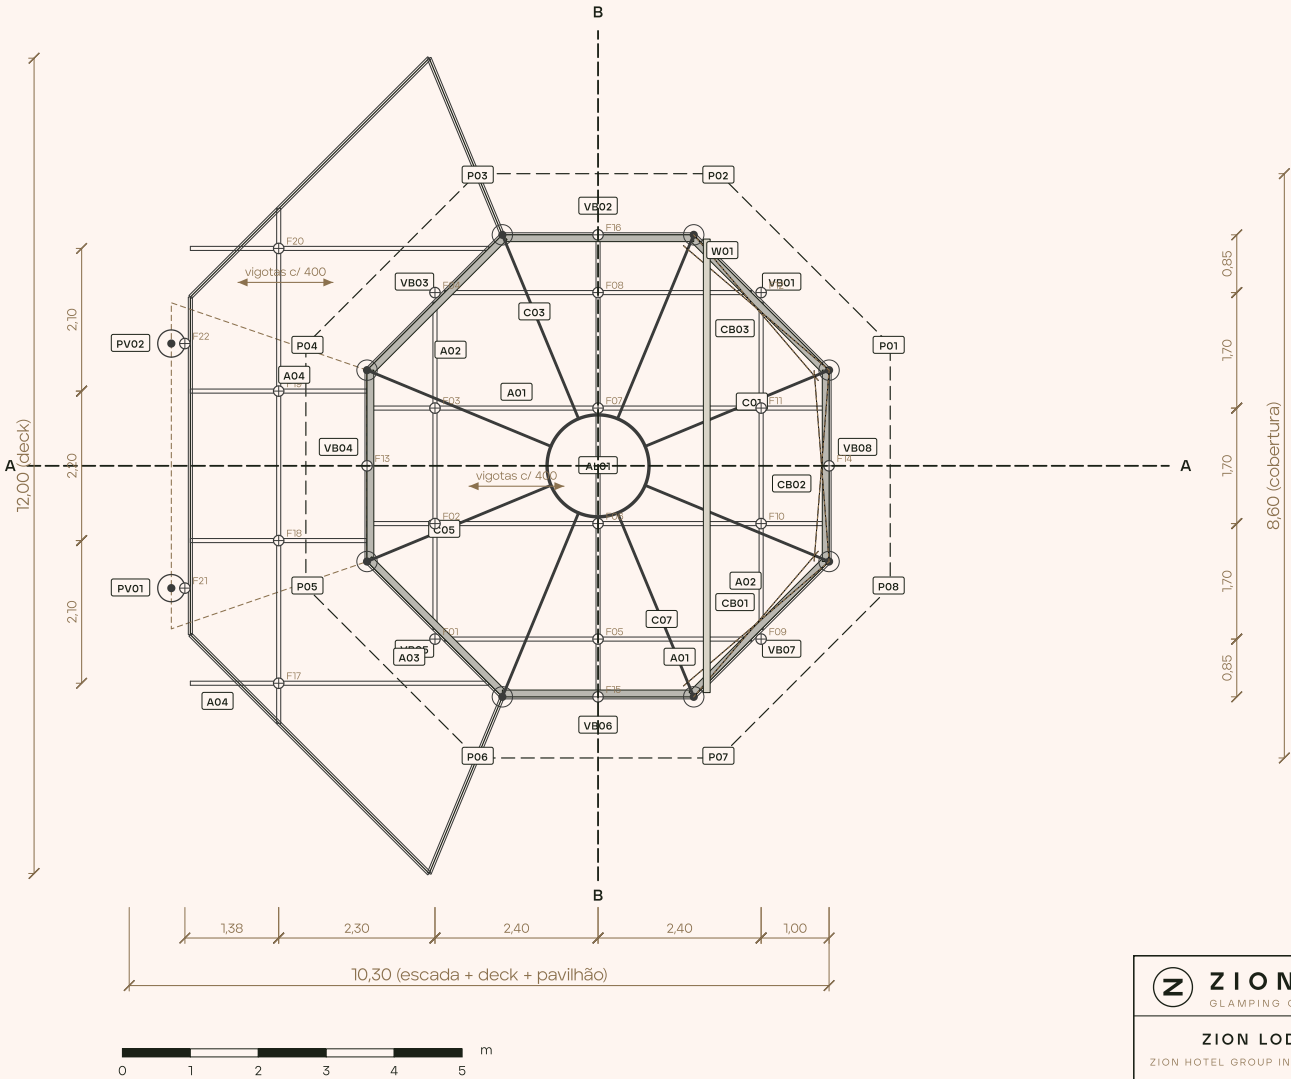

CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22

Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01

Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02

Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03

Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04

Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08

Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08

Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08

Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01

Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03

Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01

Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02

Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL		
	Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela		
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros		FOLHA 03b/LG
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		SET 2026



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO


Estacas helicoidais, cabecotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

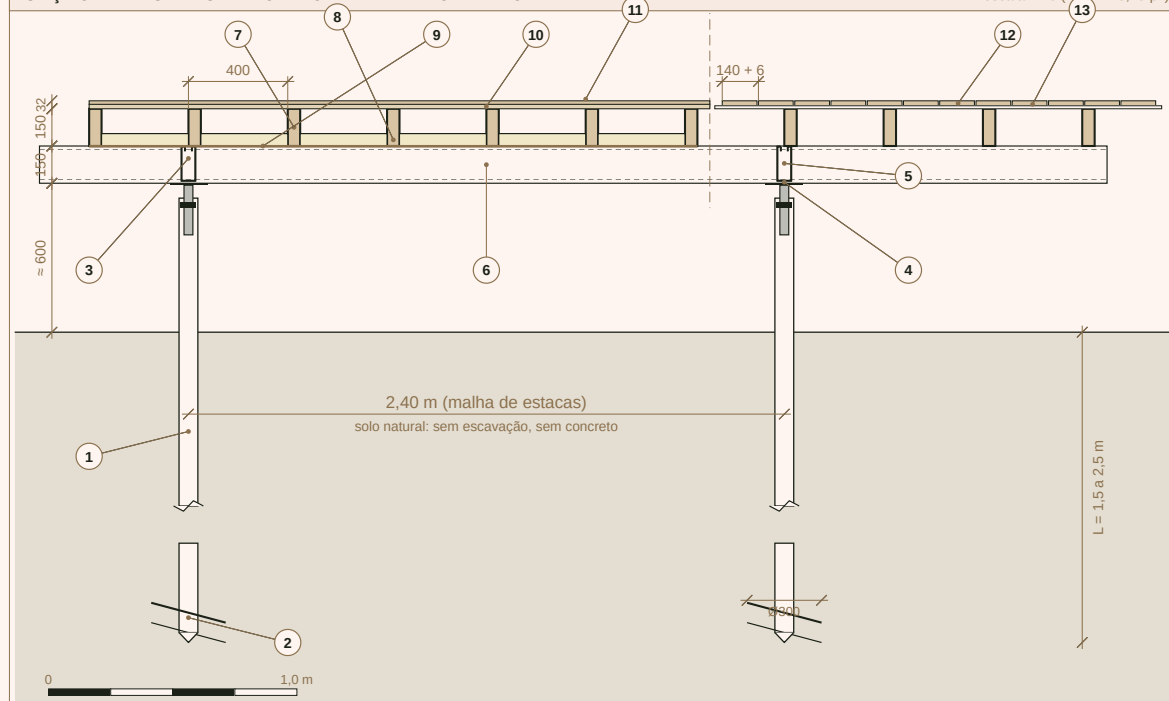

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EJEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

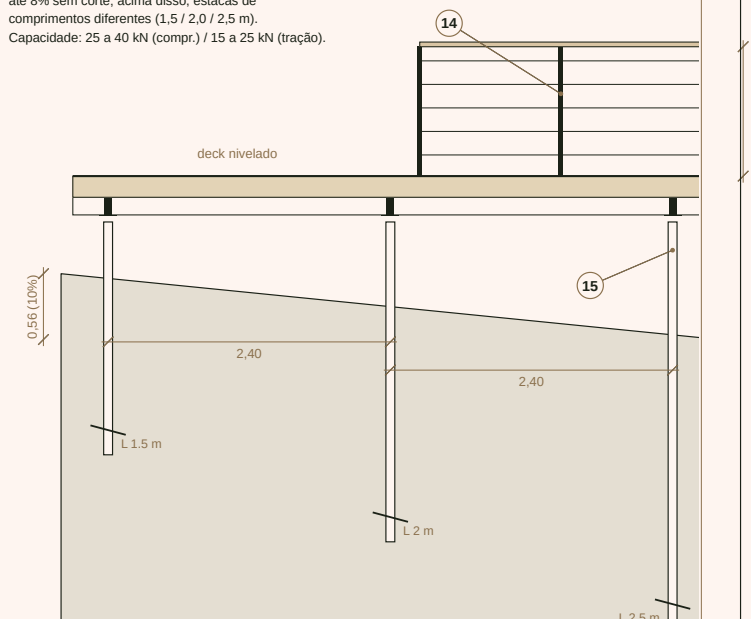

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico | 9 | Manta de fechamento inferior (respirável, anti-odores) grampeada às vigotas |
| 2 | Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem | 10 | Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas |
| 3 | Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento | 11 | Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato |
| 4 | Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U | 12 | Deck externo: cumaru ou termotrata 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta |
| 5 | Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas) | 13 | Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno) |
| 6 | Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari) | 14 | Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira |
| 7 | Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto) | 15 | Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado |
| 8 | Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado | | |



ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026




(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03


(A) PÉ DE ARCO CASULO SOBRE VIGA DE BORDA

1:5 (1 mm = 0,8 px)

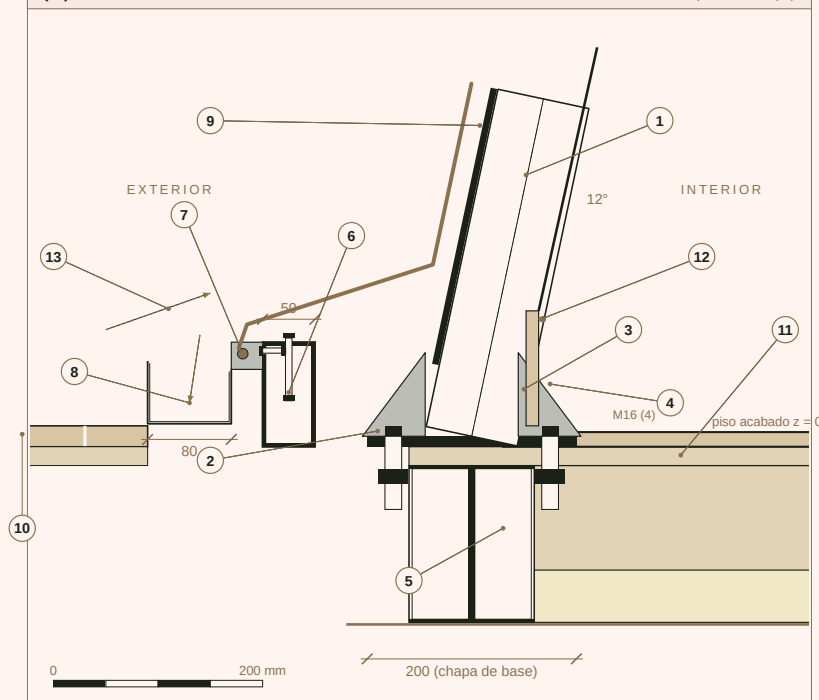


(B) POSTE EXTERNO SAFARI: BASE E ESTAI

1:20 e 1:5

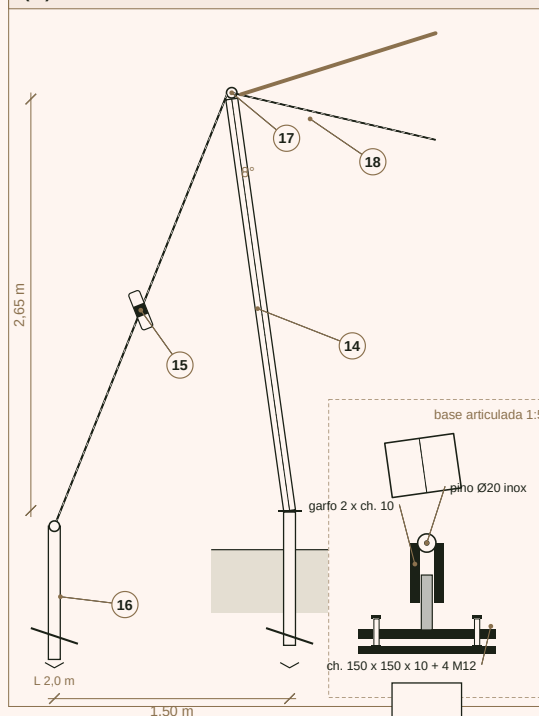

(C) CABO DE BORDA Ø12

1:2,5 e 1:5

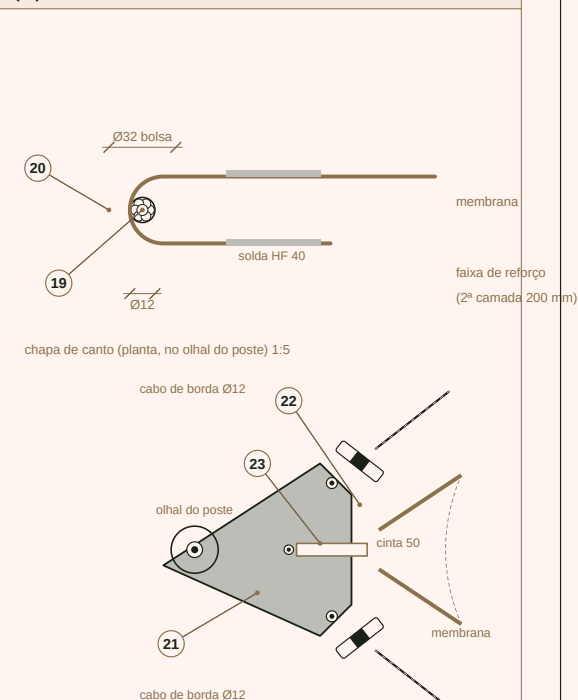

LEGENDA

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção) | 9 | Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco) |
| 2 | Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6) | 10 | Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias |
| 3 | Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm | 11 | Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm |
| 4 | Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5 | 12 | Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro |
| 5 | Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275 | 13 | Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox) |
| 6 | Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro | 14 | Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora |
| 7 | Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana) | 15 | Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16 |
| 8 | Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75 | 16 | Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com alhal |

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de bordo Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catracas



ESCALA
1:5 / 1:20 / 1:2,5




FOLHA
DET-03

DATA
SET 2026

 DRENAGEM PLUVIAL

Esgoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06

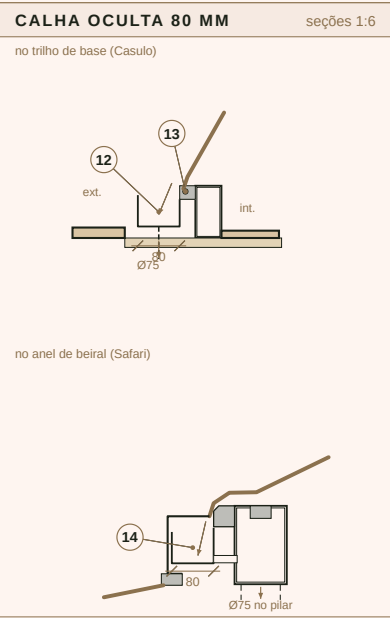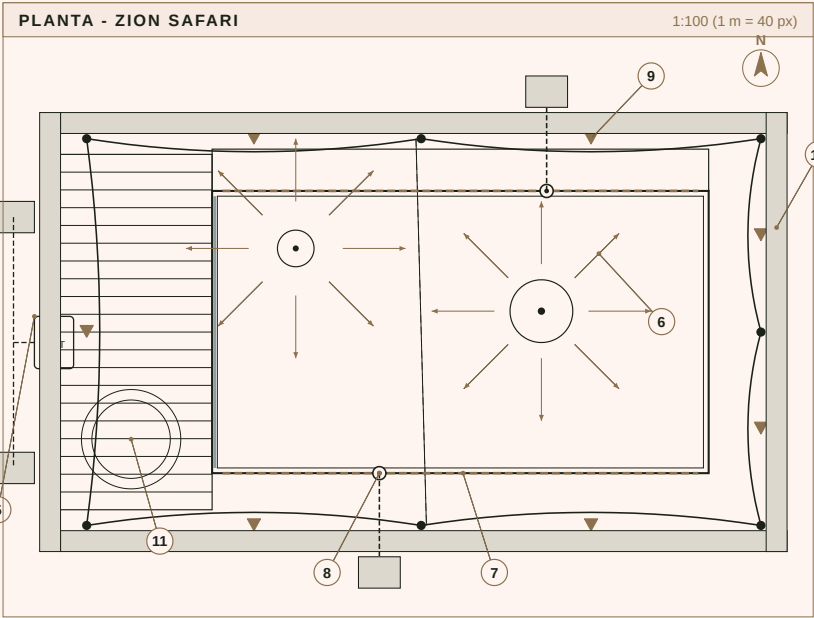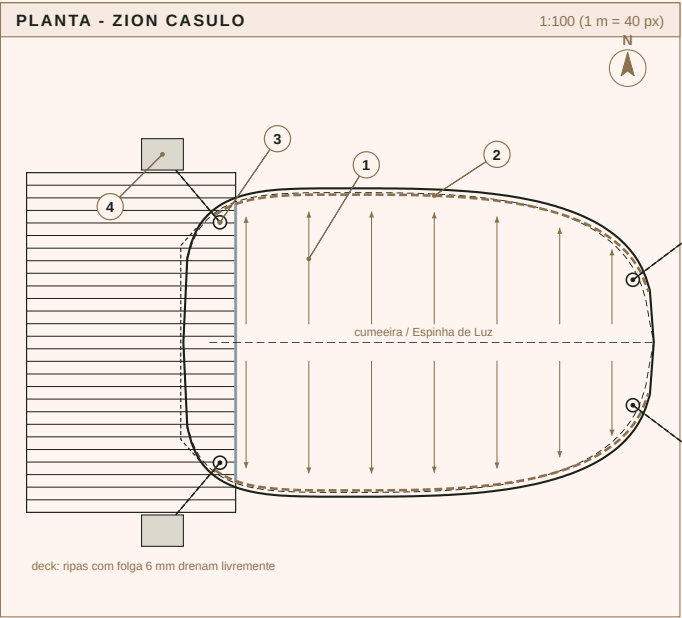

VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Esgoamento da membrana da cumeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Esgoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026




INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08


PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

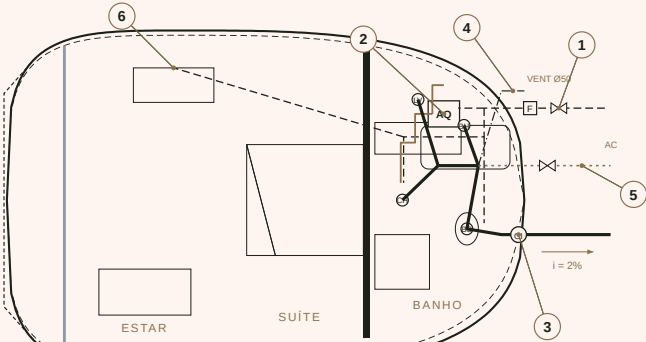


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100

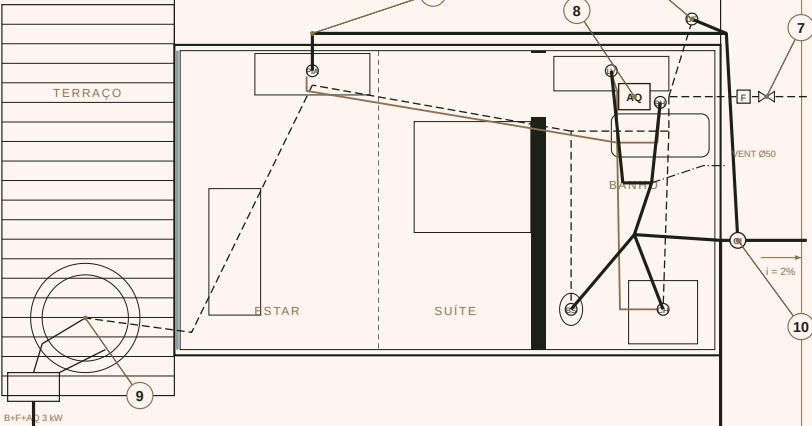

ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro

2 Aquecedor no ático técnico

3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100

4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)

6 Ponto de água do minibar (estar)

7 Entrada AF Safari pelos fundos

8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço

10 CI e saída do coletor pelos fundos

11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela

12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX

— água quente PEX isolado

— esgoto Ø40/50/100

- - - ventilação Ø50

..... águas cinzas (opcional)

⊗ registro / válvula

- LV lavatório CH chuveiro BH banheira

BS bacia PIA ilha do café DE ducha ext.

CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA	DATA
	DET-08	SET 2026




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100

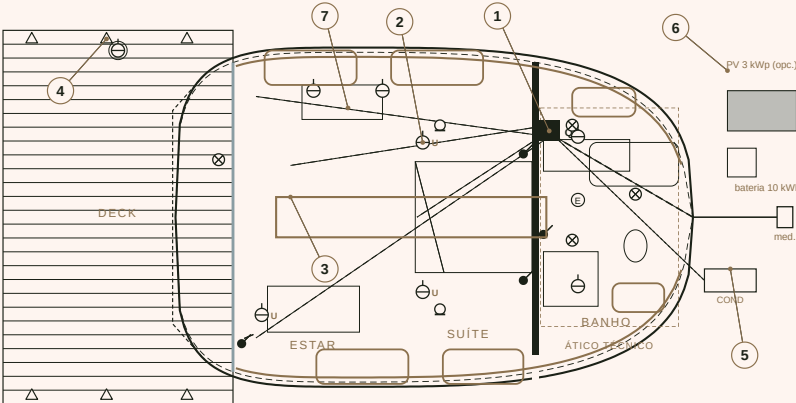

PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100


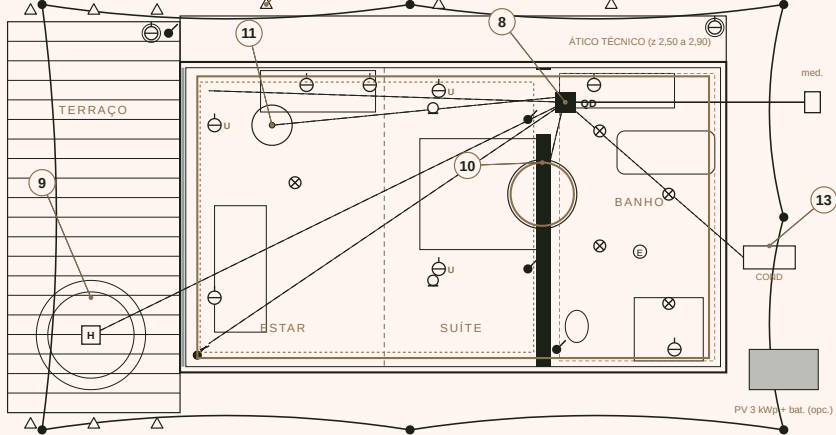


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO SAFARI)

sem escala

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



disj.	cabo	curva / proteção
C1 Climatização (evaporadora + condensadora)	20 A 4 mm² C	
C2 Aquecedor de água / bomba de calor	25 A 6 mm² C	
C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB	20 A 2,5 mm² B	
C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V	10 A 1,5 mm² B	
C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)	20 A 2,5 mm² B + DR 30 mA	
C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)	32 A 6 mm² C + DR 30 mA	
C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)	10 A 1,5 mm² B + DR 30 mA	
C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)	20 A 4 mm² C	

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- 1 Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- 2 Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- 3 Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- 4 Balizadores de deck 12 V
- 5 Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- 6 Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- 7 Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- 8 QD 16 módulos no ático do banho
- 9 Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- 10 Fita LED no anel do forro do Óculo
- 11 Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- 12 Balizadores no terraço e na passarela
- 13 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 14 DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada



ZION GLAMPING COLLECTION

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

COMUM

ESCALA

1:100 / sem escala

FOLHA

DET-07

DATA

SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminho e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 0,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 22 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ 2 estacas dos postes da vela locadas a partir do centro do octógono
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Anel de borda octogonal conferido pelos 8 raios a partir do centro (r 3,68 m ± 5 mm) ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 14 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.

Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.

Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.

Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.

Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.

Prazo por etapa e equipe proposta
4.

Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
- Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
- Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
- Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
