

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E

VIDROS

ZL-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZL-LOT3-001	Escopo do lote 3	2
ZL-LON-001	Quadro de painéis	3

ZL-MAT-L3	Materiais do lote 3	4
ZL-ESQ-001	Vidros e esquadrias	12
ZL-MONT-L3	Sequência do lote 3	13
ZL-LOT3-RFQ	RFQ do lote 3	14

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Lona externa (membrana PVDF tipo II) confeccionada por painéis conforme os padrões de corte deste lote, com keder, bolsas e reforços
Forro interno tensionado (Trevira CS) por painéis, com harpão
Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada
Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores
Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes
Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2
Fundação, piso e instalações: lote 1
Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Confeccionista de membranas tensionadas (corte CNC, solda HF, form-finding) + vidraceiro com vidro insulado / laminado + instaladores de membrana.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTE

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval
Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados
Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

1 padrões externos = 72,0 m2 · 1 internos = 35,3 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
G1	8	Lona Externa	Gomo G1 · do anel da lanterna (r 0,75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2	3,39 x 4,72	9	72	BOLSA DE CABO, CLAMP, SOLDA HF	0
F1	8	Forro / Revestimento Interno	Forro F1 · gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana	2,43 x 3,11	4,41	35,3	HARPÃO	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Alumínio e lanterna

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Perfil de borda arredondado do beiral + calha oculta (8 lados)	un	8	38	PREÇO A COTAR
Perfil de clamp do anel da lanterna (2 metades)	un	1	6	PREÇO A COTAR
Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo 0,45 m)	un	1	14	PREÇO A COTAR
Tampa da lanterna Ø1,60 em chapa de alumínio 2 mm sobre quadro, com pingadeira	un	1	14	PREÇO A COTAR
Trilho do forro tensionado	un	1	16	PREÇO A COTAR

Envelope: membrana, vela, isolamento, painéis

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos (+15% emendas/bolsas)	m2	84	88	PREÇO A COTAR

ESPECIFICAÇÃO DA LONA

LONA EXTERNA	PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster HT 1100 dtex, PVC + laca PVDF bifacial), cor creme Zion, resistência ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos; opção: PTFE-vidro 800 g/m2 (30 anos, custo maior)
FORRO	Trevira CS 210 g/m2 (ou lona translúcida 350 g/m2 sob claraboias), harpão de PVC soldado
ISOLAMENTO	lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros + manta refletiva com face para a câmara; PIR 60 mm na Cápsula
KEDER E PERFIS	cordão keder Ø10 / Ø13 PVC; perfil duplo keder alu 6060-T5; barras de clamp 40 x 6; harpão 40 x 20; presilhas inox 304
COSTURAS	solda de alta frequência 40 mm; nenhuma costura com linha na face externa; reforços de 150 mm em recortes e cantos
CABOS	inox 316 7 x 19 Ø8 / Ø10 / Ø12 com terminais prensados, esticadores M12 a M20, manilhas

Vela de sombra: membrana PVDF 14 m2 (+15%) com bolsas de cabo	m2	16	17	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3 (sobre o forro, câmara ventilada acima)	m2	46	58	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de alumínio (bolha)	m2	46	12	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS (cone interno até o anel da lanterna)	m2	44	13	PREÇO A COTAR
Painéis SIP 100 mm (OSB/PIR/OSB) nas 3 faces opacas	m2	20,5	450	PREÇO A COTAR
Membrana hidrófuga + ripas de ventilação (câmara ventilada da parede)	m2	20,5	41	PREÇO A COTAR
Ripado de madeira termotratada 40 x 40 mm (externo)	m2	20,5	164	PREÇO A COTAR
Revestimento de madeira dos pilares (2 meias-canais 140 mm, h 2,70)	un	8	80	PREÇO A COTAR
Painéis de madeira internos das faces opacas	m2	20	140	PREÇO A COTAR

 ZION LODGE 38 · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

1 padrões externos · 1 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF


TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

- SOLDA HF: emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP: barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO: cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- HARPÃO: perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
G1	8	3,39 x 4,72	9,00	Lona Externa
F1	8	2,43 x 3,11	4,41	Forro

Total lona externa: 72,0 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 35,3 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

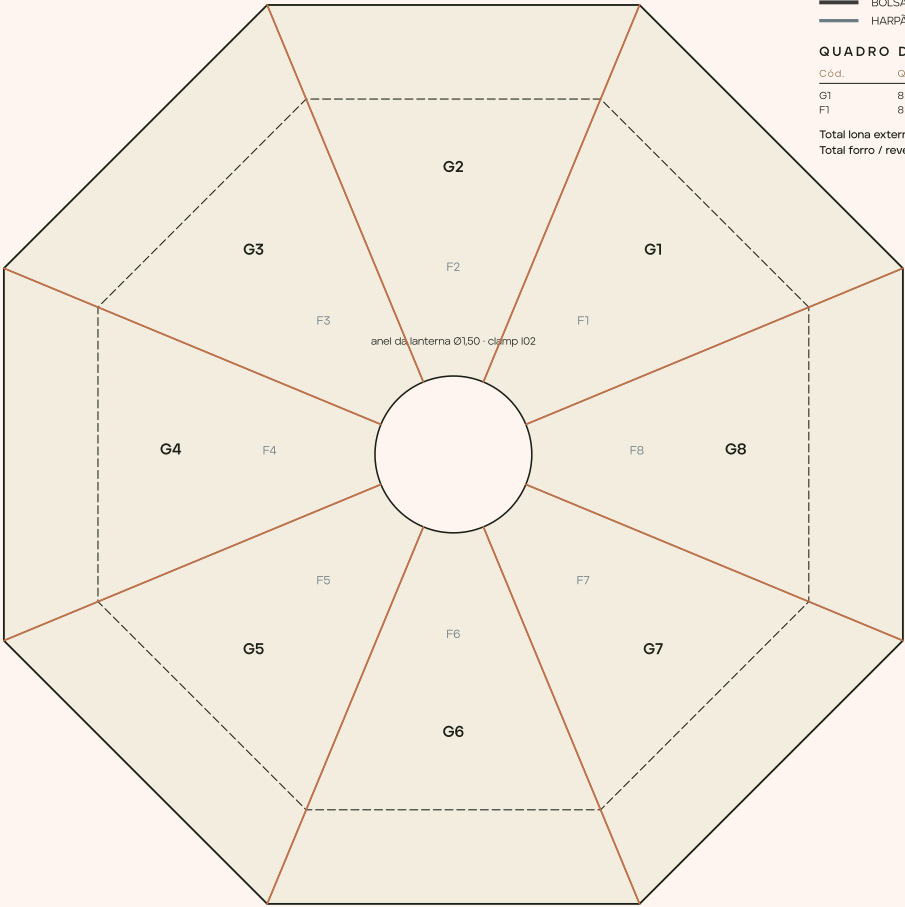

Planta da cobertura · 8 gomos iguais soldados sobre os caibros · bolsa de cabo no beiral (perfil I01) · forro em

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
	ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA LN-01 ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE G1

Gomo G1 · do anel da lanterna (r 0,75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2 · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

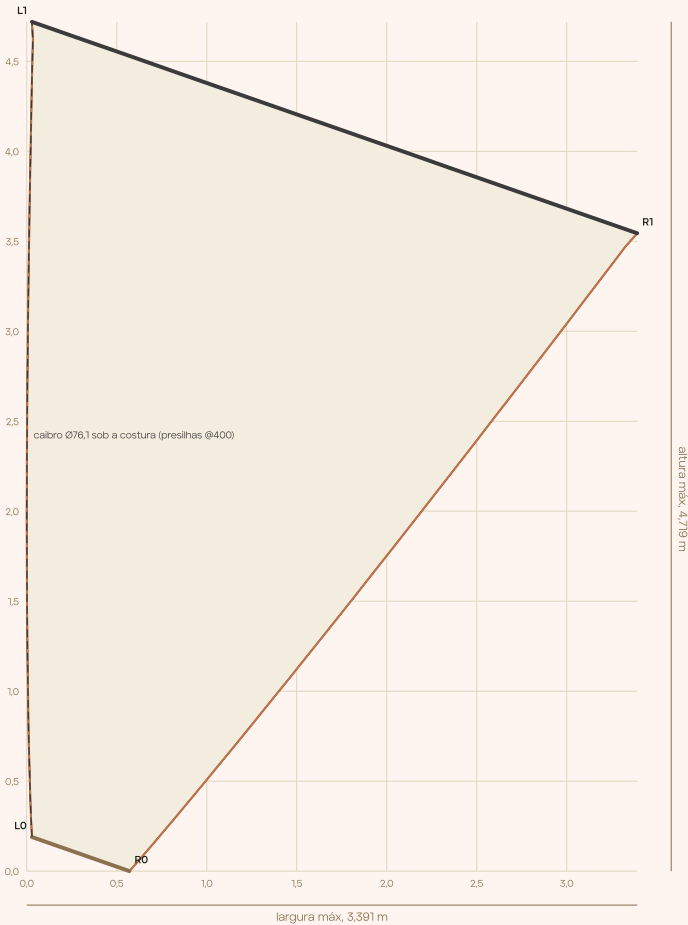


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,029	0,189	0,570	0,000	0,574
0,500	0,012	0,689	0,895	0,381	0,935
1,000	0,004	1,189	1,212	0,767	1,280
1,500	0,000	1,689	1,526	1,156	1,616
2,000	0,000	2,189	1,838	1,547	1,946
2,500	0,003	2,689	2,147	1,940	2,271
3,000	0,008	3,189	2,454	2,334	2,591
3,500	0,015	3,689	2,760	2,730	2,907
4,000	0,024	4,189	3,064	3,127	3,220
4,500	0,030	4,689	3,371	3,521	3,539

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8)

ÁREA DE FORMA FINAL
9,00 m2

COMPRIMENTO L / R
4,53 / 4,53 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
3,39 x 4,72 m

MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; 8 gomos soldados em fábrica numa peça única (= 73 m2) com abertura central Ø1,50

BORDAS E RECORTES

- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Todos os gomos são iguais (octógono regular); confeccionar 1 gabarito e 8 peças; borda com bolsa de cabo Ø10 e pingadeira no perfil de beiral I01.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE G1 Lona Externa	
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-11 SET 2026

ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

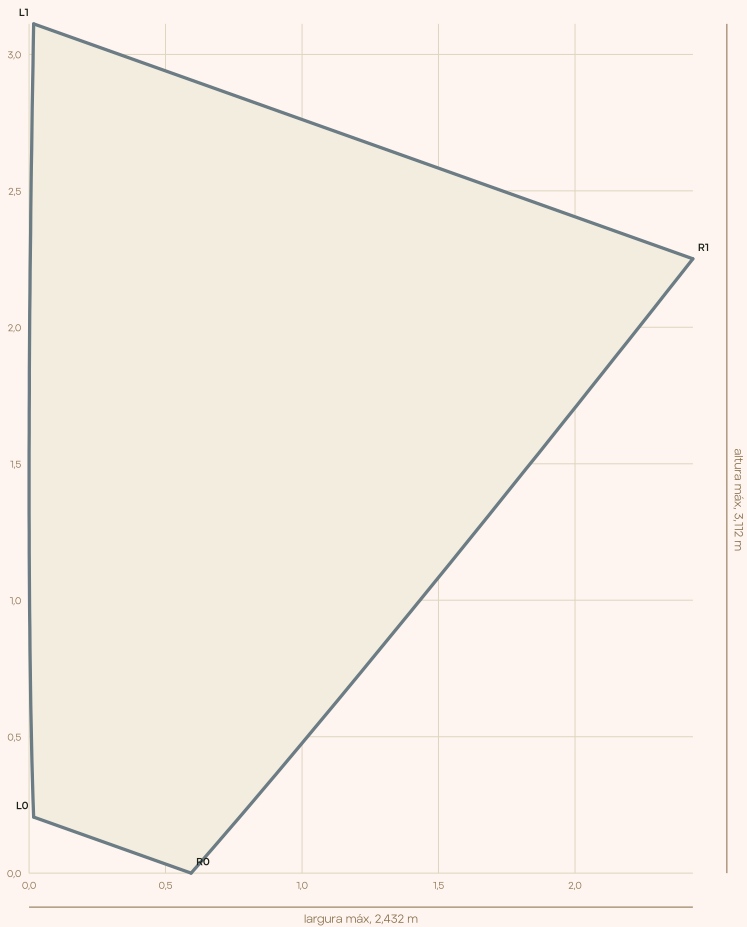


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,017	0,206	0,594	0,000	0,612
0,500	0,005	0,705	0,919	0,380	0,970
1,000	0,000	1,205	1,239	0,764	1,315
1,500	0,001	1,705	1,555	1,151	1,650
2,000	0,004	2,205	1,869	1,541	1,990
2,500	0,010	2,705	2,180	1,932	2,304
2,907	0,017	3,112	2,432	2,251	2,564

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8)

ÁREA DE FORMA FINAL
4,41 m2

COMPRIMENTO L / R
2,91 / 2,91 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
2,43 x 3,11 m

MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos dos calibros e no anel de beiral

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.


ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-12 SET 2026




ZION LODGE 38 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento


1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

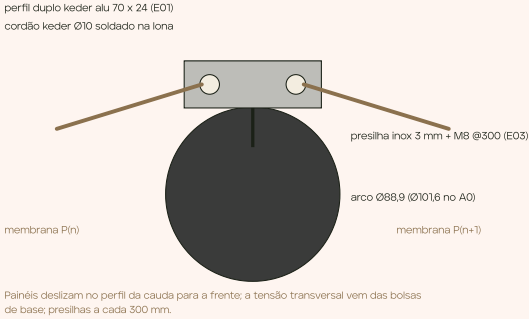


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

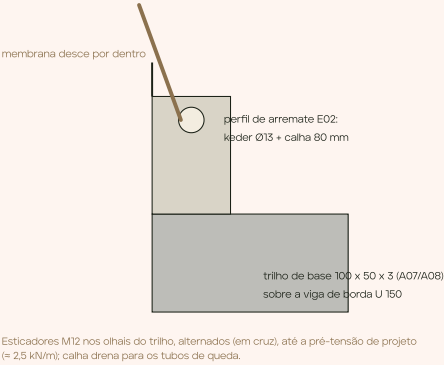


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)

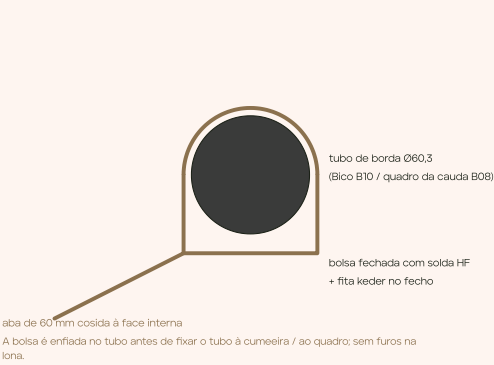


4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

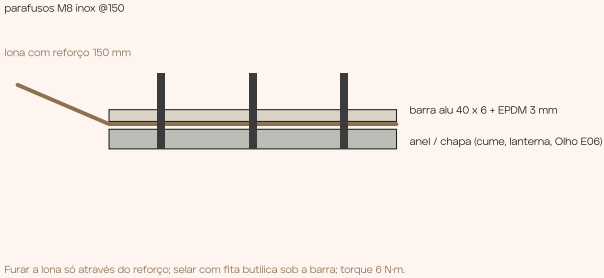

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

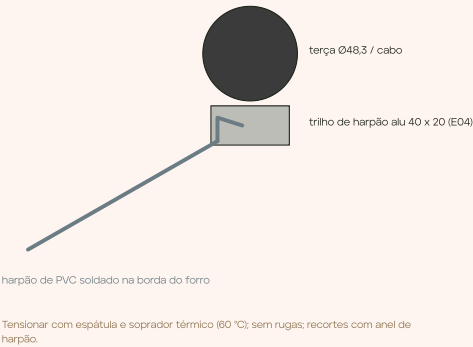

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA

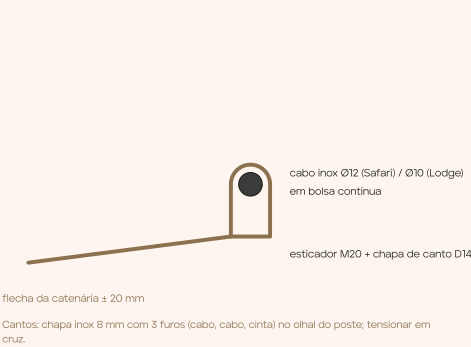

Lodge: peça única de 8 gomos içada pelo anel da lanterna (clamp 4, perfil I02), passada sobre o anel de beiral (perfil de borda I01) e tensionada pela bolsa de cabo Ø10 (6); presilhas nos caibros; forro em harpão (5).
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

 ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos	
	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-90 SET 2026



ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

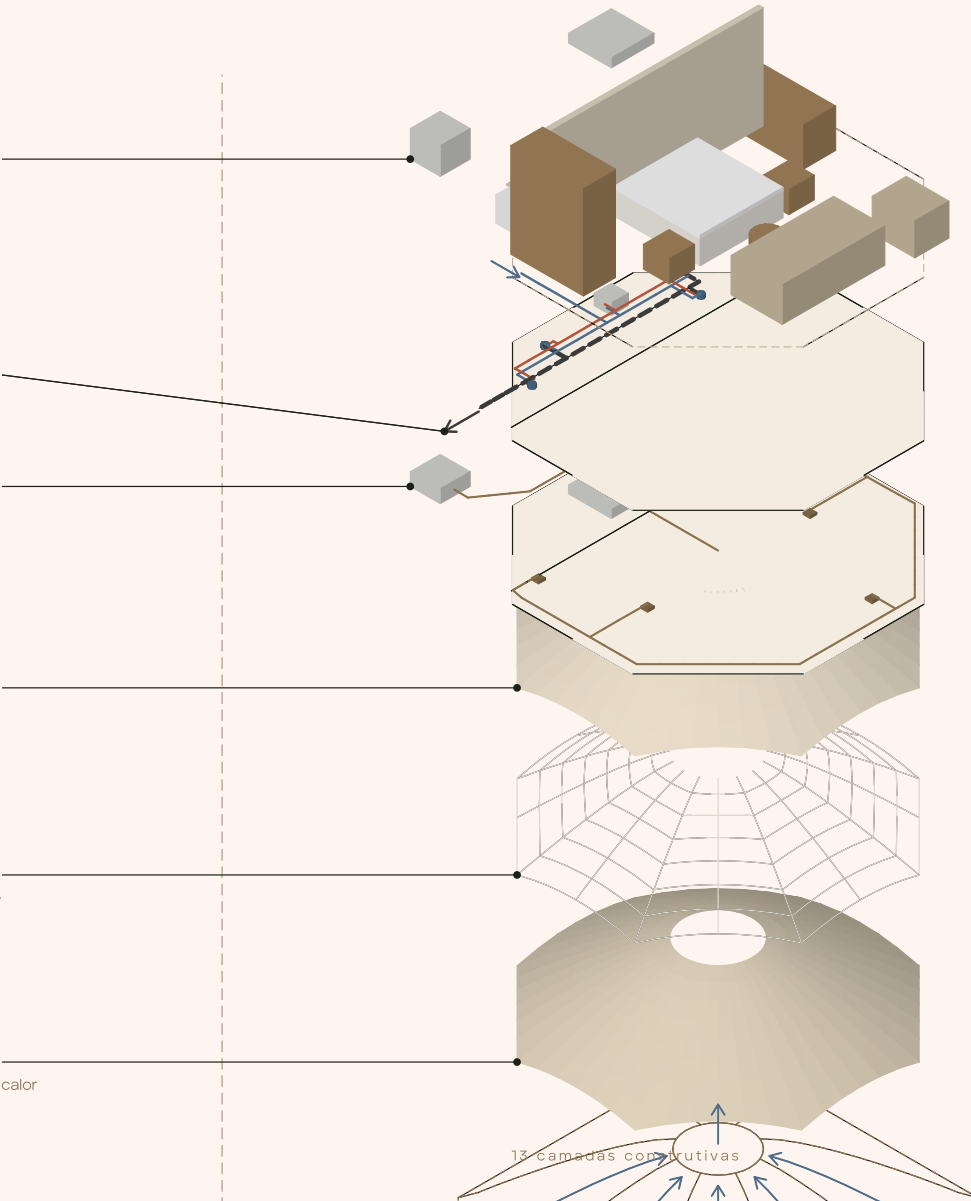

 ZION LODGE • QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica





CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00 x 2,40	1	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82 x 2,55	2	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60 x 0,60	1	Vidro insulado jateado; peitoril 160	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50 x 0,45	1	Anel de vidro laminado curvo Ø150 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90 x 2,10	1	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 7 tipos · 10 unidades
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF cônica em 8 gomos radiais · Lanterna Zion no cume · calha oculta no anel de beiral com 4 TQ Ø75 nos pilares · vela de sombra sobre o deck

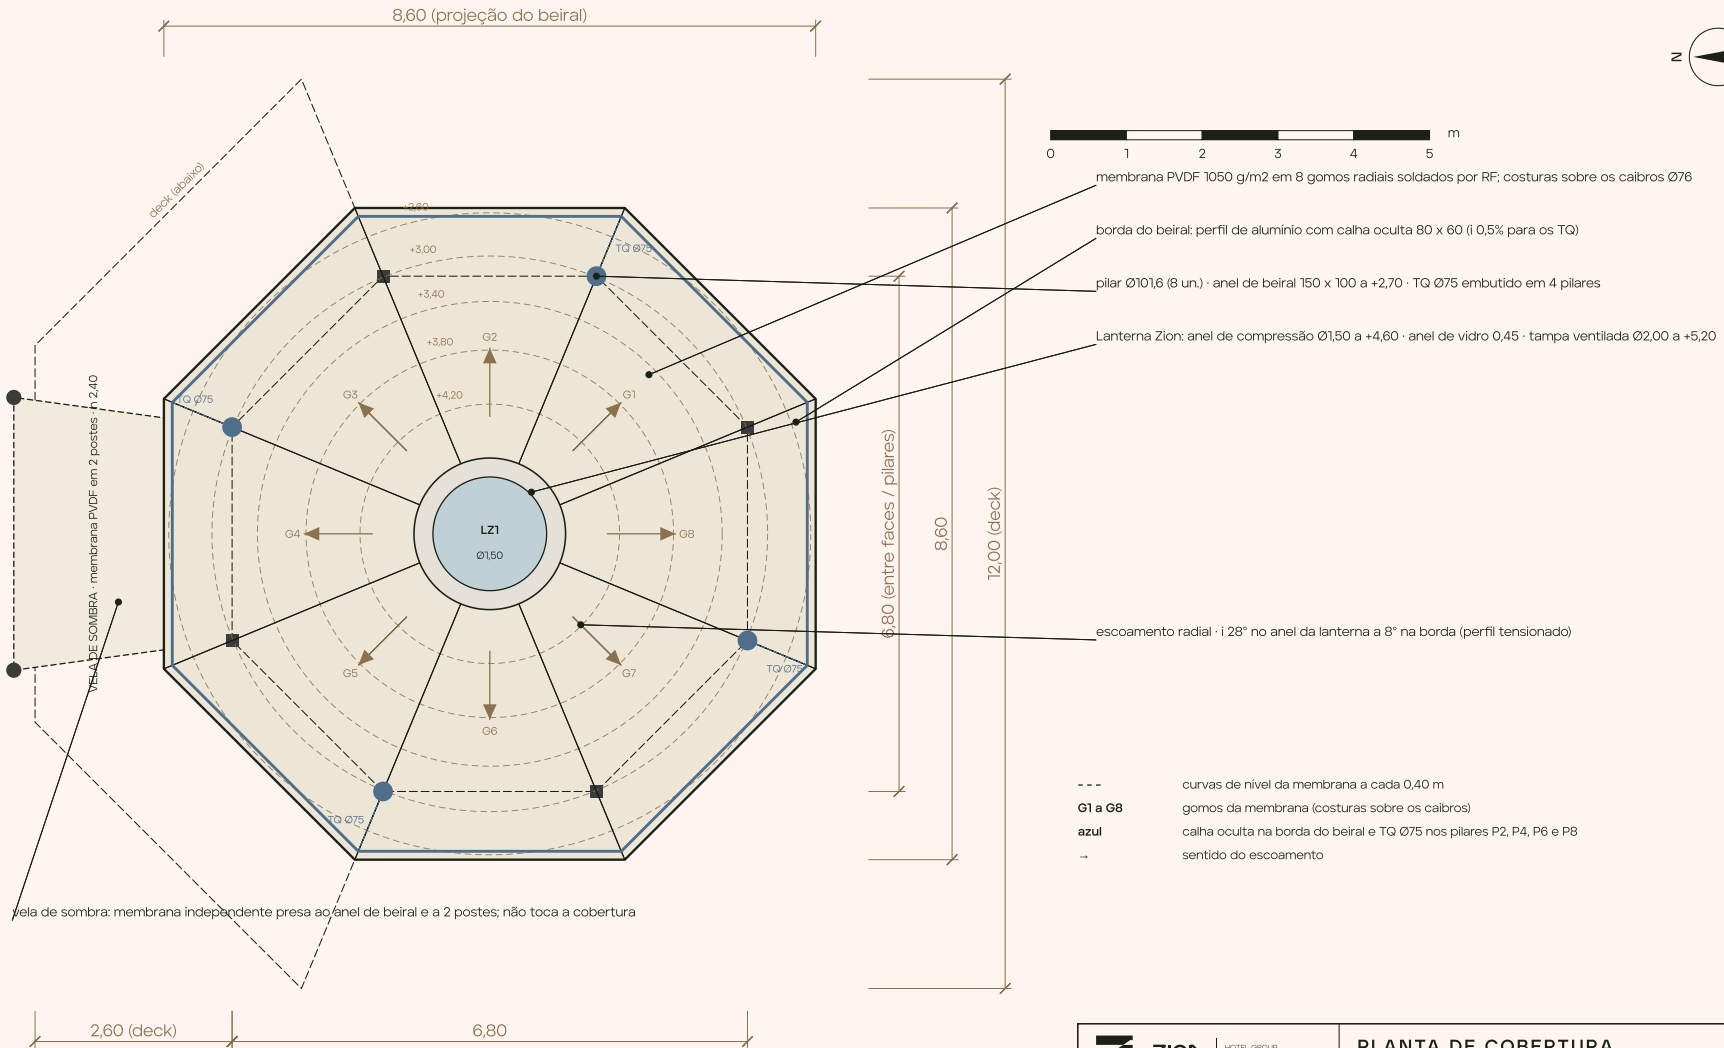

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA DE COBERTURA Escoamento radial, calha oculta, TQ Ø75, Lanterna Zion e vela de sombra	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		FOLHA PA-04 SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

39,2 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00	2,40	1	4,8	144	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41	2,55	2	1,05	31	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82	2,55	2	7,19	216	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82	2,55	2	7,19	216	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60	0,60	1	0,96	29	Vidro insulado jateado; peitoril 1,60	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50	0,45	1	0,68	20	Anel de vidro laminado curvo Ø1,50 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90	2,10	1	1,89	57	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros: tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelo anel da lanterna e presa no clamp I02 ☐ Bolsa de borda tensionada em cruz sobre o perfil do beiral; balanço de 0,90 m uniforme nos 8 lados ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 8 gomos tensionados do anel de beiral ao anel da lanterna, sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Montantes RPT fixados nos talões dos pilares, no prumo ☐ 10 vidros insulados calçados e selados; porta de correr 2,00 x 2,40 regulada no trilho embutido ☐ Fresta da banheira selada; revestimento dos pilares encaixado ☐ Vidro curvo e tampa da lanterna com teste de água

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias)
2.

Padrões de corte: ZL-LON-001_padroes.dxf e ZL-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90
3.

Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding
4.

Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe
2.

Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido)
3.

Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra
4.

Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração
- Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido
- Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água
- Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado)

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
