



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · PROJETO POR CAMADAS · DO FERRO À LONA

ZION CÁPSULA

POR CAMADAS

ZK-CAM-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Um só documento com todas as camadas da cabana na ordem em que são montadas: fundação e deck, a estrutura de ferro (cada peça com medida, perfil, peso, encaixe e sequência), a fixação da lona nos ferros, o isolamento e a câmara ventilada, o revestimento interno, a lona externa com os padrões de corte, os vidros e as esquadrias, e a sequência completa de montagem em 6 etapas.

Fontes: lotes ZK-LOT1 a LOT4-001, padrões ZK-LON-001, detalhes DET-01 a DET-13, manual de montagem. Unidade: metros nas tabelas de geometria, milímetros nos perfis.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZK-CAM-001-C0	C0 · Visão geral	2
ZK-CAM-001-C1	C1 · Fundação	4
ZK-CAM-001-C1m	C1 · Montagem	7
ZK-CAM-001-C2	C2 · Lista ferro a ferro	8
ZK-CAM-001-C2e	C2 · Encaixes	9
ZK-CAM-001-C2m	C2 · Montagem	12
ZK-CAM-001-C3	C3 · Fixação da lona	13
ZK-CAM-001-C4	C4 · Isolamento	15

ZK-CAM-001-C4m	C4 · Montagem	17
ZK-CAM-001-C5	C5 · Revestimento interno	18
ZK-CAM-001-C5m	C5 · Montagem	19
ZK-CAM-001-C6	C6 · Lona externa	20
ZK-CAM-001-C6m	C6 · Montagem	24
ZK-CAM-001-C7	C7 · Vidros	25
ZK-CAM-001-C8	C8 · Montagem 1	27
ZK-CAM-001-C8b	C8 · Montagem 2	28
ZK-CAM-001-C9	C9 · Transporte e revisão	29


C0 · VISÃO GERAL DAS CAMADAS

da fundação à entrega: o que é cada camada, de que lote vem e quando é montada

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
FUNDAÇÃO E DECK	ESTRUTURA DE FERRO	FIXAÇÃO DA LONA	ISOLAMENTO E CÂMARA	REVESTIMENTO INTERNO	LONA EXTERNA	VIDROS E ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES E INTERIOR	TESTES E ENTREGA
4 estacas helicoidais, grelha U 150 x 60, módulos de piso, deck	casco monocoque (anéis + longarinas)	perfis keder, trilho de base, clamps, cabos, presilhas	PIR 60 mm + barreira de vapor + câmara 40 mm	compensado curvado 75 m2	46 painéis de ACM = 80 m2	5 esquadrias = 14,3 m2	elétrica, hidráulica, banho, marcenaria, acabamentos	chuva, carga térmica, pré-tensão, as-built
lote 1 · etapas 1 a 4	lote 2 · etapas 5 a 7	lote 2 / 3 · com a estrutura	lote 3 · etapa 9	lote 3 / 4 · etapa 10	lote 3 · etapa 8	lote 3 · etapa 11	lotes 1 e 4 · etapas 12 a 16	Zion · etapa 17

Regra do kit: nenhuma peça maior que 4,80 m nem mais pesada que 120 kg; tudo parafusado (sem solda em campo), sem concreto, sem guindaste. Cada camada só começa depois que a anterior foi conferida e liberada: fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → vidros medidos na estrutura montada.

 ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA
Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala

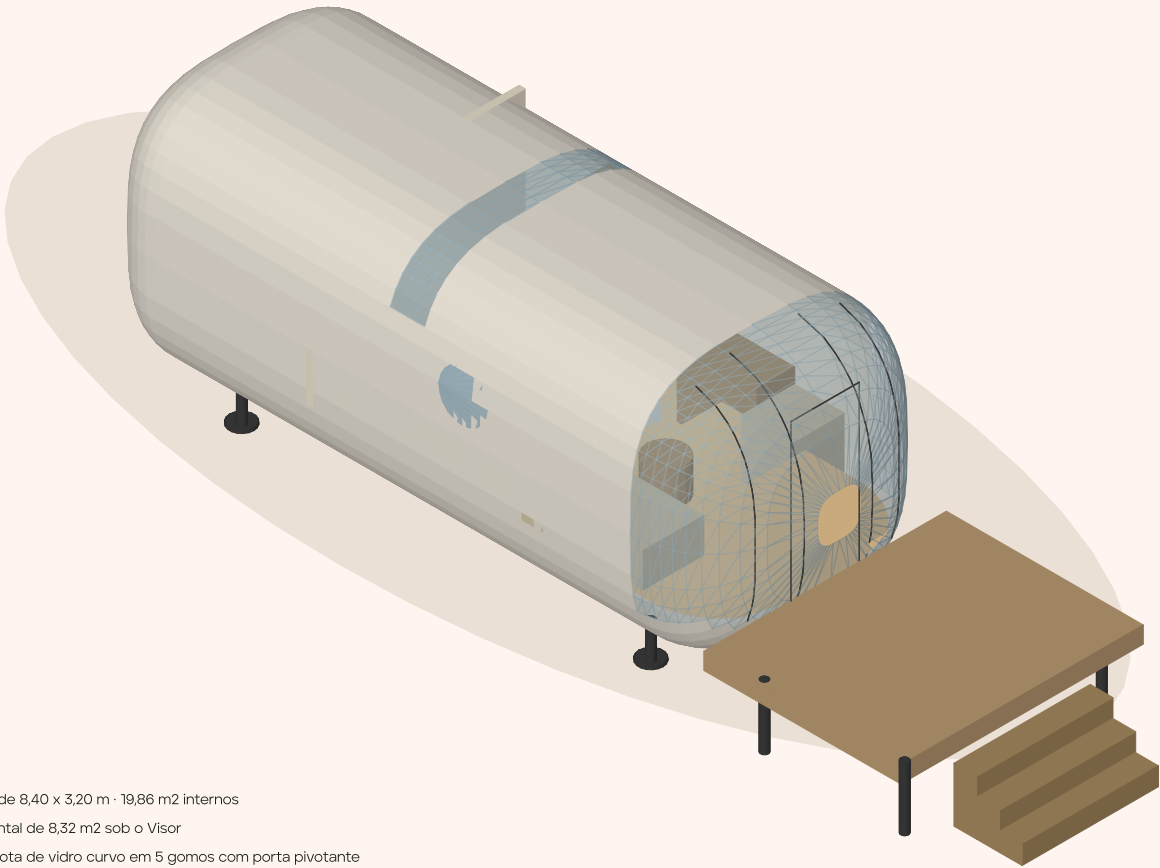

- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m2 internos
- ② Deck frontal de 8,32 m2 sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA 08/CP ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

C1 · FUNDAÇÃO E DECK

4 pontos de fundação · coordenadas (x; y) em m · estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável (ou sapata pré-moldada em rocha)



PONTO	X	Y
F01	1,50	-1,00
F02	1,50	1,00

PONTO	X	Y
F03	6,90	-1,00
F04	6,90	1,00

 VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO comprimento e torque das estacas dependem da sondagem do sítio.


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

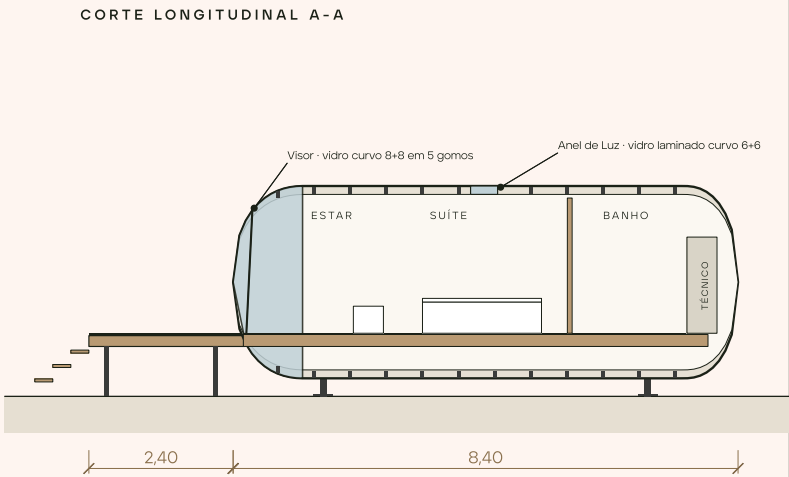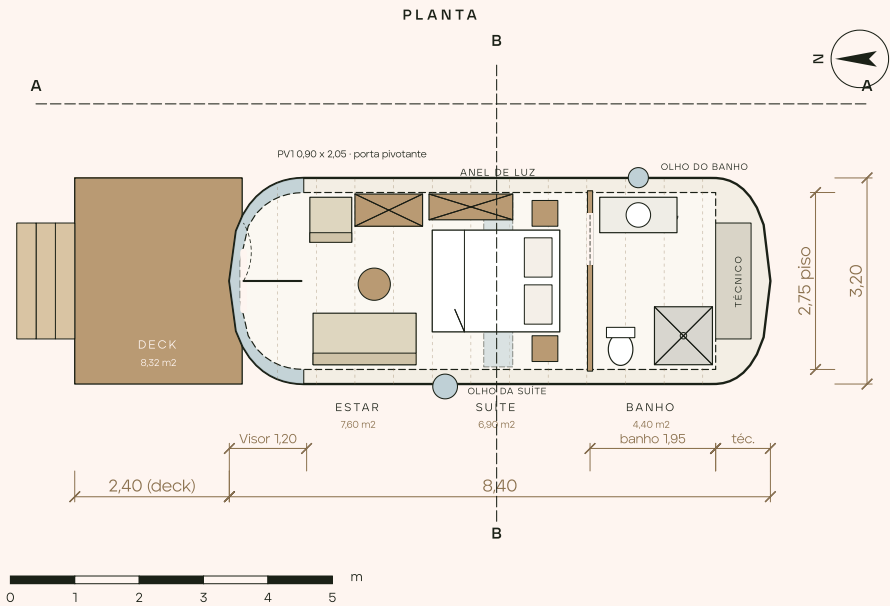

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

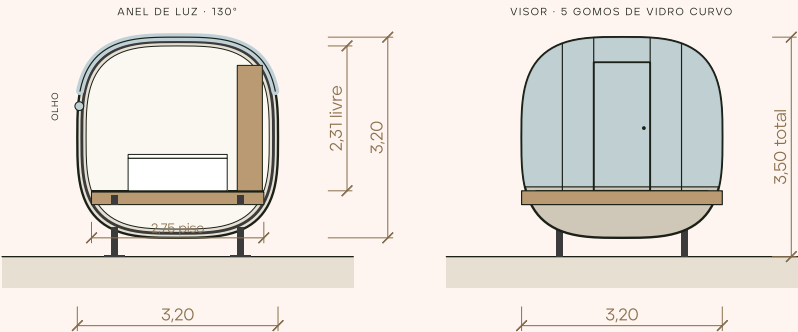

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- 01 Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- 02 Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- 03 Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- 04 Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- 05 Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 01/CP SET 2026


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

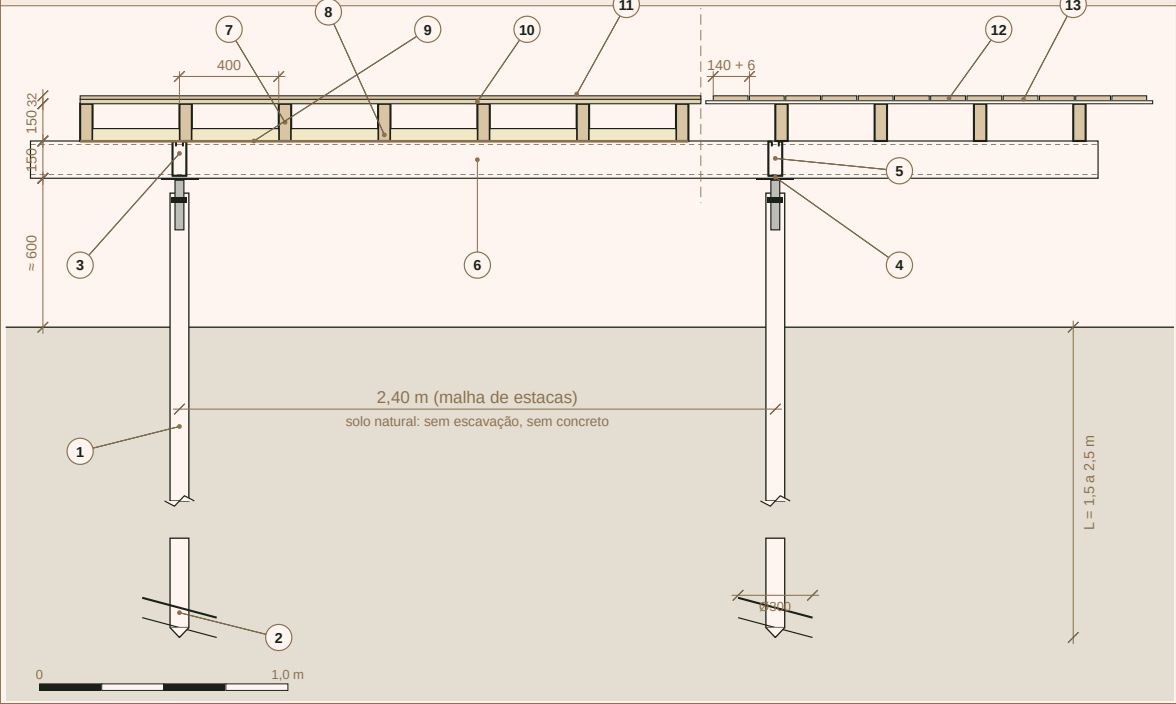

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

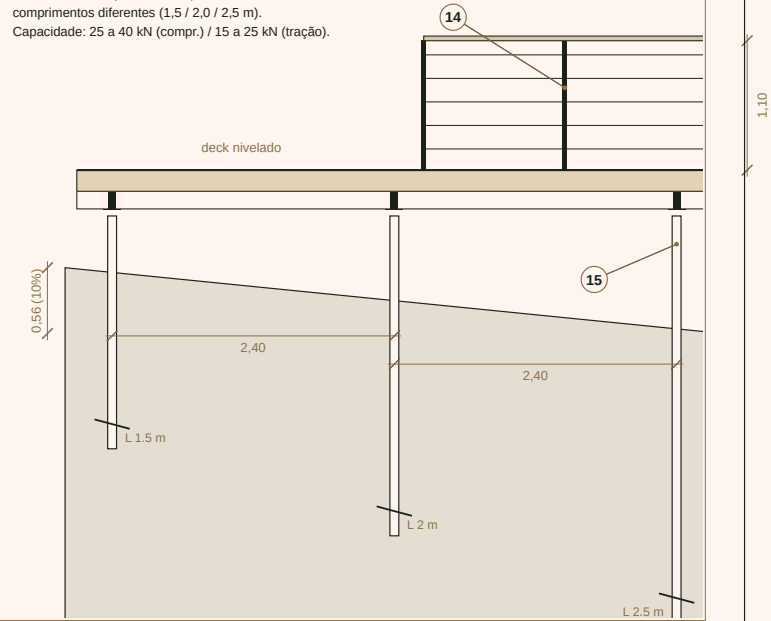

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

C1 · MONTAGEM DA FUNDAÇÃO, GRELHA, PISO E DECK

etapas 1 a 4 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores · 3 h	Nível a laser, trena, estacas, linha · Roçadeira	Acesso do caminhão-prancha até 30 m do ponto de pouso	☐ 4 pontos dos pés locados ± 20 mm ☐ Cota de referência definida ☐ Acesso e área de manobra confirmados
02 Fundação dos pés (4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas) Operador + 2 montadores · 0,5 dia	Chave de torque, nível · Motor de cravação ou mini-escavadeira	Solo com rocha rasa: usar sapata pré-moldada 60 x 60	☐ Torque registrado / sapatas niveladas ± 5 mm ☐ Cabeçotes ou chumbadores prontos
05 Deck frontal e escada 2 carpinteiros · 0,5 dia	Parafusadeira, nível		☐ 4 módulos de deck nivelados ☐ Escada fixada ☐ Guarda-corpo em cabo

C2 · ESTRUTURA DE FERRO · CADA PEÇA, MEDIDA, PERFIL, PESO E ENCAIXE

8 tipos de peça · ≈ 0 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36 galvanizado a fogo · parafusos 8.8 galv.

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
K01	Anéis da casca: tubo retangular 60 x 40 x 3,0 mm calandrado (12 un. x 10,90 m)	137,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K02	Longarinas: tubo 40 x 40 x 2,0 mm curvado nas calotas (7 un.)	57,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K03	Chassi do piso: perfil U 150 x 50 x 3,0 mm (2 longarinas)	15,1			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K04	Travessas do piso: perfil U 100 x 50 x 2,65 mm (12 un.)	31,5			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K05	Pés telescópicos: tubo Ø101,6 x 4,0 em tubo Ø114,3 x 4,5, curso 0,40 m, placa base 250 x 250 x 10	4			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K06	Chapas de nó, cantoneiras e olhais de içamento (4 un.)	46			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K07	Parafusos estruturais 8.8 galvanizados M10/M12 com porcas e arruelas	380			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K08	Aço total estimado (anéis, longarinas, chassi, pés, chapas)	1196			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12

⚠

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 bitolas e espessuras são premissas de projeto preliminar; o cálculo estrutural confirma.

C2 · ENCAIXES · COMO CADA FERRO LIGA NO OUTRO

nó a nó: peça de ligação, o que recebe, parafusos e torque, regra de montagem


NÓ	PEÇA DE LIGAÇÃO	LIGA EM	PARAFUSOS / TORQUE	REGRA
N1 · Anel na longarina	Chapa gousset	Anel 60 x 40 x 3 / longarina 40 x 40	2 M10	Fabricado em oficina.
N2 · Chassi	U 150 x 50 + travessas	Anéis	M12	
N3 · Pé telescópico	Ø101,6 em Ø114,3, curso 0,40	Chassi e estaca	Pino + M16	Nivelar ± 5 mm.
N4 · Painei de ACM	Perfil ômega + junta H com EPDM	Anéis	Rebite / M6 @300	Junta 12 mm em todos os anéis.

REGRAS DE FABRICAÇÃO

GABARITOS	bancada 1:1 impressa do DXF para cada peça curva; conferir 5 pontos antes de soldar chapas
SOLDA	só em fábrica, MIG/TIG qualificado; nenhuma solda depois de galvanizar
GALVANIZAÇÃO	a fogo NBR 6323 ≥ 70 µm; furos de respiro nos tubos; roscas protegidas
FIT TEST	montar 1 pórtico completo em fábrica, medir, fotografar, só então galvanizar
MARCAÇÃO	código gravado em cada peça (ex.: ZC-B03-C), setas de orientação, peso nas peças > 40 kg

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala


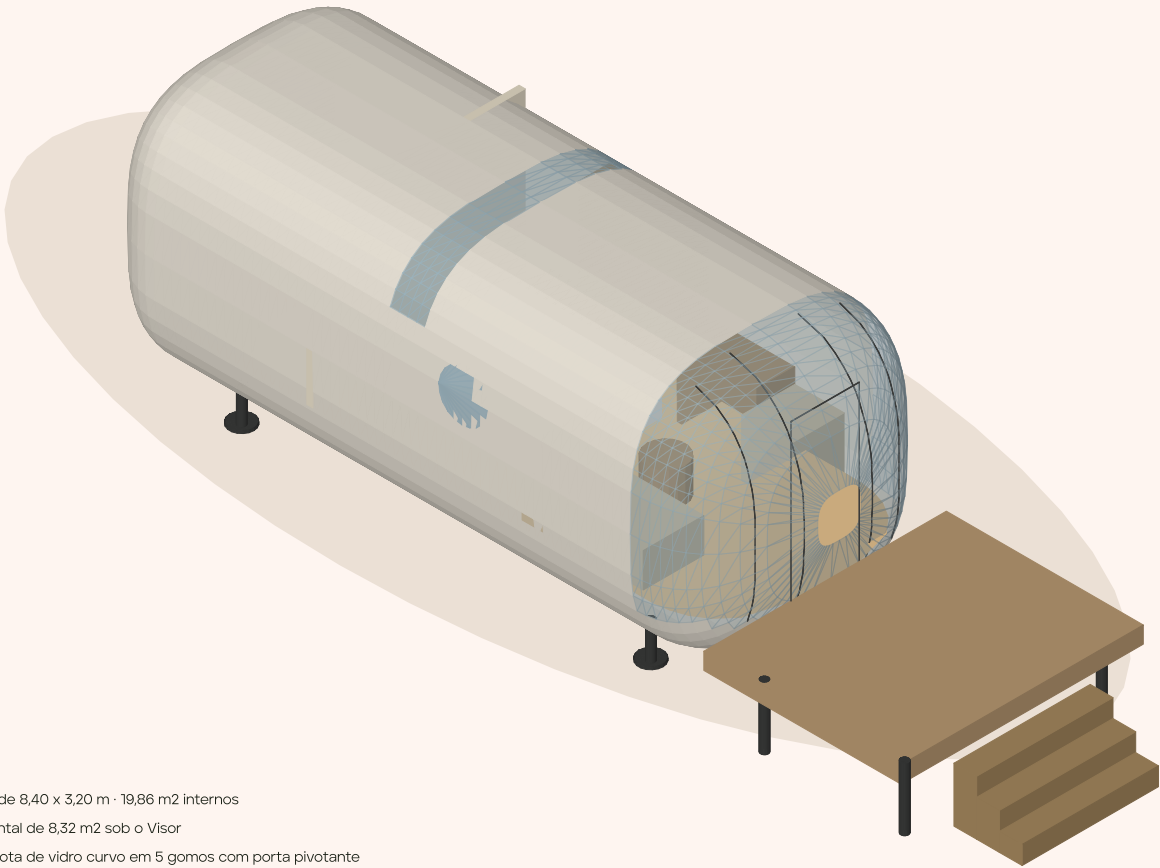


- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m2 internos
- ② Deck frontal de 8,32 m2 sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 08/CP SET 2026


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

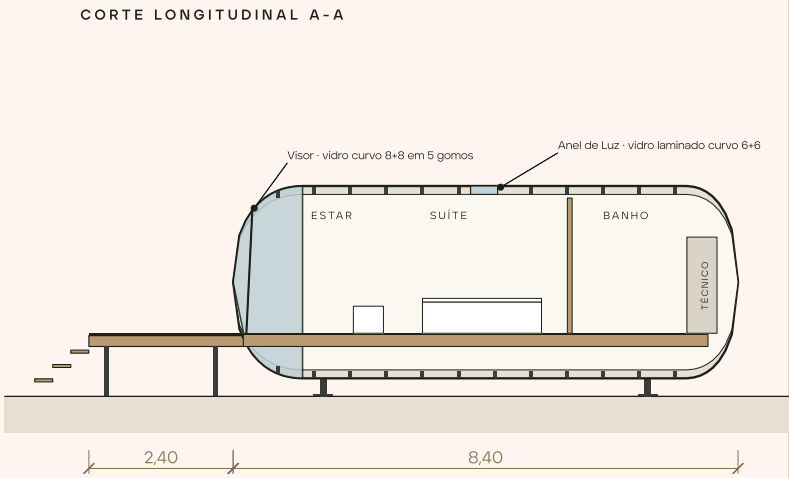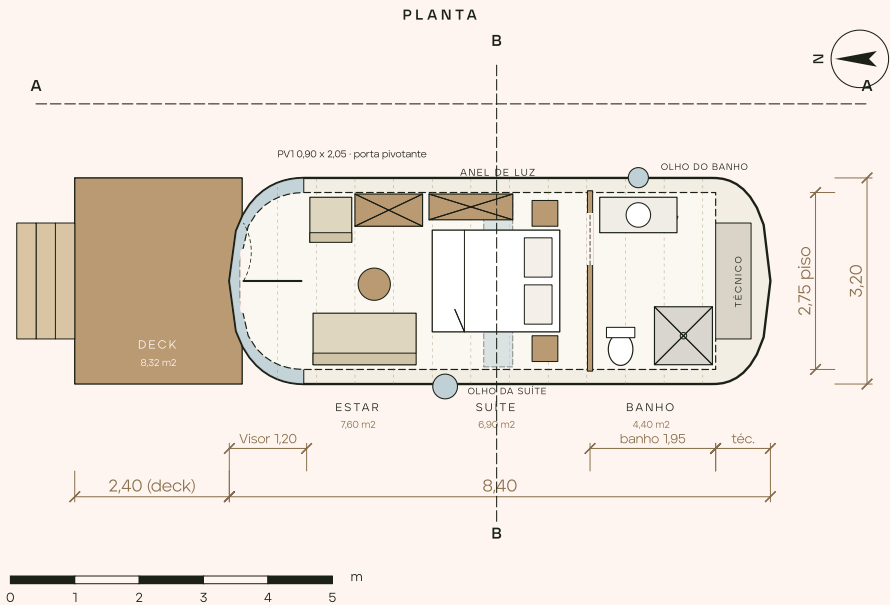

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

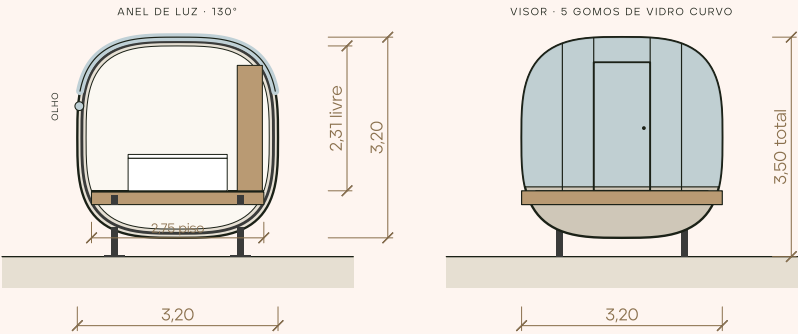

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superellipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- 01 Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- 02 Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- 03 Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- 04 Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- 05 Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

C2 · MONTAGEM DA ESTRUTURA PASSO A PASSO

etapas 5 a 7: arcos, travamentos, conferência de esquadro

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
03 Transporte e pouso da cápsula Líder + motorista + 3 montadores · 0,5 dia	Cintas 3 t, manilhas, cordas guia · Caminhão-prancha 9 m + munck 8 t (ou guincho e trilhos em sítios sem munck)	Pouso com vento > 25 km/h; olhais de içamento não conferidos	☐ 4 olhais inspecionados ☐ Pés telescópicos travados no curso ☐ Nivelamento ± 5 mm no piso interno

C3 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

tipos de borda usados neste modelo e as peças metálicas que as recebem


BORDA	COMO FIXA
JUNTA	JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

PERFIL ÔMEGA	subestrutura de alumínio sobre os anéis para o ACM
JUNTA H	alumínio com EPDM, 12 mm em todos os anéis


ZION CÁPSULA · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento


1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

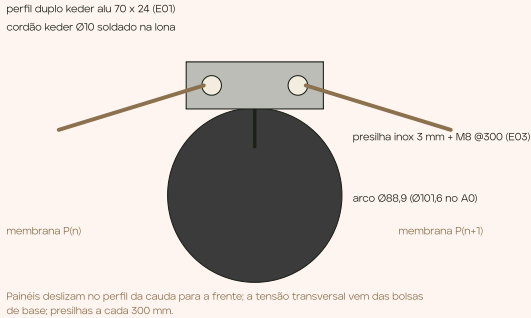


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

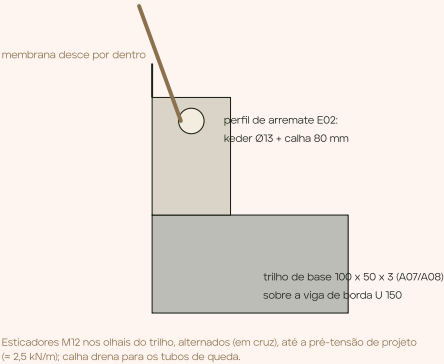


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)

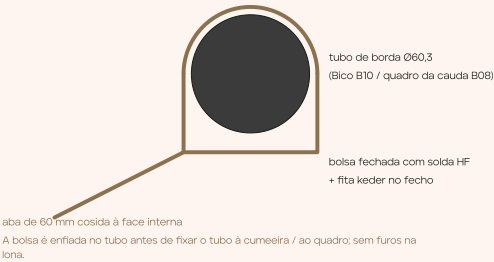

4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

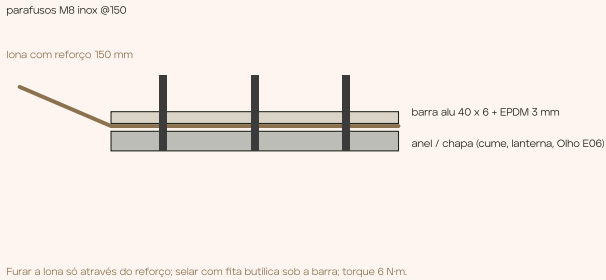

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

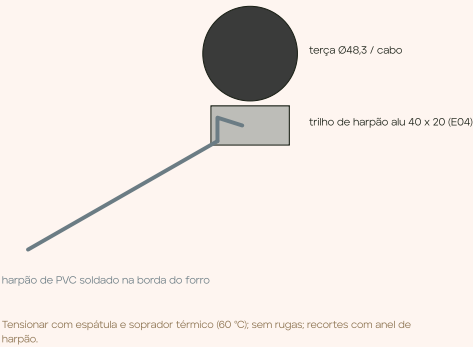

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Cápsula: revestimento rígido (ACM) em perfis H de alumínio com EPDM nos anéis; sem lona tensionada. Este quadro vale para a vela e para o forro têxtil opcional.
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água · vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-90 SET 2026

C4 · ISOLAMENTO E CÂMARA VENTILADA

entre a lona externa e o forro: o que vai, em que ordem, e como respira

- ORDEM

JUNTAS
- ACM externo → câmara 40 mm → PIR 60 mm em painéis curvados → barreira de vapor (manta líquida) → compensado curvado



PIR com encaixe macho-fêmea, fitas nas juntas

Envelope (de fora para dentro)

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Painel de alumínio composto 4 mm (ACM) curvado, cor champagne fosco (84,02 m2 + 18 % de perdas)	m2	99,1		PREÇO A COTAR
Subestrutura do ACM: perfis ômega de alumínio 20 mm e fixadores ocultos	m	134,4		PREÇO A COTAR
Membrana de estanqueidade e barreira de vapor (manta líquida + fita butílica nas juntas)	m2	92,4		PREÇO A COTAR
Isolamento PIR 60 mm em painéis curvados entre anéis (λ 0,022)	m2	90,7		PREÇO A COTAR
Câmara de ar ventilada 40 mm com sarrafos de PVC	m2	84		PREÇO A COTAR
Forro e paredes: compensado naval curvado 12 mm com lâmina de carvalho, verniz fosco	m2	89,6		PREÇO A COTAR
Selante de poliuretano e fita EPDM nas juntas dos gomos	m	85,8		PREÇO A COTAR


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

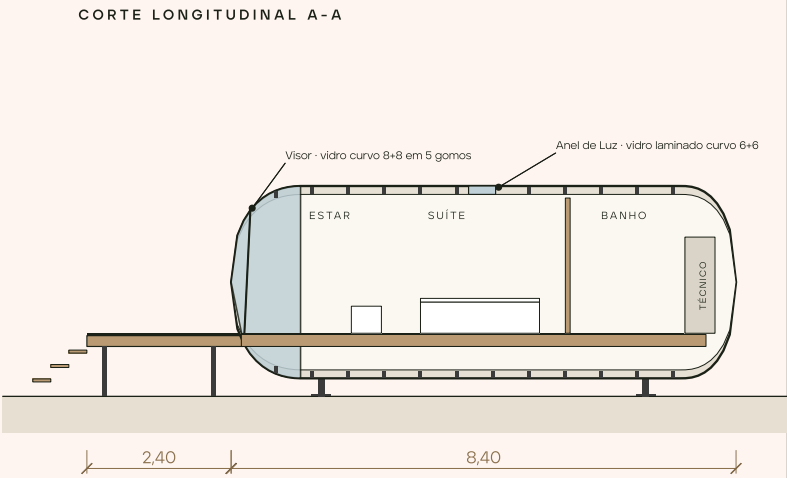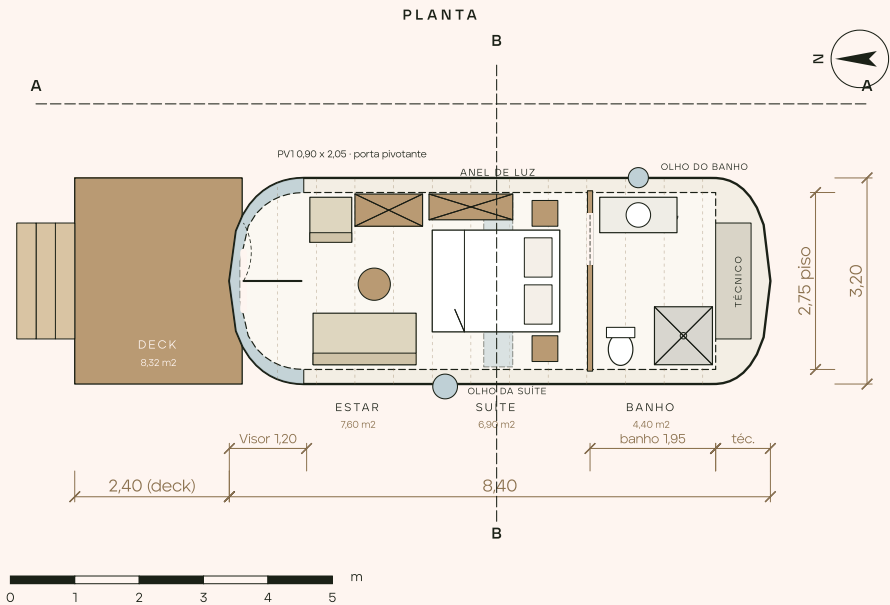

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

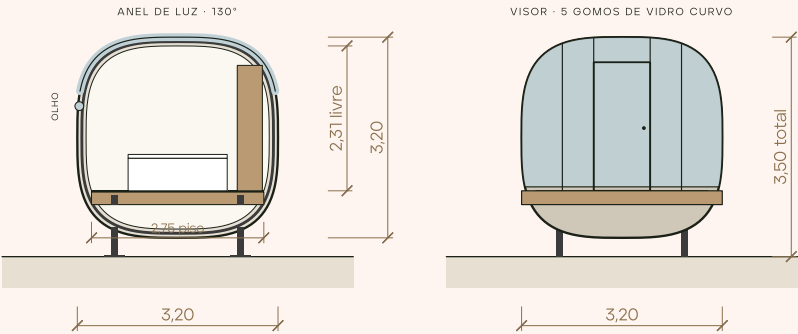

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superellipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA	
	Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00	
ZION CÁPSULA	ESCALA escala gráfica (A1)	FOLHA 01/CP
ZION GLAMPING COLLECTION	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C4 · INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

etapa 9 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
------------------------	----------------------------	--------	-----------

C5 · REVESTIMENTO INTERNO

forro tensionado (compensado naval curvado laminado) em 5 painéis = 75 m2 · ripados · painéis · marcenaria acoplada

PAINÉIS DO FORRO

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS
I1T	4	Revestimento interno I1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,64 x 2,48	1,47	5,9	JUNTA
I2T	38	Revestimento interno I2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,49	1,49	56,7	JUNTA
I5D	1	Revestimento interno I5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA
I10E	1	Revestimento interno I10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA
I12T	4	Revestimento interno I12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,54 x 2,41	2,4	9,6	JUNTA

O QUE REVESTE CADA AMBIENTE

FORRO	tensionado creme com harpão; translúcido sob claraboias / lanterna
PAREDES OPACAS	compensado curvado laminado em carvalho
PISO	carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho
RODAPÉ	técnico removível 150 mm (eletrodutos, PEX)

FIXAÇÃO DO FORRO

Trilho harpão de alumínio 40 x 20 (E04) nos talões das terças / cabos; o painel entra com o harpão de PVC soldado e tensiona a quente; recortes de luminárias e difusores com anel.

C5 · INSTALAÇÃO DO FORRO

etapa 10 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
------------------------	----------------------------	--------	-----------

C6 · REVESTIMENTO EXTERNO EM ACM

5 padrões = 80 m2 (forma final; + 12 a 15 % de sobras) · padrões DXF e XLSX em capsule/lona/

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
R1T	4	Revestimento externo R1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,65 x 2,72	1,61		6,4 JUNTA	0
R2T	36	Revestimento externo R2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,72	1,63		58,8 JUNTA	0
R5D	1	Revestimento externo R5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,72	1,63		1,6 JUNTA	1
R10E	1	Revestimento externo R10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,72	1,63		1,6 JUNTA	1
R12T	4	Revestimento externo R12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,62 x 2,64	2,77		11,1 JUNTA	0

ACM4 mm PVDF champanhe fosco, curvado a frio sobre ômega; painéis ≤ 2,80 x 1,20 m

JUNTASperfil H com EPDM e selante PU

ZION CÁPSULA · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

5 padrões externos · 5 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
R1T	4	0,65 x 2,72	1,61	Revestimento Externo
R2T	36	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R5D	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R10E	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R12T	4	1,62 x 2,64	2,77	Revestimento Externo
I1T	4	0,64 x 2,48	1,47	Forro
I2T	38	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I5D	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I10E	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I12T	4	1,54 x 2,41	2,40	Forro

Total forro / revestimento interno: 75,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total revestimento externo: 79,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)



Vista lateral · painéis de ACM entre anéis em 4 setores (T topo, D/E lados, B barriga) · juntas em perfil H · revestimento interno em compensado curvado

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-01 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R1T

Revestimento externo R1T · topo · entre x 0.75 e x 1.35 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

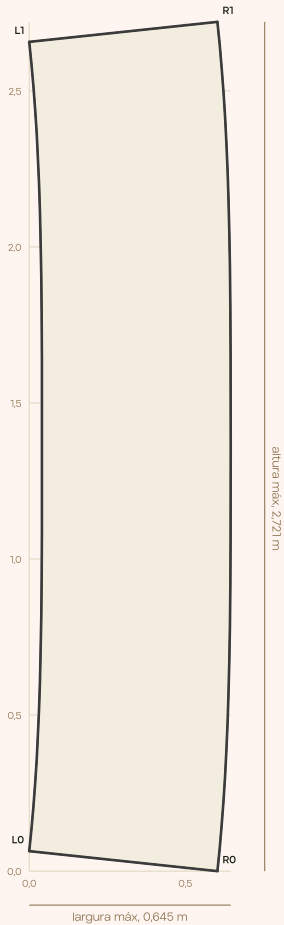


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0.000	0.000	0.064	0.603	0.000	0.606
0.250	0.021	0.313	0.625	0.261	0.606
0.500	0.033	0.563	0.637	0.523	0.606
0.750	0.038	0.813	0.643	0.786	0.605
1.000	0.040	1.063	0.645	1.048	0.605
1.250	0.040	1.313	0.645	1.310	0.605
1.500	0.040	1.563	0.645	1.573	0.605
1.750	0.039	1.813	0.644	1.835	0.605
2.000	0.035	2.063	0.640	2.097	0.605
2.250	0.026	2.312	0.630	2.359	0.606
2.500	0.009	2.562	0.612	2.621	0.606
2.596	0.000	2.657	0.603	2.721	0.606

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: R1T, R1E, R1B, R1D)
ÁREA DE FORMA FINAL
161 m2
COMPRIMENTO L / R
2.60 / 2.72 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0.65 x 2.72 m
MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0.5 a 1.5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R1T Revestimento Externo
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-11 SET 2026



ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R2T

Revestimento externo R2T · topo · entre x 1.35 e x 1.95 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

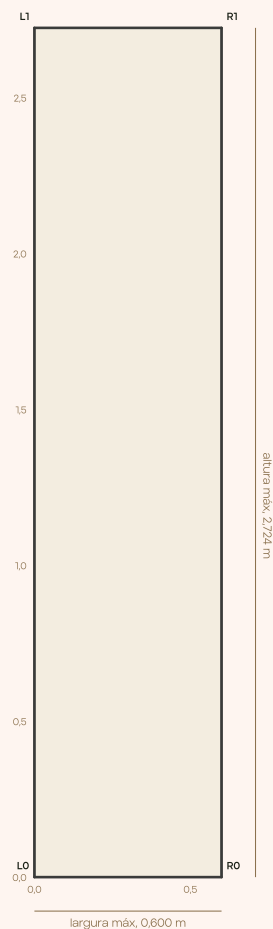


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE

36 (códigos: R2T, R2E, R2B, R2D, R3T, R3E, R3B, R3D, R4T, R4E, R4B, R4D, R5T, R5E, R5B, R6E, R6B, R6D, R7E, R7B, R7D, R8T, R8E, R8B, R8D, R9T, R9E, R9B, R9D, R10T, R10B, R10D, R11T, R11E, R11B, R11D)

ÁREA DE FORMA FINAL

1,63 m²

COMPRIMENTO L / R

2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)

0,60 x 2,72 m

MATERIAL

ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

NOTAS

- **Padrão** = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial; típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 na trama) e as sobras de bolsa/ceder.

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

PADRÃO DE CORTE R2T

Revestimento Externo

ZION CÁPSULA
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA ver malha (m)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA LN-12

SET 2026

C6 · INSTALAÇÃO DA LONA EXTERNA

etapa 8 do manual · vento > 30 km/h suspende

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
------------------------	----------------------------	--------	-----------

C7 · VIDROS E ESQUADRIAS

14,3 m2 · medição na estrutura montada ± 3 mm · panos ≤ 90 kg

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
VS1	Visor: calota de vidro laminado curvo em 5 gomos	3,20	3,20	1	10,24	307	Laminado curvo 8 + 8 mm low-e, calandrado; juntas verticais em -0,95 / -0,45 / +0,45 / +0,95; alumínio anodizado bronze	Calota frontal (x 0 a 1,20)
PV1	Porta pivotante do Visor	0,90	2,05	1	1,84	55	Vidro laminado 10 + 10, pivô de piso, fechadura digital	Gomo central do Visor
AL1	Anel de Luz: faixa de vidro curvo em 3 gomos	0,45	3,60	1	1,62	49	Laminado curvo 6 + 6 com controle solar, ± 65° do zênite	x 3,95 a 4,40, sobre a cama
OL1	Olho da suíte Ø0,60	0,60	0,60	1	0,36	11	Vidro insulado circular, aro de alumínio	x 3,35, lado esquerdo, z 1,35
OL2	Olho do banho Ø0,50	0,50	0,50	1	0,25	8	Vidro insulado acidado, aro de alumínio	x 6,35, lado direito, z 1,60
ETAPA · EQUIPE · TEMPO		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS				RISCOS		CHECKLIST
06	Vistoria e entrega Lider + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro						☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues


ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05


(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40

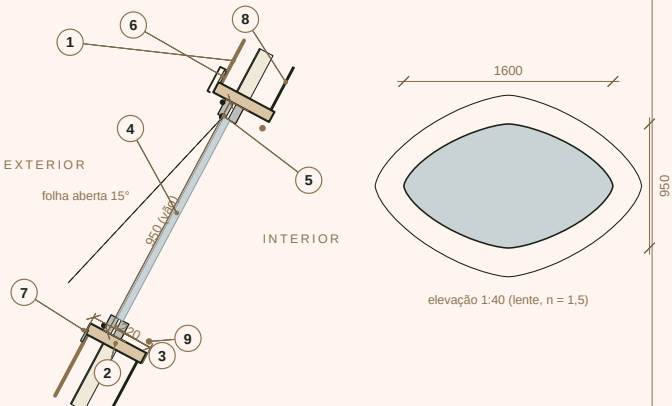


(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5

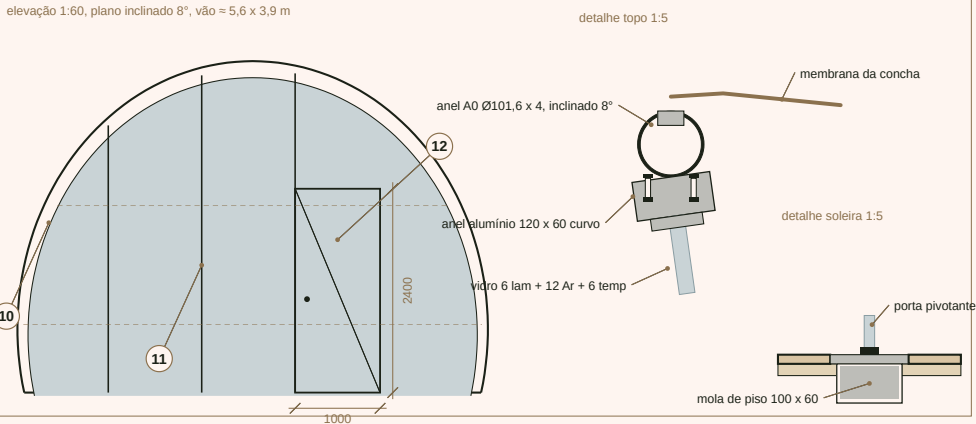


(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5

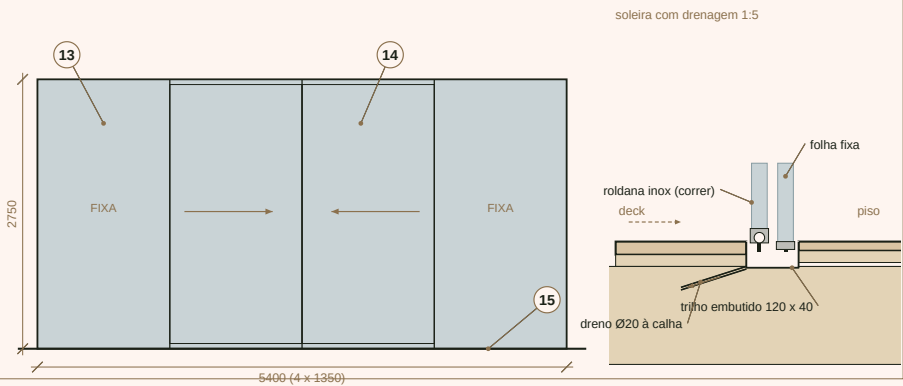

(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)

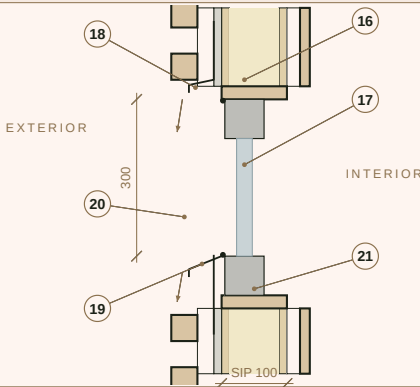

- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM

ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM

6 etapas · 3 dias · equipe de 4 montadores + líder, mais especialistas

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores · 3 h	Nível a laser, trena, estacas, linha · Roçadeira	Acesso do caminhão-prancha até 30 m do ponto de pouso	☐ 4 pontos dos pés locados ± 20 mm ☐ Cota de referência definida ☐ Acesso e área de manobra confirmados
02 Fundação dos pés (4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas) Operador + 2 montadores · 0,5 dia	Chave de torque, nível · Motor de cravação ou mini-escavadeira	Solo com rocha rasa: usar sapata pré-moldada 60 x 60	☐ Torque registrado / sapatas niveladas ± 5 mm ☐ Cabeçotes ou chumbadores prontos
03 Transporte e pouso da cápsula Líder + motorista + 3 montadores · 0,5 dia	Cintas 3 t, manilhas, cordas guia · Caminhão-prancha 9 m + munck 8 t (ou guincho e trilhos em sítios sem munck)	Pouso com vento > 25 km/h; olhais de içamento não conferidos	☐ 4 olhais inspecionados ☐ Pés telescópicos travados no curso ☐ Nivelamento ± 5 mm no piso interno

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM (CONTINUAÇÃO)

instalações, interior, acabamentos, testes e entrega

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
04 Ligações de instalações Eletricista + encanador · 0,5 dia	Ferramentas de crimpagem e teste	Conexões rápidas sem teste de estanqueidade	☐ Água, esgoto e energia conectados nos engates rápidos da cauda ☐ DR e aterramento testados ☐ Teste de pressão 6 bar / 30 min
05 Deck frontal e escada 2 carpinteiros · 0,5 dia	Parafusadeira, nível		☐ 4 módulos de deck nivelados ☐ Escada fixada ☐ Guarda-corpo em cabo
06 Vistoria e entrega Líder + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro		☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues

C9 · TRANSPORTE E REVISÃO

volumes do kit · registro de revisão

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Cápsula completa (casca, piso, marcenaria, instalações)	8,40 x 3,20 x 3,20 m	86	4200
Módulos do deck + escada + guarda-corpo (paletes)	2,6 x 1,2 x 0,8 m	2,5	420
Pés telescópicos, sapatas / estacas, chumbadores (feixe)	2,0 x 0,6 x 0,5 m	0,6	380
FF&E e enxoval (dentro da cápsula)	—	0	350

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	08/10/2026	Emissão do projeto por camadas, consolidando lotes 1 a 4, padrões de lona, detalhes e manual
