



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION GLAMPING STORE

ZION SAFARI

CABANA ESCULTURAL DE DOIS CUMES ·
TEASER DE COTAÇÃO · ZS-ONE-001 · REV
00 — CONCEITO · 17/09/2026

9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m · 48
m2 internos + 28 m2 de deck · 2 + 1 hóspedes · montagem em 15
dias. Kit numerado em 4 lotes: deck e infra · estrutura metálica ·
lonas, revestimentos e vidros · mobílias. Este teaser mostra o
projeto (plantas, cortes, camadas, estrutura, lona, esquadrias) e o
que cotar em cada lote.

Sem preços. Projeto preliminar; toda especificação estrutural sujeita a validação
de engenheiro (ART). Os documentos completos de cada lote (ZS-LOT1 a LOT4-
001) acompanham este teaser com listas peça a peça, padrões de corte DXF e
RFQ.



EM NÚMEROS · O QUE CADA LOTE COTA

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

9,50 x 5,40 m DIMENSÕES	48 + 28 m2 INTERNO + DECK	3.509 kg AÇO GALVANIZADO	182 m2 LONA + FORRO	42,3 m2 VIDRO
30 ESTACAS	15 dias MONTAGEM	9 vol · 63 m3 TRANSPORTE	10,8 t PESO TOTAL	2 + 1 HÓSPEDES

Cabana escultural de dois cumes: estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, lona PVDF tensionada, vidro e madeira sobre deck em estacas helicoidais. Tudo chega em kit numerado (peças ≤ 4,80 m, ≤ 120 kg), sem concreto, sem solda em campo e sem guindaste.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA Empreiteiro de estacas helicoidais + montadores + eletricista / encanador 30 estacas helicoidais com cabeçote - Grelha U 150 x 60 galv.: ≈ 2.062 kg - Piso 48 m2 + terraço 28 m2 - Instalações completas Documento completo: ZS-LOT1-001 (PDF)	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA Serralheria com calandra de tubos, solda MIG/TIG e galvanizador parceiro ≈ 1.447 kg de aço galvanizado em 23 tipos de peça 2 mastros em tramos (5,80 / 4,60 m) com coroas - Pilares, anel de beiral, postes externos - Cabos inox, esticadores, chapas e luvas Documento completo: ZS-LOT2-001 (PDF)	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS Confeccionista de lonas / tendas (solda HF) + vidraceiro - Cobertura tensionada: 6 faixas soldadas = 115 m2 - Forro: 4 painéis = 67 m2 - Bolsa de cabo na borda, clamps nos cumes - Vidros e fechamentos: 12 esquadrias = 42,3 m2 Documento completo: ZS-LOT3-001 (PDF)	LOTE 4 · MOBÍLIAS Marcenaria + fornecedores de FF&E - Marcenaria acoplada ao totem do mastro e closet em L 48 itens de FF&E - Módulos ≤ 0,95 x 2,10 m e ≤ 60 kg Documento completo: ZS-LOT4-001 (PDF)
---	--	--	---

RENDERS

modelo 3D paramétrico do projeto · materiais e luz de estudo




FACHADA E DECK



LATERAL



NOITE

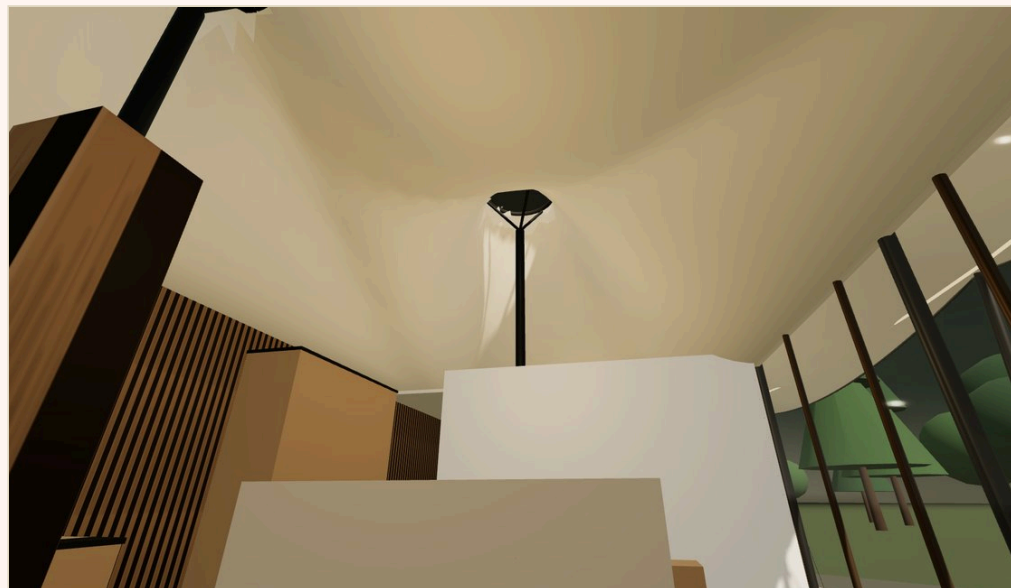

INTERIOR · ESTAR

REFERÊNCIAS REAIS

fotos de mercado que mostram a experiência-alvo · não são produto Zion · uso interno de direção de projeto



REFERÊNCIA DE MERCADO 01



REFERÊNCIA DE MERCADO 02




REFERÊNCIA DE MERCADO 03




REFERÊNCIA DE MERCADO 04

Pavilhão tensionado com cumeeira e beiral em balanço sobre a encosta, deck em aço e madeira, piscina de borda, quarto aberto para a mata: a experiência que o Zion Safari entrega, com estrutura em kit e lona PVDF.


ZION SAFARI · PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m² · terraço 20,4 m² + passarela 7,6 m² · total 79,3 m²

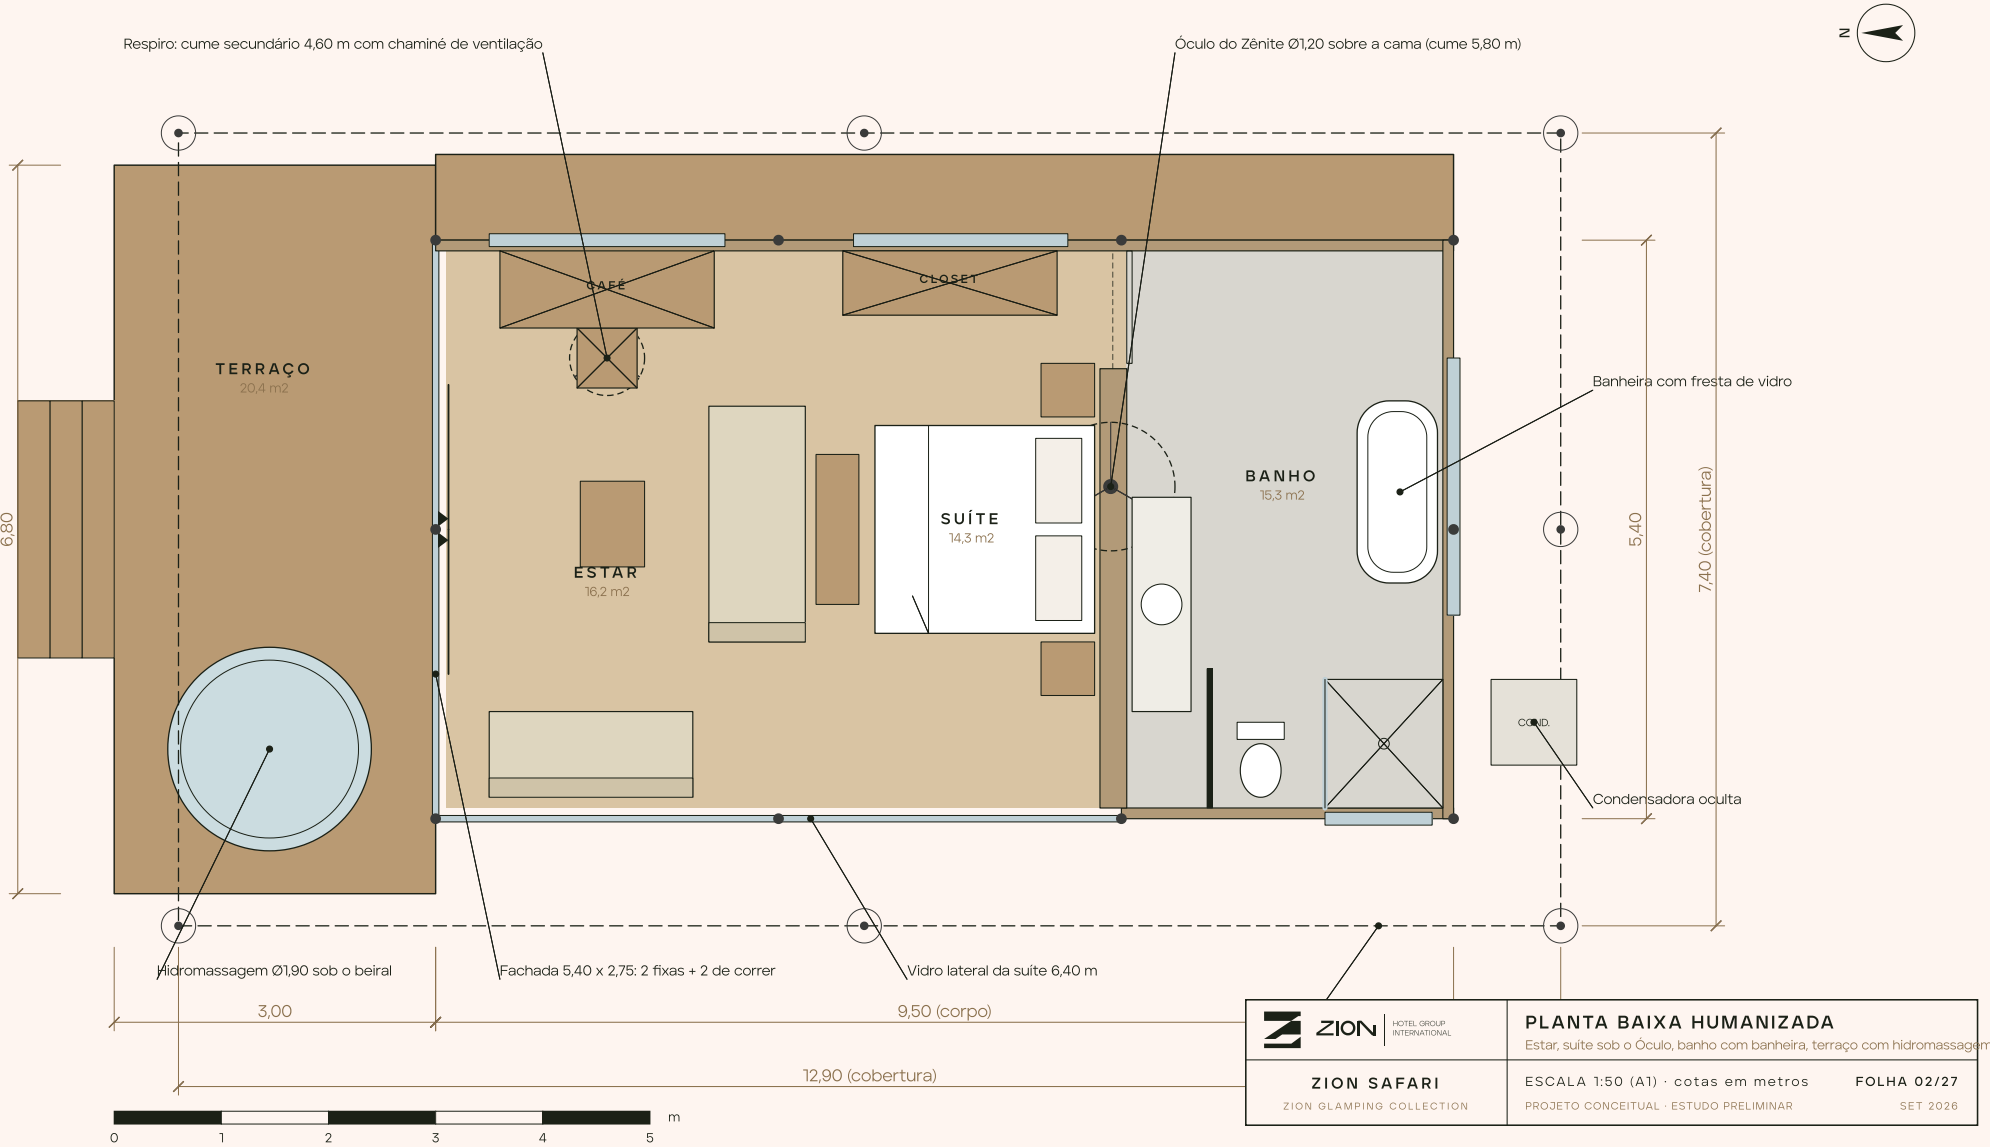

ZION SAFARI · CORTE LONGITUDINAL A-A
Plano $y = +0,40$ (eixo do mastro principal) · olhar para +y · membrana externa, câmara, forro isolado

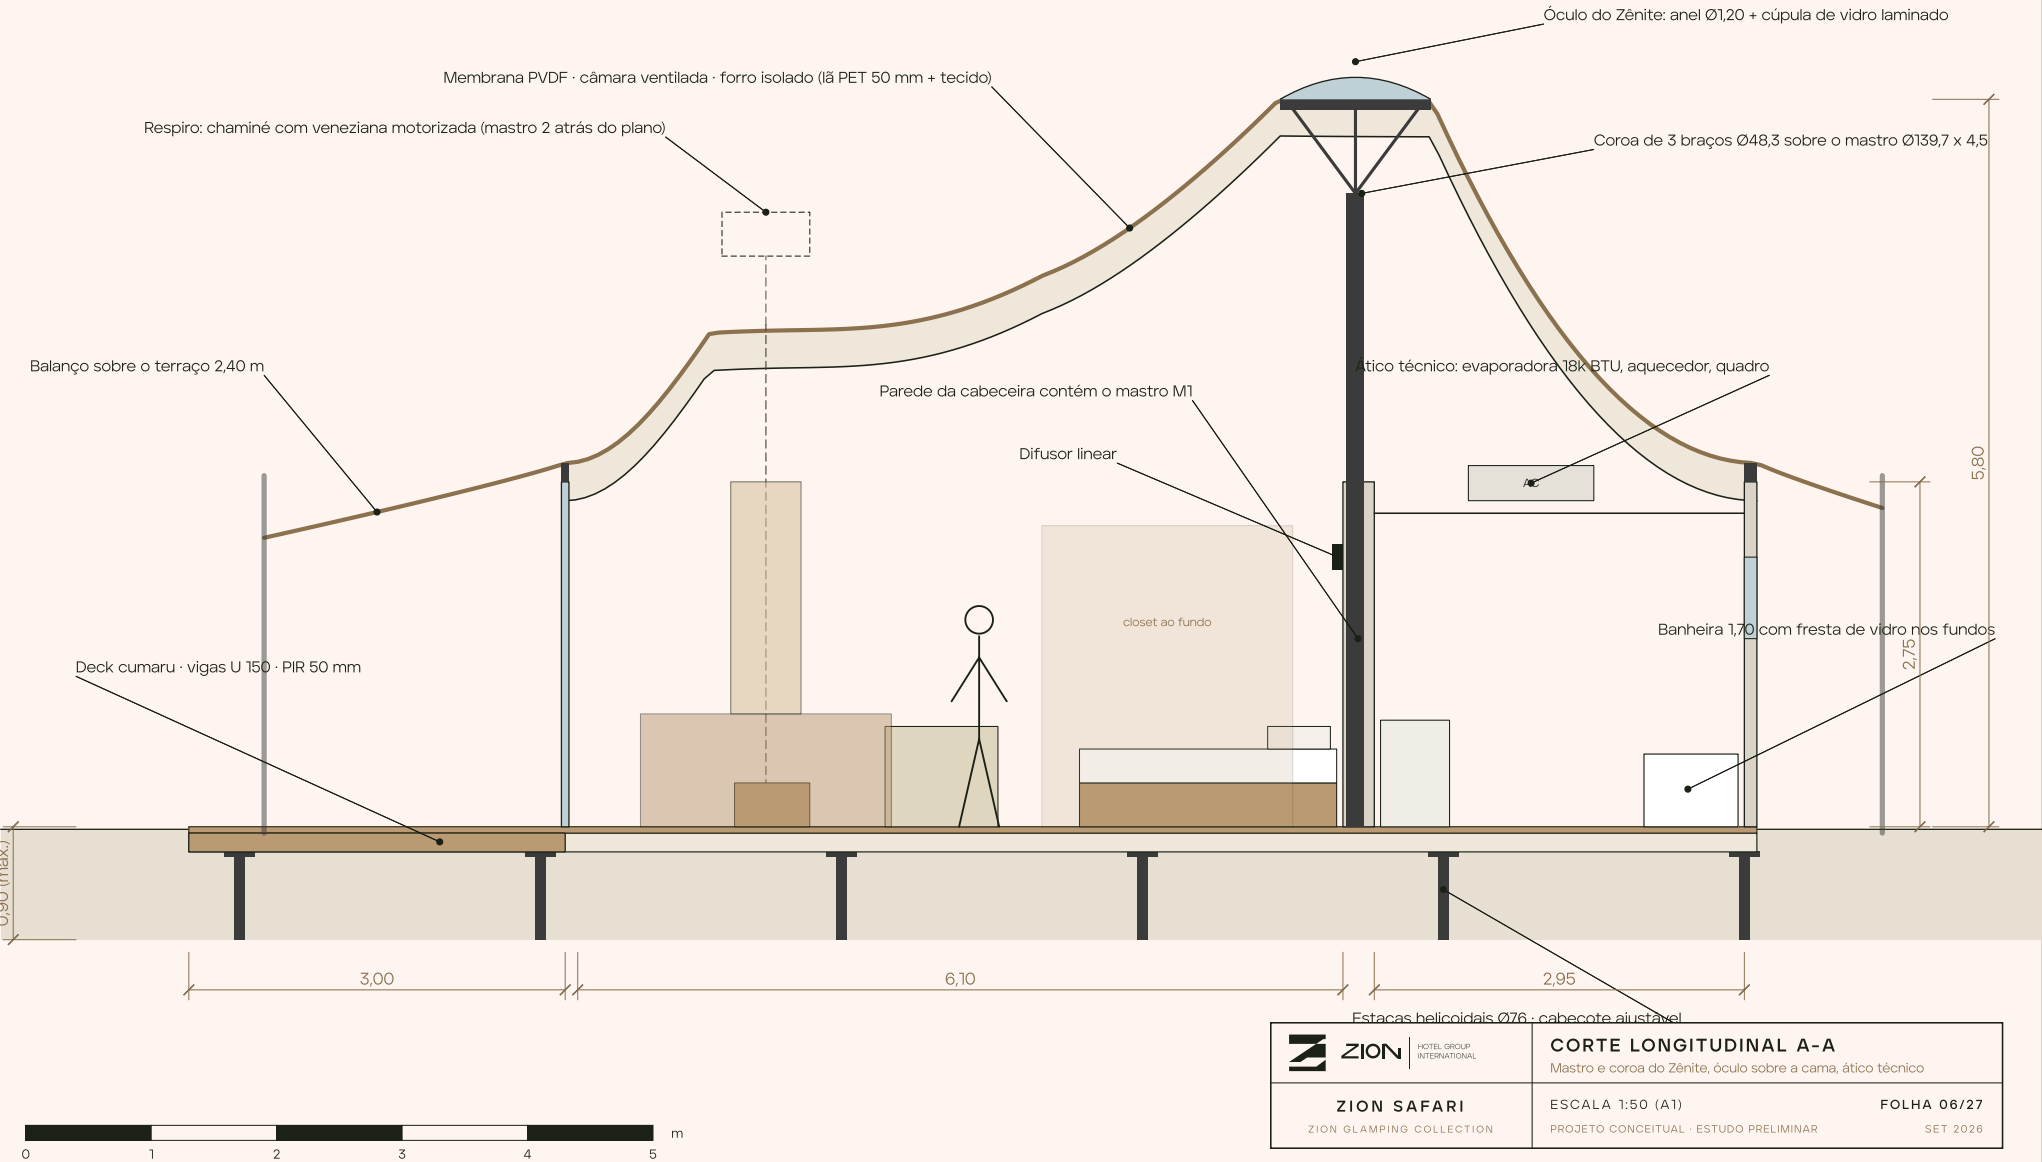

ZION SAFARI · ELEVACÃO FRONTAL
Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m

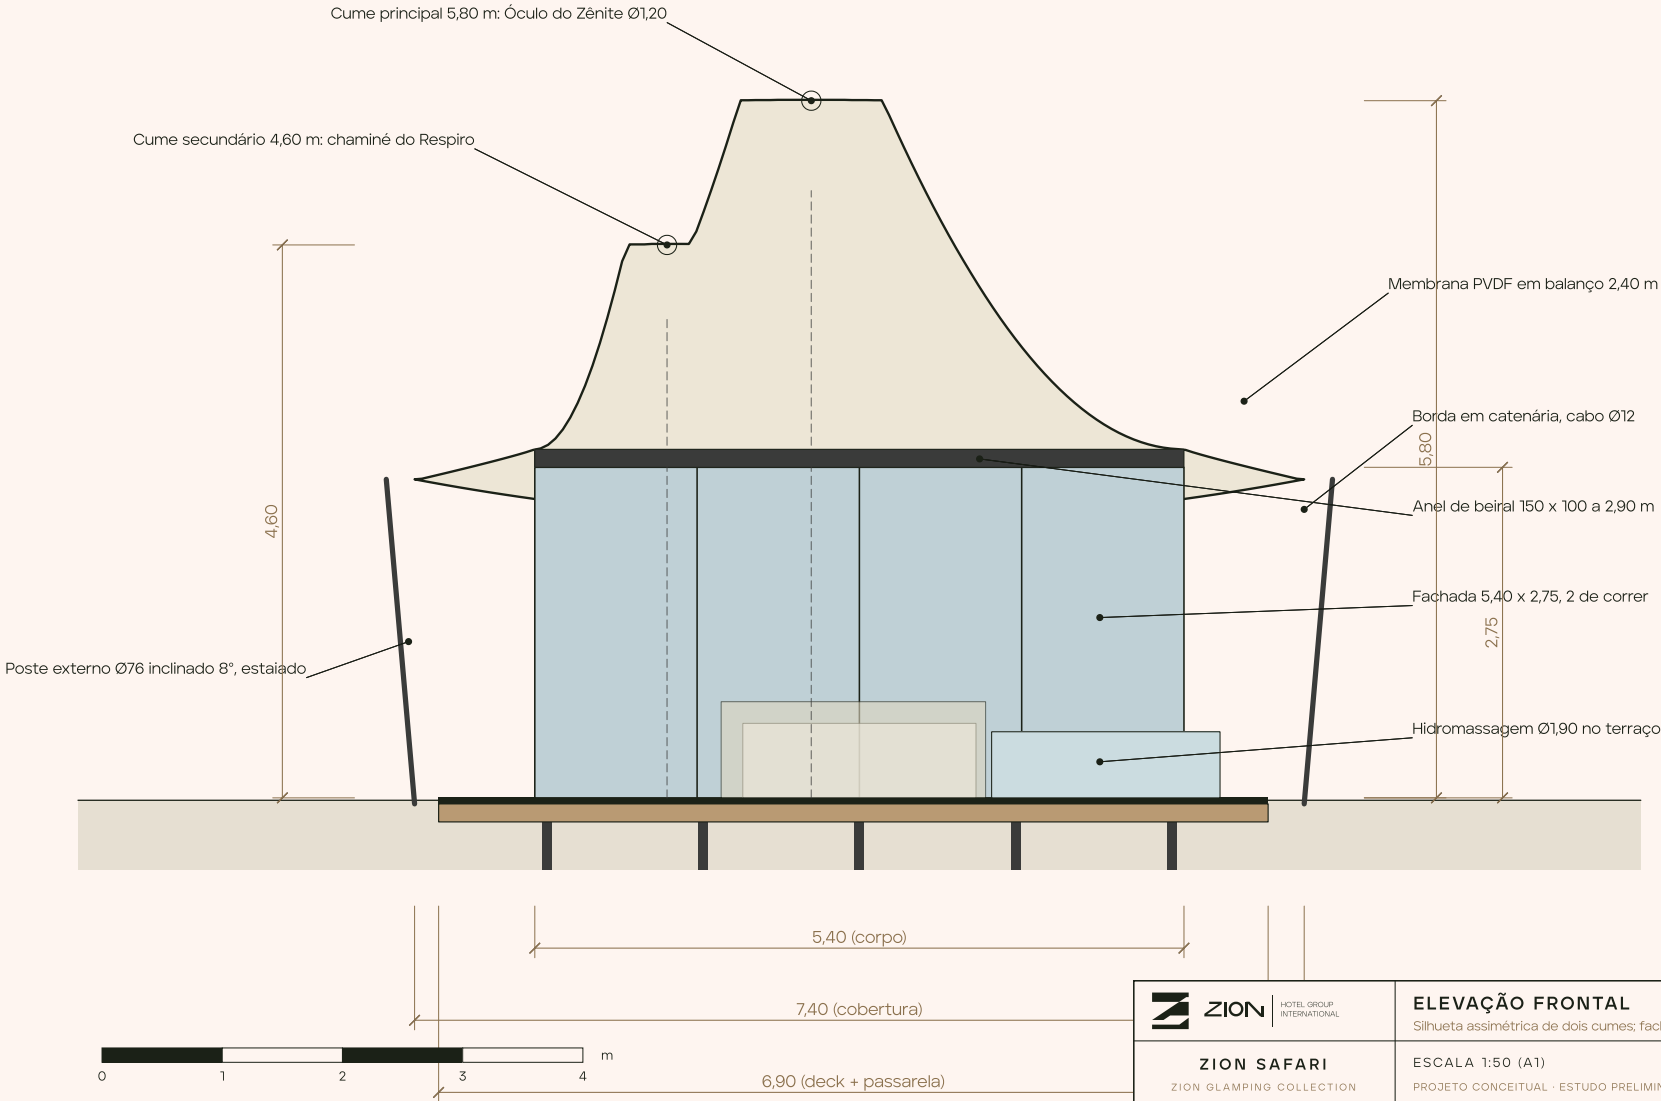

 ZION ZION GLAMPING COLLECTION	HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ELEVACÃO FRONTAL Silhueta assimétrica de dois cumes; fachada de vidro sob o beiral
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 04/27 SET 2026



ZION SAFARI · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos

CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 água fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade


CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminação indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superfície interna

CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade


CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

CAMADA 07
CAMARA DE VENTILACAO

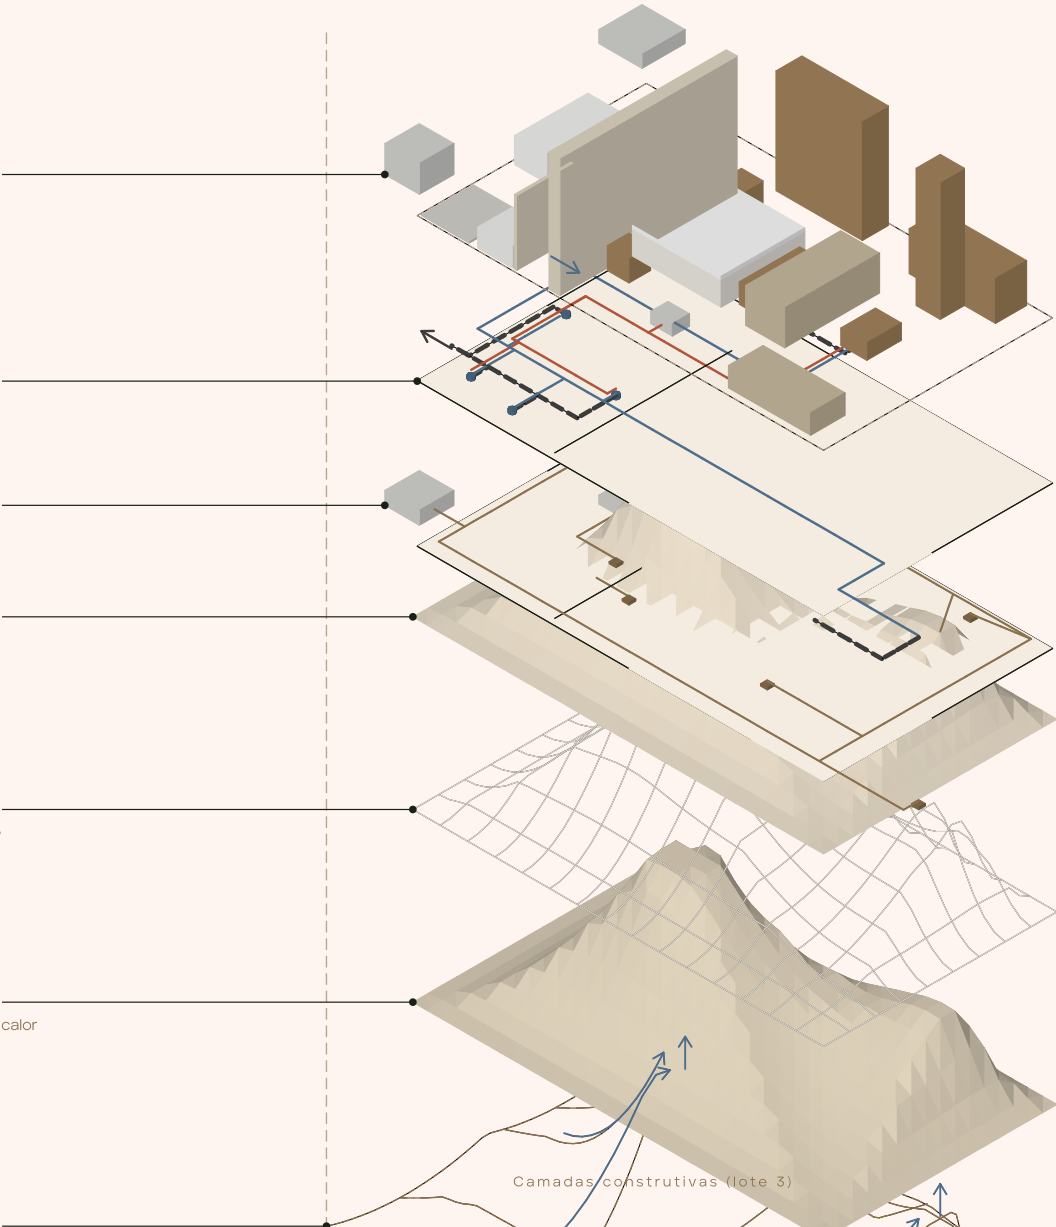

 ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes

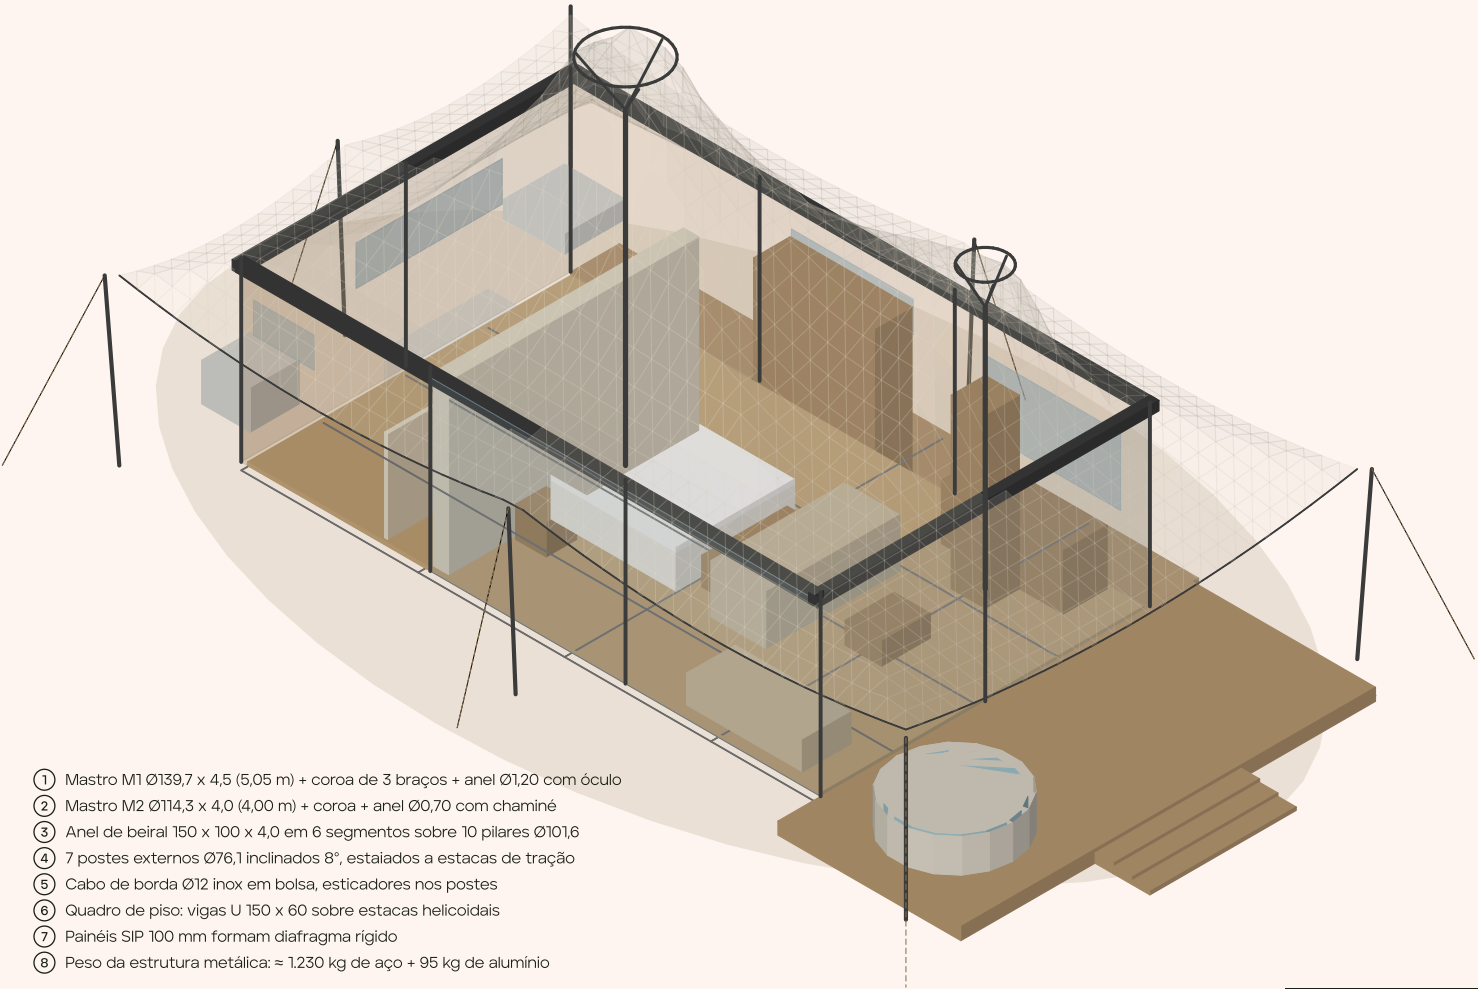


- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 12/27
SET 2026

 ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

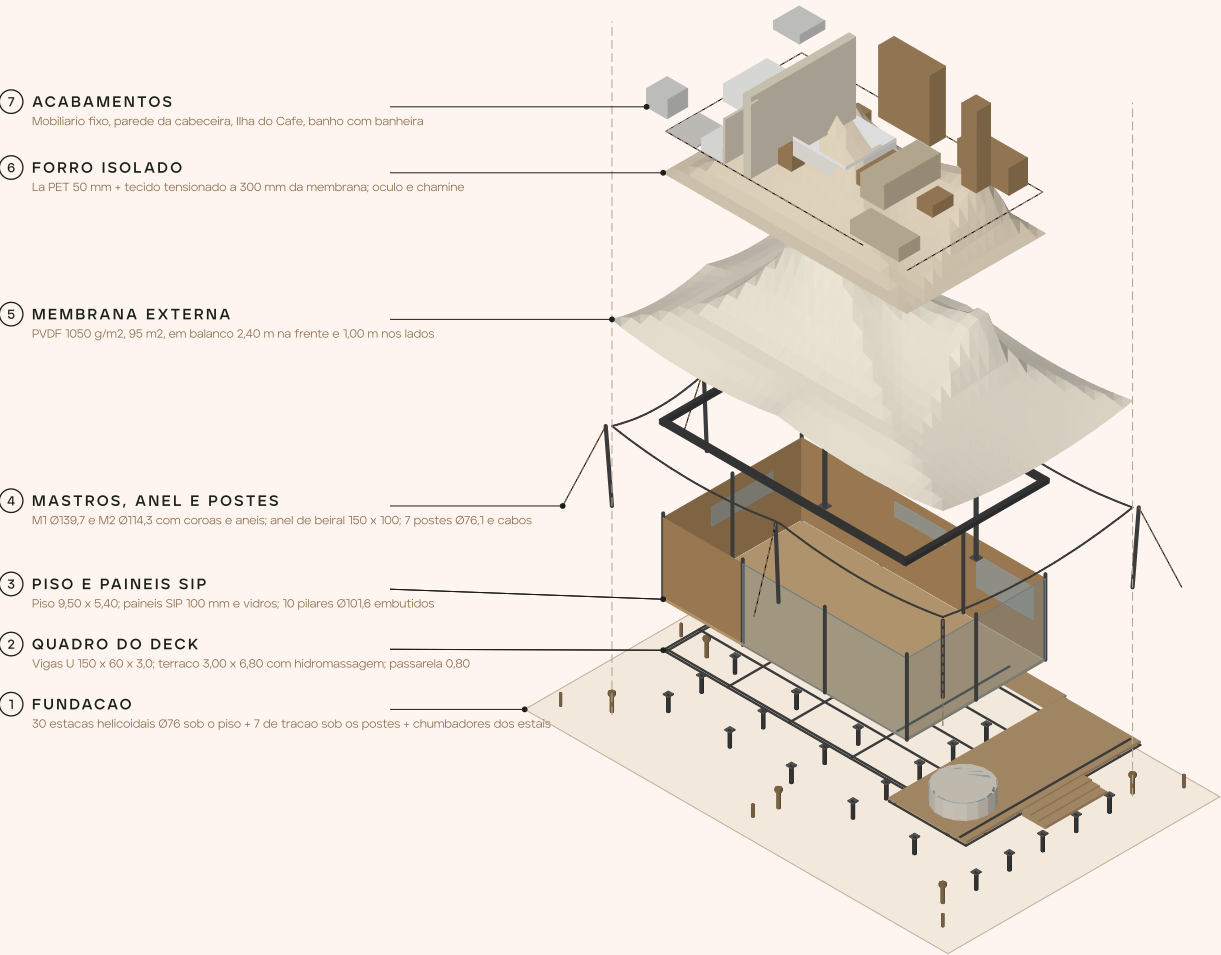

SEQUENCIA DE MONTAGEM

①	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
④	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
③	Vidros	2 dias
⑦	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1230 kg de aco + 95 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 10,8 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para icar os mastros
Postes estalados a 7 estacas de tracao
Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 10/27
SET 2026

MASTROS E COROAS


Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cumeeira, anel de beiral parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION SAFARI | DET-11

ELEVAÇÕES - MASTROS M1 E M2

1:47 (1 mm = 0,08 px)

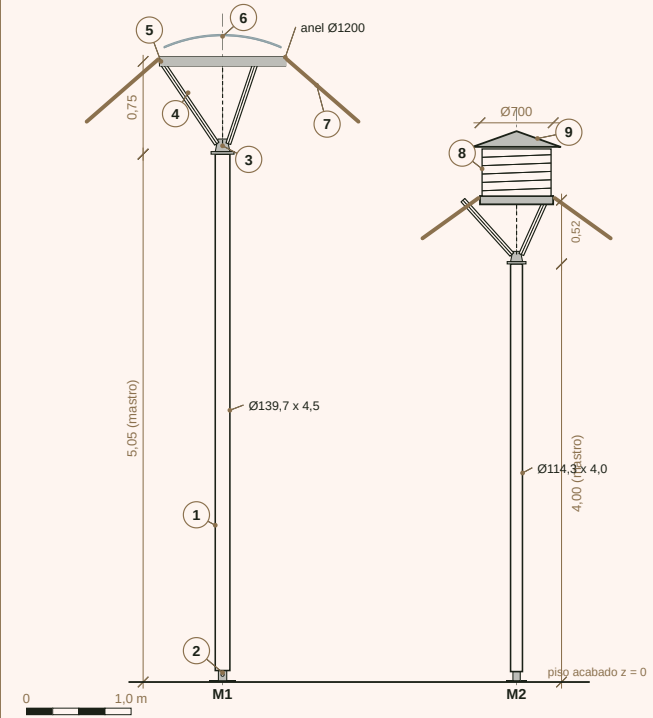

- 1

Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó
- 2

Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30
- 3

Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)
- 4

Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°
- 5

Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200

- 6

Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT
- 7

Membrana deixando o anel a = 41°
- 8


Chaminé do Respiró Ø660 com veneziana motorizada
- 9

Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela
- 10

Orelha central 16 mm soldada à chapa de base


BASE ARTICULADA DO M1

1:5 (1 mm = 0,6 px)

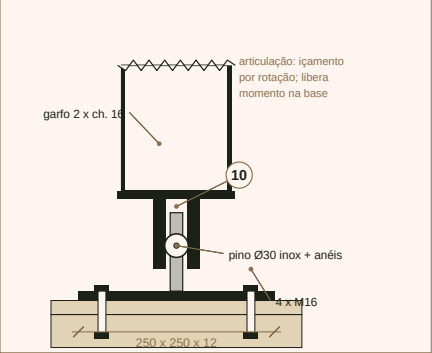

POSTE EXTERNO INCLINADO 8° E ESTAI - GEOMETRIA

1:40 (1 m = 25 px)

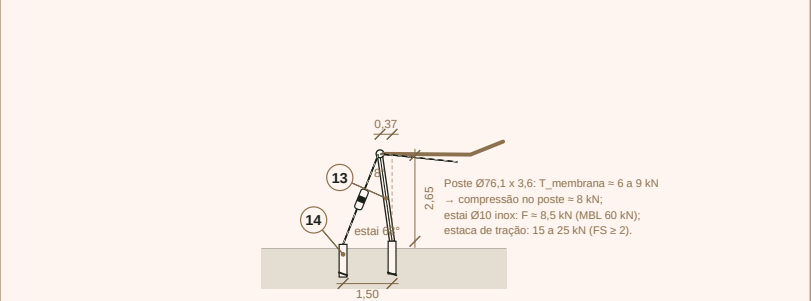

- 11

Emendas do anel de beiral sobre os pilares
- 12


Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)
- 13

Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo
- 14

Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ANEL DE BEIRAL 150 X 100 X 4: SEGMENTOS E EMENDA

1:60 / 1:5

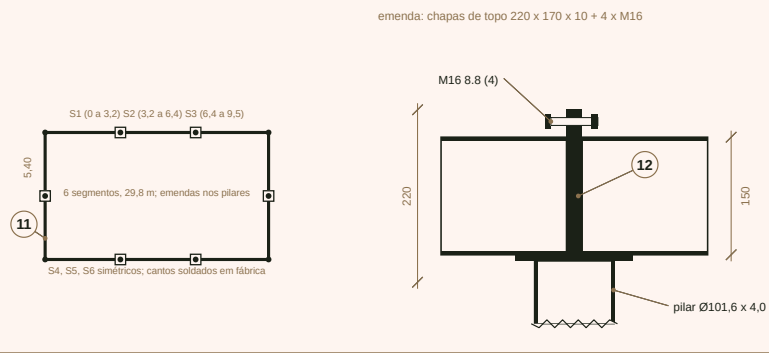

CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS
Vento V0 = 45 m/s, q = 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m² x 95 m² = 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cumeeira (tração radial) → coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão (M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas. M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ = 106, N_{Rd} = 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beiral: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP. Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f ≈ 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) = 38 kN (MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

ZION GLAMPING COLLECTION

MASTROS E COROAS

ZION SAFARI

ESCALA
1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA
DET-11

DATA
SET 2026

 ZION SAFARI · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

6 padrões externos · 4 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF


TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
S1	1	1,38 x 13,05	17,06	Lona Externa
S2	1	1,98 x 13,38	18,05	Lona Externa
S3	1	4,15 x 13,76	20,32	Lona Externa
S4	1	3,11 x 14,66	19,45	Lona Externa
S5	1	3,51 x 13,61	22,33	Lona Externa
S6	1	1,43 x 13,07	17,36	Lona Externa
F1	1	1,73 x 9,79	14,31	Forro
F2	1	3,58 x 10,56	17,41	Forro
F3	1	3,26 x 11,15	16,64	Forro
F4	1	2,69 x 10,35	18,76	Forro

Total lona externa: 114,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 67,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

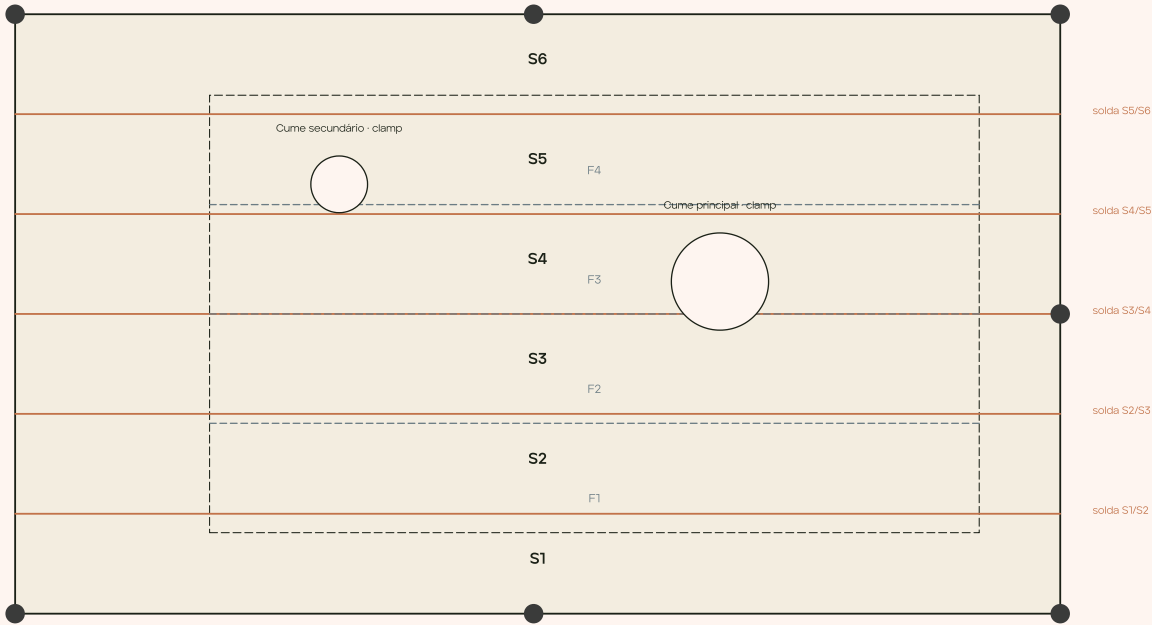


Planta da cobertura · 6 faixas longitudinais soldadas (HF) · perímetro em bolsa de cabo Ø12 com chapas de canto nos 7 postes · forro em 4 faixas sobre o corpo

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-01 SET 2026



ZION SAFARI · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

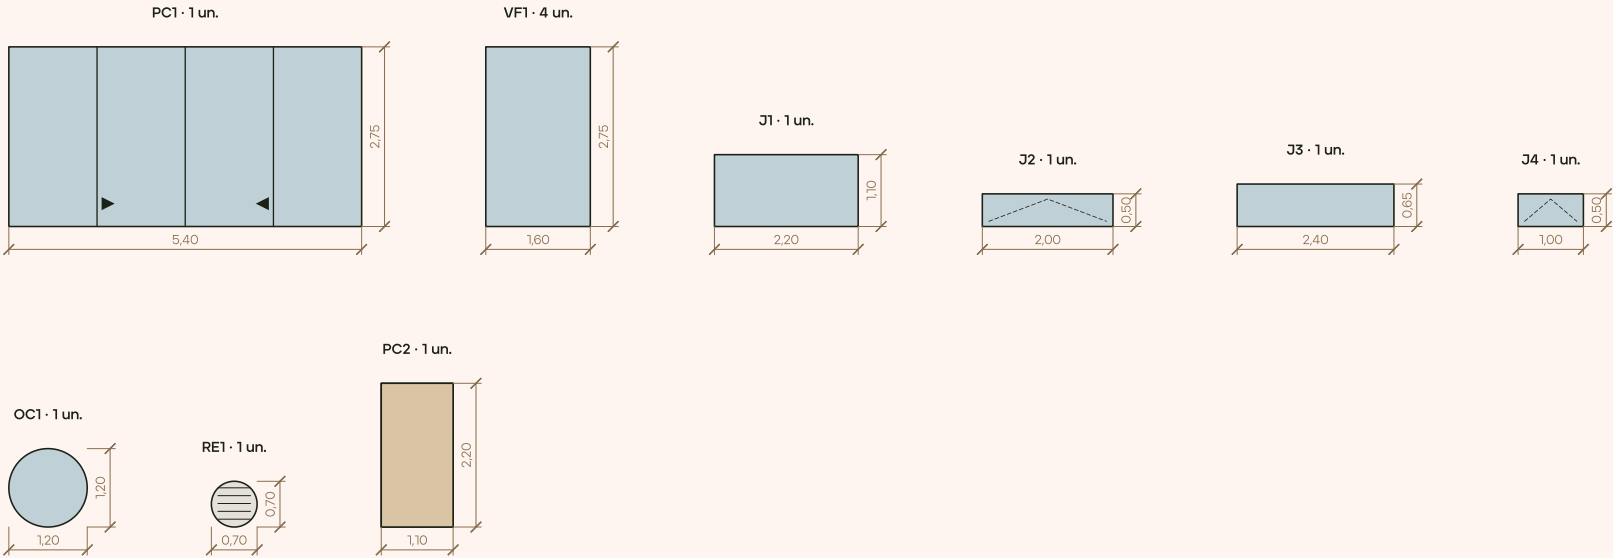

CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40 x 2,75	1	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60 x 2,75	4	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20 x 1,10	1	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00 x 0,50	1	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheira (fixa)	2,40 x 0,65	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00 x 0,50	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20 x 1,20	1	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70 x 0,70	1	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10 x 2,20	1	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

QUADRO DE ESQUADRIAS

9 tipos · 12 unidades

ZION SAFARI

ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA PA-09

SET 2026



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO


Estacas helicoidais, cabecotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

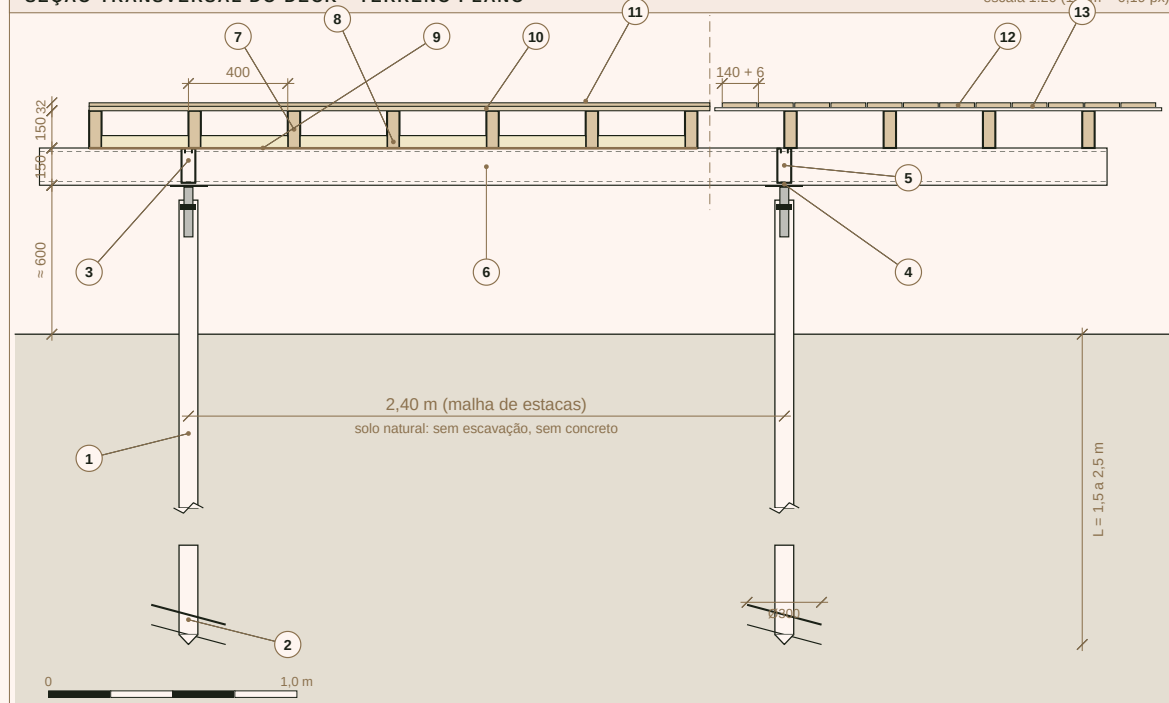

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

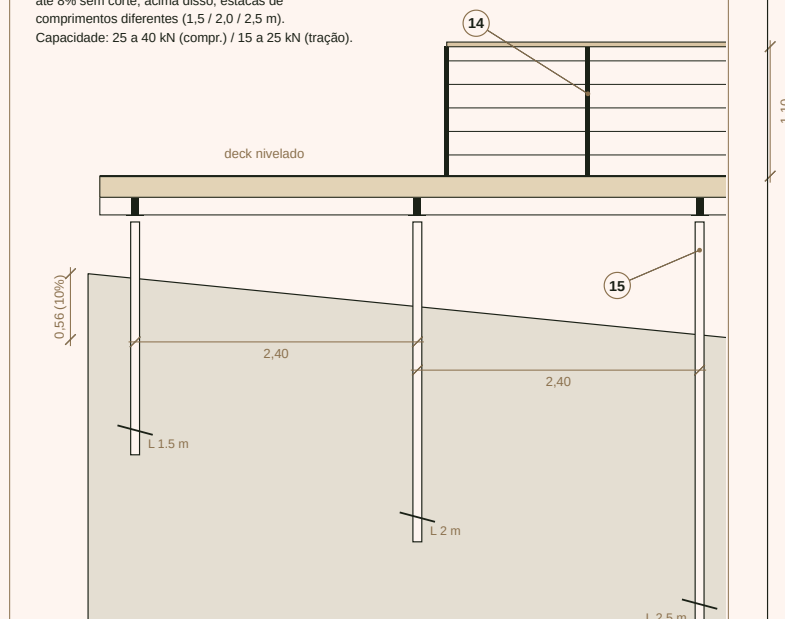

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico | 9 | Manta de fechamento inferior (respirável, anti-odores) grampeada às vigotas |
| 2 | Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem | 10 | Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas |
| 3 | Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento | 11 | Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato |
| 4 | Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U | 12 | Deck externo: cumaru ou termotrata 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta |
| 5 | Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas) | 13 | Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno) |
| 6 | Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari) | 14 | Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira |
| 7 | Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto) | 15 | Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado |
| 8 | Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado | | |



ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

COMO COTAR · O QUE A ZION ENVIA · REGRAS

retorno em 10 dias · validade 30 dias · sem preços de referência

COMO COTAR

1. Cotação por item e total, com prazo de fabricação, validade de 30 dias e impostos destacados; frete até Florianópolis / SC ou ponto de transbordo indicado.
2. Lote 2: preço por kg e por peça, com calandra, solda, galvanização a fogo (NBR 6323) e pintura destacadas; informar raio mínimo da calandra e galvanizador.
3. Lote 3: lona por m2 confeccionado (por painel) + perfis e cabos por metro + instalação por dia de equipe; vidros por pano e esquadrias por unidade, com medição na estrutura montada.
4. Lotes 1 e 4: estacas por ponto + cravação; grelha por kg; deck por m2; marcenaria por peça; FF&E por item.
5. Amostra antes da série: um arco calandrado (lote 2) e um painel soldado com keder (lote 3).

A ZION ENVIA

- Documento completo do lote (PDF) com escopo, interfaces, listas peça a peça e RFQ
- DXF das peças e tabela de geometria dos arcos / caibros / anéis (lote 2)
- Padrões de corte DXF + XLSX e pranchas LN-01 a LN-90 (lote 3)
- Quadro de esquadrias e detalhes DET-01 a DET-13
- Modelo 3D (GLB) e visualizador no navegador

REGRAS E PRAZOS

- Fit test em fábrica de um pórtico / anel completo antes de galvanizar; inspeção Zion antes da expedição
- Tolerâncias: retas ± 2 mm · calandradas ± 5 mm no gabarito · topo montado ± 15 mm
- Lona: compensação e padronagem pelo confeccionista (laudo biaxial); sem rugas após tensionar; teste de água
- Alvo: projeto executivo 3 sem · fabricação 6 sem · fundação 3 sem (paralelo) · montagem 15 dias
-  **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**
