



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION GLAMPING STORE

ZION CASULO

CABANA BIOMÓRFICA EM CASULO ·
TEASER DE COTAÇÃO · ZC-ONE-001 · REV
00 — CONCEITO · 17/09/2026

9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m · 48 m² internos +
30 m² de deck · 2 + 1 hóspedes · montagem em 12 dias. Kit
numerado em 4 lotes: deck e infra · estrutura metálica · lonas,
revestimentos e vidros · mobílias. Este teaser mostra o projeto
(plantas, cortes, camadas, estrutura, lona, esquadrias) e o que
cotar em cada lote.

Sem preços. Projeto preliminar; toda especificação estrutural sujeita a validação
de engenheiro (ART). Os documentos completos de cada lote (ZC-LOT1 a LOT4-
001) acompanham este teaser com listas peça a peça, padrões de corte DXF e
RFQ.



EM NÚMEROS · O QUE CADA LOTE COTA

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

9,60 x 6,00 x 4,20 m	48 + 30 m2	3.610 kg	200 m2	31,5 m2
DIMENSÕES	INTERNO + DECK	AÇO GALVANIZADO	LONA + FORRO	VIDRO
44	12 dias	9 vol · 51 m3	8,7 t	2 + 1
ESTACAS	MONTAGEM	TRANSPORTE	PESO TOTAL	HÓSPEDES

Cabana biomórfica em casulo: estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, lona PVDF tensionada, vidro e madeira sobre deck em estacas helicoidais. Tudo chega em kit numerado (peças ≤ 4,80 m, ≤ 120 kg), sem concreto, sem solda em campo e sem guindaste.


LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA Empreiteiro de estacas helicoidais + montadores + eletricista / encanador 44 estacas helicoidais Ø76 com cabeçote ajustável - Grelha U 150 x 60 galv.: ≈ 2.009 kg - Piso isolado 48 m2 + deck cumaru 30 m2 - Água / esgoto / elétrica (geral 50 A), boiler, condensadora Documento completo: ZC-LOT1-001 (PDF)	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA Serralheria com calandra de tubos, solda MIG/TIG e galvanizador parceiro ≈ 1.602 kg de aço galvanizado em 48 tipos de peça 9 arcos elípticos calandrados Ø60,3 + Espinha e longarinas - Bico: cumeeira Ø114,3, bordas Ø60,3, costela Ø48,3, 2 tirantes Ø12 - Chapas de base, luvas, talões, parafusos 8.8 galvanizados Documento completo: ZC-LOT2-001 (PDF)	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS Confeccionista de lonas / tendas (solda HF) + vidraceiro - Lona externa PVDF tipo II: 12 painéis = 111 m2 (P0 Bico, P1 a P8) - Forro Trevira CS: 8 painéis = 89 m2 - Keder duplo nos arcos, bolsas de tubo, clamps, cabos - Vidros: 13 esquadrias = 31,5 m2 (fachada, Espinha, 6 Olhos, porta) Documento completo: ZC-LOT3-001 (PDF)	LOTE 4 · MOBÍLIAS Marcenaria + fornecedores de FF&E 8 peças de marcenaria acoplada (MA-01 mini cozinha 2,00 m a MA-08) 50 itens de FF&E (mobiliário, luminárias, têxteis, equipamentos) - Módulos ≤ 0,95 x 2,10 m e ≤ 60 kg Documento completo: ZC-LOT4-001 (PDF)
---	--	---	---

RENDERS

modelo 3D paramétrico do projeto · materiais e luz de estudo




FACHADA E DECK

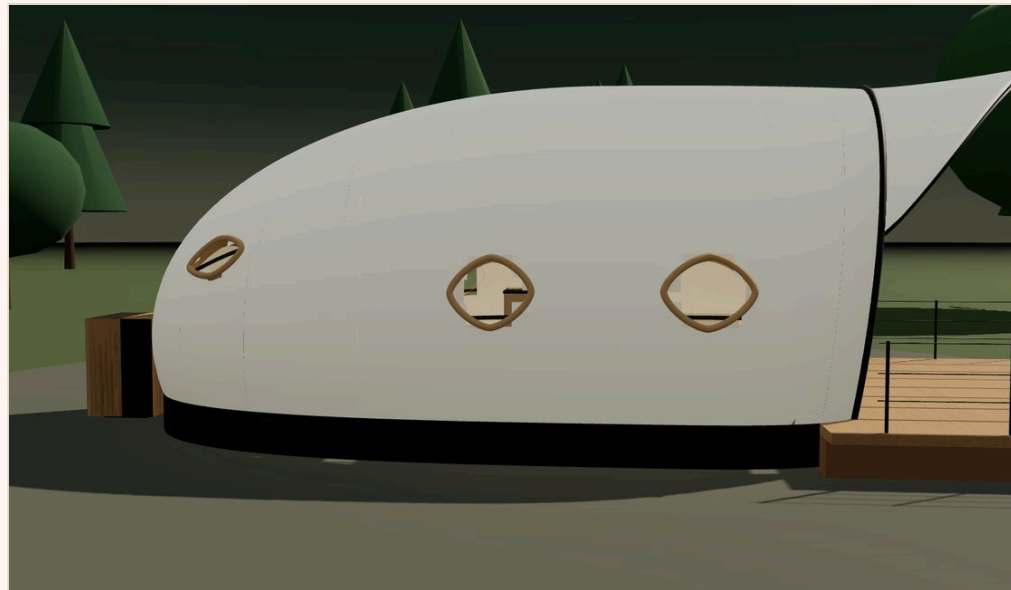

LATERAL




NOITE

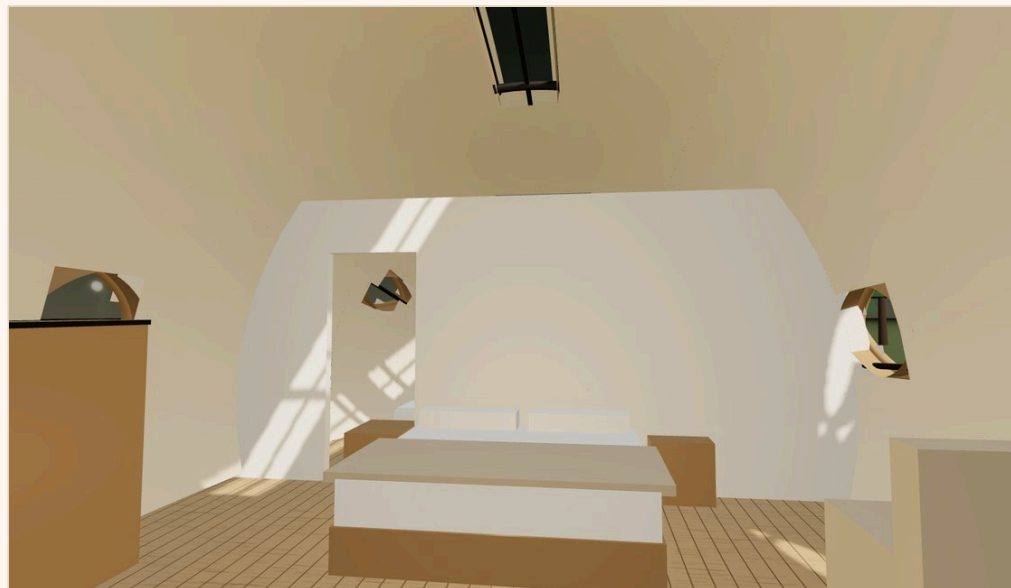

INTERIOR · ESTAR


ZION CASULO · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · bico em balanço 2,40 m · piso interno 45,6 m2 + vestíbulo 2,4 m2 = 48 m2 · deck 29,9 m2 · total 78 m2

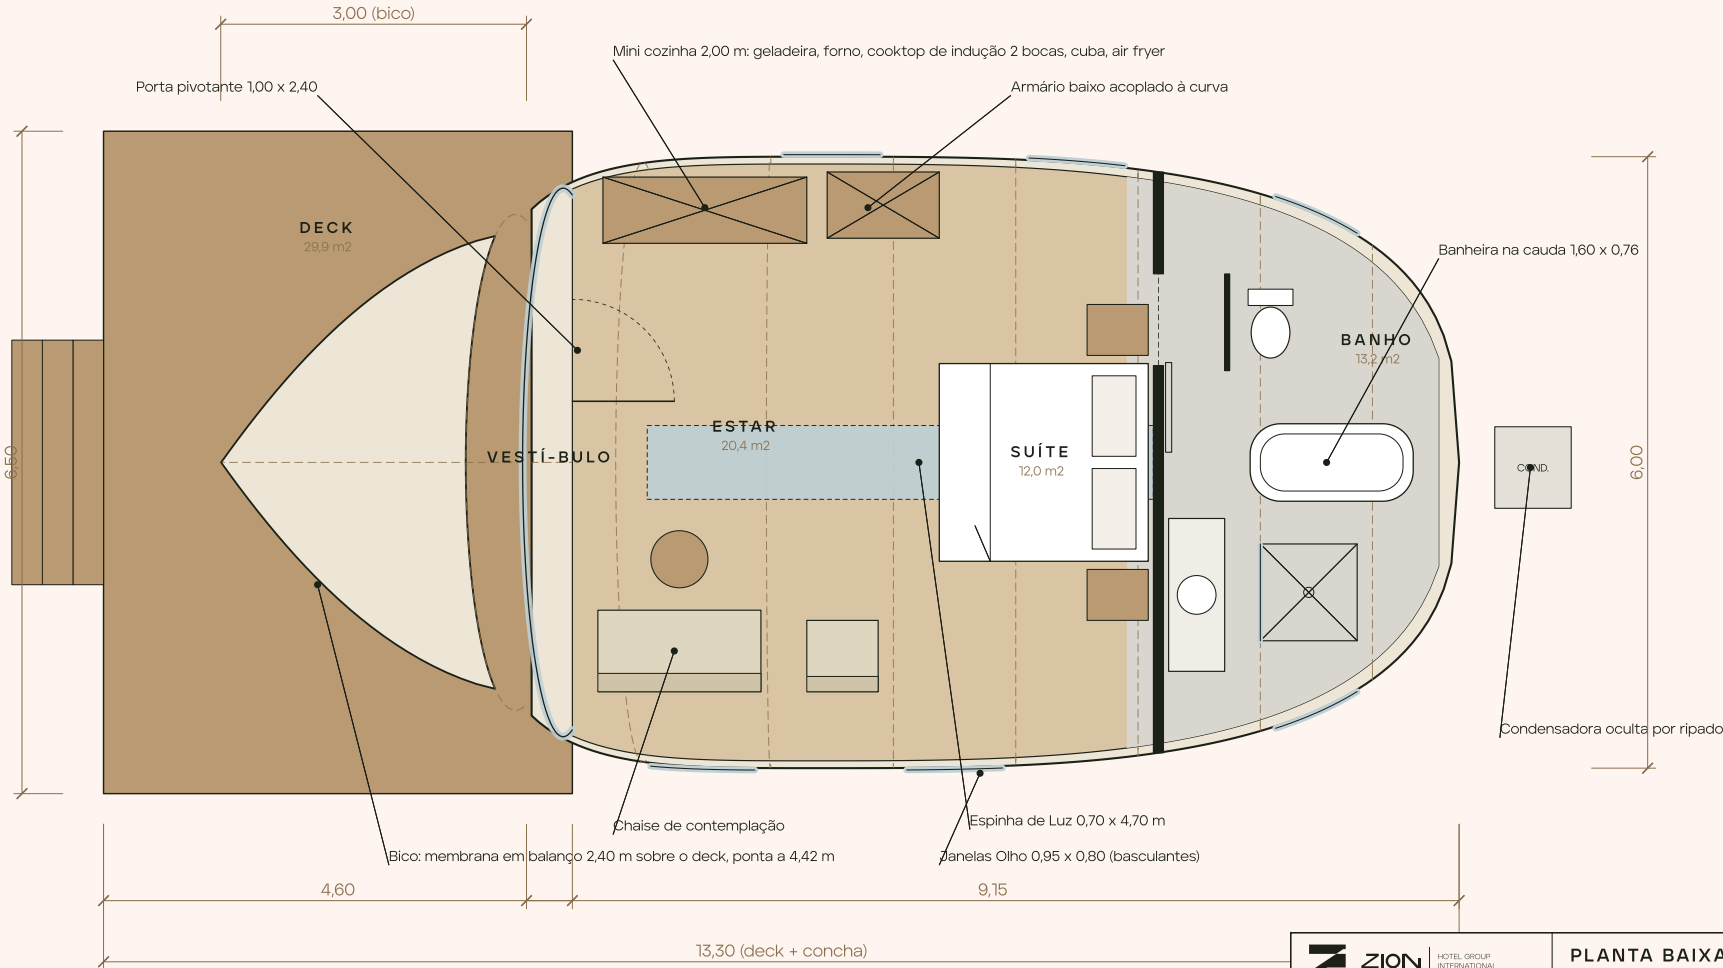


ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Layout: vestibulo, estar, suite king, banho com banheira na cauda	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	FOLHA 02/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

ZION CASULO · CORTE LONGITUDINAL A-A
Plano y = 0 (eixo) · olhar para +y · envelope: membrana + câmara ventilada + isolamento + forro

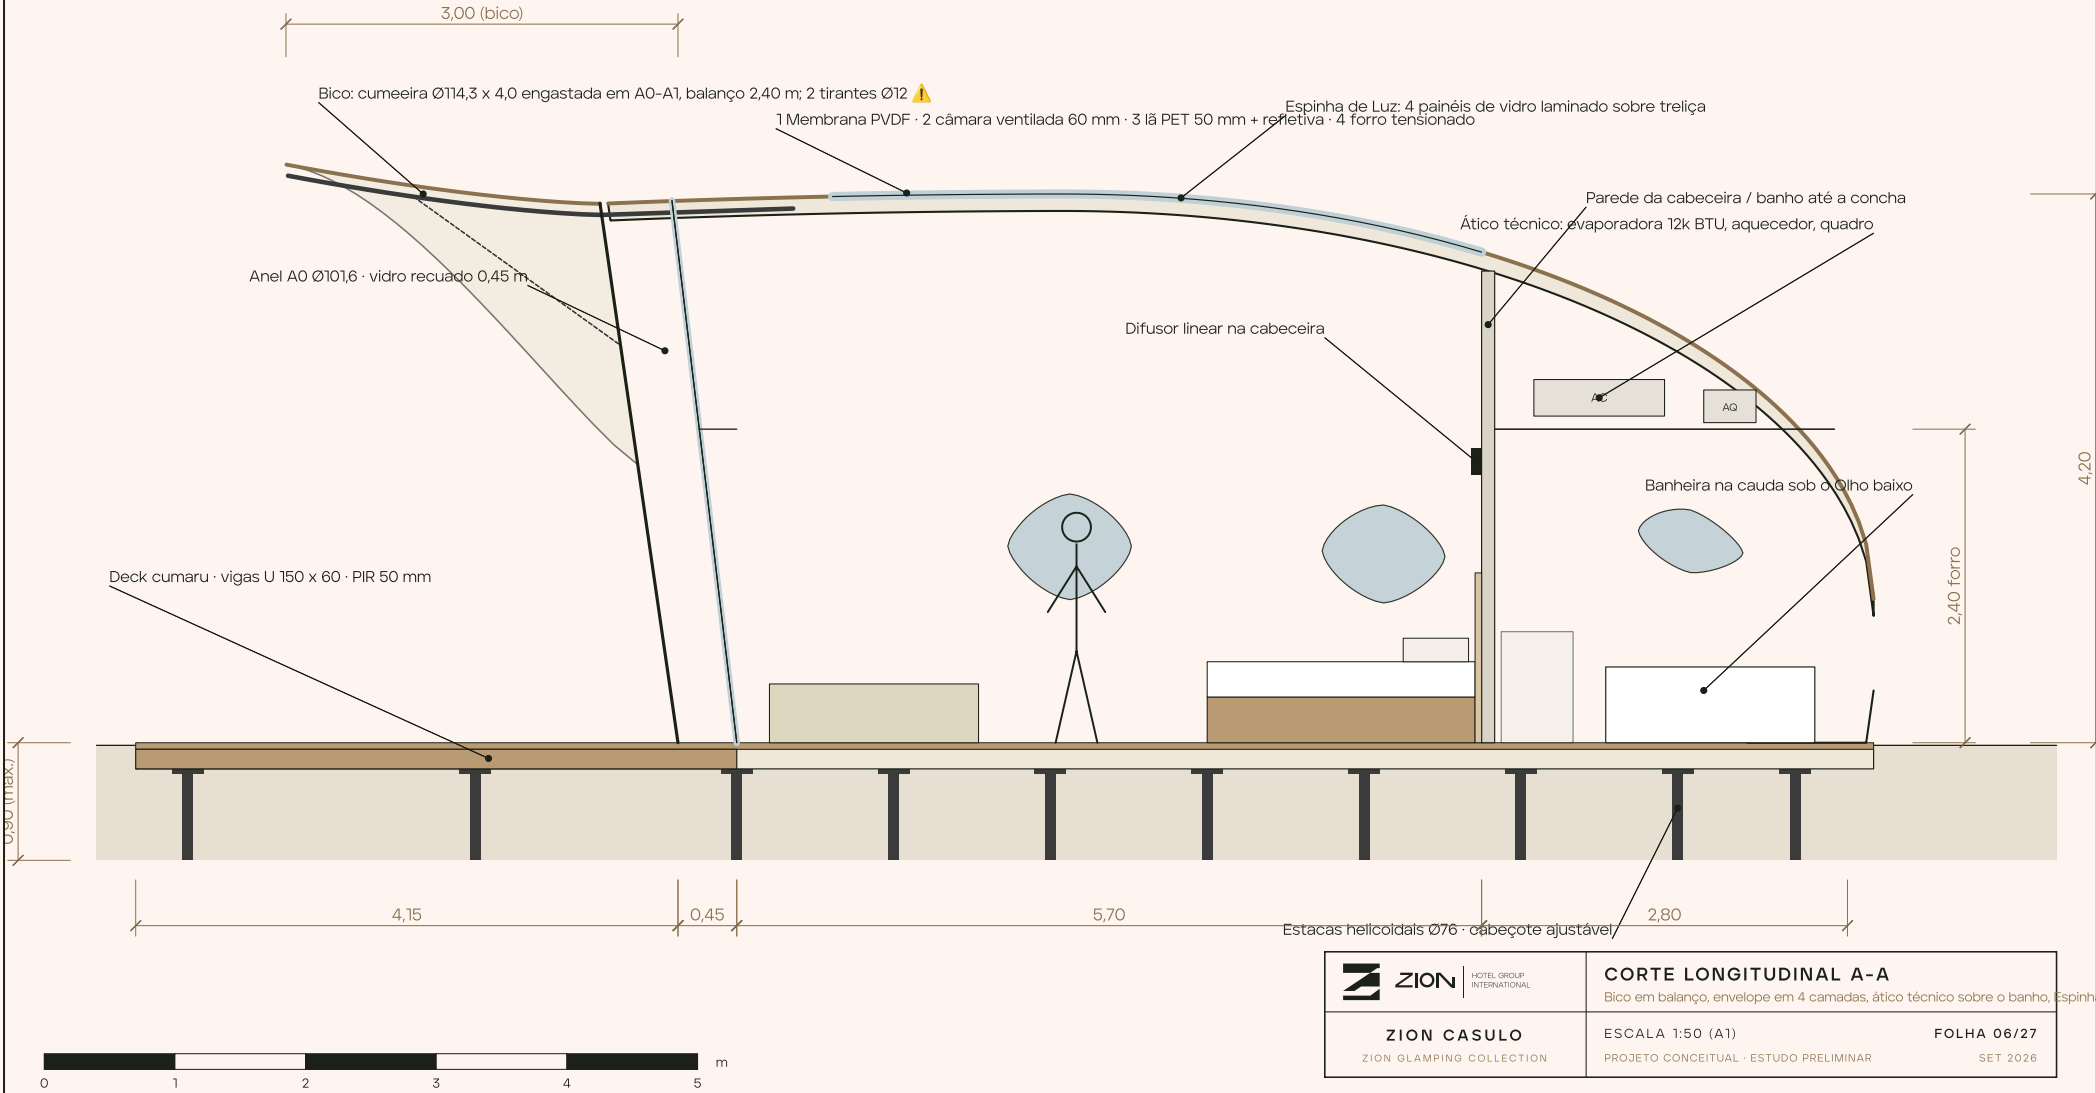

ZION CASULO · ELEVAÇÃO FRONTAL
Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · largura 6,00 m · altura 4,20 m

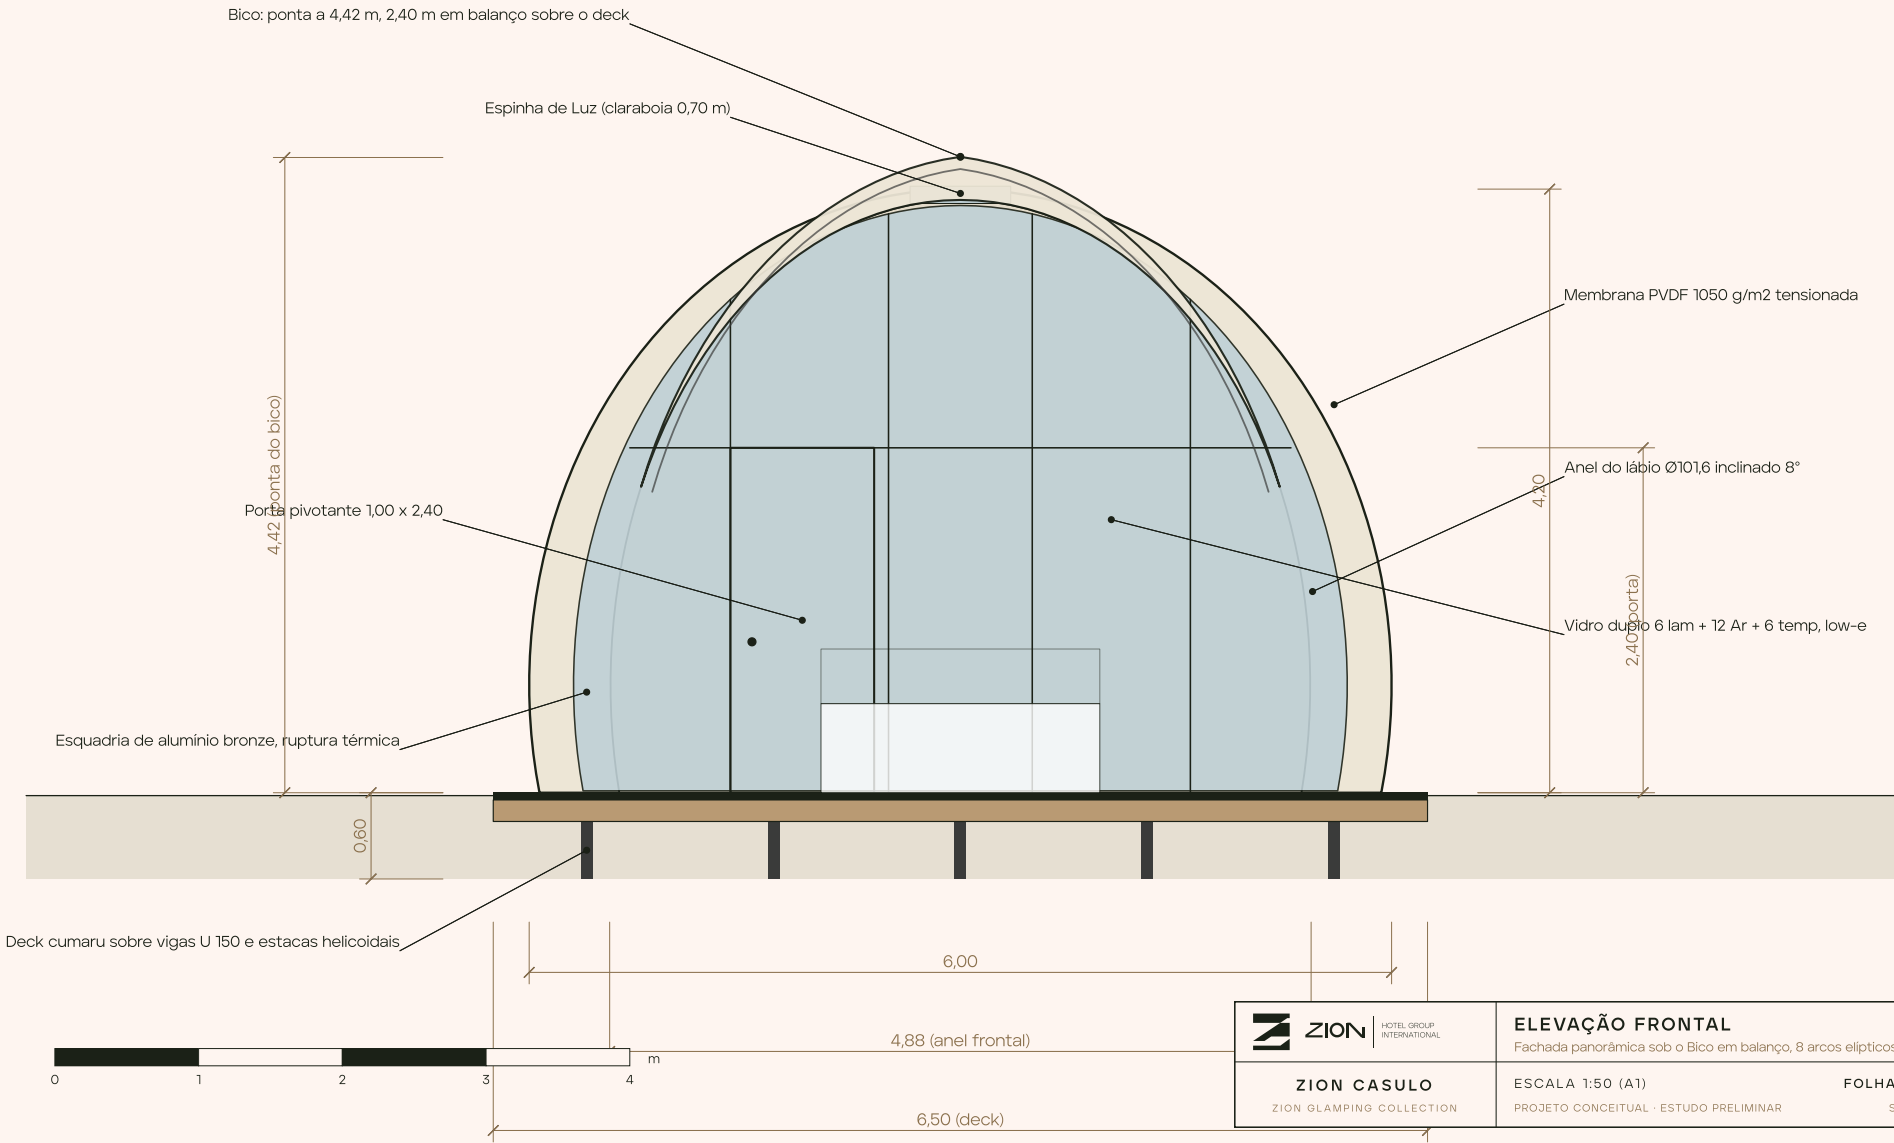



ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 água fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminação indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superfície interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

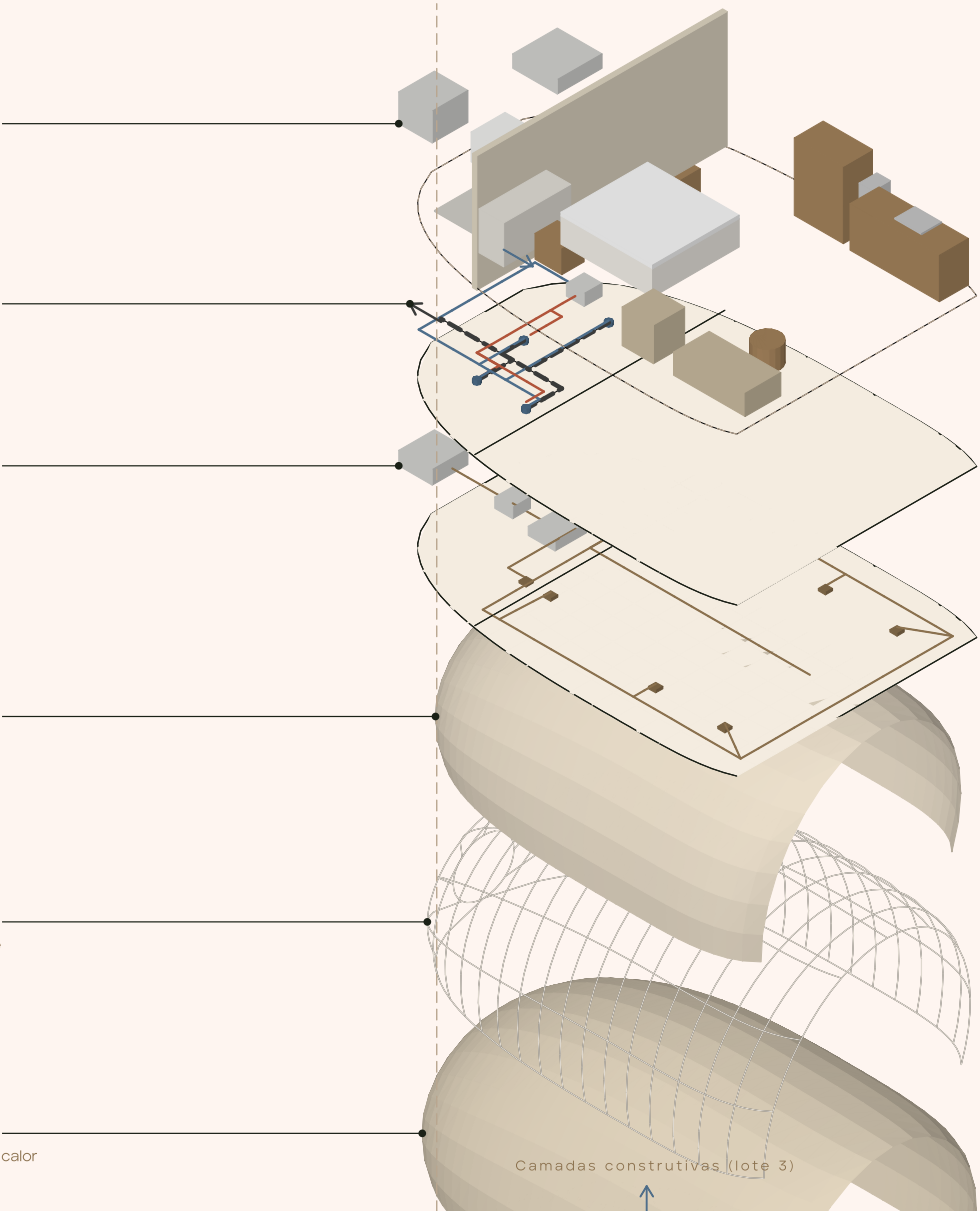

 ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha

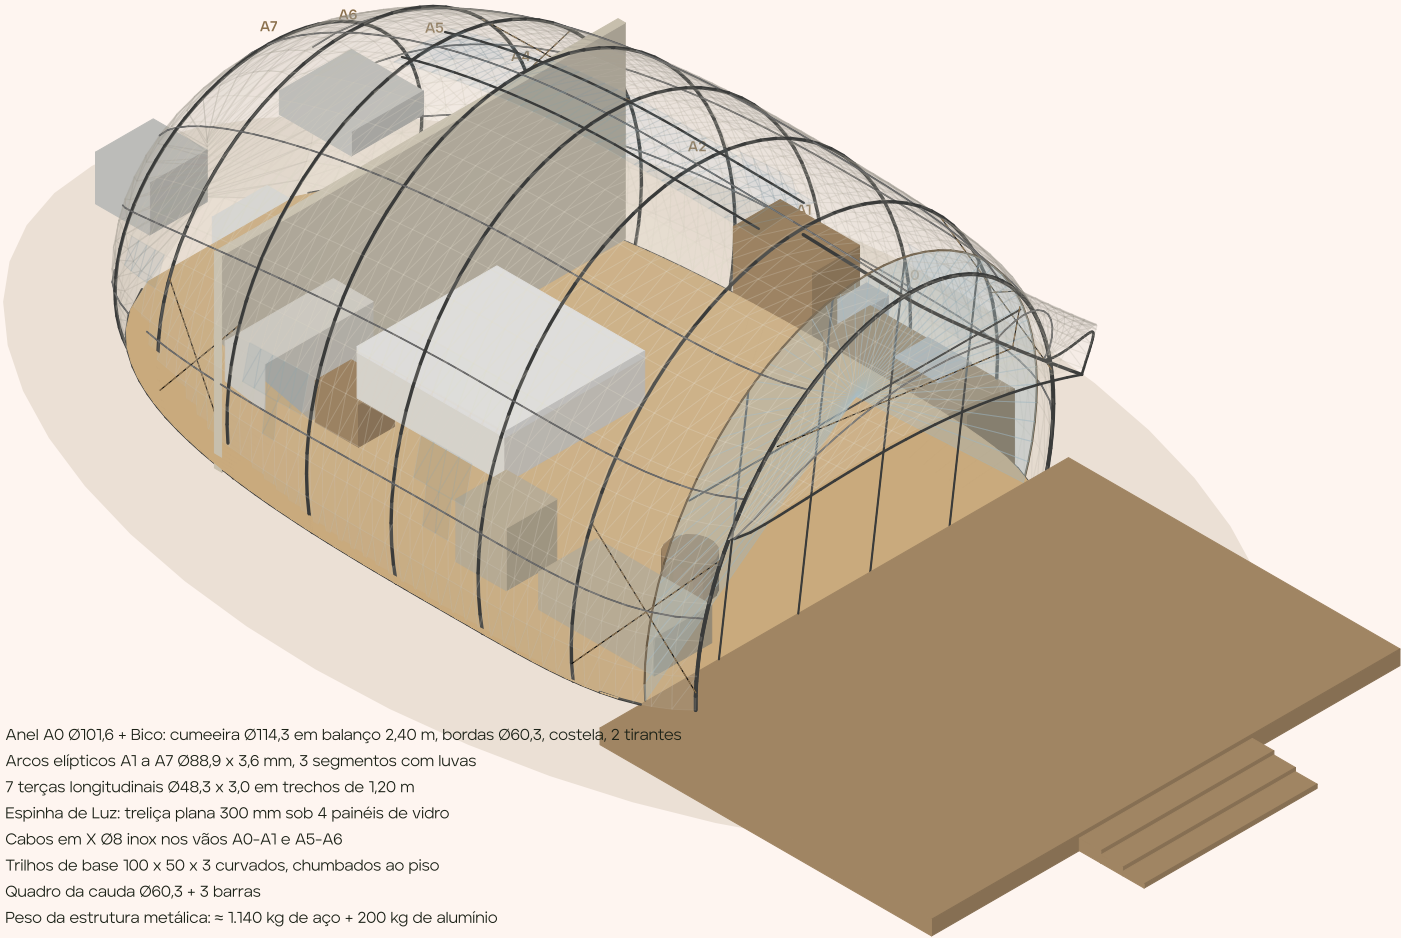


- ① Anel A0 Ø101,6 + Bico: cumeeira Ø114,3 em balanço 2,40 m, bordas Ø60,3, costela, 2 tirantes
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

 ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

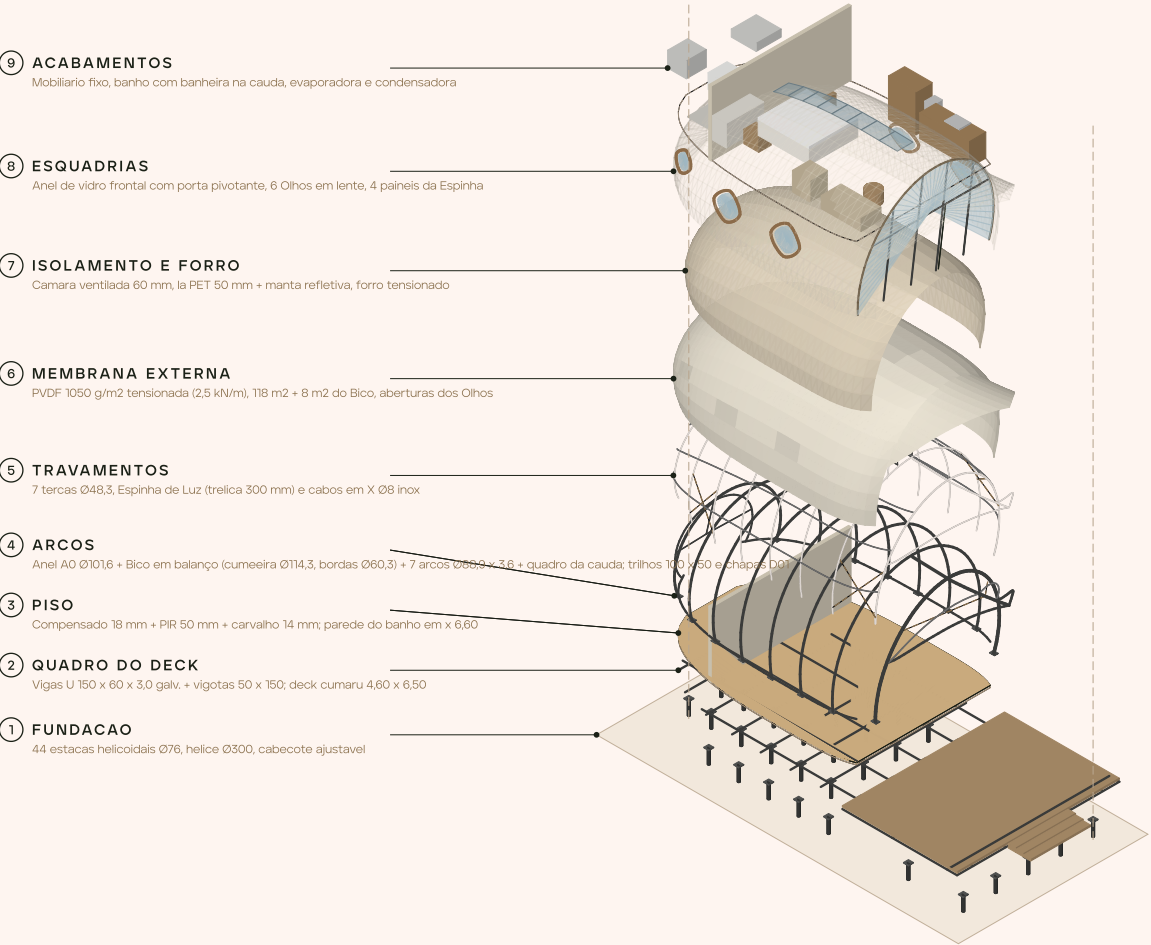

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 10/27 SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

ELEVAÇÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (1 m = 95 px)

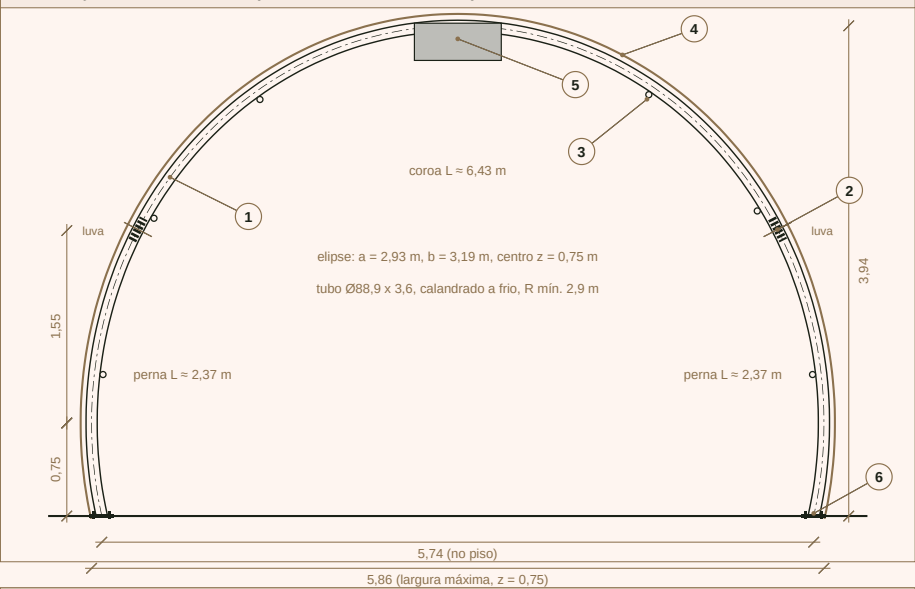



TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.
Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

DETALHES - LUVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (1 mm = 0,8 px)

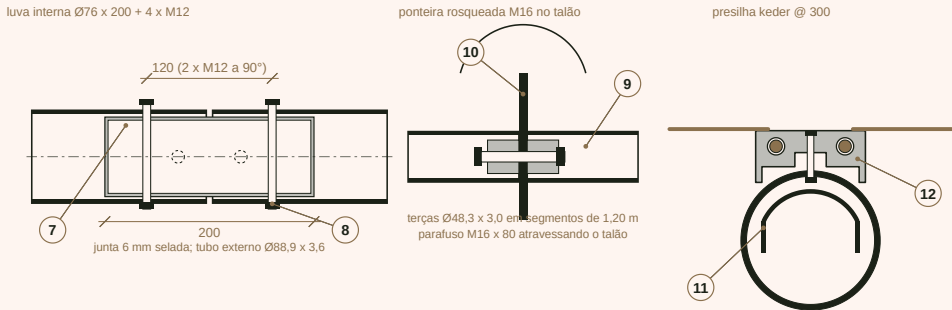

CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural

- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

ZION GLAMPING COLLECTION
SISTEMA DE ARCOS
ZION CASULO

ESCALA
1:40 / 1:5 / sem escala


FOLHA
DET-10

DATA
SET 2026



ZION CASULO · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

12 padrões externos · 8 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

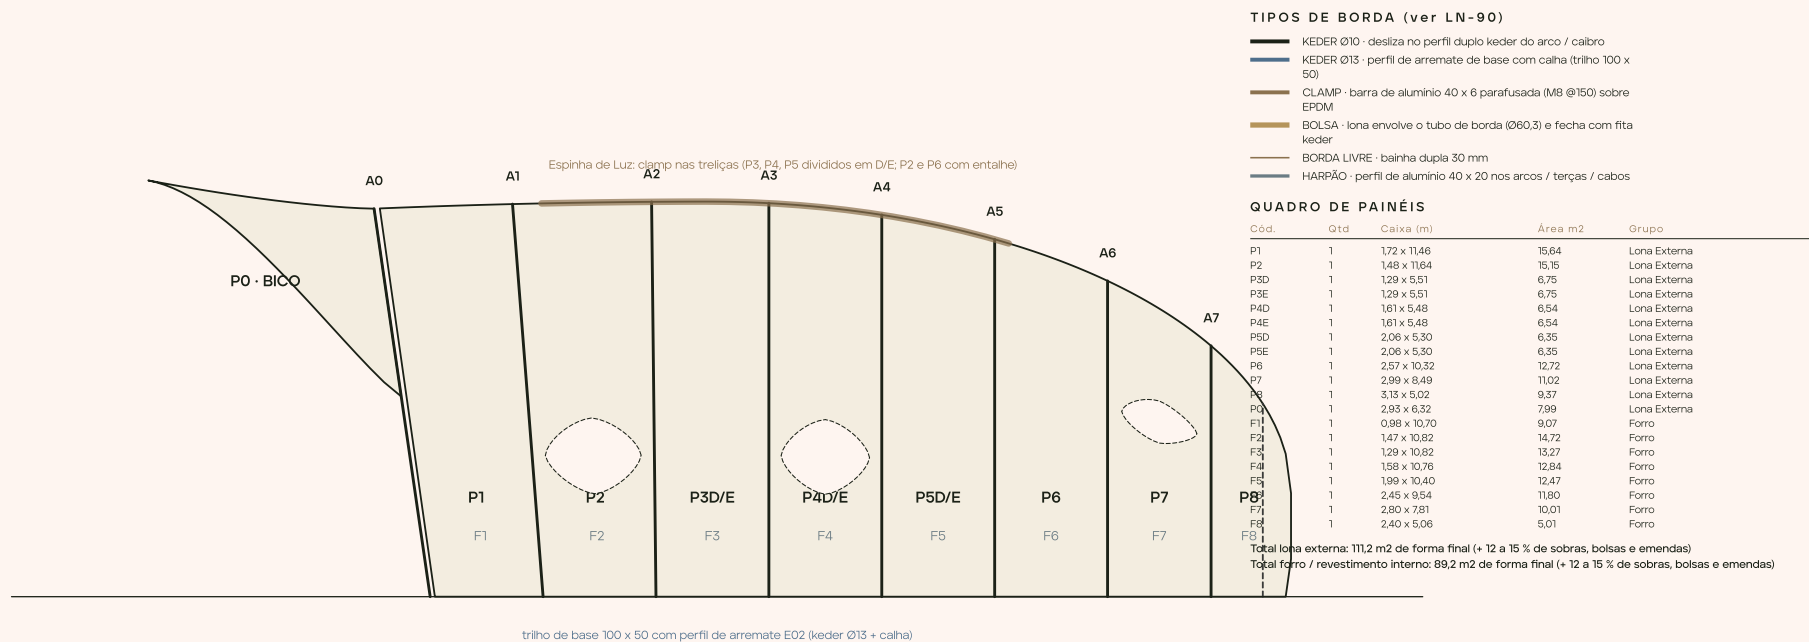


Vista lateral direita · costuras sobre os arcos A0 a A7 (perfil duplo keder) · painéis externos P0 a P8 · forros F1 a F8 (harpão)

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-01 SET 2026

 ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

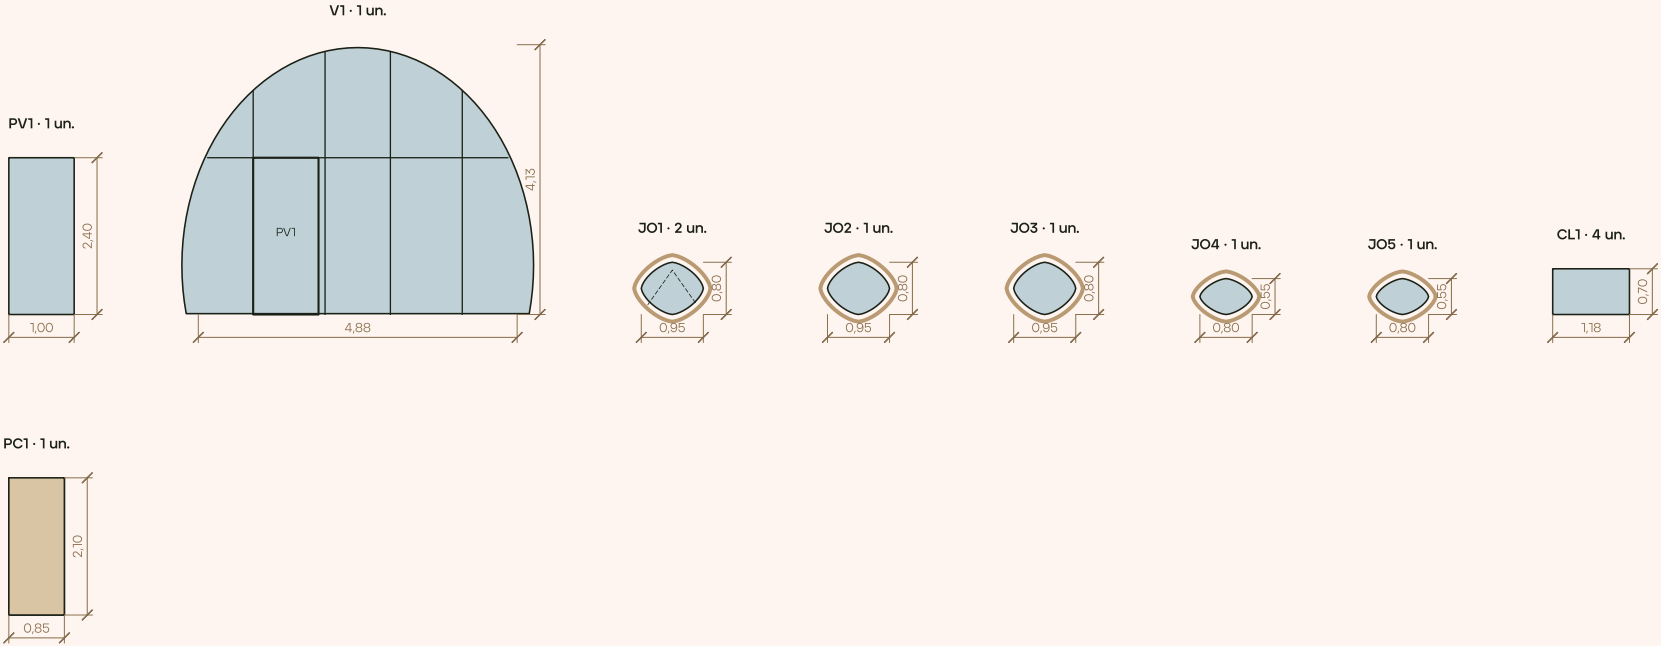

CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95 x 0,80	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suite dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Suite esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banheiro fixo (alto)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banheiro	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 13 unidades
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026


FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO


escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

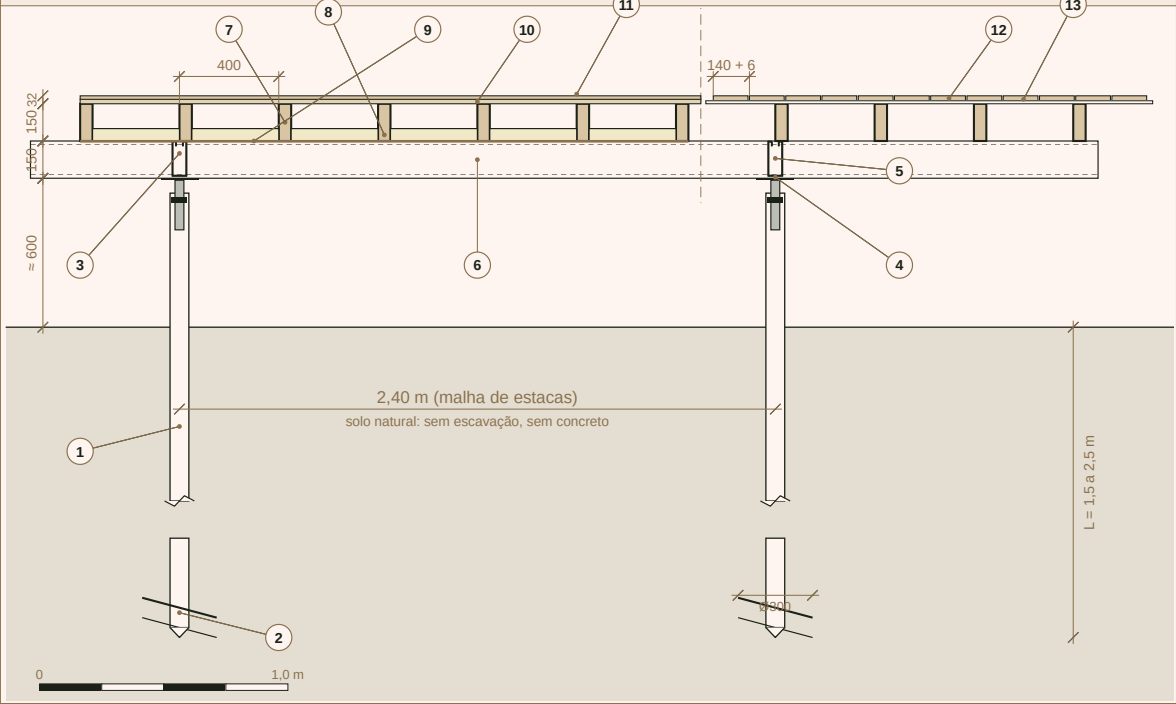

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

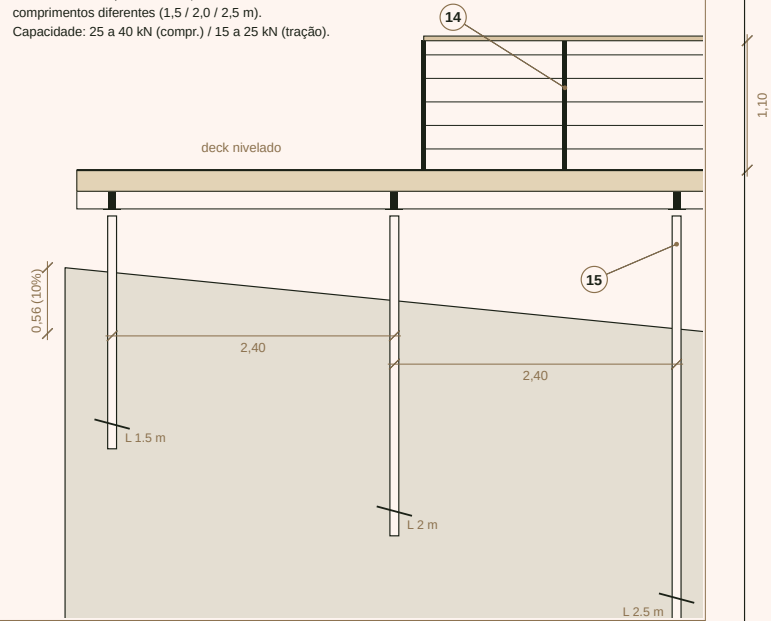

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

COMO COTAR · O QUE A ZION ENVIA · REGRAS

retorno em 10 dias · validade 30 dias · sem preços de referência

COMO COTAR

1. Cotação por item e total, com prazo de fabricação, validade de 30 dias e impostos destacados; frete até Florianópolis / SC ou ponto de transbordo indicado.
2. Lote 2: preço por kg e por peça, com calandra, solda, galvanização a fogo (NBR 6323) e pintura destacadas; informar raio mínimo da calandra e galvanizador.
3. Lote 3: lona por m2 confeccionado (por painel) + perfis e cabos por metro + instalação por dia de equipe; vidros por pano e esquadrias por unidade, com medição na estrutura montada.
4. Lotes 1 e 4: estacas por ponto + cravação; grelha por kg; deck por m2; marcenaria por peça; FF&E por item.
5. Amostra antes da série: um arco calandrado (lote 2) e um painel soldado com keder (lote 3).

A ZION ENVIA

- Documento completo do lote (PDF) com escopo, interfaces, listas peça a peça e RFQ
- DXF das peças e tabela de geometria dos arcos / caibros / anéis (lote 2)
- Padrões de corte DXF + XLSX e pranchas LN-01 a LN-90 (lote 3)
- Quadro de esquadrias e detalhes DET-01 a DET-13
- Modelo 3D (GLB) e visualizador no navegador

REGRAS E PRAZOS

- Fit test em fábrica de um pórtico / anel completo antes de galvanizar; inspeção Zion antes da expedição
- Tolerâncias: retas ± 2 mm · calandradas ± 5 mm no gabarito · topo montado ± 15 mm
- Lona: compensação e padronagem pelo confeccionista (laudo biaxial); sem rugas após tensionar; teste de água
- Alvo: projeto executivo 3 sem · fabricação 6 sem · fundação 3 sem (paralelo) · montagem 12 dias
-  **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**
