


ZION CÁPSULA

CÁPSULA MONOCOQUE TRANSPORTÁVEL ·
TEASER DE COTAÇÃO · ZK-ONE-001 · REV
00 — CONCEITO · 17/09/2026

8,40 x 3,20 x 3,20 m · 20 m² internos + 8 m² de deck · 2 hóspedes
· montagem em 3 dias. Kit numerado em 4 lotes: deck e infra ·
estrutura metálica · lonas, revestimentos e vidros · mobílias. Este
teaser mostra o projeto (plantas, cortes, camadas, estrutura,
lona, esquadrias) e o que cotar em cada lote.

Sem preços. Projeto preliminar; toda especificação estrutural sujeita a validação
de engenheiro (ART). Os documentos completos de cada lote (ZK-LOT1 a LOT4-
001) acompanham este teaser com listas peça a peça, padrões de corte DXF e
RFQ.

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA
Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala

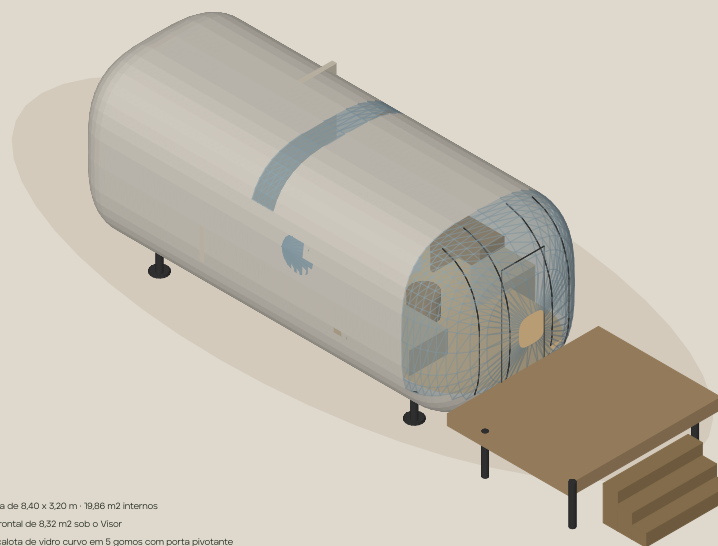

- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m² internos
- ② Deck frontal de 8,32 m² sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 08/CP SET 2026

EM NÚMEROS · O QUE CADA LOTE COTA

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m



8,40 x 3,20 x 3,20 m	20 + 8 m2	≈ 4.200 kg	155 m2	14,3 m2
DIMENSÕES	INTERNO + DECK	CASCO COMPLETO	ACM + INTERNO	VIDRO
4	3 dias	4 vol · 89 m3	5,3 t	2
ESTACAS	MONTAGEM	TRANSPORTE	PESO TOTAL	HÓSPEDES

Cápsula monocoque transportável: estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, casco em ACM curvado, vidro e madeira sobre deck em estacas helicoidais. Tudo chega em kit numerado (peças ≤ 4,80 m, ≤ 120 kg), sem concreto, sem solda em campo e sem guindaste; a Cápsula viaja inteira em prancha e exige acesso de caminhão a 30 m do pouso.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA Empreiteiro de estacas helicoidais + montadores + eletricista / encanador 4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas 4 pés telescópicos Ø101,6 (curso 0,40 m) - Deck acoplado 8,3 m2 + escada - Engates rápidos de água, esgoto e energia Documento completo: ZK-LOT1-001 (PDF)	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA Serralheria com calandra de tubos, solda MIG/TIG e galvanizador parceiro casco monocoque: lista K01 em diante no lote 2 12 anéis calandrados Ø3,20 m + 7 longarinas - Chassi de piso e 4 pés telescópicos - Aros do Visor e do Anel de Luz, olhais de içamento Documento completo: ZK-LOT2-001 (PDF)	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS Fabricante de ACM curvado + vidraceiro de vidro curvo - Painéis de ACM curvado: 46 = 80 m2 - Compensado curvado interno: 75 m2 - PIR 60 mm + barreira de vapor - Visor e Anel de Luz em vidro curvo laminado: 14,3 m2 Documento completo: ZK-LOT3-001 (PDF)	LOTE 4 · MOBÍLIAS Marcenaria + fornecedores de FF&E - Marcenaria curva acoplada aos anéis (cama, banco, bancada, banho) 36 itens de FF&E - Instalado em oficina antes do transporte Documento completo: ZK-LOT4-001 (PDF)
---	---	--	---


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

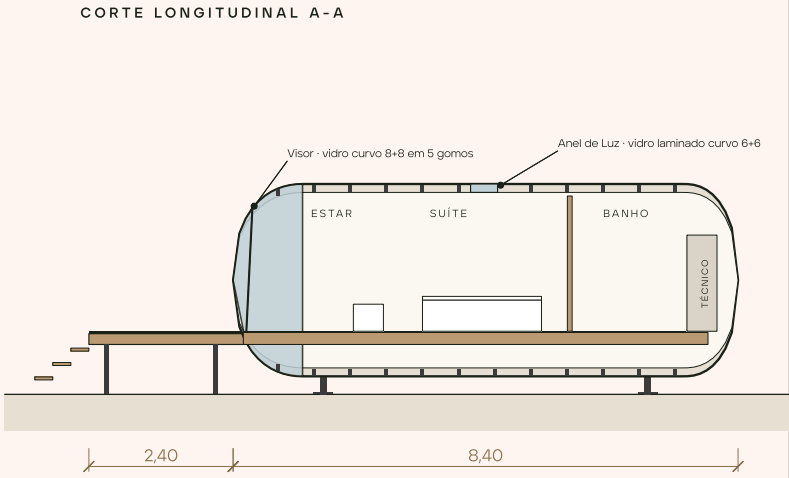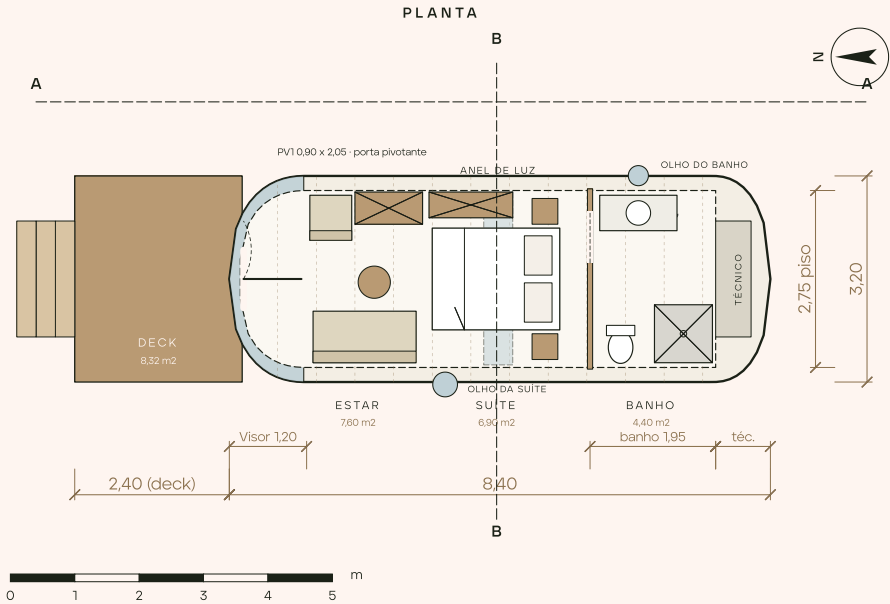

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

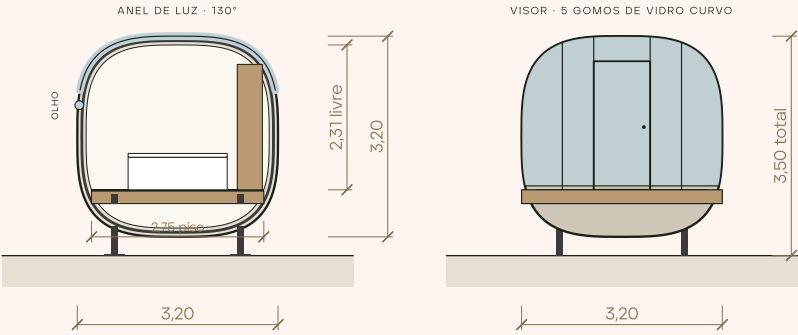

DADOS DO PRODUTO


CASCA	superellipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 01/CP SET 2026

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA
Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala

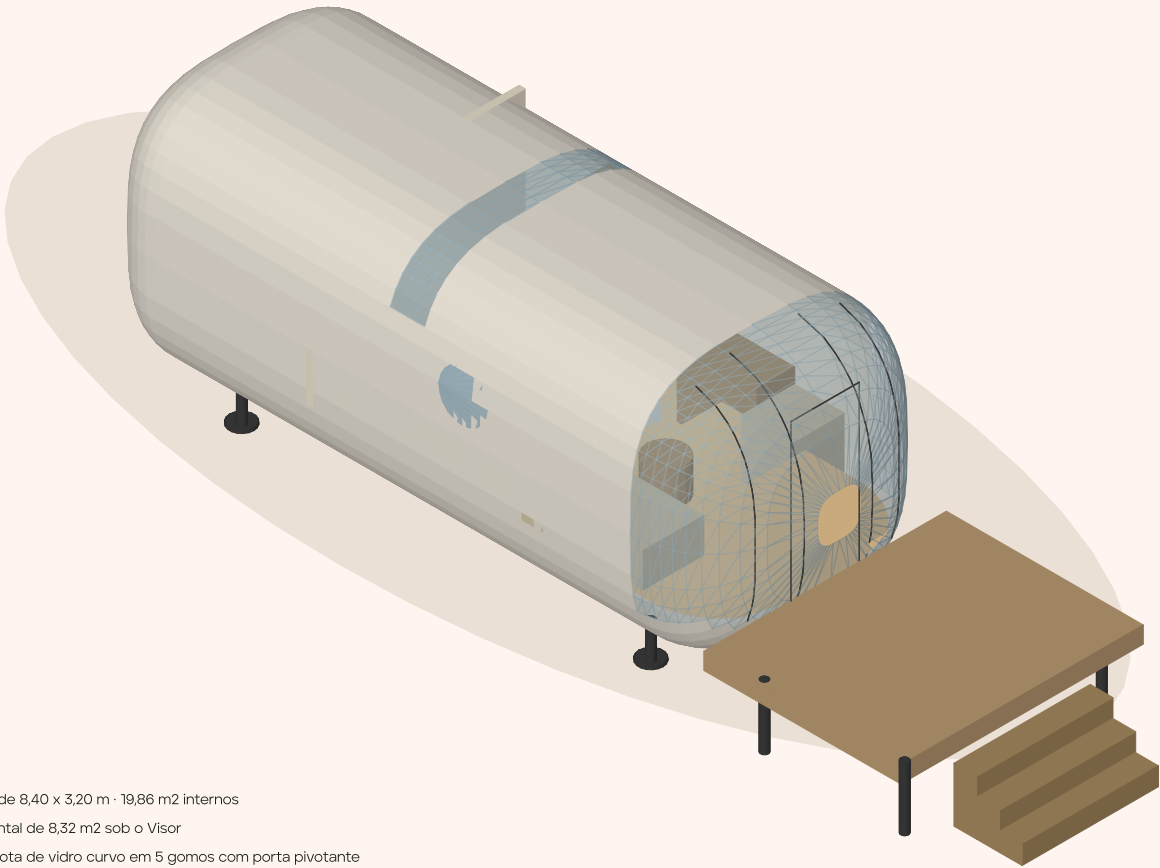


- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m2 internos
- ② Deck frontal de 8,32 m2 sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA 08/CP ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

 ZION CÁPSULA · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

5 padrões externos · 5 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

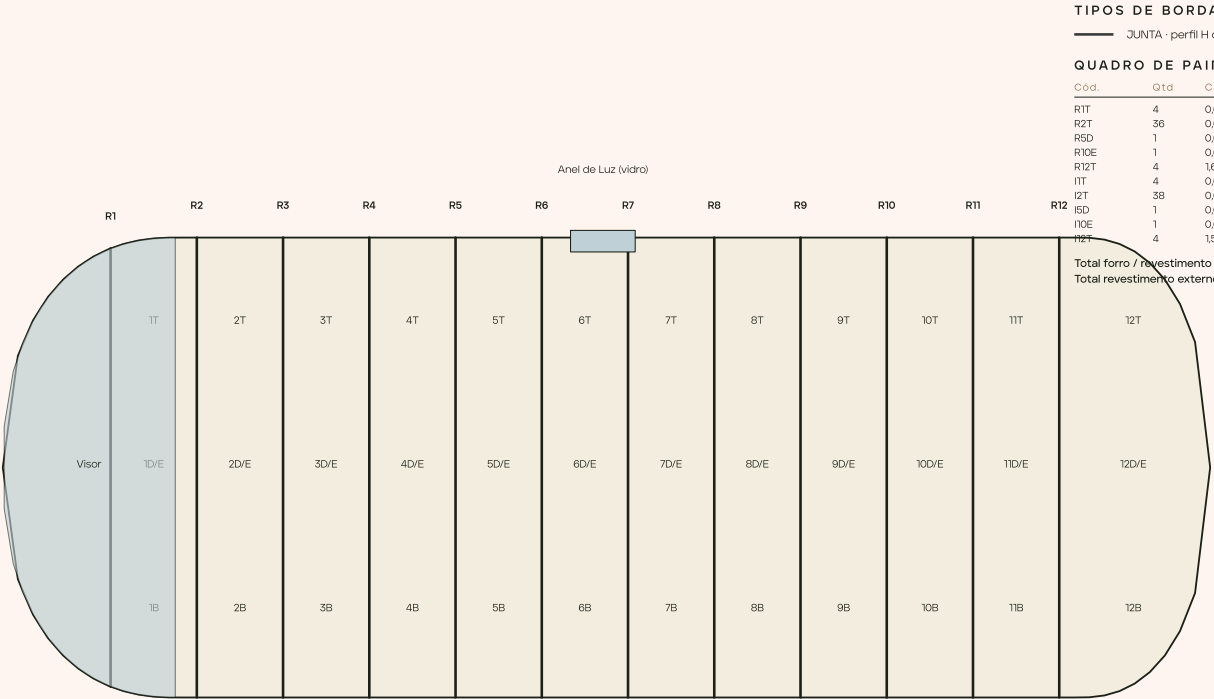

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)
— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

QUADRO DE PAINÉIS				
Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
R1T	4	0,65 x 2,72	1,61	Revestimento Externo
R2T	36	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R5D	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R10E	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R12T	4	1,62 x 2,64	2,77	Revestimento Externo
I1T	4	0,64 x 2,48	1,47	Forro
I2T	38	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I5D	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I10E	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I12T	4	1,54 x 2,41	2,40	Forro

Total forro / revestimento interno: 75,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total revestimento externo: 79,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Vista lateral · painéis de ACM entre anéis em 4 setores (T topo, D/E lados, B barriga) · juntas em perfil H · revestimento interno em compensado curvado

 **ZION** HOTEL GROUP INTERNATIONAL

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA
Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ZION CÁPSULA
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA s/ escala



FOLHA LN-01

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

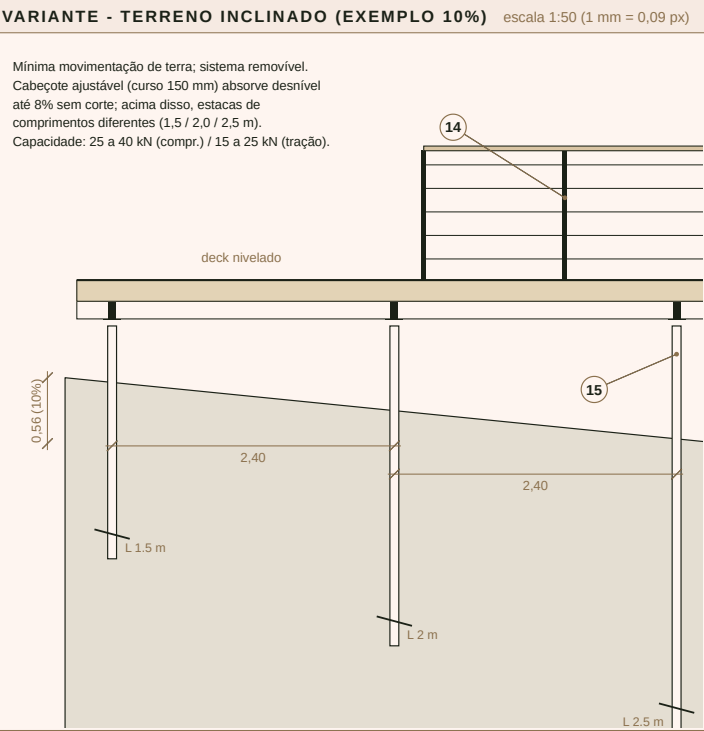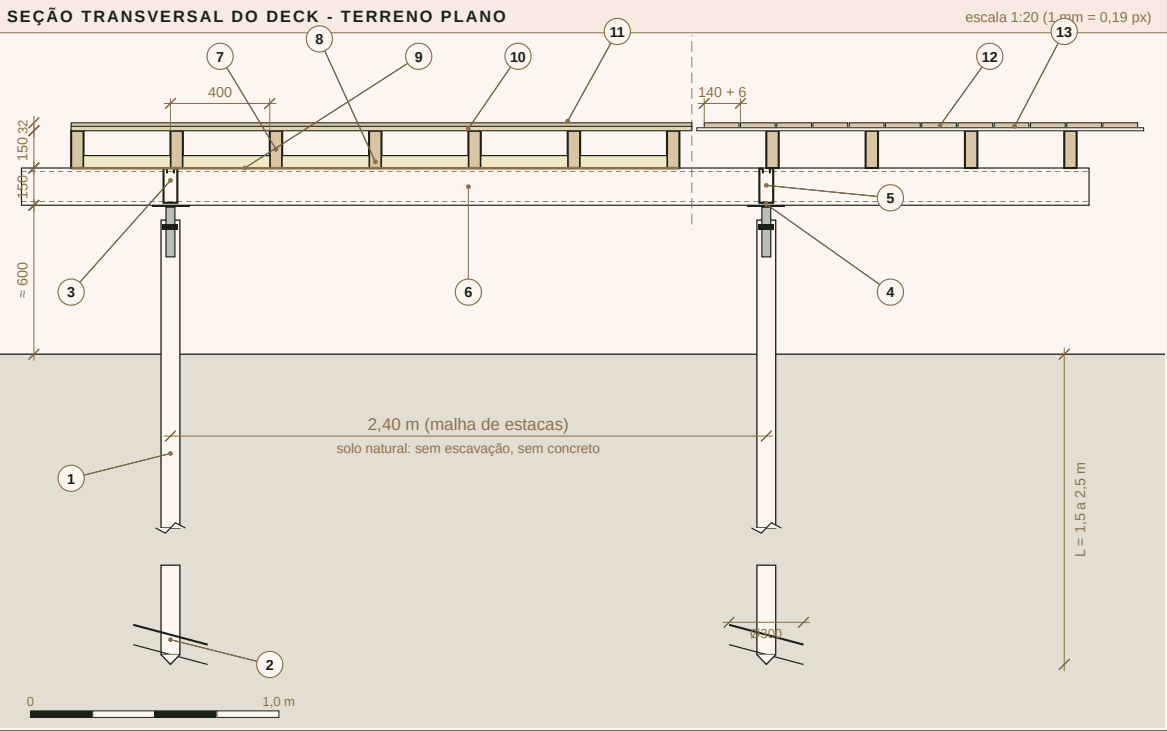

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado
- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026

COMO COTAR · O QUE A ZION ENVIA · REGRAS

retorno em 10 dias · validade 30 dias · sem preços de referência

COMO COTAR

1. Cotação por item e total, com prazo de fabricação, validade de 30 dias e impostos destacados; frete até Florianópolis / SC ou ponto de transbordo indicado.
2. Lote 2: preço por kg e por peça, com calandra, solda, galvanização a fogo (NBR 6323) e pintura destacadas; informar raio mínimo da calandra e galvanizador.
3. Lote 3: lona por m2 confeccionado (por painel) + perfis e cabos por metro + instalação por dia de equipe; vidros por pano e esquadrias por unidade, com medição na estrutura montada.
4. Lotes 1 e 4: estacas por ponto + cravação; grelha por kg; deck por m2; marcenaria por peça; FF&E por item.
5. Amostra antes da série: um arco calandrado (lote 2) e um painel soldado com keder (lote 3).

A ZION ENVIA

- Documento completo do lote (PDF) com escopo, interfaces, listas peça a peça e RFQ
- DXF das peças e tabela de geometria dos arcos / caibros / anéis (lote 2)
- Padrões de corte DXF + XLSX e pranchas LN-01 a LN-90 (lote 3)
- Quadro de esquadrias e detalhes DET-01 a DET-13
- Modelo 3D (GLB) e visualizador no navegador

REGRAS E PRAZOS

- Fit test em fábrica de um pórtico / anel completo antes de galvanizar; inspeção Zion antes da expedição
- Tolerâncias: retas ± 2 mm · calandradas ± 5 mm no gabarito · topo montado ± 15 mm
- Lona: compensação e padronagem pelo confeccionista (laudo biaxial); sem rugas após tensionar; teste de água
- Alvo: projeto executivo 3 sem · fabricação 6 sem · fundação 3 sem (paralelo) · montagem 3 dias
-  **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**
