



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION GLAMPING STORE

ZION LODGE 38

PAVILHÃO OCTOGONAL COM LANTERNA
ZION · TEASER DE COTAÇÃO · ZL-ONE-001
· REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m · 38 m² internos + 30 m² de deck · 2 + 1 hóspedes · montagem em 9 dias.
Kit numerado em 4 lotes: deck e infra · estrutura metálica · lonas, revestimentos e vidros · mobílias. Este teaser mostra o projeto (plantas, cortes, camadas, estrutura, lona, esquadrias) e o que cotar em cada lote.

Sem preços. Projeto preliminar; toda especificação estrutural sujeita a validação de engenheiro (ART). Os documentos completos de cada lote (ZL-LOT1 a LOT4-001) acompanham este teaser com listas peça a peça, padrões de corte DXF e RFQ.



EM NÚMEROS · O QUE CADA LOTE COTA

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

octógono 6,80 m entre faces DIMENSÕES	38 + 30 m2 INTERNO + DECK	2.392 kg AÇO GALVANIZADO	107 m2 LONA + FORRO	39,2 m2 VIDRO
22 ESTACAS	9 dias MONTAGEM	9 vol · 39 m3 TRANSPORTE	7,6 t PESO TOTAL	2 + 1 HÓSPEDES

Pavilhão octogonal com Lanterna Zion: estrutura tubular em aço galvanizado a fogo, lona PVDF tensionada, vidro e madeira sobre deck em estacas helicoidais. Tudo chega em kit numerado (peças ≤ 4,80 m, ≤ 120 kg), sem concreto, sem solda em campo e sem guindaste.

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA Empreiteiro de estacas helicoidais + montadores + eletricista / encanador 22 estacas helicoidais com cabecote - Grelha U 150 x 60 galv.: ≈ 1.177 kg - Piso octogonal 38 m2 + deck em 3 faces 30 m2 - Instalações completas Documento completo: ZL-LOT1-001 (PDF)	LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA Serralheria com calandra de tubos, solda MIG/TIG e galvanizador parceiro ≈ 1.216 kg de aço galvanizado em 24 tipos de peça 8 pilares + anel de beiral em 8 segmentos 8 caibros + Lanterna Zion (anel superior e montantes) - Postes da vela, chapas, luvas, parafusos Documento completo: ZL-LOT2-001 (PDF)	LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS Confeccionista de lonas / tendas (solda HF) + vidraceiro - Cobertura em 8 gomos iguais = 72 m2 - Forro em gomos: 35 m2 - Clamp da lanterna, bolsa de cabo no beiral - Vidros: 10 esquadrias = 39,2 m2 Documento completo: ZL-LOT3-001 (PDF)	LOTE 4 · MOBÍLIAS Marcenaria + fornecedores de FF&E - Parede-cabeceira ripada, closet e café nas faces opacas 42 itens de FF&E - Módulos ≤ 0,95 x 2,10 m e ≤ 60 kg Documento completo: ZL-LOT4-001 (PDF)
--	--	---	--

RENDERS

modelo 3D paramétrico do projeto · materiais e luz de estudo



FACHADA E DECK



LATERAL



NOITE




INTERIOR · ESTAR

Z

ZION LODGE · PLANTA BAIXA HUMANIZADA


Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m² (banho 6,90 m²) · deck 30,37 m² · total 68,68 m²

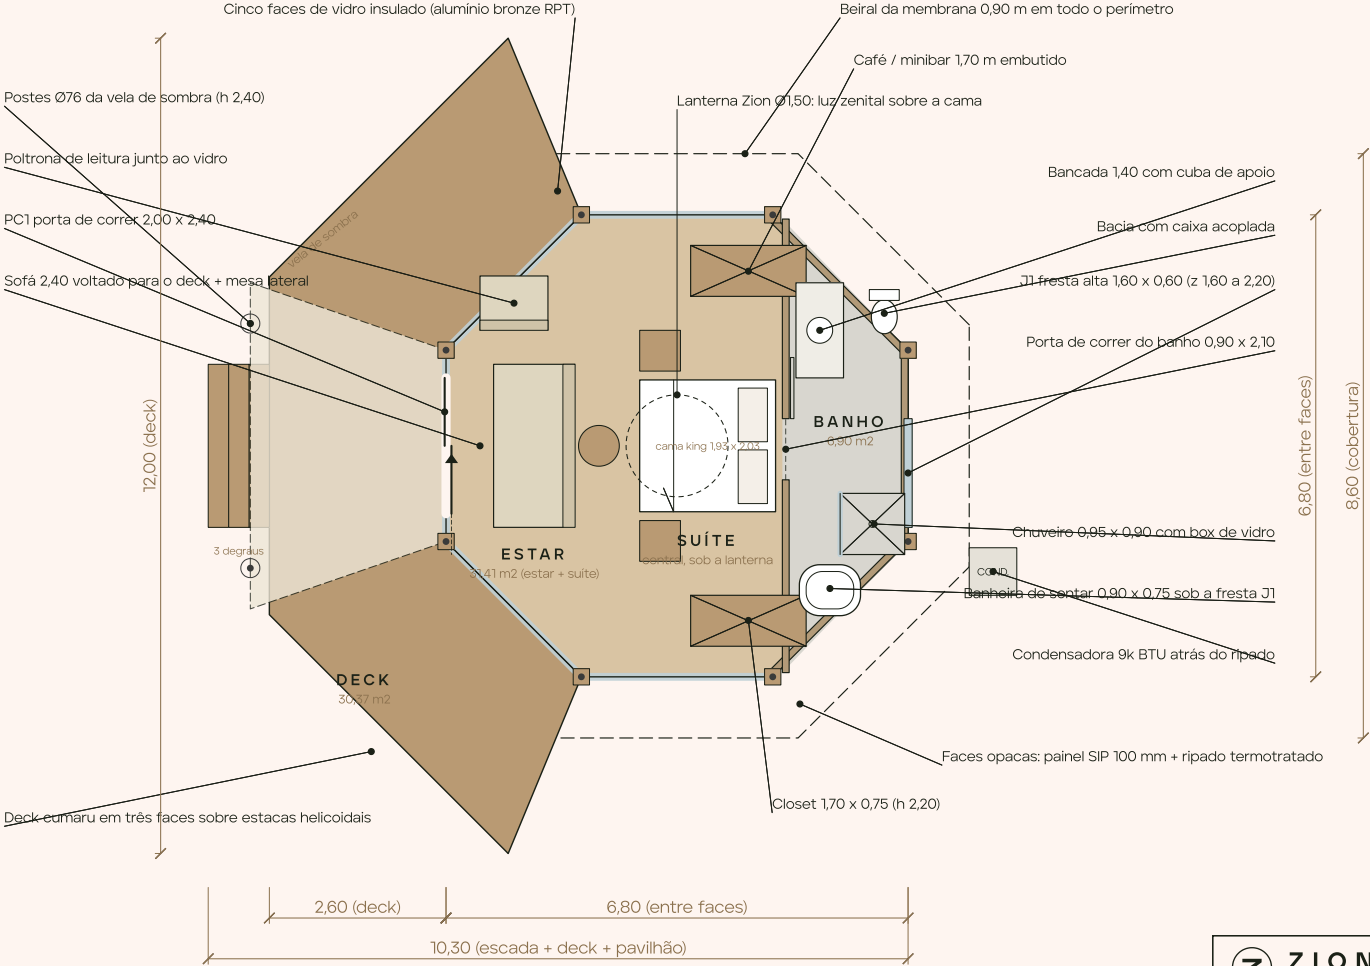

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Estar e suite sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces	
	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros	
ZION LODGE	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 02/LG
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		SET 2026

ZION LODGE · CORTE LONGITUDINAL A-A


Plano $y = 0$ (eixo da porta e da lanterna) · olhar para +y · deck, vela, pilares, caibros, membrana, forro tensionado, banho e ático técnico

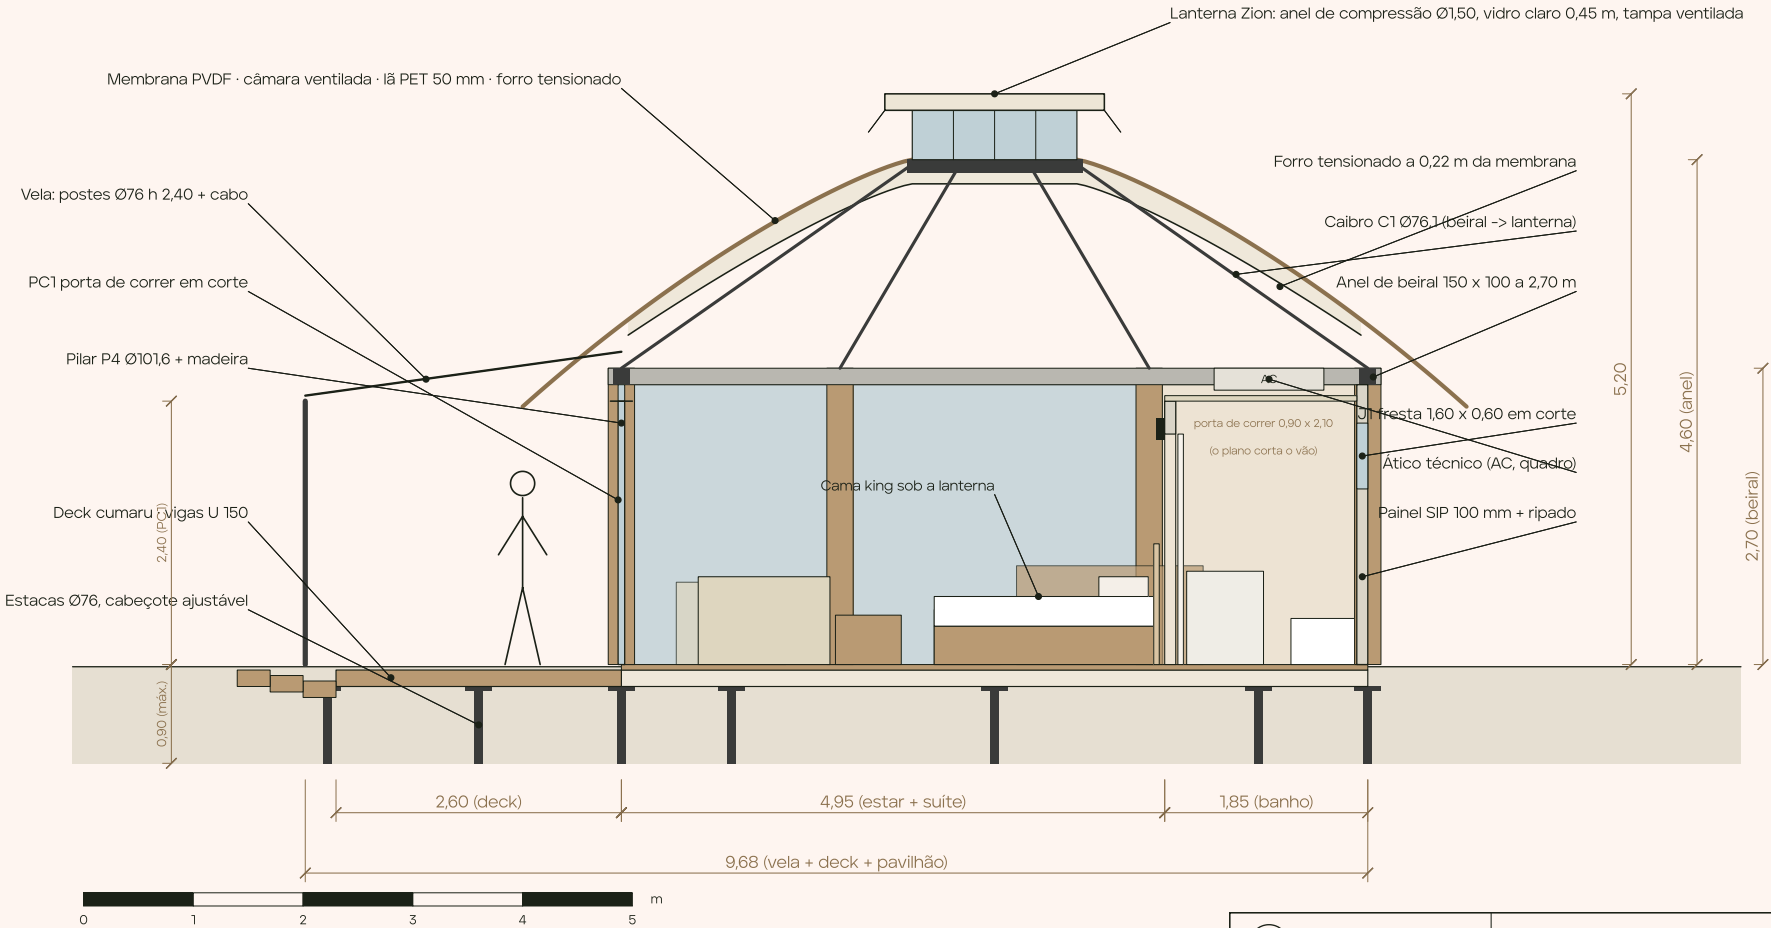

ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A	
	Deck e vela, cama sob a lanterna, banho com ático técnico	
	ESCALA 1:50 (A1)	
ZION LODGE	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 06/LG
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		SET 2026

ZION LODGE · ELEVACÃO FRONTAL

Vista do deck (olhar para +x) · três faces de vidro sob o beiral · cobertura 8,60 m · lanterna a 5,20 m · vela de sombra sobre o deck

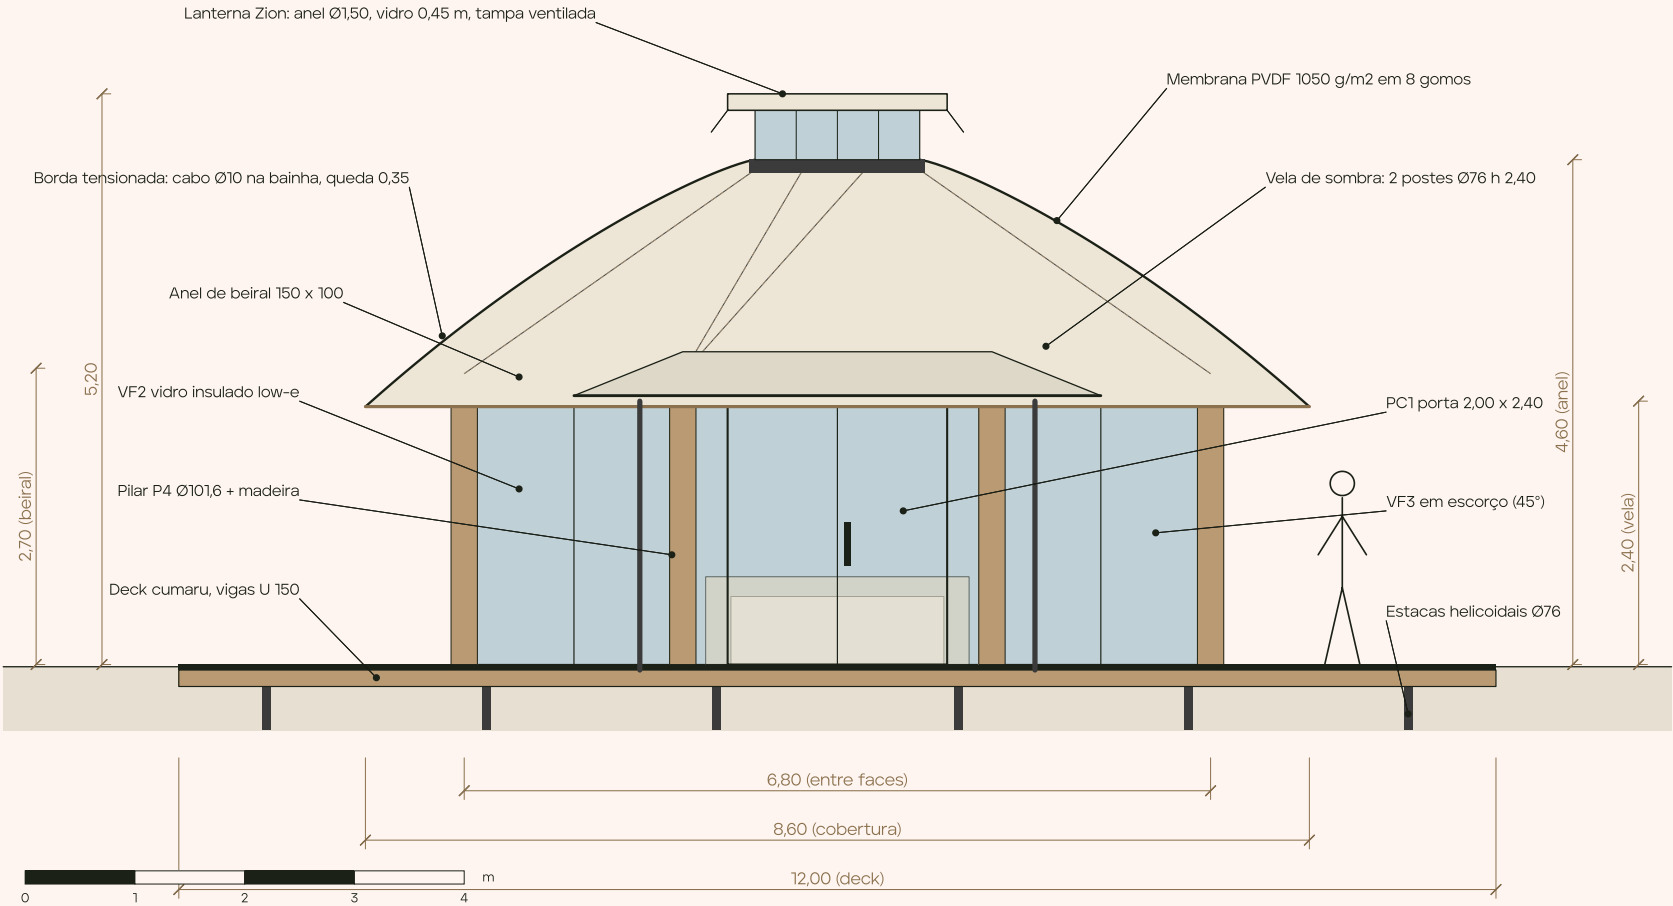

 ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVACÃO FRONTAL Três faces de vidro, porta de correr, vela de sombra e lanterna no cume	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FOLHA 04/LG ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026



ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos


CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna


CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

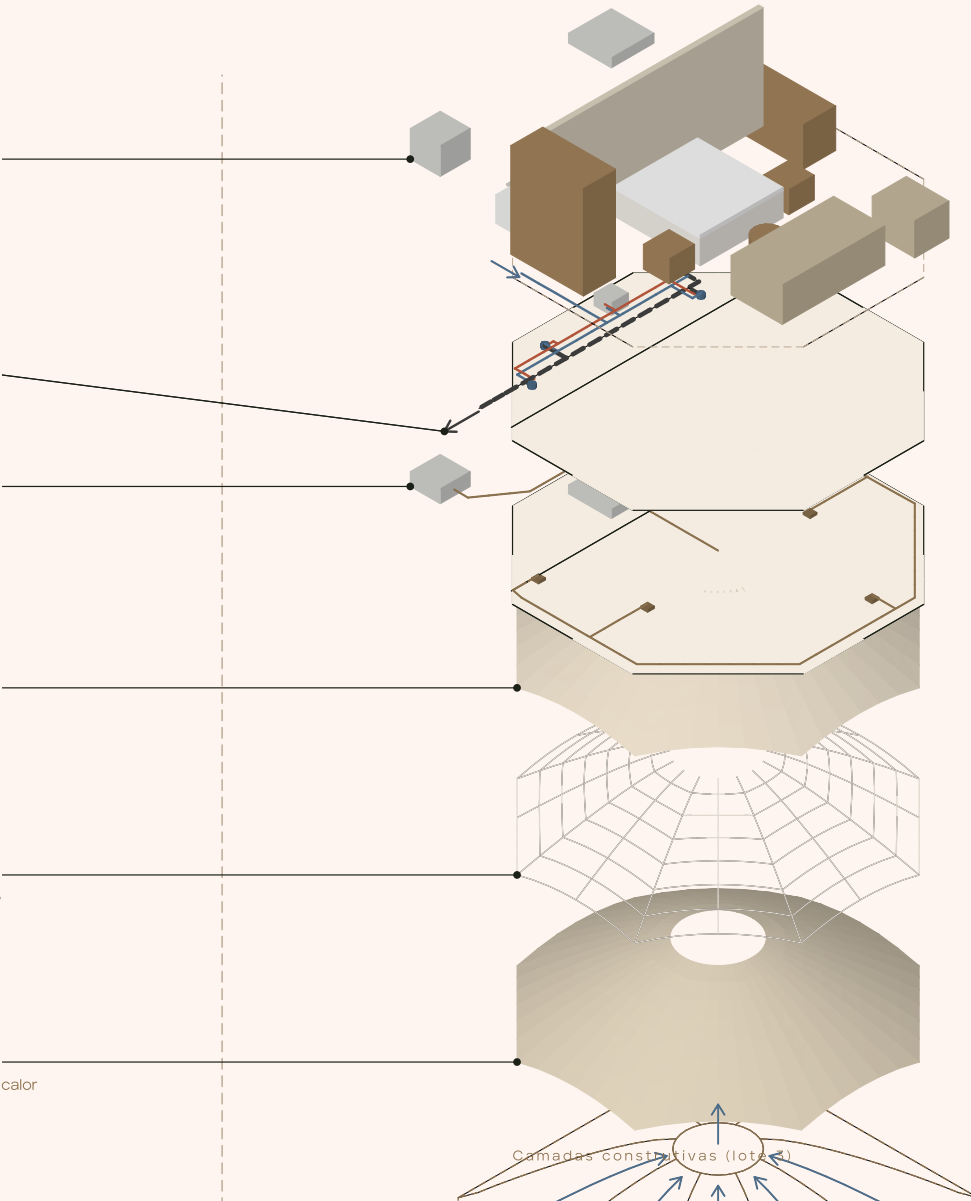

 ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna

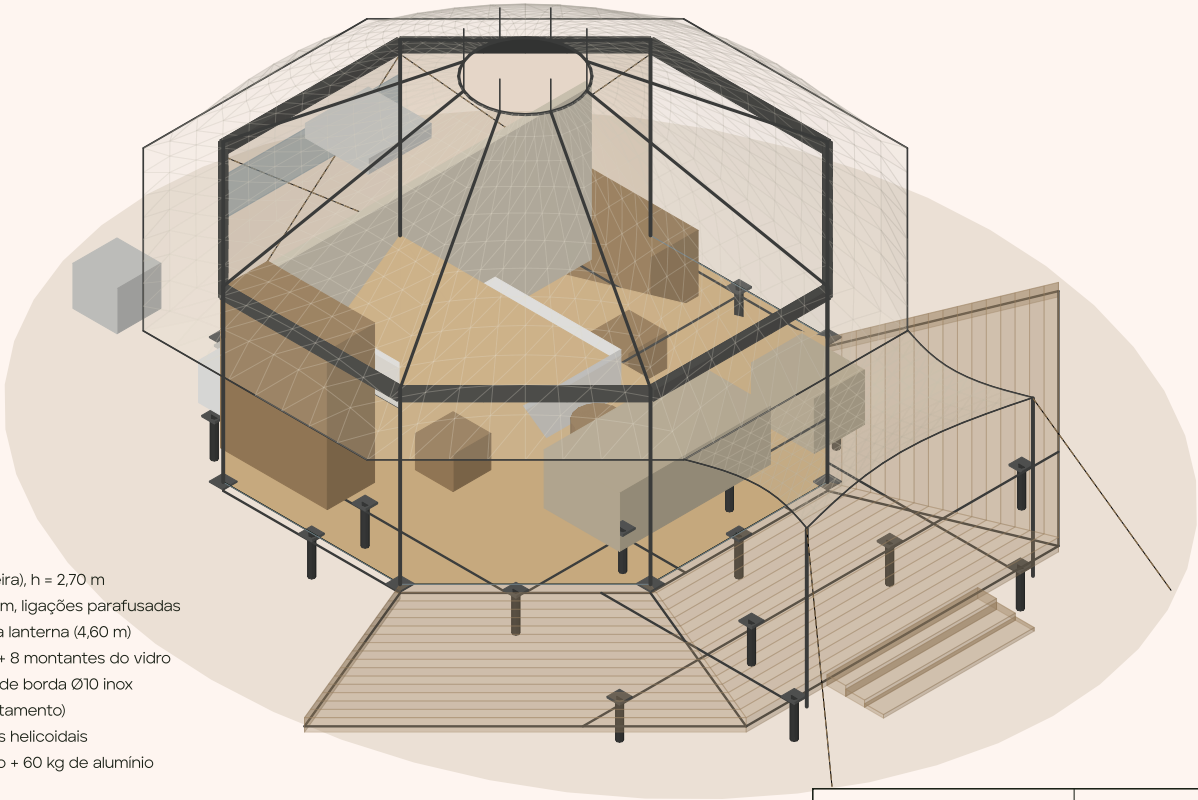


- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: = 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		FOLHA 12/27 SET 2026

 ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

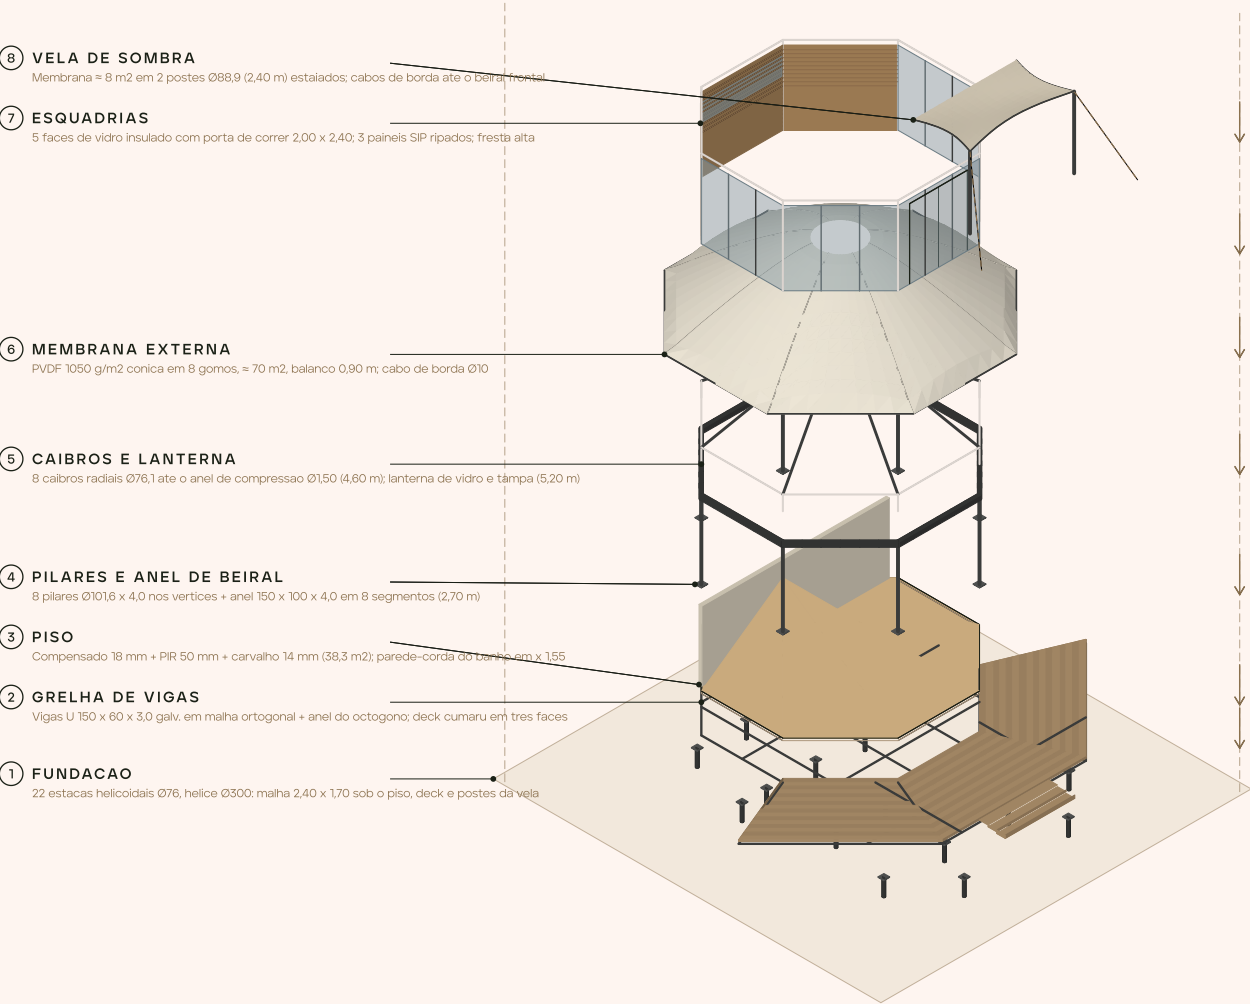

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5	Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
6	Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8	Vidros, paineis + vela	2 dias
Instalacoes + acabamentos		3 dias
Total (dias uteis)		11,5
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aco + 60 kg de aluminio
Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem	
	ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA 10/27 ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026




Anel de compressão Ø1500, oito caibros radiais, vidro laminado curvo 450 mm, tampa ventilada e forro com anel de LED. Corte, planta do anel e ligação caibro-anel.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION LODGE | DET-12

CORTE PELA LANTERNA - EIXO VERTICAL


1:4 (1 mm = 0,25 px)

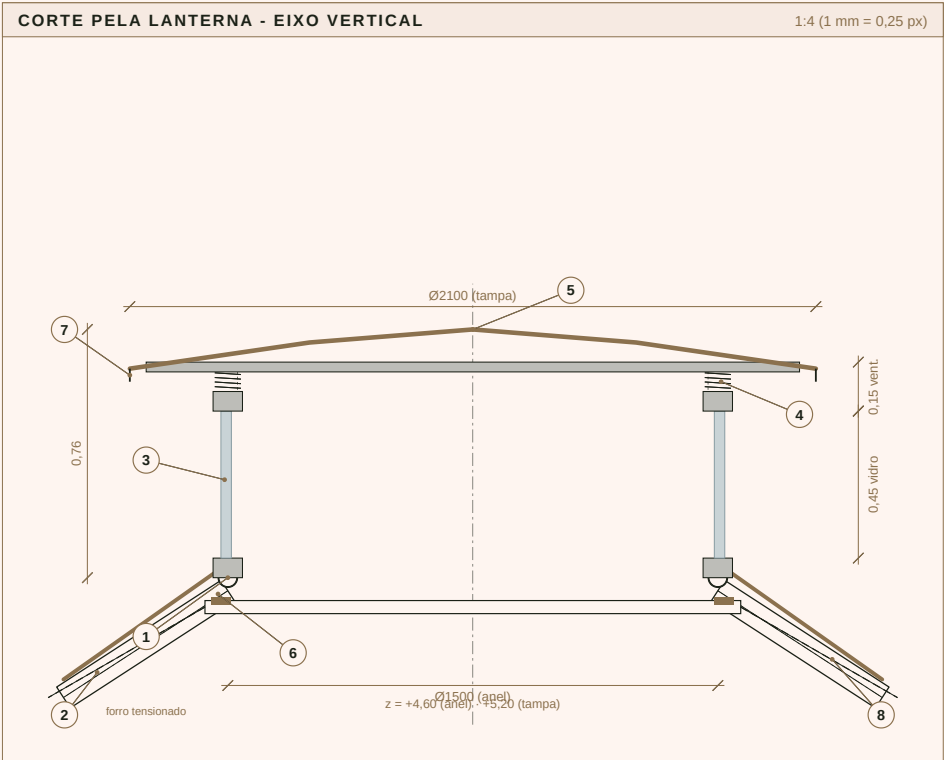

LANTERNA: por que e como
Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana a chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com N = 4 a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.


PLANTA DO ANEL DE COMPRESSÃO - 8 CAIBROS

1:15 (1 mm = 0,067 px)

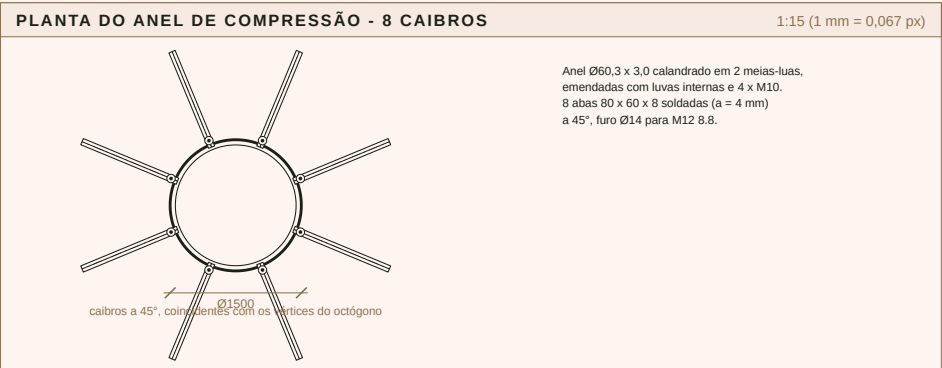

LIGAÇÃO CAIBRO - ANEL - CABEÇA ARTICULADA

1:1,7 (1 mm = 0,6 px)

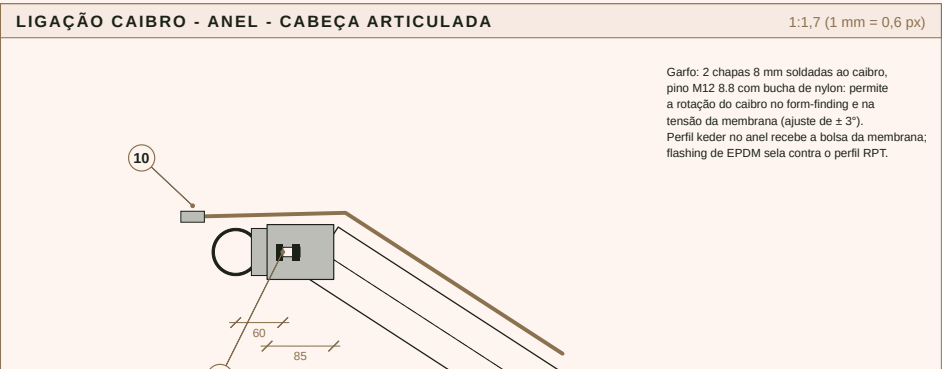

- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500

2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.

3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze

4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira

5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100
- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K

7 Praga-de-lã e beiral de 250 mm da tampa

8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)


9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)

10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

 ZION LODGE	ESCALA 1:4 / 1:15 / 1:2	
	FOLHA DET-12	DATA SET 2026

 ZION LODGE 38 · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

1 padrões externos · 1 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

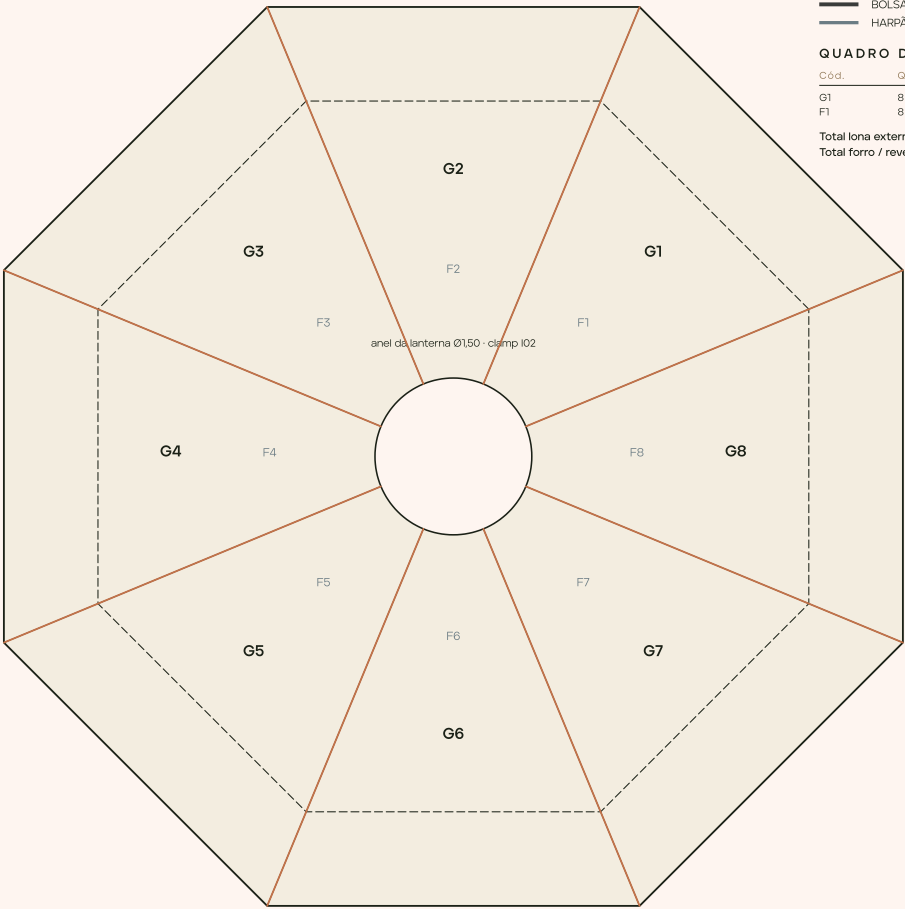

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

- SOLDA HF: emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP: barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO: cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- HARPÃO: perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
G1	8	3,39 x 4,72	9,00	Lona Externa
F1	8	2,43 x 3,11	4,41	Forro


Total lona externa: 72,0 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 35,3 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Planta da cobertura - 8 gomos iguais soldados sobre os caibros - bolsa de cabo no beiral (perfil I01) - forro em

	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
	ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA LN-01 ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION LODGE · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica



CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00 x 2,40	1	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82 x 2,55	2	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60 x 0,60	1	Vidro insulado jateado; peitoril 160	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50 x 0,45	1	Anel de vidro laminado curvo Ø150 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90 x 2,10	1	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40


 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 7 tipos · 10 unidades
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-09 SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04


SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)

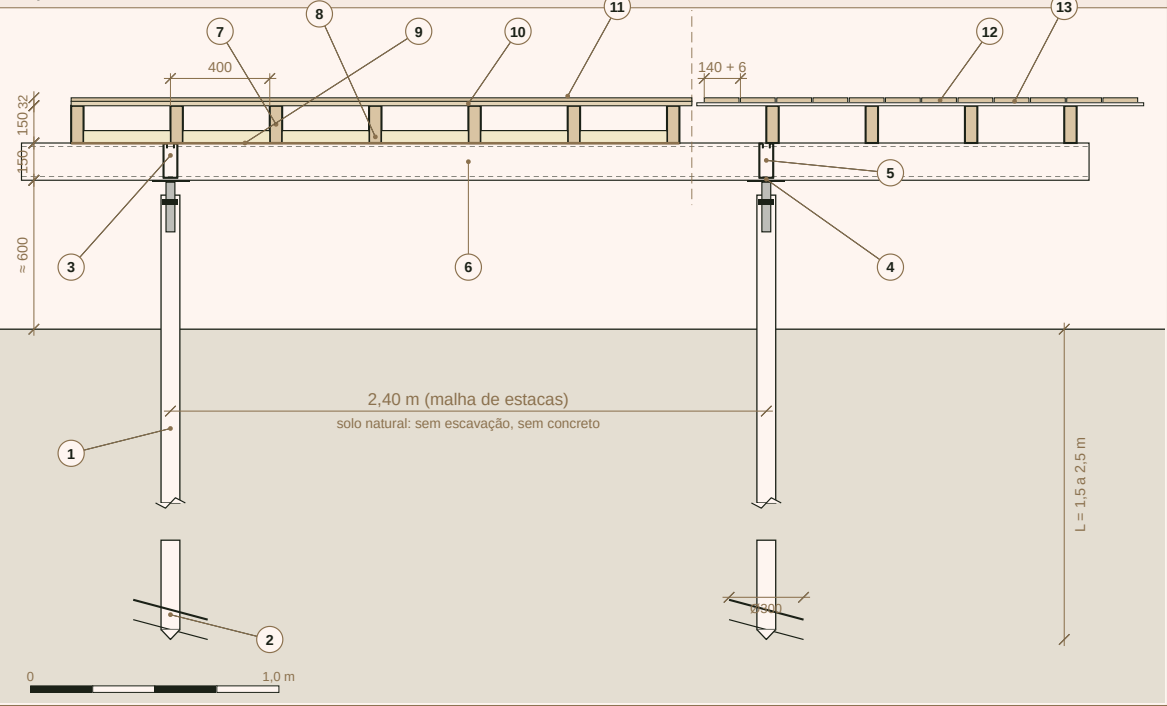

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).

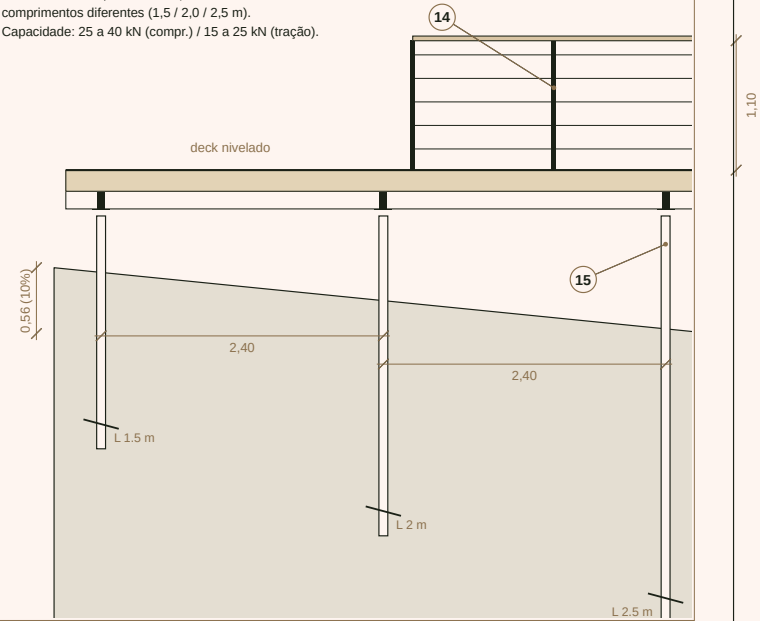

LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026

COMO COTAR · O QUE A ZION ENVIA · REGRAS

retorno em 10 dias · validade 30 dias · sem preços de referência

COMO COTAR

1. Cotação por item e total, com prazo de fabricação, validade de 30 dias e impostos destacados; frete até Florianópolis / SC ou ponto de transbordo indicado.
2. Lote 2: preço por kg e por peça, com calandra, solda, galvanização a fogo (NBR 6323) e pintura destacadas; informar raio mínimo da calandra e galvanizador.
3. Lote 3: lona por m2 confeccionado (por painel) + perfis e cabos por metro + instalação por dia de equipe; vidros por pano e esquadrias por unidade, com medição na estrutura montada.
4. Lotes 1 e 4: estacas por ponto + cravação; grelha por kg; deck por m2; marcenaria por peça; FF&E por item.
5. Amostra antes da série: um arco calandrado (lote 2) e um painel soldado com keder (lote 3).

A ZION ENVIA

- Documento completo do lote (PDF) com escopo, interfaces, listas peça a peça e RFQ
- DXF das peças e tabela de geometria dos arcos / caibros / anéis (lote 2)
- Padrões de corte DXF + XLSX e pranchas LN-01 a LN-90 (lote 3)
- Quadro de esquadrias e detalhes DET-01 a DET-13
- Modelo 3D (GLB) e visualizador no navegador

REGRAS E PRAZOS

- Fit test em fábrica de um pórtico / anel completo antes de galvanizar; inspeção Zion antes da expedição
- Tolerâncias: retas ± 2 mm · calandradas ± 5 mm no gabarito · topo montado ± 15 mm
- Lona: compensação e padronagem pelo confeccionista (laudo biaxial); sem rugas após tensionar; teste de água
- Alvo: projeto executivo 3 sem · fabricação 6 sem · fundação 3 sem (paralelo) · montagem 9 dias
-  **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**
