

LOTE 3

LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS

ZC-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZC-LOT3-001	Escopo do lote 3	2
ZC-LON-001	Quadro de painéis	3

ZC-MAT-L3	Materiais do lote 3	4
ZC-ESQ-001	Vidros e esquadrias	32
ZC-MONT-L3	Sequência do lote 3	33
ZC-LOT3-RFQ	RFQ do lote 3	34

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Lona externa (membrana PVDF tipo II) confeccionada por painéis conforme os padrões de corte deste lote, com keder, bolsas e reforços
Forro interno tensionado (Trevira CS) por painéis, com harpão
Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada
Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores
Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes
Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2
Fundação, piso e instalações: lote 1
Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Confeccionista de membranas tensionadas (corte CNC, solda HF, form-finding) + vidraceiro com vidro insulado / laminado + instaladores de membrana.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval
Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados
Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

12 padrões externos = 111,2 m2 · 8 internos = 89,2 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
P1	1	Lona Externa	Painel P1 · entre A0 (x 0.45) e A1 (x 1.65)	1,72 x 11,46	15,64	15,6	KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P2	1	Lona Externa	Painel P2 · entre A1 (x 1.65) e A2 (x 2.85) · com entalhe da Espinha de Luz	1,48 x 11,64	15,15	15,1	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P3D	1	Lona Externa	Painel P3D · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado direito da Espinha	1,29 x 5,51	6,75	6,8	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P3E	1	Lona Externa	Painel P3E · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado esquerdo da Espinha	1,29 x 5,51	6,75	6,8	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4D	1	Lona Externa	Painel P4D · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado direito da Espinha	1,61 x 5,48	6,54	6,5	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4E	1	Lona Externa	Painel P4E · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado esquerdo da Espinha	1,61 x 5,48	6,54	6,5	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5D	1	Lona Externa	Painel P5D · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado direito da Espinha	2,06 x 5,30	6,35	6,4	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5E	1	Lona Externa	Painel P5E · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado esquerdo da Espinha	2,06 x 5,30	6,35	6,4	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P6	1	Lona Externa	Painel P6 · entre A5 (x 6.45) e A6 (x 7.65) · com entalhe da Espinha de Luz	2,57 x 10,32	12,72	12,7	CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P7	1	Lona Externa	Painel P7 · entre A6 (x 7.65) e A7 (x 8.75)	2,99 x 8,49	11,02	11	KEDER Ø10, KEDER Ø13	2
P8	1	Lona Externa	Painel P8 · cauda: de A7 (x 8.75) à ponta (x 9,56)	3,13 x 5,02	9,37	9,4	BOLSA, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P0	1	Lona Externa	Painel P0 · BICO · do anel A0 (Ø ± 1,15 rad do topo) à borda livre em balanço	2,93 x 6,32	7,99	8	BOLSA, BORDA LIVRE, KEDER Ø10	0
F1	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F1 · entre x 0.90 e x 1.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	0,98 x 10,70	9,07	9,1	HARPÃO	0
F2	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F2 · entre x 1.65 e x 2.85 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,47 x 10,82	14,72	14,7	HARPÃO	2
F3	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F3 · entre x 2.85 e x 4.05 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,29 x 10,82	13,27	13,3	HARPÃO	2
F4	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F4 · entre x 4.05 e x 5.25 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,58 x 10,76	12,84	12,8	HARPÃO	2
F5	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F5 · entre x 5.25 e x 6.45 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,99 x 10,40	12,47	12,5	HARPÃO	2
F6	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F6 · entre x 6.45 e x 7.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,45 x 9,54	11,8	11,8	HARPÃO	1
F7	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F7 · entre x 7.65 e x 8.75 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,80 x 7,81	10,01	10	HARPÃO	2
F8	1	Forro / Revestimento Interno	Forro F8 · entre x 8.75 e x 9.30 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,40 x 5,06	5,01	5	HARPÃO	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Alumínio e requadros

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Perfil duplo keder de alumínio sobre arcos	un	8	77	PREÇO A COTAR
Anel curvo da fachada 120 x 60	un	1	26	PREÇO A COTAR
Montantes e travessa da fachada	un	5	25	PREÇO A COTAR
Trilho do forro tensionado	un	1	21	PREÇO A COTAR
Requadros das Janelas Olho (madeira laminada)	un	6	54	PREÇO A COTAR

Envelope: membrana, isolamento, forro

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 (+15% emendas/bolsas)	m2	127	133	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3	m2	110	138	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de alumínio (bolha)	m2	110	28	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS	m2	105	31	PREÇO A COTAR
Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14	126	PREÇO A COTAR


ESPECIFICAÇÃO DA LONA

LONA EXTERNA	PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster HT 1100 dtex, PVC + laca PVDF bifacial), cor creme Zion, resistência ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos; opção: PTFE-vidro 800 g/m2 (30 anos, custo maior)
FORRO	Trevira CS 210 g/m2 (ou lona translúcida 350 g/m2 sob claraboias), harpão de PVC soldado
ISOLAMENTO	lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros + manta refletiva com face para a câmara; PIR 60 mm na Cápsula
KEDER E PERFIS	cordão keder Ø10 / Ø13 PVC; perfil duplo keder alu 6060-T5; barras de clamp 40 x 6; harpão 40 x 20; presilhas inox 304
COSTURAS	solda de alta frequência 40 mm; nenhuma costura com linha na face externa; reforços de 150 mm em recortes e cantos
CABOS	inox 316 7 x 19 Ø8 / Ø10 / Ø12 com terminais prensados, esticadores M12 a M20, manilhas



ZION CASULO · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

12 padrões externos · 8 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

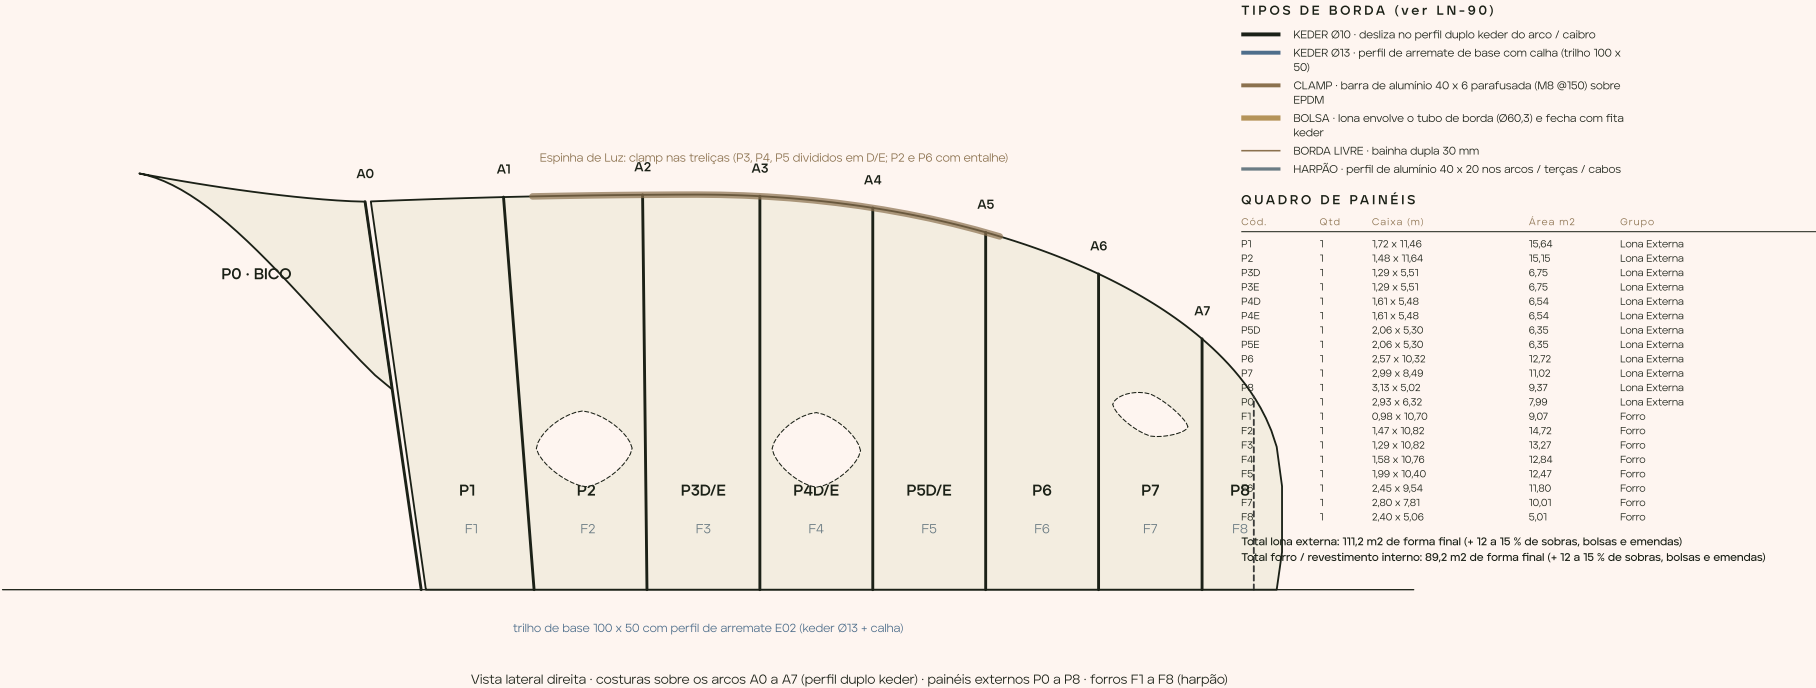



HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA
Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ESCALA s/ escala

FOLHA LN-01

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P1

Painel P1 · entre A0 (x 0.45) e A1 (x 1.65) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,371	1,247	0,000	1,300
0,500	0,098	0,861	1,379	0,486	1,334
1,000	0,177	1,354	1,488	0,977	1,364
1,500	0,236	1,851	1,574	1,473	1,390
2,000	0,277	2,349	1,638	1,977	1,412
2,500	0,300	2,849	1,684	2,489	1,430
3,000	0,306	3,349	1,711	3,012	1,444
3,500	0,299	3,849	1,723	3,549	1,456
4,000	0,281	4,348	1,724	4,103	1,464
4,500	0,260	4,848	1,719	4,677	1,469
5,000	0,243	5,347	1,712	5,269	1,472
5,500	0,239	5,847	1,711	5,872	1,472
6,000	0,250	6,347	1,715	6,471	1,471
6,500	0,270	6,847	1,722	7,056	1,467
7,000	0,290	7,346	1,725	7,620	1,460
7,500	0,304	7,846	1,719	8,166	1,451
8,000	0,305	8,346	1,700	8,696	1,438
8,500	0,292	8,846	1,665	9,213	1,422
9,000	0,260	9,345	1,611	9,721	1,402
9,500	0,211	9,843	1,536	10,221	1,378
10,000	0,143	10,338	1,440	10,714	1,350
10,500	0,095	10,830	1,319	11,203	1,319
10,764	0,000	11,088	1,246	11,459	1,300

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P1)
ÁREA DE FORMA FINAL
15,64 m2
COMPRIMENTO L / R
10,76 / 11,55 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,72 x 11,46 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P1 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-11 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P2

Painel P2 · entre A1 (x 1.65) e A2 (x 2.85) · com entalhe da Espinha de Luz · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,190	0,052	1,390	0,000	1,201
0,500	0,176	0,552	1,409	0,501	1,234
1,000	0,159	1,051	1,426	1,003	1,267
1,500	0,140	1,551	1,439	1,504	1,300
2,000	0,119	2,051	1,450	2,006	1,332
2,500	0,097	2,550	1,459	2,508	1,363
3,000	0,075	3,050	1,466	3,012	1,392
3,500	0,054	3,549	1,471	3,516	1,417
4,000	0,035	4,049	1,474	4,021	1,440
4,500	0,019	4,549	1,477	4,528	1,458
5,000	0,007	5,048	1,478	5,035	1,471
5,500	0,001	5,548	1,478	5,544	1,477
6,000	0,001	6,048	1,478	6,052	1,478
6,500	0,006	6,548	1,478	6,561	1,472
7,000	0,017	7,048	1,477	7,068	1,459
7,500	0,033	7,548	1,475	7,575	1,442
8,000	0,052	8,048	1,471	8,080	1,420
8,500	0,073	8,547	1,466	8,585	1,394
9,000	0,095	9,047	1,460	9,088	1,366
9,500	0,117	9,546	1,451	9,591	1,335
10,000	0,138	10,046	1,440	10,092	1,303
10,500	0,157	10,545	1,427	10,594	1,270
11,000	0,175	11,045	1,411	11,095	1,237
11,500	0,189	11,545	1,392	11,597	1,204

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P2)
- ÁREA DE FORMA FINAL
15,15 m²
- COMPRIMENTO L / R
11,55 / 11,65 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,48 x 11,64 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m² (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m².

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P2 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-12 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P3D

Painel P3D · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

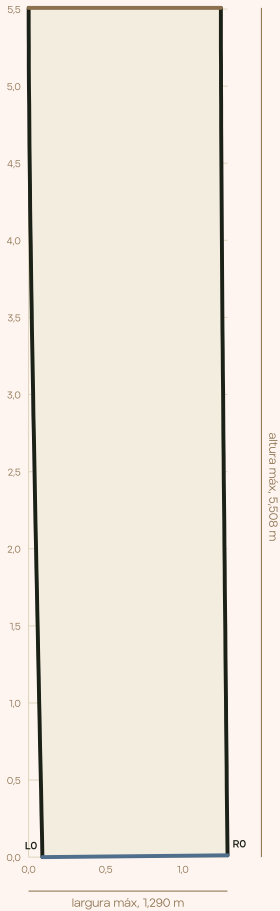


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,090	0,000	1,290	0,012	1,200
0,500	0,080	0,500	1,285	0,510	1,206
1,000	0,069	1,000	1,280	1,008	1,211
1,500	0,059	1,500	1,275	1,506	1,217
2,000	0,049	2,000	1,271	2,004	1,222
2,500	0,039	2,499	1,266	2,503	1,227
3,000	0,029	2,999	1,261	3,001	1,232
3,500	0,021	3,499	1,257	3,500	1,236
4,000	0,013	3,999	1,254	4,000	1,240
4,500	0,007	4,499	1,250	4,499	1,243
5,000	0,003	4,999	1,248	4,999	1,245
5,500	0,000	5,499	1,247	5,499	1,247
6,000	0,000	5,999	1,247	5,999	1,247
6,500	0,002	6,499	1,248	6,499	1,246
7,000	0,006	6,999	1,250	6,999	1,244
7,500	0,011	7,499	1,253	7,499	1,241
8,000	0,019	7,999	1,256	7,998	1,237
8,500	0,027	8,499	1,260	8,497	1,233
9,000	0,036	8,999	1,265	8,996	1,229
9,500	0,046	9,499	1,269	9,494	1,224
10,000	0,056	9,999	1,274	9,993	1,218
10,500	0,066	10,499	1,279	10,491	1,213
11,000	0,077	10,999	1,284	10,989	1,207
11,500	0,087	11,498	1,289	11,487	1,202
11,647	0,090	11,645	1,290	11,634	1,200

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P3D)

ÁREA DE FORMA FINAL
6,75 m2

COMPRIMENTO L / R
11,65 / 11,62 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,29 x 5,51 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calibro
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P3D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-13 SET 2026

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), RO → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 ZION CASULO · PADRÃO DE CORTES

ORTE P3E

Painel P3E · entre A2 (x 2.85) e A3 (x 4.05) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

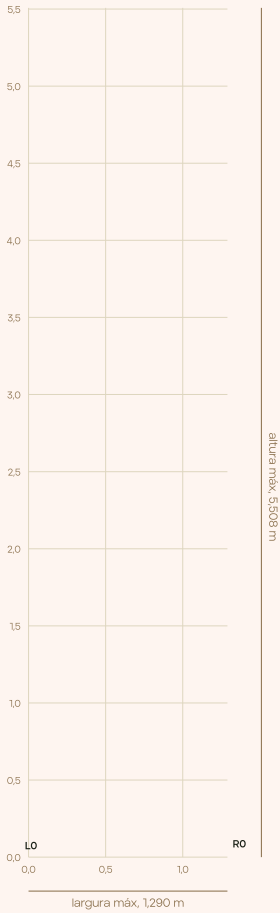


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,090	0,000	1,290	0,012	1,200
0,500	0,080	0,500	1,285	0,510	1,206
1,000	0,069	1,000	1,280	1,008	1,211
1,500	0,059	1,500	1,275	1,506	1,217
2,000	0,049	2,000	1,271	2,004	1,222
2,500	0,039	2,499	1,266	2,503	1,227
3,000	0,029	2,999	1,261	3,001	1,232
3,500	0,021	3,499	1,257	3,500	1,236
4,000	0,013	3,999	1,254	4,000	1,240
4,500	0,007	4,499	1,250	4,499	1,243
5,000	0,003	4,999	1,248	4,999	1,245
5,500	0,000	5,499	1,247	5,499	1,247
6,000	0,000	5,999	1,247	5,999	1,247
6,500	0,002	6,499	1,248	6,499	1,246
7,000	0,008	6,999	1,250	6,999	1,244
7,500	0,011	7,499	1,253	7,499	1,241
8,000	0,019	7,999	1,256	7,998	1,237
8,500	0,027	8,499	1,260	8,497	1,233
9,000	0,036	8,999	1,265	8,996	1,229
9,500	0,046	9,499	1,269	9,494	1,224
10,000	0,056	9,999	1,274	9,993	1,218
10,500	0,066	10,499	1,279	10,491	1,213
11,000	0,077	10,999	1,284	10,989	1,207
11,500	0,087	11,498	1,289	11,487	1,202
11,647	0,090	11,645	1,290	11,634	1,200

BORDAS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P3E)

ÁREA DE FORMA FINAL
6,75 m2

COMPRIMENTO L / R
11,65 / 11,62 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,29 x 5,51 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / caibro
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTES P3E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-14 SET 2026



ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P4D

Painel P4D · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

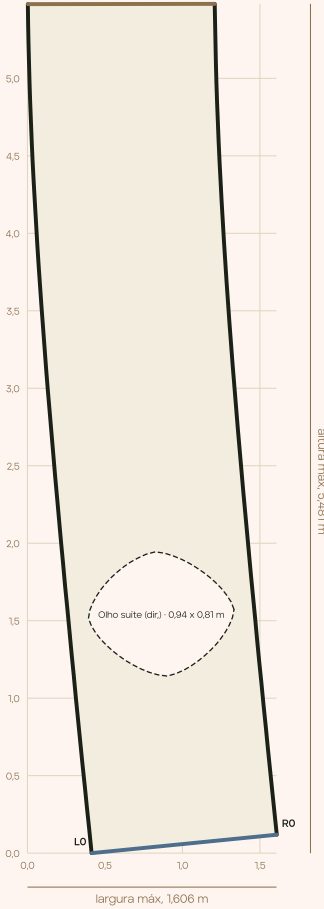


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,414	0,000	1,608	0,119	1,200
0,500	0,363	0,497	1,559	0,600	1,200
1,000	0,313	0,995	1,511	1,082	1,201
1,500	0,265	1,493	1,464	1,564	1,201
2,000	0,218	1,990	1,418	2,048	1,202
2,500	0,173	2,488	1,375	2,532	1,202
3,000	0,131	2,987	1,334	3,018	1,203
3,500	0,093	3,485	1,297	3,507	1,204
4,000	0,060	3,984	1,265	3,998	1,205
4,500	0,032	4,483	1,238	4,491	1,206
5,000	0,013	4,983	1,219	4,987	1,206
5,500	0,002	5,483	1,208	5,484	1,206
6,000	0,001	5,983	1,207	5,982	1,206
6,500	0,009	6,483	1,215	6,480	1,206
7,000	0,027	6,982	1,233	6,976	1,206
7,500	0,062	7,482	1,257	7,470	1,205
8,000	0,085	7,981	1,289	7,961	1,204
8,500	0,122	8,479	1,325	8,450	1,203
9,000	0,163	8,978	1,365	8,937	1,203
9,500	0,207	9,476	1,408	9,422	1,202
10,000	0,253	9,973	1,453	9,905	1,201
10,500	0,301	10,471	1,499	10,388	1,201
11,000	0,351	10,969	1,547	10,870	1,200
11,500	0,401	11,466	1,596	11,351	1,200
11,622	0,414	11,588	1,608	11,469	1,200

BORDAS E RECORTES

- QUANTIDADE
1 (códigos: P4D)
- ÁREA DE FORMA FINAL
6,54 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,62 / 11,38 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,61 x 5,48 m
- MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P4D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-15 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTES

FORTE P4E

Painel P4E · entre A3 (x 4.05) e A4 (x 5.25) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,414	0,000	1,608	0,119	1,200
0,500	0,363	0,497	1,559	0,600	1,200
1,000	0,313	0,995	1,511	1,082	1,201
1,500	0,265	1,493	1,464	1,564	1,201
2,000	0,218	1,990	1,418	2,048	1,202
2,500	0,173	2,488	1,375	2,532	1,202
3,000	0,131	2,987	1,334	3,018	1,203
3,500	0,093	3,485	1,297	3,507	1,204
4,000	0,060	3,984	1,265	3,998	1,205
4,500	0,032	4,483	1,238	4,491	1,206
5,000	0,013	4,983	1,219	4,987	1,206
5,500	0,002	5,483	1,208	5,484	1,206
6,000	0,001	5,983	1,207	5,982	1,206
6,500	0,009	6,483	1,215	6,480	1,206
7,000	0,027	6,982	1,233	6,976	1,206
7,500	0,062	7,482	1,257	7,470	1,205
8,000	0,085	7,981	1,289	7,961	1,204
8,500	0,122	8,479	1,325	8,450	1,203
9,000	0,163	8,978	1,365	8,937	1,203
9,500	0,207	9,476	1,408	9,422	1,202
10,000	0,253	9,973	1,453	9,905	1,201
10,500	0,301	10,471	1,499	10,388	1,201
11,000	0,351	10,969	1,547	10,870	1,200
11,500	0,401	11,466	1,596	11,351	1,200
11,622	0,414	11,588	1,608	11,469	1,200

BORDAS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P4E)
ÁREA DE FORMA FINAL
6,54 m2
COMPRIMENTO L / R
11,62 / 11,38 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,61 x 5,48 m
MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calibro
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P4E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-16 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P5D

Painel P5D · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado direito da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

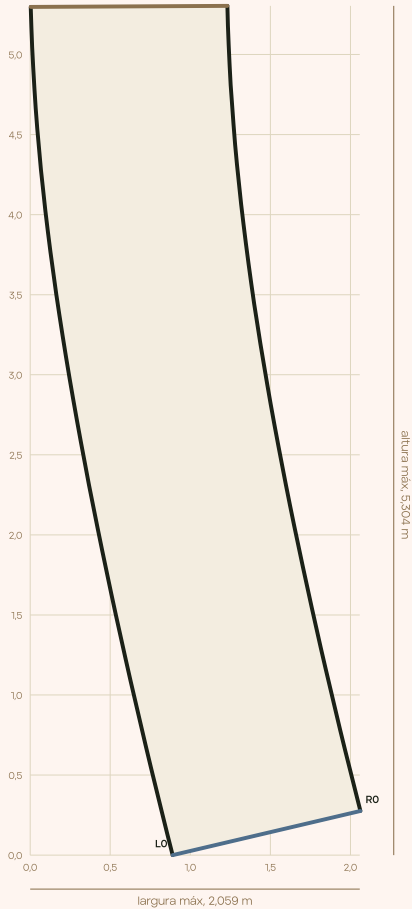


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,890	0,000	2,063	0,276	1,205
0,500	0,769	0,485	1,949	0,728	1,205
1,000	0,654	0,972	1,841	1,181	1,206
1,500	0,544	1,460	1,739	1,636	1,207
2,000	0,440	1,949	1,641	2,094	1,210
2,500	0,343	2,439	1,550	2,555	1,213
3,000	0,254	2,931	1,467	3,020	1,216
3,500	0,175	3,425	1,392	3,490	1,219
4,000	0,108	3,920	1,329	3,966	1,222
4,500	0,055	4,417	1,279	4,447	1,225
5,000	0,019	4,916	1,246	4,932	1,227
5,500	0,002	5,416	1,229	5,420	1,228
6,000	0,004	5,916	1,231	5,909	1,228
6,500	0,026	6,415	1,252	6,396	1,226
7,000	0,066	6,914	1,290	6,881	1,224
7,500	0,122	7,410	1,343	7,360	1,222
8,000	0,192	7,905	1,409	7,835	1,219
8,500	0,274	8,399	1,485	8,304	1,215
9,000	0,365	8,890	1,571	8,768	1,212
9,500	0,464	9,380	1,663	9,228	1,209
10,000	0,569	9,869	1,762	9,685	1,207
10,500	0,680	10,357	1,866	10,139	1,205
11,000	0,797	10,843	1,975	10,592	1,205
11,384	0,890	11,215	2,063	10,939	1,205

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P5D)
ÁREA DE FORMA FINAL
6,35 m2
COMPRIMENTO L / R
11,38 / 10,82 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,06 x 5,30 m
MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P5D Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-17 SET 2026

ZION CASULO · PA

CORTE P5E

Painel P5E · entre A4 (x 5.25) e A5 (x 6.45) · lado esquerdo da Espinha · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

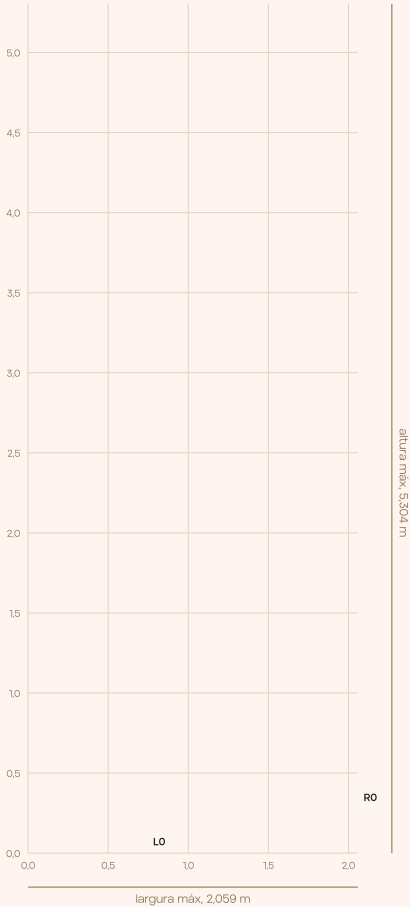


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,890	0,000	2,063	0,276	1,205
0,500	0,769	0,485	1,949	0,728	1,205
1,000	0,654	0,972	1,841	1,181	1,206
1,500	0,544	1,460	1,739	1,636	1,207
2,000	0,440	1,949	1,641	2,094	1,210
2,500	0,343	2,439	1,550	2,555	1,213
3,000	0,254	2,931	1,467	3,020	1,216
3,500	0,175	3,425	1,392	3,490	1,219
4,000	0,108	3,920	1,329	3,966	1,222
4,500	0,055	4,417	1,279	4,447	1,225
5,000	0,019	4,916	1,246	4,932	1,227
5,500	0,002	5,416	1,229	5,420	1,228
6,000	0,004	5,916	1,231	5,909	1,228
6,500	0,026	6,415	1,252	6,396	1,226
7,000	0,068	6,914	1,290	6,881	1,224
7,500	0,122	7,410	1,343	7,360	1,222
8,000	0,192	7,905	1,409	7,835	1,219
8,500	0,274	8,399	1,485	8,304	1,215
9,000	0,365	8,890	1,571	8,768	1,212
9,500	0,464	9,380	1,663	9,228	1,209
10,000	0,569	9,869	1,762	9,685	1,207
10,500	0,680	10,357	1,866	10,139	1,205
11,000	0,797	10,843	1,975	10,592	1,205
11,384	0,890	11,215	2,063	10,939	1,205

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P5E)
- ÁREA DE FORMA FINAL
6,35 m2
- COMPRIMENTO L / R
11,38 / 10,82 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
2,06 x 5,30 m
- MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 : desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - CLAMP : barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - KEDER Ø13 : perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P5E Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-18 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P6

Painel P6 · entre A5 (x 6.45) e A6 (x 7.65) · com entalhe da Espinha de Luz · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

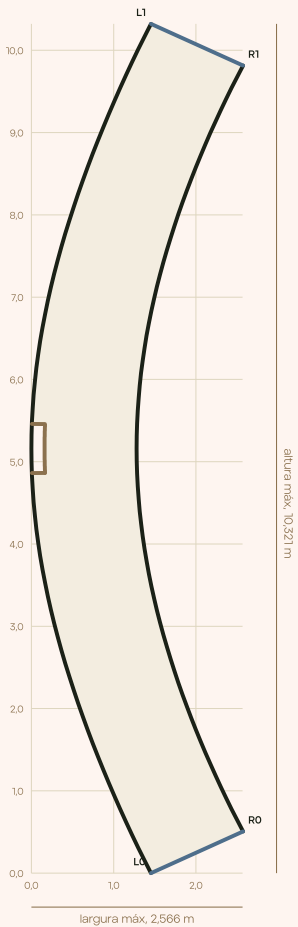


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,453	0,000	2,572	0,507	1,229
0,500	1,232	0,448	2,374	0,898	1,228
1,000	1,024	0,903	2,189	1,295	1,229
1,500	0,830	1,364	2,017	1,698	1,233
2,000	0,651	1,831	1,859	2,109	1,239
2,500	0,489	2,304	1,715	2,529	1,247
3,000	0,345	2,782	1,587	2,960	1,255
3,500	0,222	3,267	1,477	3,400	1,262
4,000	0,124	3,757	1,390	3,851	1,269
4,500	0,053	4,252	1,326	4,310	1,275
5,000	0,011	4,750	1,289	4,776	1,278
5,500	0,001	5,250	1,280	5,245	1,279
6,000	0,022	5,749	1,299	5,713	1,277
6,500	0,075	6,247	1,346	6,176	1,273
7,000	0,156	6,740	1,418	6,633	1,267
7,500	0,263	7,228	1,514	7,090	1,260
8,000	0,394	7,711	1,630	7,517	1,252
8,500	0,545	8,187	1,764	7,943	1,244
9,000	0,713	8,658	1,914	8,360	1,237
9,500	0,898	9,123	2,077	8,768	1,232
10,000	1,096	9,582	2,253	9,169	1,228
10,500	1,309	10,034	2,443	9,564	1,228
10,821	1,453	10,321	2,572	9,814	1,229

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P6)
- ÁREA DE FORMA FINAL
12,72 m²
- COMPRIMENTO L / R
10,82 / 9,76 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
2,57 x 10,32 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
 - KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (triño 100 x 50)
 - CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P6 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-19 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P7

Painel P7 · entre A6 (x 7.65) e A7 (x 8.75) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

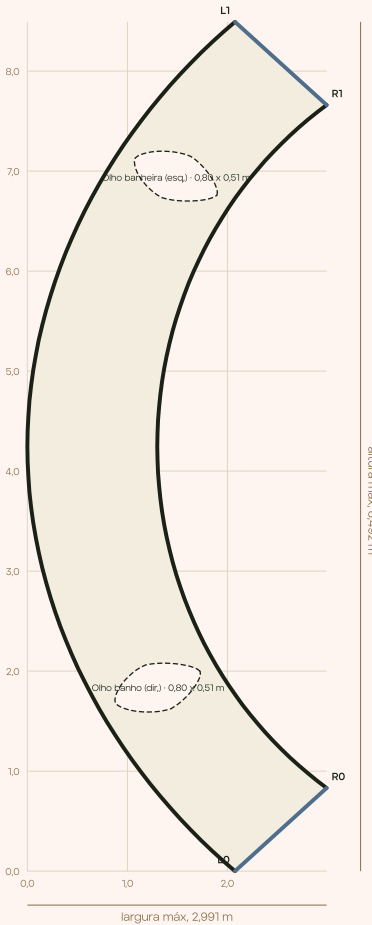


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,076	0,000	2,991	0,831	1,236
0,500	1,707	0,338	2,687	1,080	1,229
1,000	1,367	0,704	2,410	1,354	1,228
1,500	1,058	1,097	2,159	1,653	1,233
2,000	0,782	1,514	1,936	1,977	1,243
2,500	0,543	1,953	1,743	2,325	1,256
3,000	0,344	2,411	1,581	2,697	1,270
3,500	0,187	2,886	1,452	3,091	1,282
4,000	0,077	3,373	1,362	3,502	1,292
4,500	0,015	3,869	1,311	3,924	1,297
5,000	0,002	4,369	1,300	4,351	1,299
5,500	0,039	4,867	1,331	4,777	1,295
6,000	0,125	5,359	1,402	5,194	1,287
6,500	0,258	5,841	1,511	5,597	1,276
7,000	0,438	6,308	1,655	5,981	1,263
7,500	0,655	6,757	1,833	6,341	1,250
8,000	0,913	7,186	2,042	6,678	1,238
8,500	1,205	7,591	2,278	6,989	1,230
9,000	1,530	7,971	2,541	7,276	1,228
9,500	1,884	8,324	2,832	7,537	1,232
9,755	2,076	8,492	2,991	7,661	1,236

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P7)
ÁREA DE FORMA FINAL
11,02 m2
COMPRIMENTO L / R
9,76 / 7,91 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,99 x 8,49 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P7 Lona Externa	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-20 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P8

Painel P8 · cauda: de A7 (x 8,75) à ponta (x 9,56) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

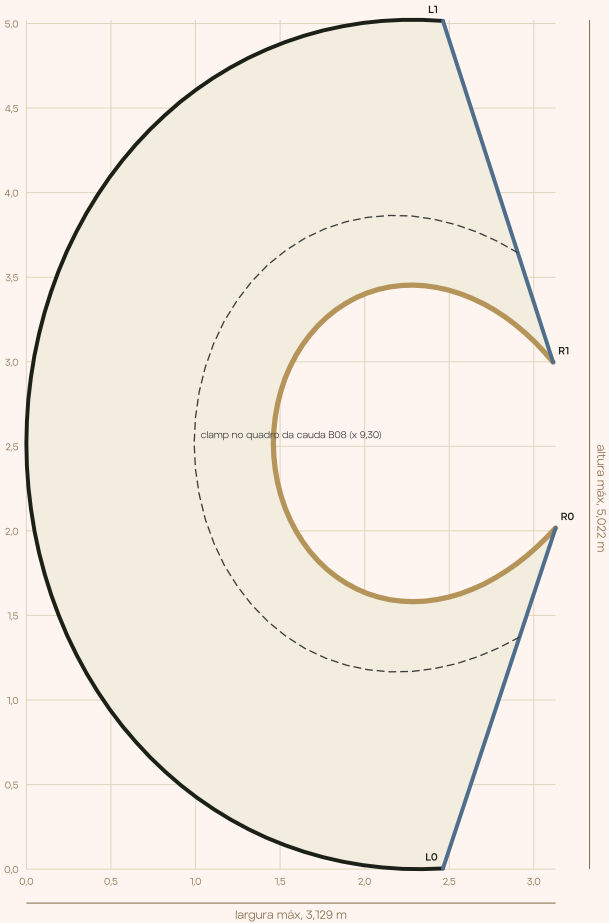


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,463	0,004	3,129	2,017	2,121
0,500	1,964	0,028	2,886	1,797	1,995
1,000	1,483	0,160	2,607	1,644	1,861
1,500	1,045	0,398	2,313	1,583	1,736
2,000	0,670	0,727	2,033	1,624	1,632
2,500	0,373	1,128	1,791	1,762	1,553
3,000	0,162	1,581	1,607	1,978	1,499
3,500	0,038	2,064	1,495	2,249	1,469
4,000	0,001	2,562	1,461	2,545	1,460
4,500	0,052	3,059	1,509	2,840	1,473
5,000	0,191	3,538	1,634	3,103	1,507
5,500	0,418	3,983	1,830	3,307	1,565
6,000	0,730	4,373	2,081	3,428	1,649
6,500	1,118	4,696	2,366	3,448	1,758
7,000	1,567	4,903	2,657	3,365	1,885
7,500	2,054	5,010	2,927	3,199	2,019
7,909	2,463	5,016	3,114	2,997	2,121

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P8)

ÁREA DE FORMA FINAL
9,37 m2

COMPRIMENTO L / R
7,91 / 4,73 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
3,13 x 5,02 m

MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- BOLSA - lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Ponta: a lona fecha em cone sobre o quadro da cauda; a borda R vira bolsa de cinta com olhal e o excedente é dobrado e clampado no anel Ø60,3.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PADRÃO DE CORTE P8 Lona Externa ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-21 SET 2026
---	--



ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P0

Painel P0 · BICO · do anel A0 ($\theta \pm 1,15$ rad do topo) à borda livre em balanço · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

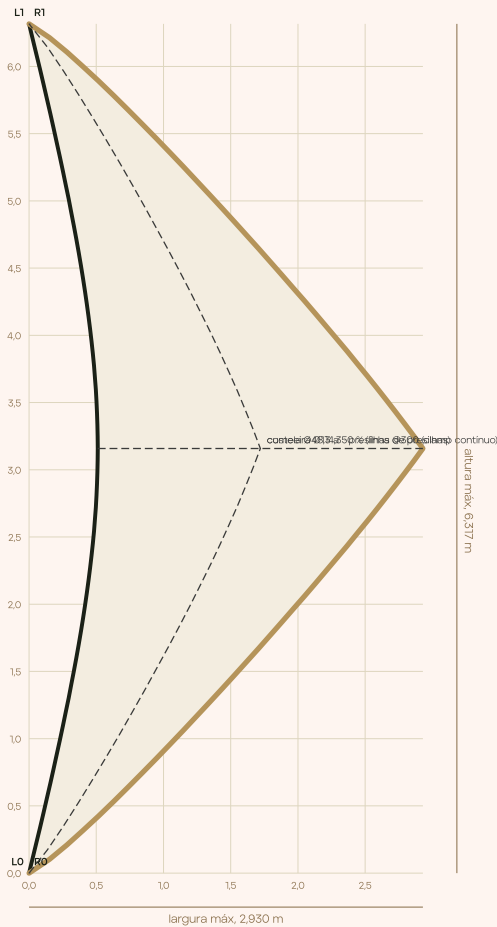


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,500	0,116	0,486	0,555	0,461	0,439
1,000	0,226	0,974	1,033	0,941	0,807
1,500	0,326	1,464	1,490	1,432	1,165
2,000	0,411	1,957	1,936	1,930	1,525
2,500	0,475	2,453	2,367	2,436	1,892
3,000	0,508	2,951	2,773	2,947	2,265
3,500	0,505	3,451	2,705	3,458	2,201
4,000	0,466	3,950	2,294	3,968	1,828
4,500	0,398	4,445	1,860	4,473	1,462
5,000	0,310	4,937	1,413	4,970	1,103
5,500	0,208	5,427	0,952	5,459	0,745
6,000	0,097	5,914	0,469	5,937	0,373
6,414	0,000	6,317	0,000	6,317	0,000

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P0)
ÁREA DE FORMA FINAL
799 m2
COMPRIMENTO L / R
6,41 / 8,64 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,93 x 6,32 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

— KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
— BOLSA · lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
— BORDA LIVRE · bainha dupla 30 mm

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Bordas laterais ($\theta = \pi/2 \pm 1,15$) coincidem com o encontro da borda livre com o anel; reforço triangular 300 mm e olhal do tirante.
- Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P0 Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-22 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · entre x 0.90 e x 1.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,150	0,765	0,000	0,760
0,500	0,054	0,646	0,841	0,497	0,800
1,000	0,089	1,145	0,895	0,996	0,820
1,500	0,110	1,645	0,935	1,497	0,838
2,000	0,118	2,145	0,961	2,001	0,855
2,500	0,116	2,645	0,975	2,509	0,870
3,000	0,104	3,145	0,979	3,021	0,884
3,500	0,087	3,644	0,976	3,538	0,895
4,000	0,067	4,144	0,968	4,063	0,904
4,500	0,051	4,644	0,960	4,593	0,911
5,000	0,042	5,143	0,955	5,128	0,914
5,500	0,043	5,643	0,956	5,665	0,913
6,000	0,053	6,143	0,961	6,200	0,910
6,500	0,071	6,643	0,970	6,729	0,903
7,000	0,090	7,143	0,977	7,252	0,893
7,500	0,107	7,642	0,979	7,769	0,881
8,000	0,117	8,142	0,973	8,280	0,867
8,500	0,118	8,642	0,957	8,787	0,852
9,000	0,107	9,142	0,929	9,290	0,835
9,500	0,084	9,642	0,887	9,791	0,816
10,000	0,047	10,140	0,829	10,289	0,797
10,410	0,000	10,548	0,765	10,697	0,760

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F1)
ÁREA DE FORMA FINAL
9,07 m²
COMPRIMENTO L / R
10,41 / 10,72 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,98 x 10,70 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m² tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m² sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-23 SET 2026

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F2

Forro F2 · entre x 1.65 e x 2.85 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,176	0,053	1,386	0,000	1,211
0,500	0,163	0,552	1,405	0,502	1,244
1,000	0,145	1,052	1,421	1,004	1,277
1,500	0,125	1,552	1,434	1,505	1,310
2,000	0,103	2,051	1,444	2,008	1,341
2,500	0,081	2,551	1,452	2,511	1,371
3,000	0,060	3,050	1,458	3,015	1,398
3,500	0,040	3,550	1,462	3,520	1,423
4,000	0,022	4,050	1,465	4,026	1,442
4,500	0,009	4,549	1,466	4,534	1,457
5,000	0,002	5,049	1,467	5,043	1,465
5,500	0,000	5,549	1,467	5,552	1,467
6,000	0,005	6,049	1,467	6,061	1,461
6,500	0,016	6,549	1,465	6,569	1,449
7,000	0,032	7,049	1,463	7,076	1,432
7,500	0,051	7,549	1,460	7,582	1,410
8,000	0,072	8,048	1,455	8,086	1,383
8,500	0,094	8,548	1,448	8,590	1,355
9,000	0,116	9,047	1,439	9,092	1,324
9,500	0,136	9,547	1,427	9,594	1,291
10,000	0,155	10,046	1,413	10,096	1,258
10,500	0,171	10,546	1,396	10,597	1,225
10,721	0,176	10,767	1,386	10,819	1,211

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F2)
ÁREA DE FORMA FINAL
14,72 m²
COMPRIMENTO L / R
10,72 / 10,82 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,47 x 10,82 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m² tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m² sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F2 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-24 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F3

Forro F3 · entre x 2.85 e x 4.05 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,083	0,000	1,285	0,012	1,202
0,500	0,073	0,500	1,280	0,510	1,207
1,000	0,062	1,000	1,275	1,008	1,213
1,500	0,052	1,500	1,270	1,506	1,218
2,000	0,042	2,000	1,266	2,004	1,223
2,500	0,032	2,499	1,261	2,502	1,229
3,000	0,023	2,999	1,257	3,001	1,233
3,500	0,015	3,499	1,253	3,500	1,237
4,000	0,009	3,999	1,249	3,999	1,241
4,500	0,004	4,499	1,247	4,499	1,243
5,000	0,001	4,999	1,245	4,999	1,244
5,500	0,000	5,499	1,245	5,499	1,245
6,000	0,002	5,999	1,246	5,999	1,244
6,500	0,005	6,499	1,248	6,499	1,242
7,000	0,011	6,999	1,250	6,999	1,239
7,500	0,018	7,499	1,254	7,498	1,236
8,000	0,027	7,999	1,258	7,997	1,232
8,500	0,036	8,499	1,263	8,496	1,227
9,000	0,046	8,999	1,267	8,994	1,222
9,500	0,056	9,499	1,272	9,492	1,216
10,000	0,066	9,999	1,277	9,990	1,211
10,500	0,077	10,499	1,282	10,488	1,205
10,821	0,083	10,820	1,285	10,808	1,202

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F3)
ÁREA DE FORMA FINAL
13,27 m2
COMPRIMENTO L / R
10,82 / 10,80 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,28 x 10,82 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F3 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-25 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F4

Forro F4 · entre x 4.05 e x 5.25 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros




TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,383	0,000	1,577	0,118	1,200
0,500	0,332	0,497	1,528	0,597	1,200
1,000	0,282	0,995	1,480	1,078	1,201
1,500	0,235	1,493	1,434	1,560	1,201
2,000	0,189	1,991	1,389	2,043	1,202
2,500	0,145	2,489	1,347	2,527	1,203
3,000	0,105	2,987	1,308	3,014	1,204
3,500	0,069	3,486	1,273	3,503	1,205
4,000	0,039	3,985	1,244	3,995	1,205
4,500	0,017	4,484	1,223	4,489	1,206
5,000	0,003	4,984	1,210	4,986	1,206
5,500	0,000	5,484	1,207	5,484	1,206
6,000	0,008	5,984	1,214	5,981	1,206
6,500	0,025	6,484	1,230	6,477	1,206
7,000	0,050	6,983	1,255	6,970	1,205
7,500	0,083	7,482	1,287	7,461	1,204
8,000	0,121	7,981	1,323	7,949	1,203
8,500	0,162	8,479	1,364	8,435	1,202
9,000	0,207	8,977	1,407	8,919	1,202
9,500	0,254	9,475	1,453	9,401	1,201
10,000	0,302	9,972	1,499	9,882	1,201
10,500	0,352	10,470	1,548	10,363	1,200
10,796	0,383	10,765	1,577	10,647	1,200

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F4)
ÁREA DE FORMA FINAL
12,84 m2
COMPRIMENTO L / R
10,90 / 10,56 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,58 x 10,76 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F4 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-26 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F5

Forro F5 · entre x 5.25 e x 6.45 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

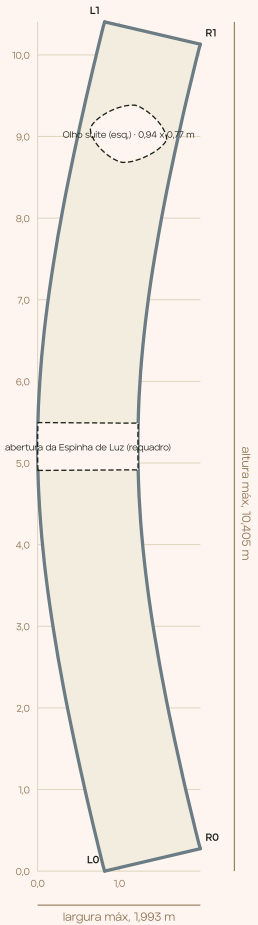


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,820	0,000	1,993	0,275	1,205
0,500	0,699	0,485	1,880	0,722	1,205
1,000	0,585	0,972	1,774	1,173	1,206
1,500	0,477	1,460	1,674	1,627	1,208
2,000	0,376	1,950	1,579	2,084	1,211
2,500	0,282	2,441	1,492	2,545	1,214
3,000	0,198	2,934	1,413	3,011	1,218
3,500	0,125	3,428	1,345	3,483	1,221
4,000	0,067	3,925	1,290	3,960	1,224
4,500	0,025	4,423	1,252	4,443	1,226
5,000	0,003	4,923	1,231	4,930	1,228
5,500	0,002	5,423	1,230	5,417	1,228
6,000	0,022	5,922	1,248	5,904	1,227
6,500	0,081	6,421	1,285	6,387	1,224
7,000	0,118	6,918	1,338	6,866	1,222
7,500	0,189	7,412	1,405	7,338	1,218
8,000	0,272	7,905	1,482	7,805	1,215
8,500	0,365	8,397	1,569	8,266	1,211
9,000	0,465	8,887	1,663	8,724	1,208
9,500	0,572	9,375	1,762	9,178	1,206
10,000	0,685	9,862	1,868	9,630	1,205
10,500	0,804	10,348	1,979	10,079	1,205
10,559	0,820	10,405	1,993	10,130	1,205

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F5)
ÁREA DE FORMA FINAL
12,47 m2
COMPRIMENTO L / R
10,56 / 10,00 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,99 x 10,40 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F5 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-27 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F6

Forro F6 · entre x 6.45 e x 7.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

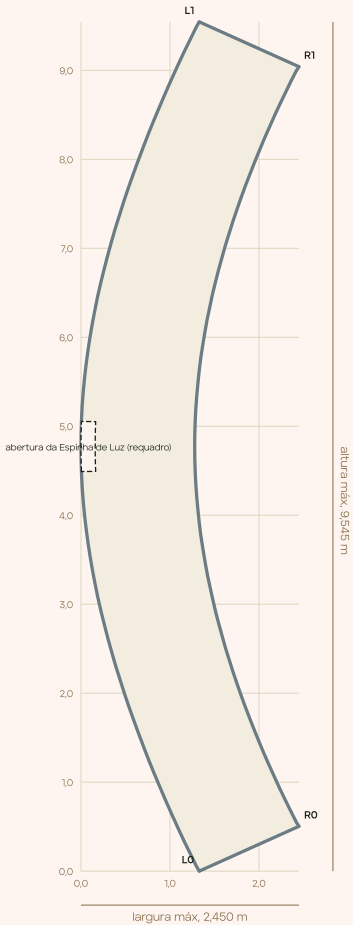


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,330	0,000	2,450	0,503	1,228
0,500	1,108	0,448	2,254	0,888	1,227
1,000	0,904	0,904	2,075	1,282	1,230
1,500	0,716	1,367	1,909	1,684	1,235
2,000	0,543	1,837	1,758	2,095	1,242
2,500	0,389	2,312	1,623	2,516	1,250
3,000	0,256	2,794	1,506	2,949	1,259
3,500	0,148	3,282	1,410	3,392	1,267
4,000	0,067	3,776	1,338	3,846	1,273
4,500	0,017	4,273	1,284	4,307	1,277
5,000	0,000	4,773	1,279	4,773	1,279
5,500	0,017	5,272	1,294	5,238	1,277
6,000	0,067	5,770	1,338	5,700	1,273
6,500	0,148	6,263	1,410	6,153	1,267
7,000	0,257	6,751	1,506	6,597	1,259
7,500	0,389	7,233	1,623	7,029	1,250
8,000	0,543	7,709	1,758	7,450	1,242
8,500	0,716	8,178	1,909	7,861	1,235
9,000	0,905	8,641	2,075	8,263	1,230
9,500	1,108	9,098	2,254	8,658	1,227
9,999	1,330	9,545	2,450	9,042	1,228

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F6)
ÁREA DE FORMA FINAL
11,80 m2
COMPRIMENTO L / R
10,00 / 8,94 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,45 x 9,54 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

- HARPÃO - perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F6 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-28 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F7

Forro F7 · entre x 7.65 e x 8.75 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

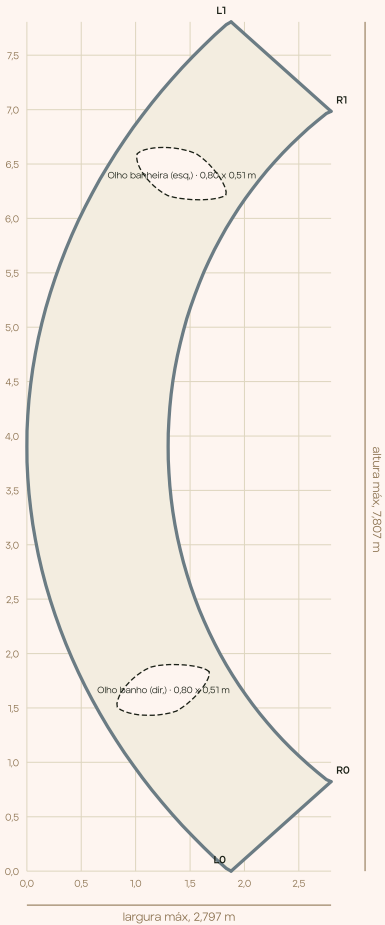


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	1,878	0,000	2,797	0,823	1,234
0,500	1,510	0,336	2,494	1,065	1,226
1,000	1,179	0,710	2,232	1,340	1,227
1,500	0,891	1,112	1,998	1,640	1,235
2,000	0,621	1,539	1,793	1,967	1,247
2,500	0,402	1,988	1,620	2,320	1,262
3,000	0,227	2,456	1,481	2,698	1,277
3,500	0,100	2,939	1,379	3,096	1,288
4,000	0,024	3,433	1,318	3,508	1,296
4,500	0,000	3,933	1,299	3,928	1,299
5,000	0,030	4,431	1,323	4,347	1,296
5,500	0,112	4,924	1,389	4,758	1,287
6,000	0,245	5,406	1,495	5,154	1,275
6,500	0,425	5,872	1,638	5,529	1,260
7,000	0,649	6,319	1,815	5,879	1,246
7,500	0,914	6,743	2,023	6,203	1,234
8,000	1,215	7,142	2,261	6,501	1,226
8,500	1,550	7,515	2,527	6,772	1,226
8,942	1,878	7,807	2,797	6,984	1,234

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: F7)
- ÁREA DE FORMA FINAL
10,01 m2
- COMPRIMENTO L / R
8,94 / 7,11 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
2,80 x 7,81 m
- MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

- HARPÃO: perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
- RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F7 Forro / Revestimento Interno	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-29 SET 2026

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE F8

Forro F8 · entre x 8.75 e x 9.30 (superfície interna, a 0,17 m da membrana) · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

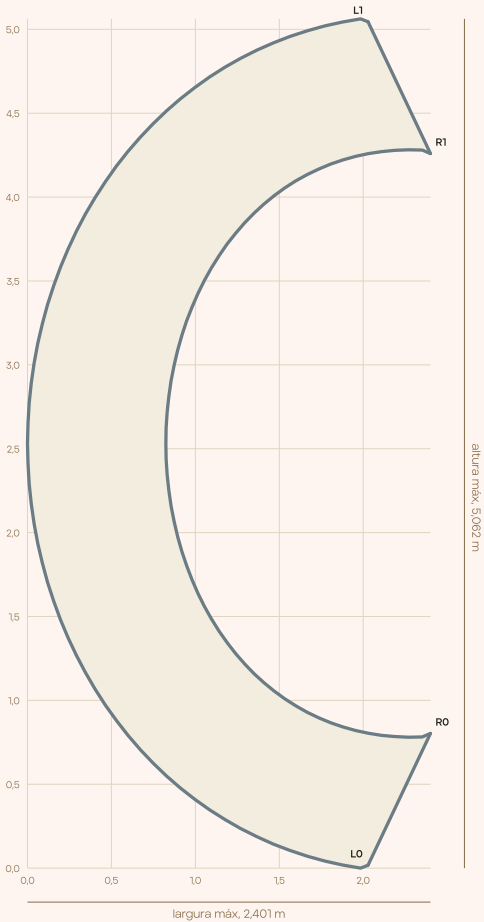


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	2,029	0,017	2,401	0,803	0,870
0,500	1,547	0,112	2,019	0,807	0,840
1,000	1,102	0,337	1,679	0,923	0,823
1,500	0,719	0,657	1,386	1,126	0,816
2,000	0,413	1,051	1,149	1,402	0,816
2,500	0,190	1,498	0,975	1,733	0,819
3,000	0,053	1,978	0,867	2,101	0,823
3,500	0,001	2,475	0,825	2,487	0,824
4,000	0,034	2,973	0,851	2,876	0,823
4,500	0,151	3,458	0,944	3,249	0,820
5,000	0,354	3,914	1,103	3,590	0,816
5,500	0,642	4,322	1,327	3,880	0,815
6,000	1,008	4,661	1,608	4,101	0,820
6,500	1,441	4,909	1,938	4,238	0,835
7,000	1,919	5,051	2,302	4,281	0,860
7,113	2,029	5,045	2,401	4,259	0,870

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: F8)
ÁREA DE FORMA FINAL
5,01m2
COMPRIMENTO L / R
7,11 / 5,33 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
2,40 x 5,06 m
MATERIAL
Trevira CS (poliéster FR) 210 g/m2 tensionado, cor creme; ou lona translúcida 350 g/m2 sobre a Espinha

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos


- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Bordas com harpão soldado (perfil 40 x 20); recortes dos Olhos e dos difusores com anel de harpão próprio.

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F8 Forro / Revestimento Interno
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-30 SET 2026

 ZION CASULO · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS


Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

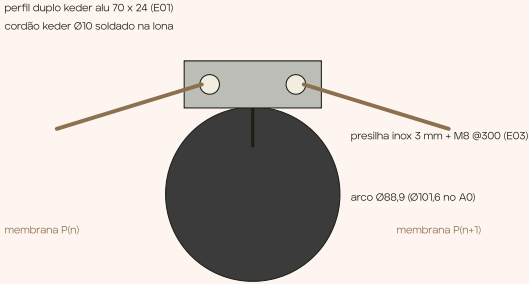


Painéis deslizam no perfil da cauda para a frente; a tensão transversal vem das bolsas de base; presilhas a cada 300 mm.

2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

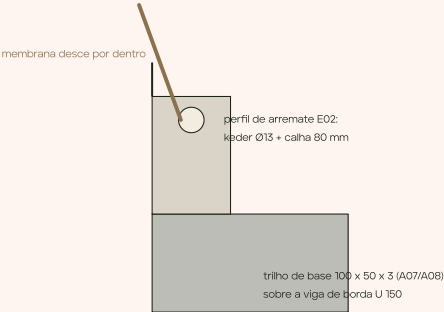


Esticadores M12 nos olhais do trilho, alternados (em cruz), até a pré-tensão de projeto (= 2,5 kN/m); calha drena para os tubos de queda.

3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)




A bolsa é enfiada no tubo antes de fixar o tubo à cumeeira / ao quadro; sem furos na lona.

4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)



Furar a lona só através do reforço; selar com fita butílica sob a barra; torque 6 N.m.

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

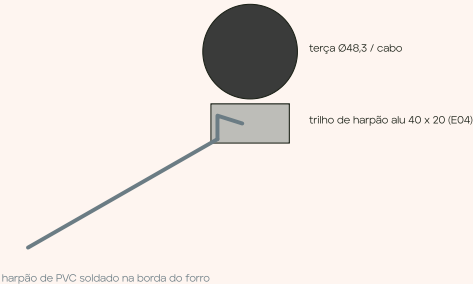

Tensionar com espátula e soprador térmico (80 °C); sem rugas; recortes com anel de harpão.

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA




flecha da catenária ± 20 mm
Cantos: chapa inox 8 mm com 3 furos (cabo, cabo, cinta) no olhal do poste; tensionar em cruz.

Casulo: painéis P1 a P8 no keder dos arcos (1) e nas bolsas de base (2); Bico P0 no keder do A0 e na bolsa do tubo de borda (3); presilhas na cumeeira e na costela; Espinha e Olhos em clamp (4); forro F1 a F8 em harpão (5).
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-90 SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO
Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).

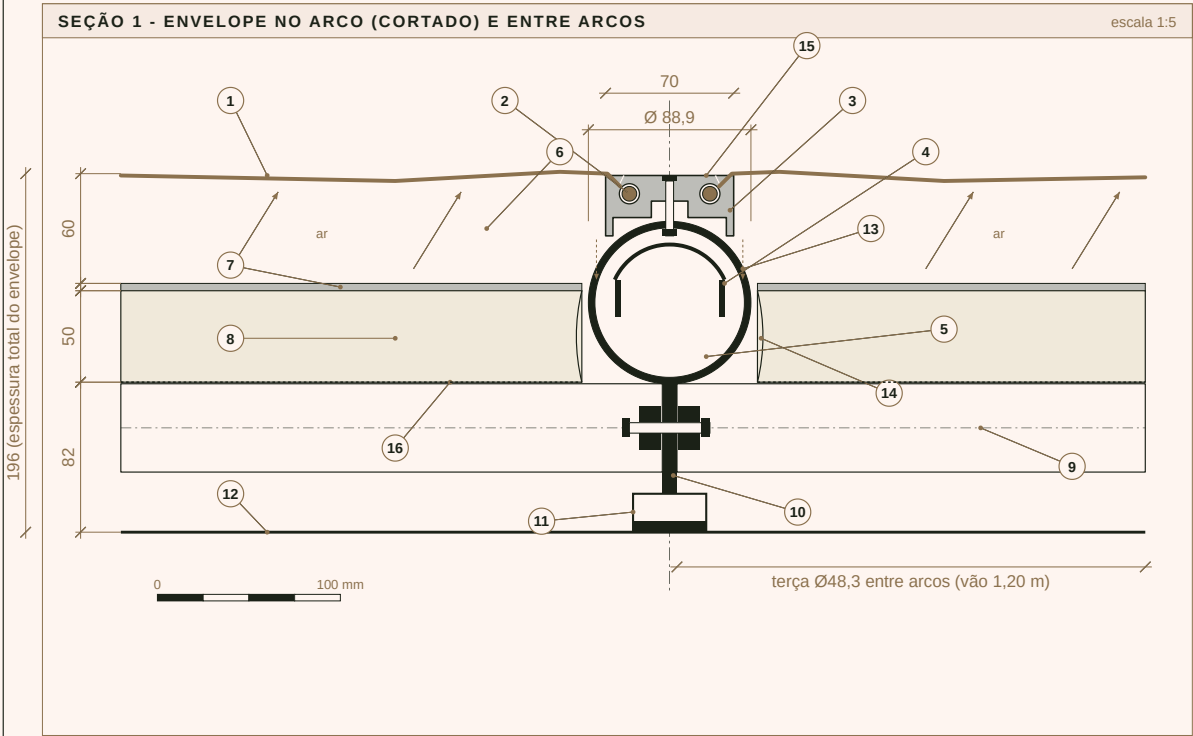

LEGENDA

- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1

2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking

3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze

4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco

5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)

6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira

7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas

8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ ($R = 1,25$)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueados M16

10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)

11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão

12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6


13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta

14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)

15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)

16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-01

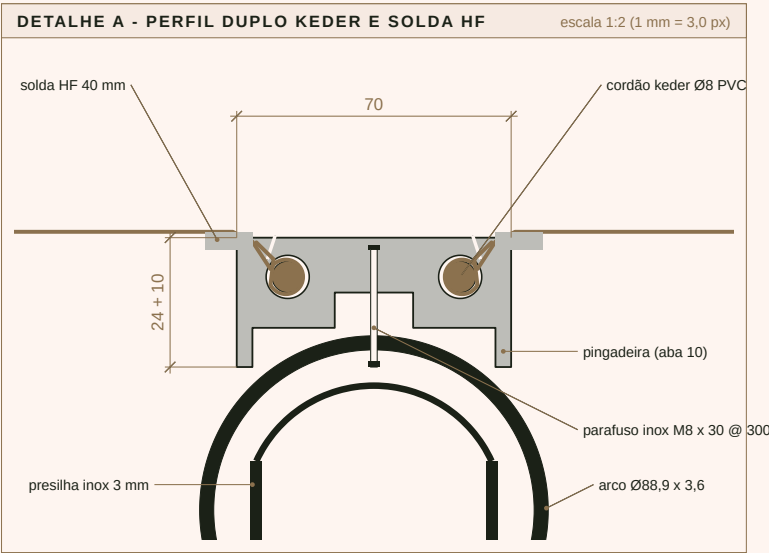

RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.
Especificação: U = 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U = 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO ZION CASULO	ESCALA 1:5 (1 mm = 1,4 px)	
	FOLHA DET-01	DATA SET 2026



ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

- 13

CAMADA 13

ACABAMENTO INTERNO

Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos
- 12

CAMADA 12

INSTALACOES HIDRAULICAS

PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade
- 11

CAMADA 11

INSTALACOES ELETRICAS

Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta
- 10

CAMADA 10

MEMBRANA INTERNA

Forro tensionado acustico define a superficie interna
- 9

CAMADA 09


BARREIRA DE CONDENSACAO

Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade
- 8

CAMADA 08

ISOLAMENTO TERMICO

La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

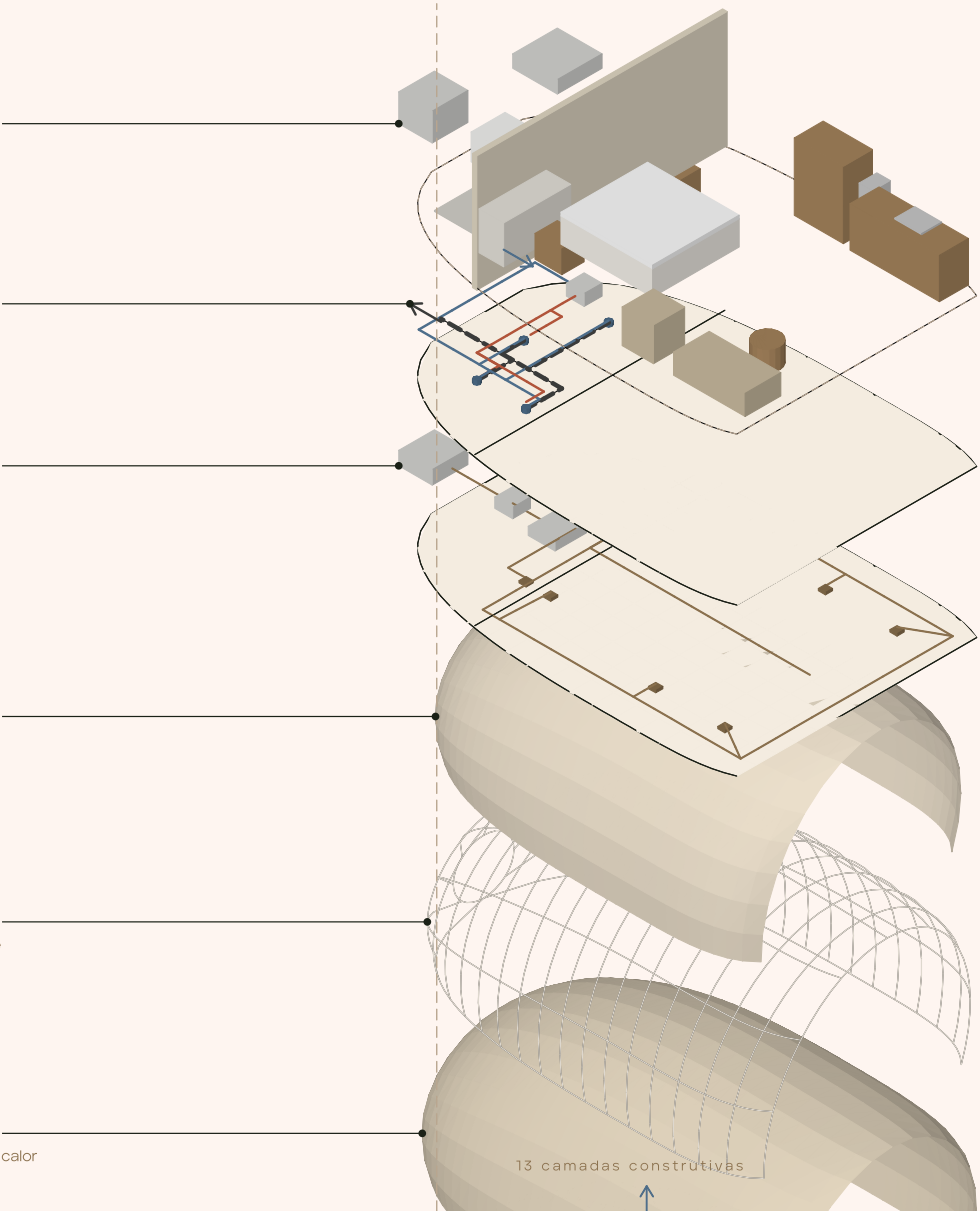


ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05


(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40

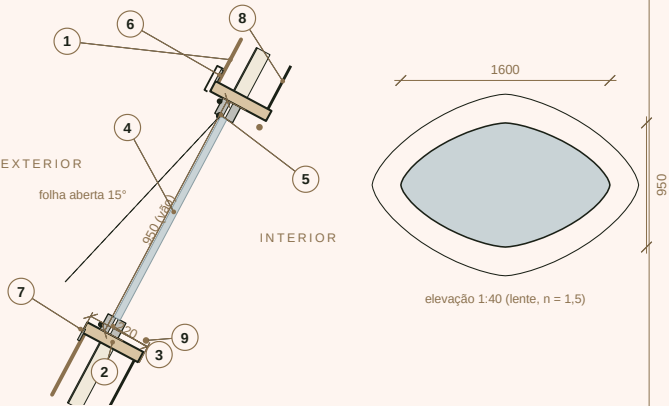


(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5

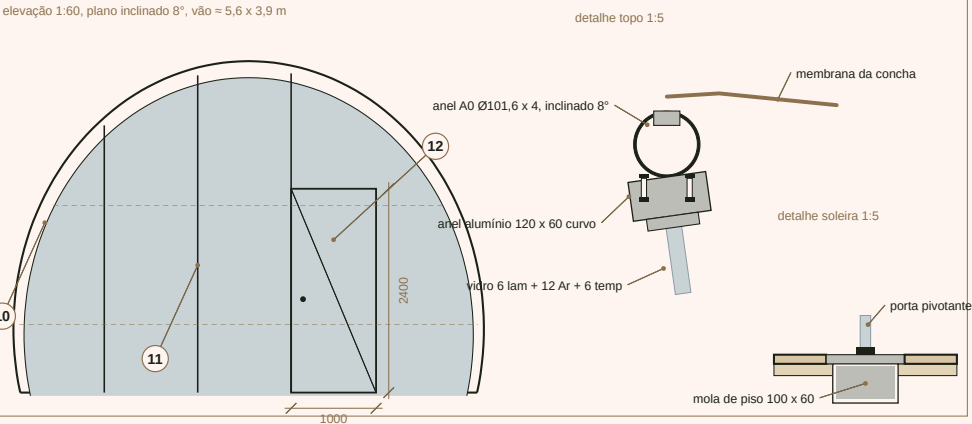

(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5

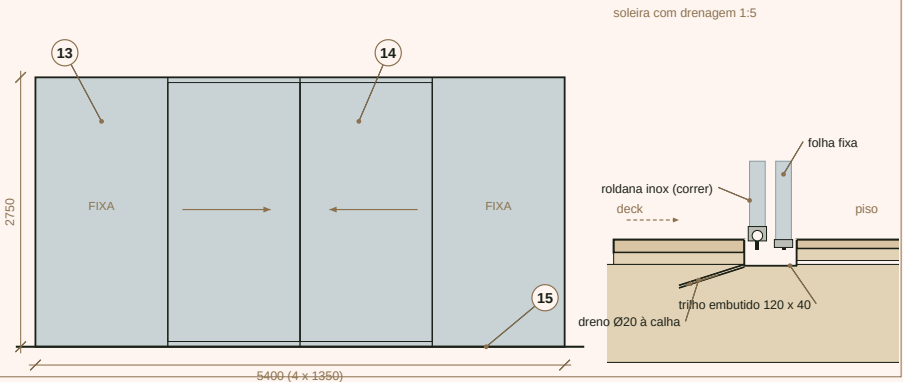


- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)

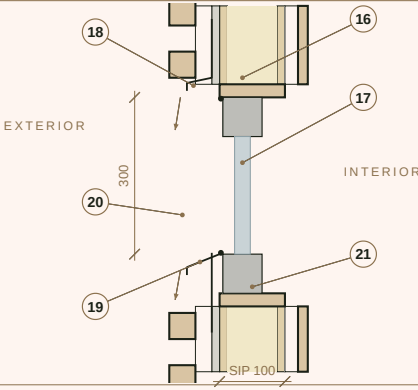

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM


ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

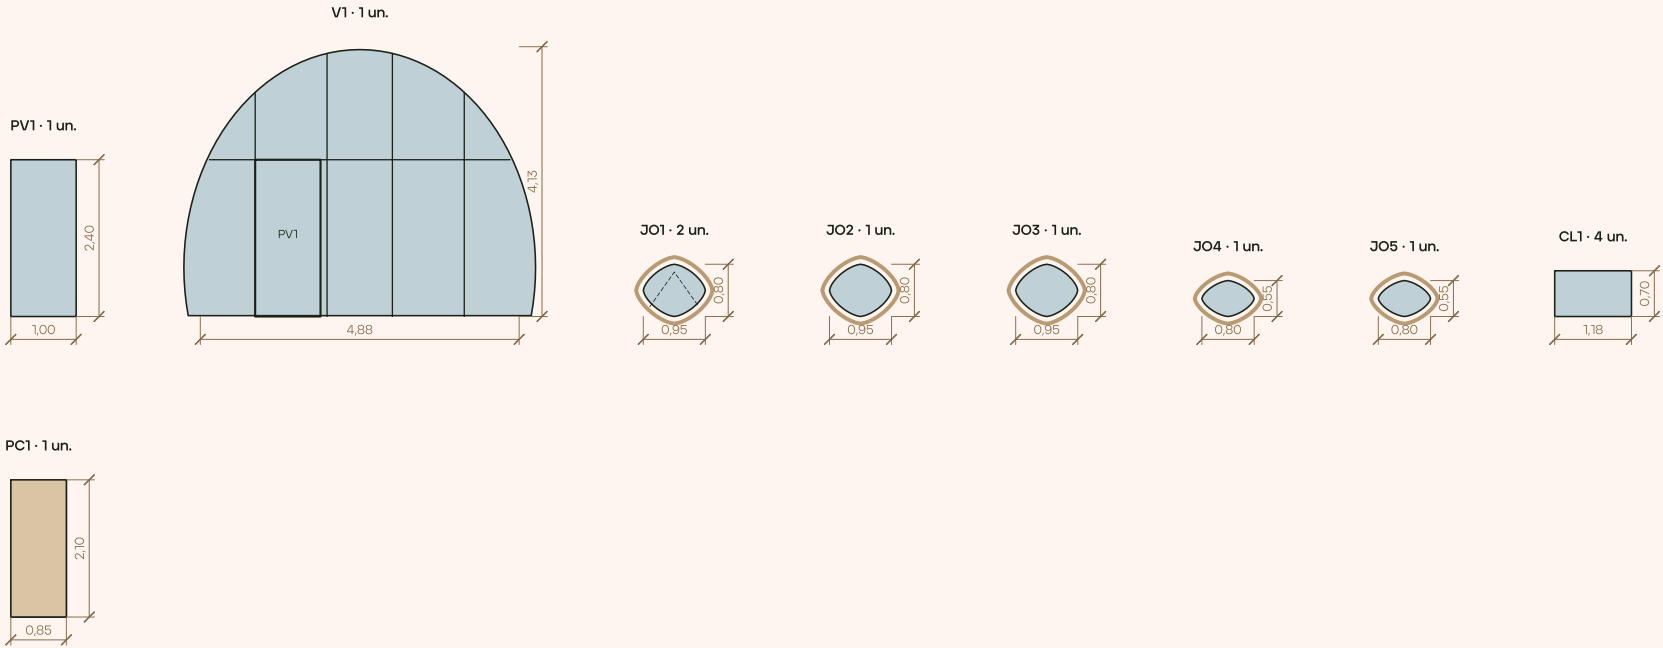

CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95 x 0,80	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suite dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Suite esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banheiro fixo (alto)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banheiro	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

QUADRO DE ESQUADRIAS

9 tipos · 13 unidades

ZION CASULO

ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR


FOLHA PA-09

SET 2026



ZION CASULO · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF em 7 painéis entre arcos + tampas; Espinha de Luz; calhas ocultas nos rodapés; tubos de queda Ø75 nas extremidades

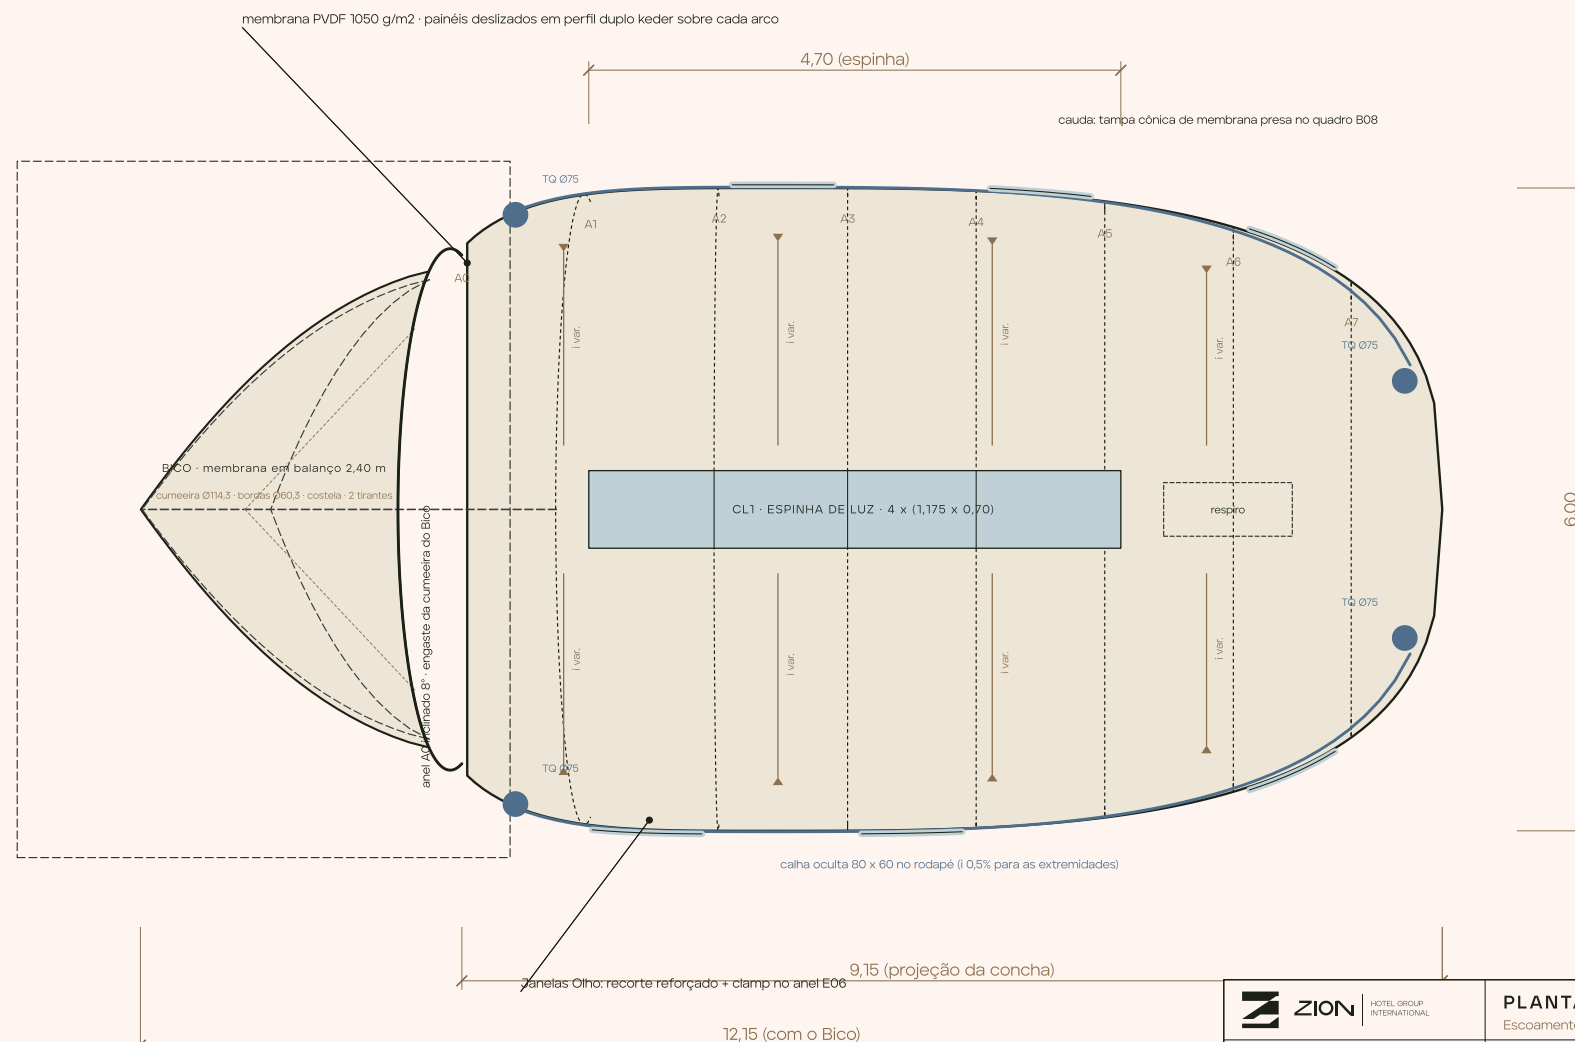

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA DE COBERTURA Escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo e respiros	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA PA-04 SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

31,5 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00	2,40	1	2,4	72	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88	4,13	1	20,15	605	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95	0,80	2	0,76	23	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suíte dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Suíte esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18	0,70	4	0,82	25	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85	2,10	1	1,78	54	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros; tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado) ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias)
2.

Padrões de corte: ZC-LON-001_padroes.dxf e ZC-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90
3.

Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding
4.

Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe
2.

Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido)
3.

Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra
4.

Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração
- Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido
- Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água
- Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado)

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
