



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION LODGE 38 · LOTE 4 DE 4

LOTE 4 MOBÍLIAS

ZL-LOT4-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Marcenaria acoplada, mobiliário solto, equipamentos, enxoval e OS&E. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m²

INTERNOS

30,4 m²

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZL-LOT4-001	Escopo do lote 4	2
ZL-MOB-001	Programa de mobiliário	3

ZL-FFE-001	FF&E e equipamentos	4
ZL-MONT-L4	Sequência do lote 4	6
ZL-LOT4-RFQ	RFQ do lote 4	7

LOTE 4 · MOBÍLIAS · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

- Marcenaria acoplada (MA): peças fixas fabricadas em fábrica com gabaritos da estrutura, montadas e acabadas antes do embarque
- Mobiliário solto (MS) e FF&E Zion New Luxury: cama, chaise, sofá, poltronas, mesas, luminárias, tapetes, cortinas, arte
- Equipamentos: mini cozinha / café (cooktop de indução, forno, geladeira, air fryer, cafeteira), cofre, som, fechadura digital, automação, secador
- Louças, metais e banheira (fornecimento; instalação no lote 1/3 conforme o manual)
- Enxoval, amenities, OS&E, sinalização e kit de segurança

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

- Piso, deck e instalações: lote 1
- Estrutura: lote 2
- Lona, forro e vidros: lote 3

FORNECEDOR-TIPO

Marcenaria com CNC e experiência em peças curvas + fornecedores de FF&E (curadoria Zion) + instalador de equipamentos.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

À operação: unidade mobiliada, inventário fotografado, manual do hóspede e do operador

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

- Do lote 2: talões / cantoneiras nos arcos para a marcenaria acoplada; gabarito da seção da concha
- Do lote 3: forro fechado e envelope estanque; requadros dos Olhos
- Do lote 1: pontos de água, esgoto, tomadas dedicadas (cooktop, forno), dutos

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

PROGRAMA DE MOBILIÁRIO · ANTEPROJETO

posições e dimensões do modelo 3D · o projeto de interiores ZL-INT-001 (marcenaria acoplada, elevações, detalhes) segue o método do Casulo e é a próxima entrega desta linha

PEÇA	TIPO	DIMENSÕES (M)	POSIÇÃO	CLASSE
Cama king 1,93 x 2,03	bed	2,00 x 1,94 x h 0,55	x -0,55 a 1,45 · y -0,97 a 0,97	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,60 x 0,60 x h 0,50	x -0,55 a 0,05 · y 1,10 a 1,70	MS (solta)
Criado-mudo	table	0,60 x 0,60 x h 0,50	x -0,55 a 0,05 · y -1,70 a -1,10	MS (solta)
Café / minibar	cabinet	1,70 x 0,75 x h 0,90	x 0,20 a 1,90 · y 2,20 a 2,95	MA (acoplada)
Closet	cabinet	1,70 x 0,75 x h 2,20	x 0,20 a 1,90 · y -2,95 a -2,20	MA (acoplada)
Sofá 2,40	sofa	1,20 x 2,40 x h 0,80	x -2,70 a -1,50 · y -1,20 a 1,20	MS (solta)
Mesa lateral	table	Ø0,60 x h 0,45	(-1,15; 0,00)	MS (solta)
Poltrona	chair	1,00 x 0,80 x h 0,75	x -2,90 a -1,90 · y 1,70 a 2,50	MS (solta)
Bancada 1,40	vanity	0,70 x 1,40 x h 0,85	x 1,75 a 2,45 · y 1,00 a 2,40	MA (acoplada)
Bacia sanitária	wc	0,70 x 0,70 x h 0,42	x 2,70 a 3,40 · y 1,60 a 2,30	MS (solta)
Chuveiro 0,95 x 0,90	shower	0,95 x 0,90 x h 0,02	x 2,40 a 3,35 · y -1,60 a -0,70	MS (solta)
Banheira 0,90 x 0,75 (sentar)	tub	0,90 x 0,75 x h 0,58	x 1,80 a 2,70 · y -2,50 a -1,75	MS (solta)

Marcenaria acoplada (MA): fixada à estrutura (mastros, pilares, anéis, parede da cabeceira) e nunca à lona; fundos e tampos recortados por gabarito;

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 para peças que carregam nos mastros (Safari) e nos pilares (Lodge).

FF&E, EQUIPAMENTOS, ENXOVAL E OS&E

42 itens · quantidades por unidade · Zion New Luxury · sem preços (PREÇO A COTAR)

MOBILIÁRIO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
M01	Cama king box + colchão	Box 1,93 x 2,03 revestido em linho, colchão molas ensacadas 32 cm, pillow top	un	1	Suíte · sob a Lanterna Zion
M02	Cabeceira estofada	Painel curvo em madeira laminada com estofado em linho, integrado à marcenaria	un	1	Suíte
M03	Criado-mudo suspenso	Carvalho natural, gaveta com fecho toque, iluminação embutida	un	2	Suíte
M16	Ripado da cabeceira	Painel ripado termotratado com fitas LED (parede da cabeceira)	m2	8	Parede-corda
M04	Sofá 2,40 m	Estrutura em madeira, espuma D33, tecido bouclé antimancha	un	1	Estar · sofá 2,40
M07	Poltrona de leitura	Poltrona giratória em couro natural e madeira	un	1	Estar
M08	Mesa de centro / lateral	Tampo em pedra (quartzito) sobre base de madeira torneada	un	1	Estar · mesa lateral
M09	Ilha do café / minibar	Marcenaria sob medida com tampo em pedra, frigobar embutido, gaveta de cápsulas	un	1	Estar · café / minibar 1,70 m
M10	Closet / armário	Marcenaria em carvalho com portas ripadas, cabideiro, prateleiras e cofre	un	1	Estar · closet 1,70 x 0,75
M12	Bancada do banho	Tampo em pedra com cuba esculpida, gabinete ripado suspenso	un	1	Banho · bancada 1,40 m
M13	Espelho com iluminação	Espelho redondo Ø0,90 com LED perimetral e antiembaçante	un	1	Banho

LUMINÁRIAS E DECORAÇÃO

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
F01	Arandela de leitura	Arandela articulada em latão escovado, LED 2700 K dimerizável	un	2	Suíte
F02	Luminária de piso	Luminária de piso em madeira e linho, 2700 K	un	1	Estar
F03	Luminária de mesa	Abajur cerâmico artesanal, 2700 K	un	1	Estar
F04	Tapete de lã	Tapete de lã tecido à mão 2,00 x 3,00	un	1	Estar
F06	Cortinas e blackout	Cortina de linho + blackout motorizado, por metro linear de fachada de vidro	m	14,1	Cinco faces de vidro · 5 x 2,82 m
F07	Cortina da lanterna / óculo	Tela de sombreamento motorizada circular	un	1	Lanterna · tela circular Ø1,50
F08	Arte e objetos	Curadoria Zion: peças de artesanato regional, cerâmica, vasos, livros	vb	1	Geral
F10	Plantas e vasos	Plantas de interior em vasos de cerâmica	vb	1	Geral

EQUIPAMENTOS

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
E01	Frigobar	Frigobar 90 L embutido, silencioso (< 38 dB), classe A	un	1	Estar
E02	Cafeteira de cápsulas + chaleira	Cafeteira de cápsulas premium e chaleira elétrica de pescoço de ganso	cj	1	Estar

E03	Cofre eletrônico	Cofre digital 20 L para notebook	un	1	Closet
E04	Caixa de som / rádio	Sistema de som Bluetooth de mesa	un	1	Estar
E06	Secador de cabelo	Secador profissional 2000 W com suporte	un	1	Banho
E10	Fechadura eletrônica	Fechadura digital com cartão/senha na porta principal	un	1	Porta PC1
E11	Termostato e automação de cenas	Central de automação (cenas de luz, cortinas, clima, som)	un	1	Ático

ENXOVAL E OS&E

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
O01	Enxoval de cama	3 jogos: lençóis 400 fios algodão egípcio, edredom, duvet, protetor, 6 travesseiros	cj	1	Suíte
O02	Enxoval de banho	3 jogos: toalhas de banho/rosto/piso 600 g/m2, roupões, chinelos	cj	1	Banho
O03	Amenities	Dispensers de vidro (shampoo, condicionador, sabonete, hidratante) + kit de boas-vindas (estoque inicial)	cj	1	Banho
O04	Louças, talheres e copos	Serviço para 4 (café da manhã e taças de vinho), bandeja, cesta	cj	1	Café
O05	Manta, almofadas e decoração têxtil	Manta de lã, 6 almofadas, cortina de banho em linho	cj	1	Geral
O06	Cabides, lixeiras, acessórios	Cabides de madeira, lixeiras, cesto de roupa, kit de costura, guarda-chuva	cj	1	Geral
O07	Sinalização e papelaria Zion	Placas, diretório de serviços, QR de automação, cartões	cj	1	Geral
O08	Kit de segurança	Extintor, detector de fumaça, lanterna, kit primeiros socorros	cj	1	Geral

DECK E EXTERIOR

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
D01	Espreguiçadeiras	Par de espreguiçadeiras em madeira teca e corda náutica, almofadas outdoor	par	1	Deck
D02	Mesa e cadeiras de deck	Mesa redonda Ø0,80 + 2 cadeiras em madeira e corda náutica	cj	1	Deck
D04	Balizadores e lanternas de deck	Lanternas portáteis LED recarregáveis + tochas de citronela	cj	1	Deck
D05	Ducha externa	Ducha de deck em aço inox com base de cumaru	un	1	Deck
D07	Fogueira / fire pit	Fire pit em aço corten com grelha e tampa	un	1	Deck · opcional



BANHO (ACESSÓRIOS)

CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	AMBIENTE
B01	Acessórios do banho	Toalheiros aquecidos, ganchos, saboneteiras e porta-papel em latão escovado	cj	1	Banho
B02	Banqueta e bandeja da banheira	Banqueta de teca e bandeja para banheira	cj	1	Banho · banheira de sentar
B03	Balança e acessórios	Balança digital, secador de toalhas, kit de manicure	cj	1	Banho

Z

ZION LODGE · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m2 (banho 6,90 m2) · deck 30,37 m2 · total 68,68 m2

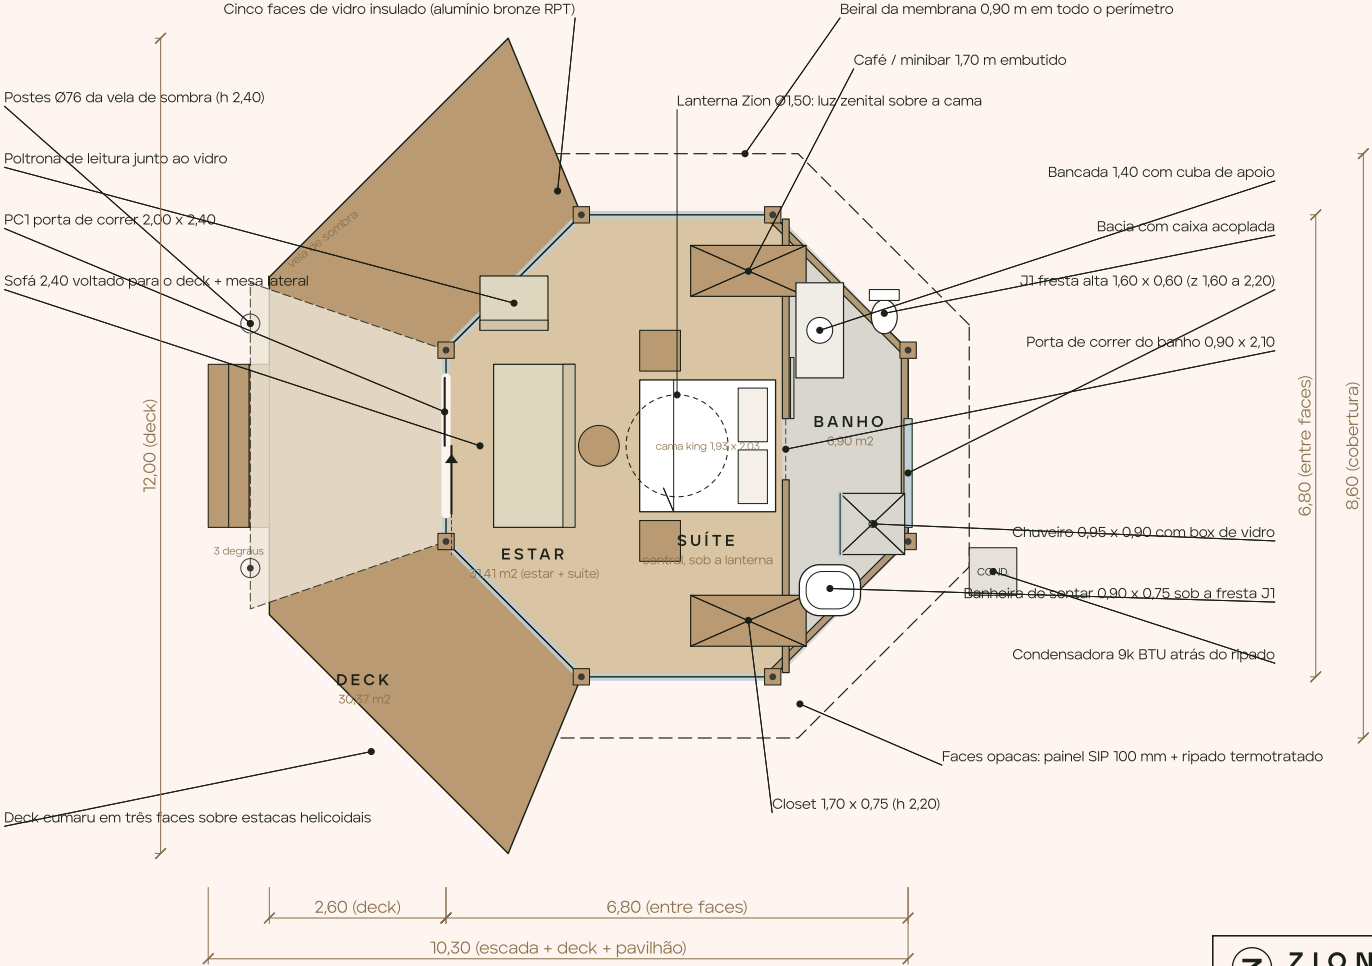

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Estar e suíte sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces	
	ZION LODGE	
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros	FOLHA 02/LG
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SEQUÊNCIA · BANHO, MÓVEIS, ACABAMENTOS E ENTREGA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntes e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Closet, café/minibar, criados e bancada 1,40 fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 4

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (MA, MS, FF&E)
2.

Pranchas de interiores IN-01 a IN-06 (Casulo) ou programa de mobiliário e planta humanizada
3.

Gabarito da seção da concha / paredes (lote 2) para as peças acopladas
4.

Paleta de materiais e acabamentos Zion

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça de marcenaria (com ferragens e acabamento) e por item de FF&E
2.

Prazo, amostras de lâmina, pedra e tecidos
3.

Plano de embalagem: módulos ≤ 0,95 x 2,10 m e ≤ 60 kg
4.

Garantia e assistência

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Marcenaria: ± 3 mm; portas e gavetas reguladas; acabamento PU fosco sem marcas

FF&E conforme especificação; inventário fotografado na entrega

Equipamentos testados e com nota fiscal em nome da operação

Garantia: marcenaria 3 anos · FF&E conforme fabricante

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.

Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.

Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.

Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).

Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
