



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION SAFARI · LOTE 2 DE 4

LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZS-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m²

INTERNOS

28,0 m²

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZS-LOT2-001	Escopo do lote 2	2
ZS-EST-001	Lista de peças	3
ZS-EST-002	Geometria dos mastros e postes	4

ZS-FAB-001	Fabricação e tolerâncias	5
ZS-LOG-001	Transporte	6
ZS-MONT-L2	Sequência do lote 2	11
ZS-LOT2-RFQ	RFQ do lote 2	12

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

23 tipos de peça · peso total ≈ 1.447 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
B01	Mastro principal M1	1	5,05	Tubo Ø139,7 x 4,5	ASTM A500 Gr. B galv.	79,8	80	Corte + base articulada soldada + capitel usinado	Pino Ø30 na base D09; capitel D10 com 3 M16 para a coroa
B02	Mastro secundário M2	1	4,00	Tubo Ø114,3 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	46,6	47	Idem	Idem
B03	Coroa do Zênite: 3 braços Ø48,3 x 950 + anel Ø1.200	1	0,95	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10 calandrada	ASTM A500 / A36 galv.	39,2	39	Solda em gabarito + usinagem do capitel	Capitel D10: 3 M16 8.8; anel recebe clamp E05 e óculo
B04	Coroa do Respiro: 3 braços Ø48,3 x 700 + anel Ø700 + chaminé	1	0,70	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10	ASTM A500 / A36 galv.	28,8	29	Idem + veneziana de alumínio	Idem
B05	Pilar do corpo P1 a P10	10	2,90	Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	30,4	304	Corte + chapas de topo e base soldadas	Base D01 (4 M16) na viga de borda; topo D11 (4 M16) no anel VB
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB06 (4,75 / 2,70 m)	6	4,97	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	77,5	465	Corte + chapas de topo soldadas + perfil de borda	Chapa de topo D12 com 4 M16 8.8 entre segmentos; D11 nos pilares
C02	Poste externo PE01 a PE07 (inclinado 8°)	7	2,80	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,5	137	Corte + base articulada + olhal soldado	Pino Ø20 na base D13; olhal recebe chapa de canto D14
C03	Cabo de borda Ø12 inox (4 trechos)	4	10,50	Cabo inox AISI 316 Ø12 mm 7 x 19	inox 316	7,5	30	Terminais prensados	Esticador M20 inox nas chapas de canto D14
C04	Estai do poste Ø10 inox	7	4,20	Cabo inox AISI 316 Ø10 mm	inox 316	2,7	19	Terminais prensados	Esticador M16 + olhal da estaca de tração F03
C05	Cabo de suspensão do forro Ø4 inox	16	3,50	Cabo inox Ø4	inox 316	0,3	5	Terminais prensados	Olhais nos braços das coroas e no anel VB
D01	Chapa de base dos pilares (200 x 200 x 10)	10	0,20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	3,1	31	Corte plasma + solda	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6)	24	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	19	Corte + furação	4 M12 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	50	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	45	Corte + furação	2 M12 por aba
D09	Base articulada do mastro (chapa 250 x 250 x 12 + orelhas + pino Ø30)	2	0,25	Chapa A36 + pino SAE 1045	ASTM A36 galv.	9,5	19	Corte + solda + usinagem do pino	4 chumbadores M20 na viga A02 reforçada
D10	Capitel usinado do mastro (disco Ø200 x 20 + 3 orelhas)	2	0,20	Aço SAE 1020 usinado	SAE 1020 galv.	6,8	14	Torno + fresa + solda	3 M16 8.8 para os braços da coroa
D11	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	10	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	14	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral
D12	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10)	12	0,18	Chapa A36	ASTM A36 galv.	2,1	25	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos
D13	Base articulada do poste (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	7	0,15	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	3,4	24	Corte + solda	4 M12 no cabeçote F02
D14	Chapa de canto da membrana (inox 8 mm, 3 furos Ø18)	7	0,18	Chapa inox 304	inox 304	1,1	8	Corte laser	Olhal do poste + 2 esticadores + cinta
E01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha	8	3,75	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	6,0	48	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no anel VB
E02	Perfil de clamp do anel de cume (alumínio 60 x 12, 2 metades)	2	3,80	Alumínio 6063 usinado	alumínio	4,6	9	Usinagem	M10 inox @150 no anel B03/B04 + EPDM
E03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	24	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	25	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos painéis e anéis internos
E04	Esquadria do óculo Ø1.200 com ruptura térmica	1	3,80	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	12,0	12	Calandra + usinagem	M8 inox no anel + selante estrutural

GEOMETRIA · MASTROS, COROAS, ANEL DE BEIRAL, PILARES E POSTES

coordenadas no sistema do projeto · alturas em metros sobre o piso

MASTROS E COROAS

CUME	X	Y	TOPO DA MEMBRANA	TOPO DO MASTRO	ANEL Ø
Cume principal (Zênite)	6,30	0,40	5,80	5,05	1,20
Cume secundário (Respiro)	1,60	1,60	4,60	4,00	0,70

PILARES DO CORPO (Ø101,6 x 4,0 · topo 2,90)

PILAR	X	Y
P01	0,00	-2,70
P02	0,00	2,70
P03	9,50	-2,70
P04	9,50	2,70
P05	3,20	-2,70
P06	3,20	2,70
P07	6,40	-2,70
P08	6,40	2,70
P09	9,50	0,00
P10	0,00	0,00

POSTES EXTERNOS INCLINADOS 8° (Ø76,1 x 3,6)

POSTE	X	Y	COTA DO CABO DE BORDA
PE01	-2,40	-3,70	2,65
PE02	-2,40	3,70	2,65
PE03	10,50	-3,70	2,65
PE04	10,50	3,70	2,65
PE05	4,00	-3,70	2,65
PE06	4,00	3,70	2,65
PE07	10,50	0,00	2,65

ANEL DE BEIRAL 150 x 100 x 4,0

6 segmentos (4,75 / 4,75 / 2,70 m por lado) com chapas de topo 150 x 180 x 10 e 4 M16 em cada emenda; perímetro 29,8 m; calha oculta no perfil de borda E01. Base articulada dos mastros (D09) e capitéis usinados (D10) conforme DET-11.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 μ m) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira $\leq 2,4 \times 1,2$ m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)


volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: mastros, coroas, anéis, pilares	5,2 x 1,2 x 0,8 m	5	827
Estrado de estrutura 2: anel de beiral, postes, cabos, chapas	4,8 x 1,2 x 0,8 m	4,6	783
Painéis SIP em 2 pacotes	2,8 x 1,25 x 1,3 m	9,1	1828
Caixa da membrana + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	501
Cavaletes de vidro x 4 (fachada, lateral, janelas, óculo)	2,9 x 0,6 x 2,9 m	20,2	1458
Paletes de piso x 2	2,4 x 1,35 x 1,0 m	6,5	1904
Paleta de deck	2,0 x 1,0 x 1,4 m	2,8	979
Paleta de instalações + louças + marcenaria + hidromassagem	2,4 x 2,0 x 1,4 m	6,7	1795
Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	762

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

 ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)


Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes

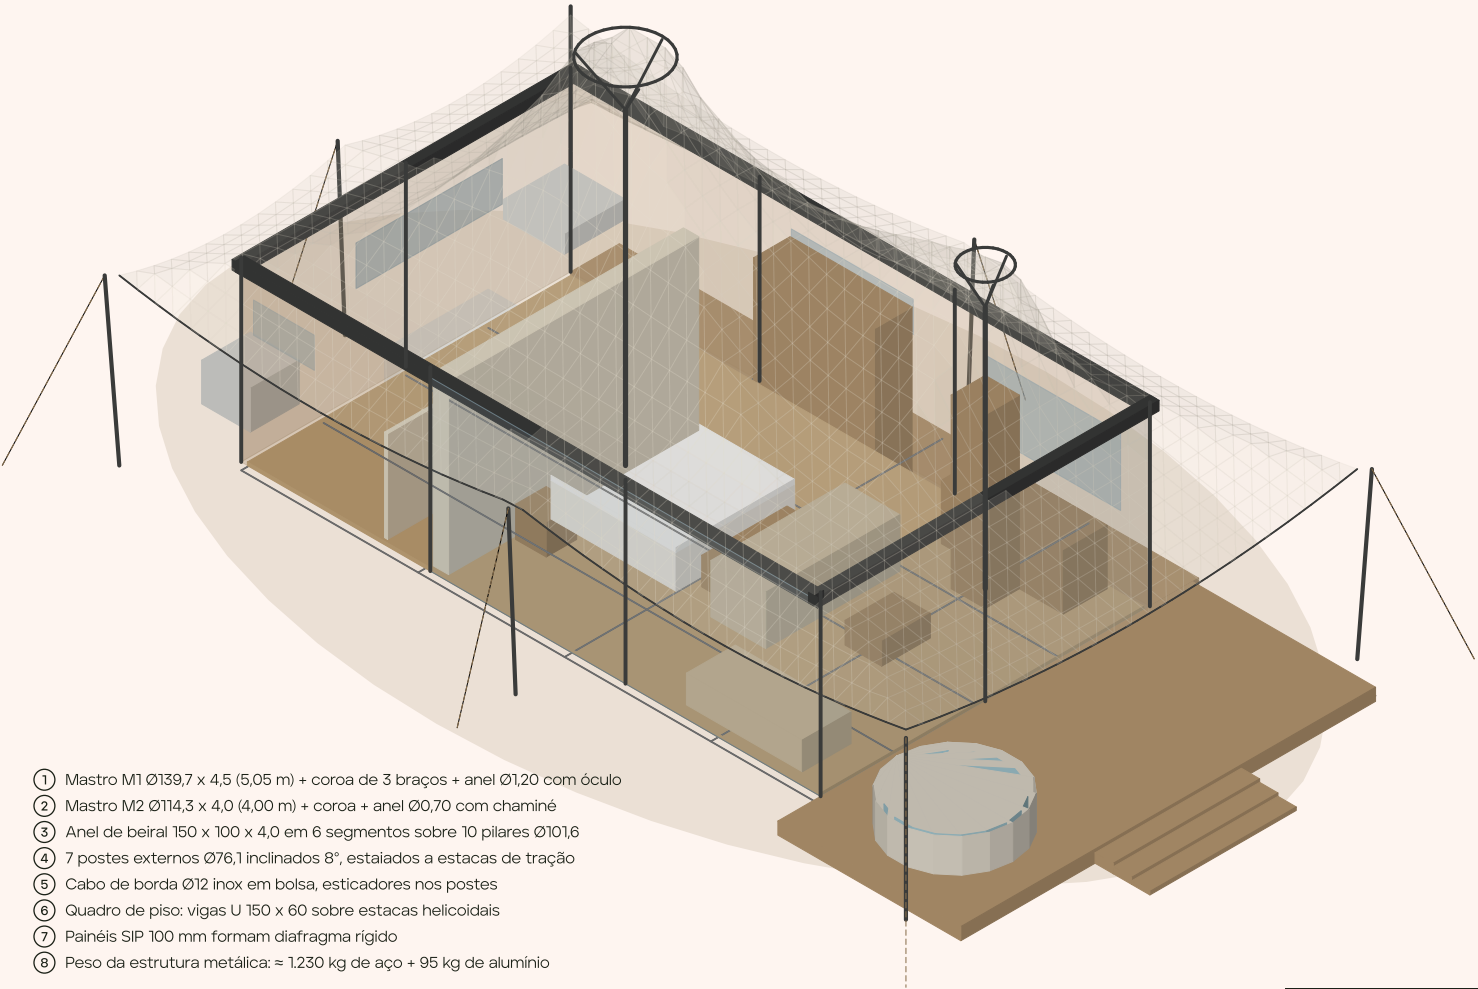


- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais

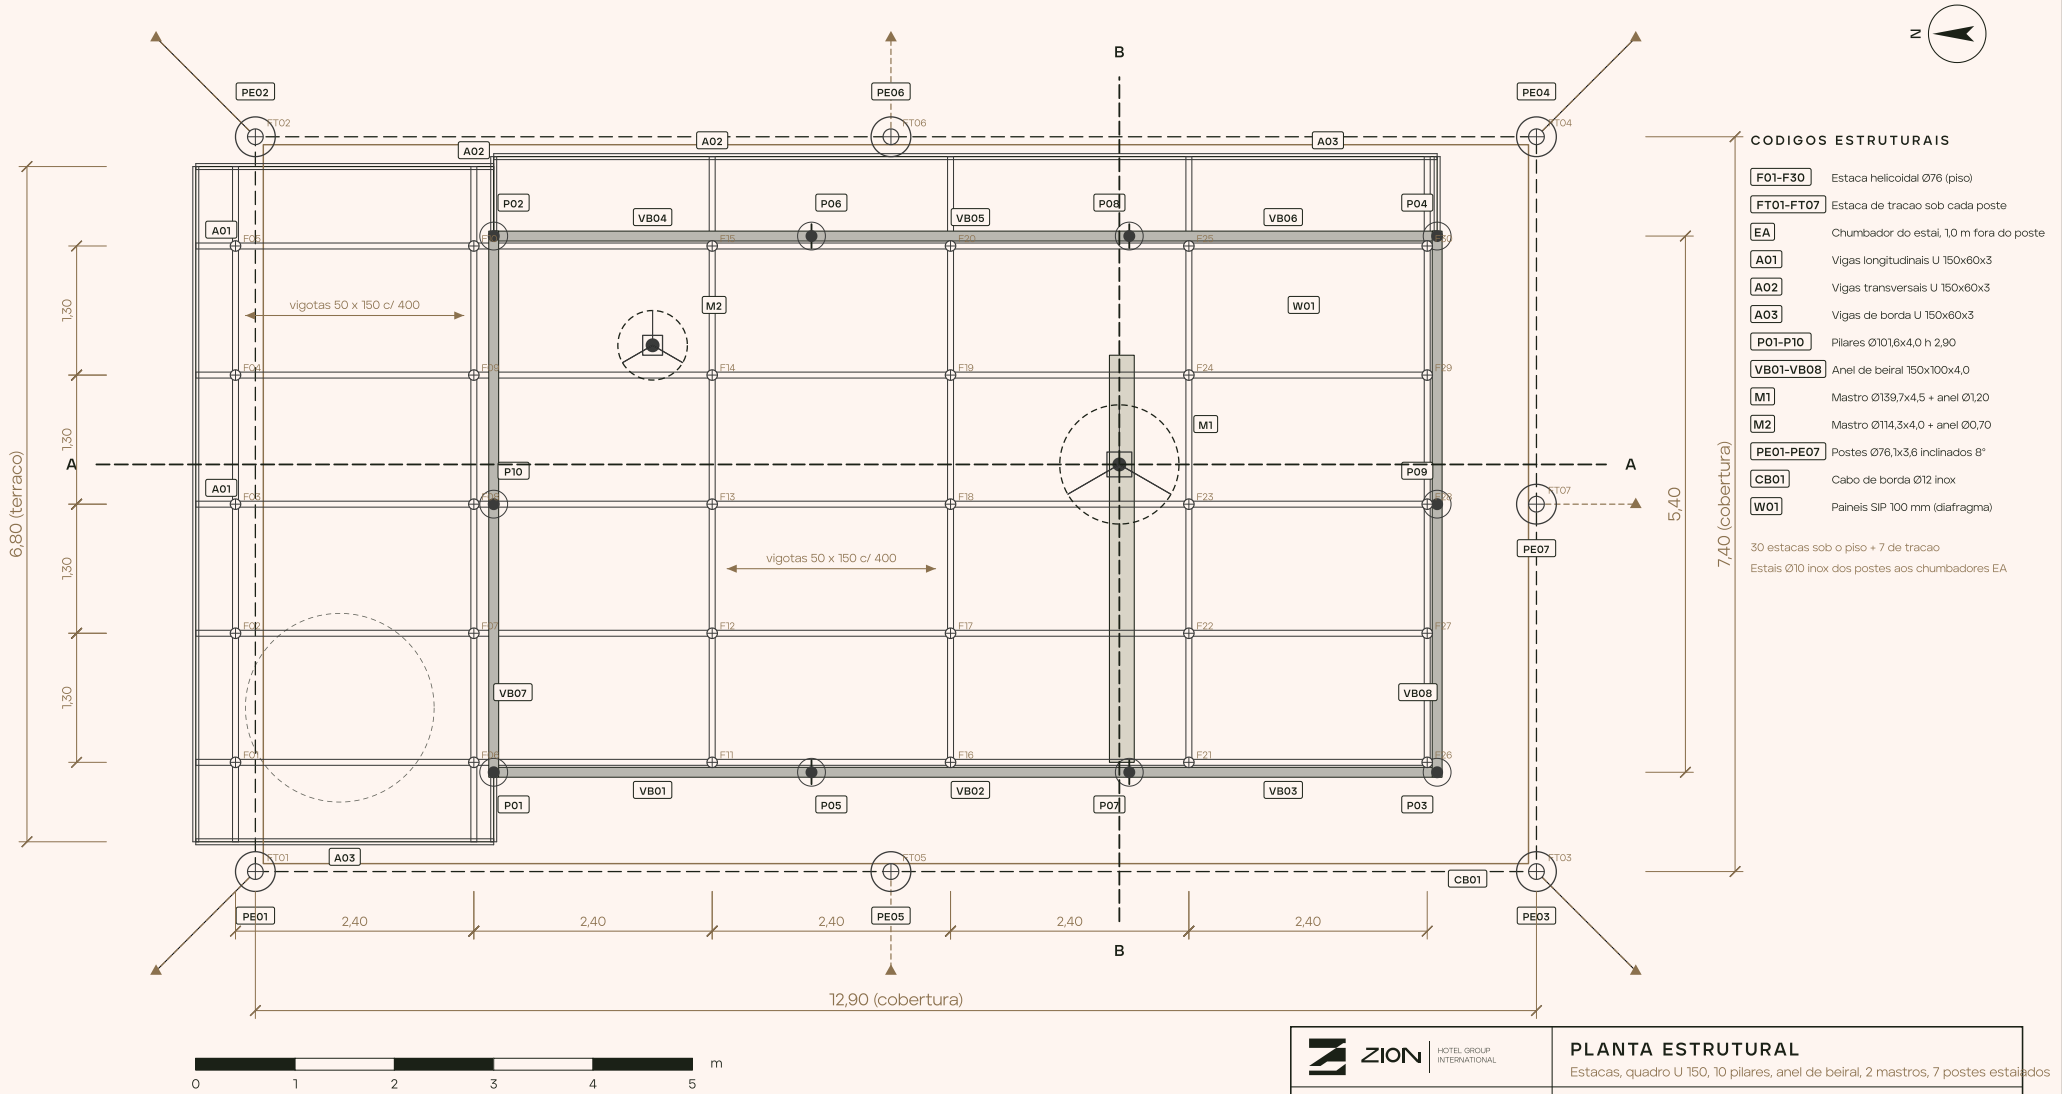

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA ESTRUTURAL	
	Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03b/27 SET 2026


 MASTROS E COROAS

Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cume, anel de beiral parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION SAFARI | DET-11

ELEVAÇÕES - MASTROS M1 E M2

1:47 (1 mm = 0,08 px)

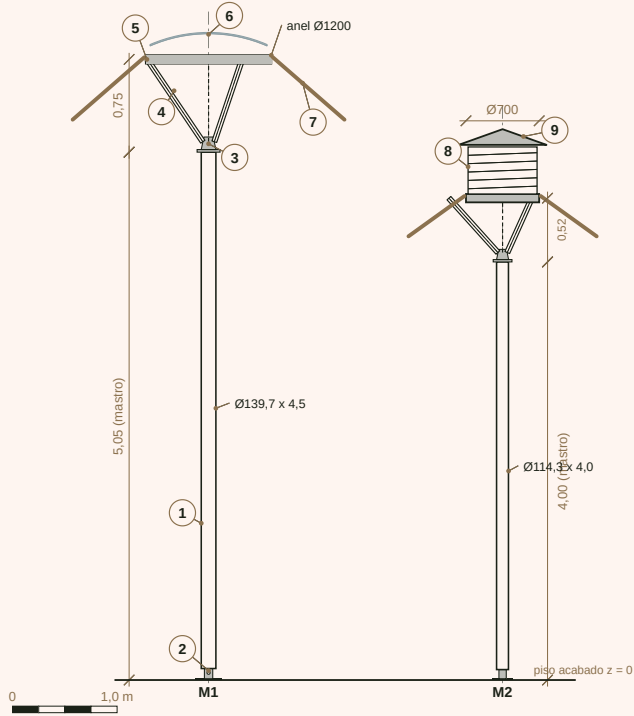


- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó
- 2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30
- 3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)
- 4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°
- 5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200

- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT
- 7 Membrana deixando o anel a = 41°
- 8 Chaminé do Respirio Ø660 com veneziana motorizada
- 9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela
- 10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base


BASE ARTICULADA DO M1

1:5 (1 mm = 0,6 px)

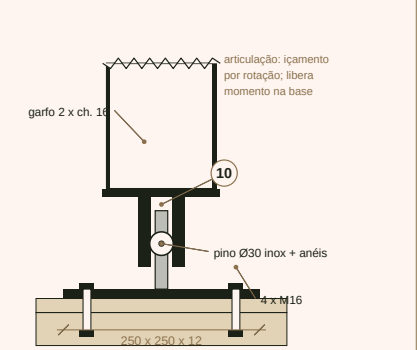

POSTE EXTERNO INCLINADO 8° E ESTAI - GEOMETRIA


1:40 (1 m = 25 px)

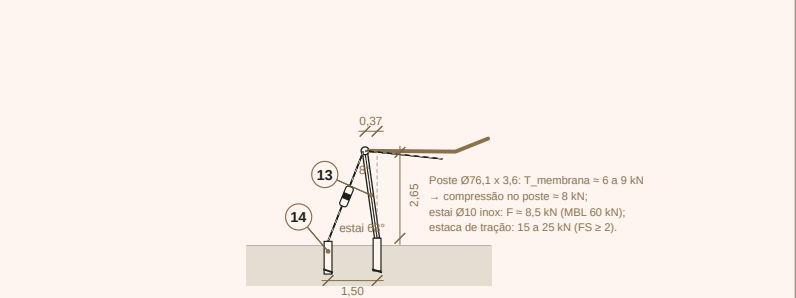

- 11 Emendas do anel de beiral sobre os pilares
- 12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)
- 13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo
- 14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ANEL DE BEIRAL 150 X 100 X 4: SEGMENTOS E EMENDA

1:60 / 1:5

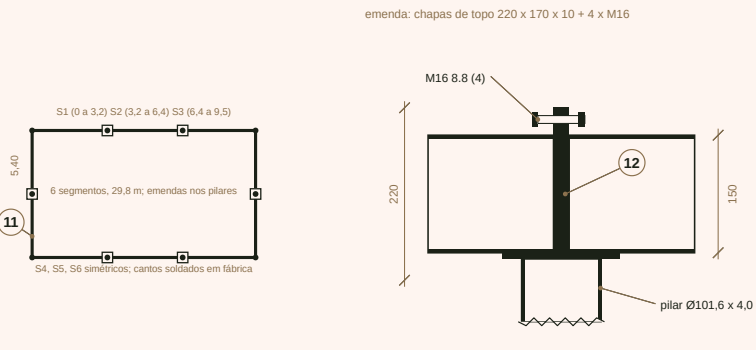

CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS

Vento V0 = 45 m/s, q = 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m² x 95 m² = 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cume (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão (M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ = 106, N_{Rd} = 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beiral: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f = 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) = 38 kN (MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

ZION GLAMPING COLLECTION
MASTROS E COROAS
ZION SAFARI


ESCALA
1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA
DET-11

DATA
SET 2026

ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala

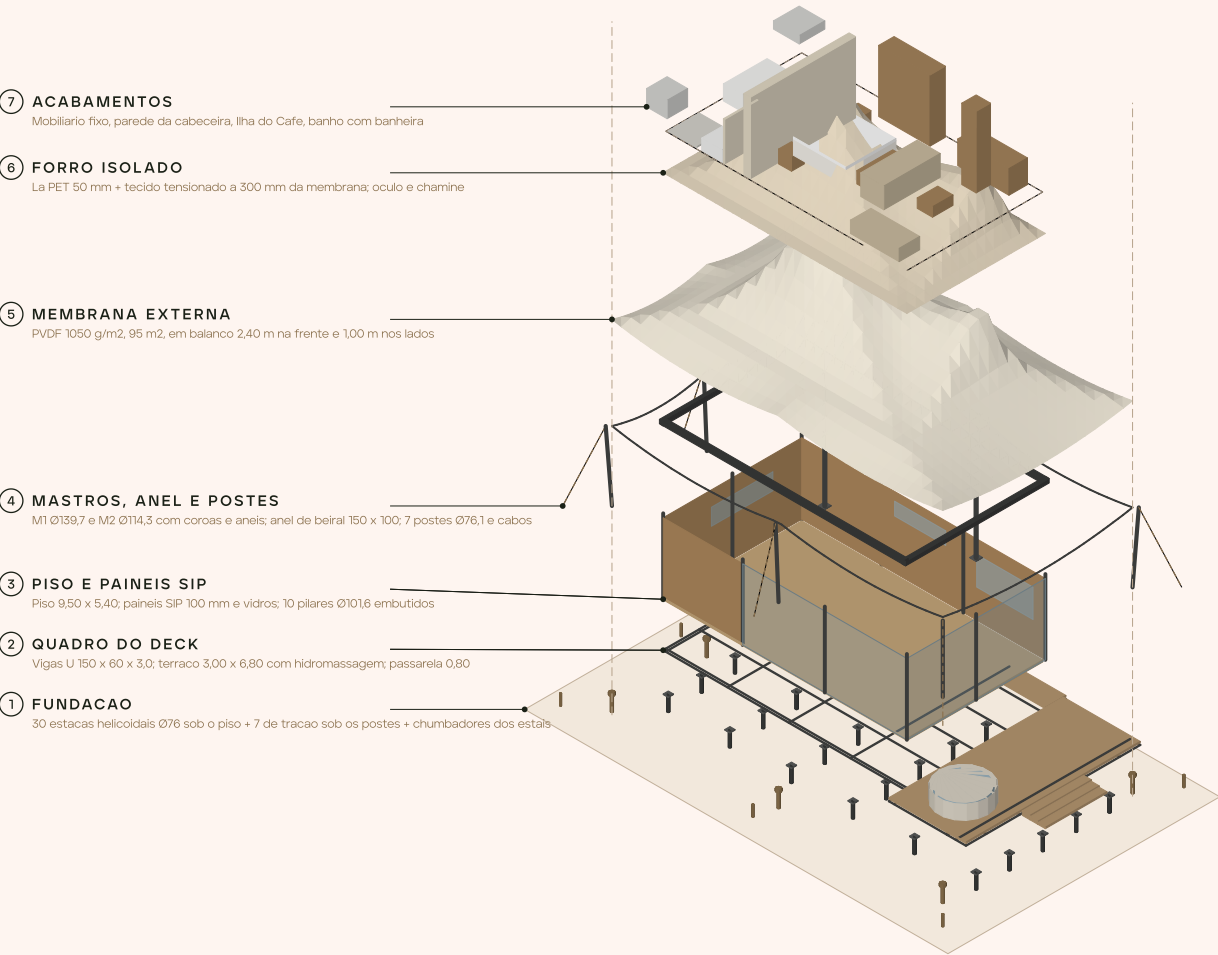

SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1230 kg de aco + 95 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 10,8 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para icar os mastros
Postes estalados a 7 estacas de tracao
Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem de pilares, anel de beiral e mastros 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Talha 1 t + tripé; munck opcional para M1	Mastro sem escora antes do anel; içar somente com a base articulada travada e 3 cordas guia	☐ 10 pilares aprumados (1/500) e chumbados ☐ 6 segmentos do anel parafusados (4 M16, 120 N·m) ☐ Mastros M1 e M2 içados e pinados; coroas e anéis fixados ☐ Diagonais do anel conferidas
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 postes pinados nas bases, inclinação 8° conferida ☐ Estais passados sem tensão final ☐ Cabo de borda nas chapas de canto (frouxo)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.

DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.

Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.

Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.

Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.

Proposta de fit test e de embalagem
4.

Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
- Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
- Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
- Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.
