ZION | HOTEL GROUP INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · PROJETO ARQUITETÔNICO COM INSTALAÇÕES

ZION CABIN 28

ARQUITETURA · HIDRÁULICA · ESGOTO · ELÉTRICA

CB28-ARQ-001 · REV 00 — CONCEITO · 28/10/2026

Cabana em light steel frame de 4,00 x 7,00 m (28 m2 externos, 24,8 m2 úteis, deck de 8 m2 à parte), opção A "Linear" do handoff de 16/10/2026: entrada lateral, cama de frente para a fachada de vidro, mesa no meio, núcleo de banho e cozinha no fundo com uma só parede de prumadas. Este caderno fixa a geometria (planta, cortes, fachadas), as aberturas, as camadas de fechamento e os pontos de água, esgoto e energia que o projeto de steel frame (CB28-EST-001) e o manual de montagem (CB28-MONT-001) usam.

Pendente com o Bruno: confirmar a opção A (a opção B muda só os painéis internos e a parede molhada), as medidas do núcleo, chuveiro elétrico ou aquecedor a gás, e o revestimento externo. Unidade: metros; perfis em milímetros.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
CB28-ARQ-001-01	Ficha técnica	2
CB28-ARQ-001-02	Regras e premissas	3
CB28-ARQ-001-03	Esquadrias, áreas, níveis	8
CB28-ARQ-001-04	Camadas e materiais	9
CB28-ARQ-001-H02	Hidráulica	11
CB28-ARQ-001-H04	Esgoto	13
CB28-ARQ-001-L02	Elétrica · pontos	15
CB28-ARQ-001-L03	Elétrica · circuitos	16
CB28-ARQ-001-05	Validação e pendências	17

FICHA TÉCNICA

o que é a cabana, como mede, do que é feita

MODELO	ZION CABIN 28 · cabana em light steel frame (LSF) · opção A "Linear" do handoff de 16/10/2026 (entrada lateral, cama de frente para o vidro, mesa no meio, casal)
MEDIDA EXTERNA	7,0 x 4,0 m = 28,0 m2 (medida pelo lado de fora das paredes) · interna 6,7 x 3,7 m = 24,8 m2 útil · deck 4,00 x 2,00 = 8,0 m2 à parte
PÉ-DIREITO	forro inclinado: 2,2 m no lado baixo (y = 4) a 2,8 m no lado alto (y = 0, entrada) · telhado de uma água, queda 15.4 % (8.7°) para o lado baixo
PROGRAMA	quarto / sala contínuos com cama queen, mesa e estar junto à fachada de vidro · núcleo no fundo: banho 1,60 x 2,00 (box 1,60 x 0,90, vaso, lavatório) + cozinha 1,60 x 1,58 aberta (bancada 1,58 com cuba, cooktop de indução 2 bocas, frigobar, micro-ondas)
NÚCLEO	uma peça só com uma só parede de prumadas (P-I01) e uma só saída de esgoto; o handoff previa 1,60 x 2,20 + 1,60 x 1,80 (= 4,00 m), ajustado para 2,00 + 1,58 para caber nos 3,70 m internos ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — BRUNO
SISTEMA	plataforma de piso em perfis Ue 150 @ 400 sobre 3 vigas de fundação em caixão (2 x Ue 200) e 15 apoios · 6 painéis externos + 2 internos em Ue 90 @ 400 com OSB 11,1 e fita X · 19 vigas de cobertura Ue 200 @ 400 · modulação única de 400 mm (in-line framing)
FECHAMENTOS	parede externa 150 mm (revestimento 10 + câmara ventilada 25 + membrana + OSB 11,1 + Ue 90 com lã 90 + gesso 12,5) · cobertura: OSB 18,3 + membrana + ripas + telha metálica 0,50, lã 100 + forro de gesso · piso: OSB 18,3 + vinílico / madeira; banho com cimentícia + impermeabilização + porcelanato
ABERTURAS	V1 fachada de vidro 3,50 m até o telhado (correr 2 folhas 1,80 x 2,20 + fixos + bandeira) · P1 entrada 0,90 x 2,10 · J1 banho 0,60 x 0,60 · J2 cozinha 1,20 x 0,60 · J3 quarto 1,20 x 1,00 · J4 alta 1,20 x 0,50 · P2 banho 0,70 x 2,10
INSTALAÇÕES	água fria 25 / 20 mm e quente PEX 16 na parede molhada e na parede de fundo · esgoto Ø 100 / 50 / 40 sob a plataforma com caixa sifonada e tubo ventilador · elétrica 220 V monofásica, QDC 12 posições, 6 circuitos + 2 reservas · chuveiro elétrico na base, aquecedor a gás como opção
STATUS	REV 00 — CONCEITO · projeto preliminar / executivo conceitual para orçamento e protótipo · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO em tudo que depende de cálculo ou norma

REGRAS DO PROJETO (HANDOFF 16/10/2026)

valem para este caderno e para os dois seguintes

REGRA	COMO APARECE AQUI
Desenho Zion	Projeto próprio; nenhuma solução copiada de terceiros. Referências de mercado só como estudo.
Números	Nenhum preço, certificado, resistência ao vento, vida útil, prazo ou capacidade estrutural inventado: vêm do fornecedor ou do engenheiro.
Responsabilidade técnica	A Zion não é responsável técnica. Projeto executivo, cálculo, ART / RRT e aprovação municipal são de profissional habilitado contratado para o sítio.
Esgoto	A cabana entrega o esgoto num só ponto. Destino (rede, ETE compacta, fossa + filtro + sumidouro) depende do terreno e da prefeitura.
Área	Área construída coberta fechada medida pelo lado de fora das paredes (28,0 m2). Área útil (24,8 m2) e deck (8,0 m2) informados à parte.
Imagens	Medidas só deste caderno (vetor). Imagens de IA servem para aparência, nunca para medir.

PREMISSAS ASSUMIDAS NESTA REVISÃO

Opção A "Linear" (o Bruno ainda não escolheu A ou B): o envelope, a plataforma, a cobertura e a fachada de vidro são iguais nas duas; a opção B move o núcleo para o meio e muda P-101 / P-102 e a prumada.

Núcleo ajustado para banho 1,60 x 2,00 e cozinha 1,60 x 1,58 (o handoff dizia "cerca de" 2,20 e 1,80, que somam 4,00 m e não cabem nos 3,70 m internos).

Telhado de uma água com queda transversal (lado alto na entrada, lado baixo com a calha), beirais de 0,35 m nos lados e 0,30 m na frente e no fundo.


Cabana sem reservatório de água e sem tratamento de esgoto: liga-se à infraestrutura do sítio num só ponto de cada rede, na parede de fundo.

Água quente: chuveiro elétrico na base; aquecedor de passagem a gás no nicho externo como opção (sem gás no kit base).

Perfis LSF ZAR-275 de 0,95 mm e modulação de 400 mm são premissa de projeto; a bitola final, as vergas e as ancoragens saem do cálculo do engenheiro do fabricante.

ZION CABIN 28 · PLANTA BAIXA · OPÇÃO A LINEAR


Arquitetura · mobiliário · cotas externas e internas

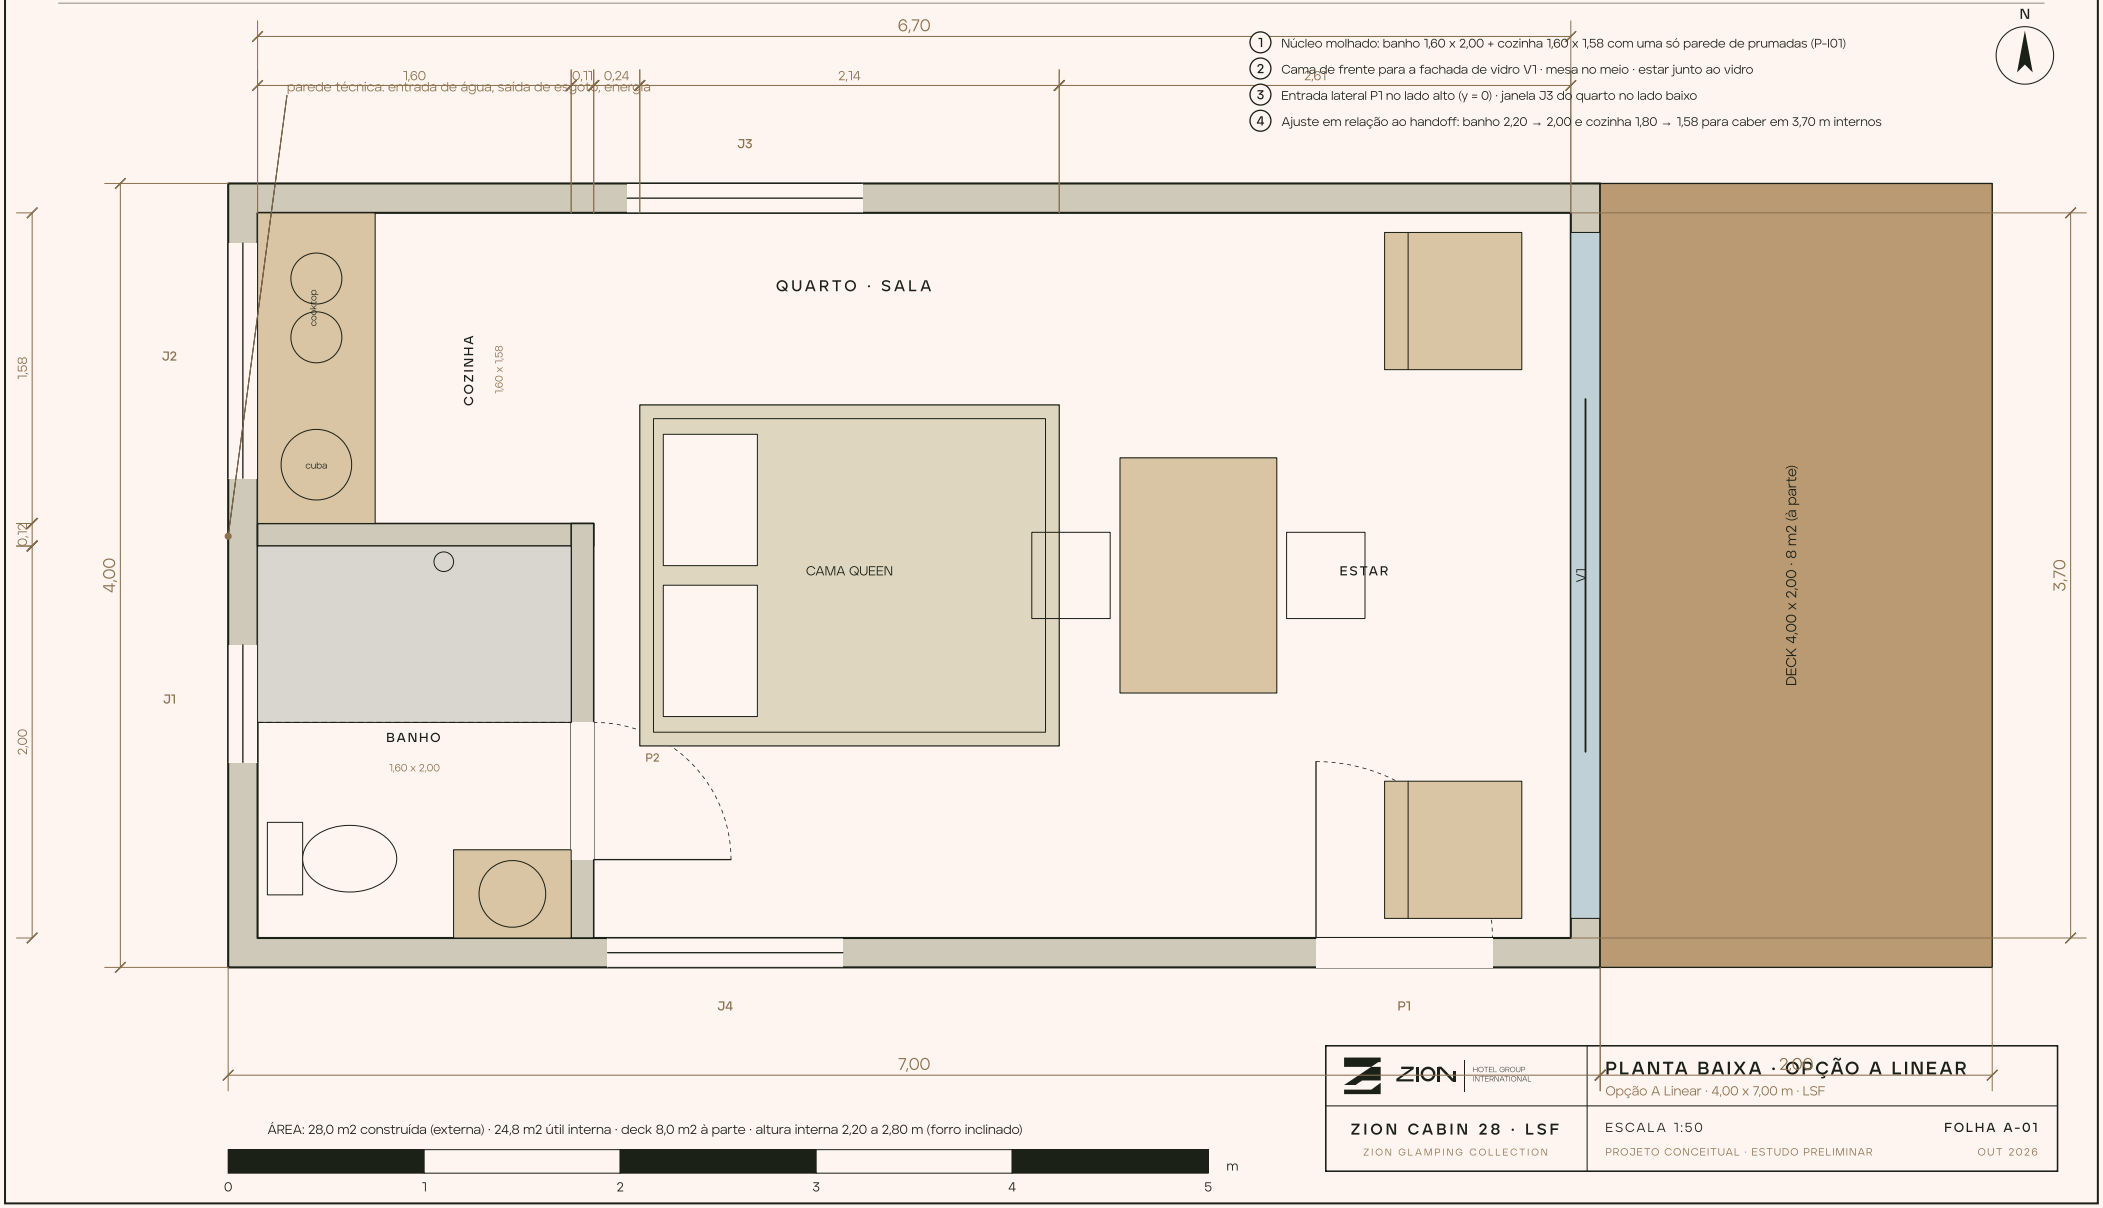

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA BAIXA · OPÇÃO A LINEAR Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA A-01 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · CORTES AA E BB


Transversal (sobre a cama) e longitudinal (pelo eixo) · níveis e camadas

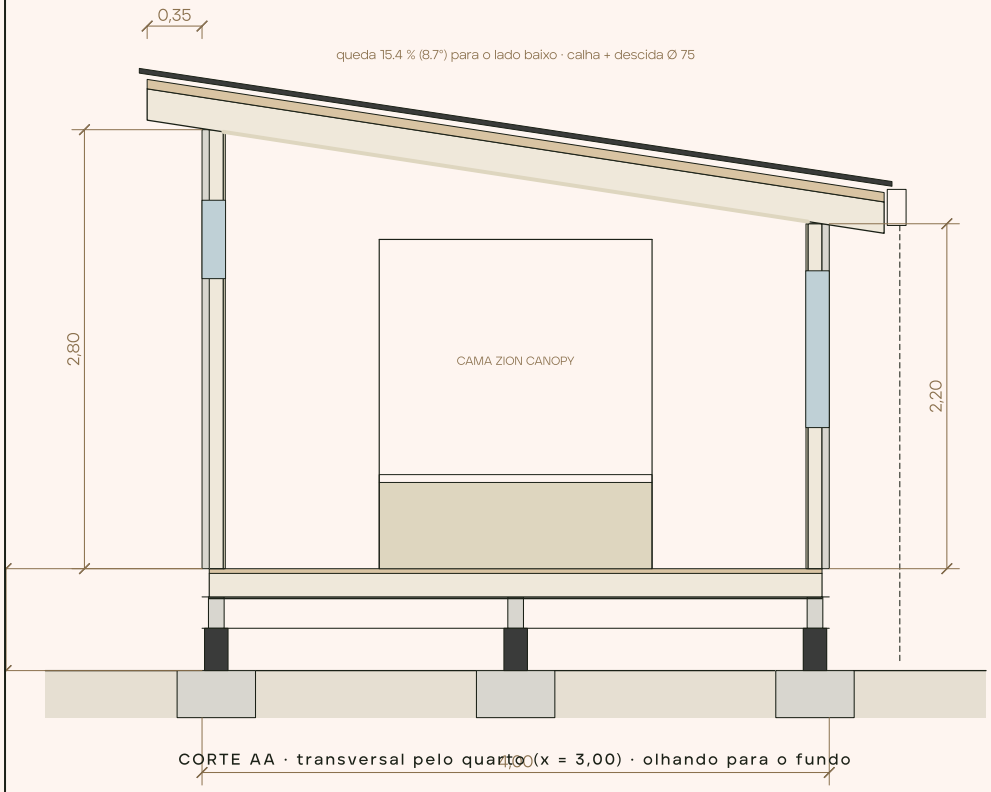

CORTE AA · transversal pelo quarto · olhando para o fundo

1. Sapata pré-moldada 0,50 x 0,50 (ou estaca helicoidal) + pedestal metálico regulável ± 50 mm
2. Viga de fundação: caixão 2 x Ue 200 + 2 x U 203, 3 linhas, apoios a cada 1,65 m
3. Plataforma: vigas Ue 150 @ 400 + OSB 18,3 + placa cimentícia 8 mm por baixo + lã PET 50 + piso vinílico / madeira
4. Parede 150 mm: revestimento 10 + câmara ventilada 25 + membrana + OSB 11,1 + Ue 90 @ 400 com lã 90 + gesso 12,5
5. Cobertura: Ue 200 @ 400 + lã 100 + câmara 100 + OSB 18,3 + membrana + ripas + telha metálica 0,50 · forro de gesso inclinado
6. Beirais 0,35 m nos lados · pé-direito 2,20 a 2,80 m
7. Janelas J4 (alta, lado alto) e J3 (quarto, lado baixo)

cobertura em uma água: caimento transversal (do lado alto y = 0 para o lado baixo y = 4) · beirais de 0,30 m na frente e no fundo

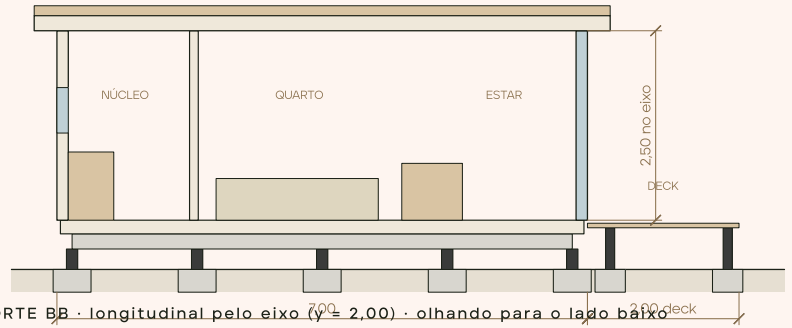


CORTE BB · longitudinal pelo eixo (y = 2,00) · olhando para o lado baixo

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	**CORTES AA E BB** Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 **FOLHA A-02** PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026


ZION CABIN 28 · FACHADAS

Frente (vidro) · lado alto (entrada) · lado baixo · fundo (técnica)


Revestimento externo: ripado horizontal em placa cimentícia pintada ou siding de madeira tratada sobre câmara ventilada · telha metálica galvalume pré-pintada · esquadrias de alumínio preto · vidro laminado 8 mm (⚠ dimensionar)

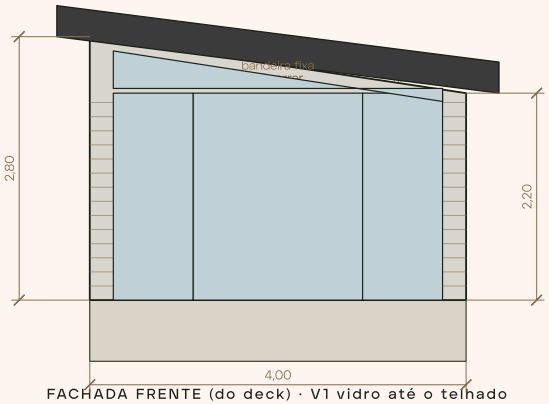


FACHADA FRENTE (do deck) · V1 vidro até o telhado

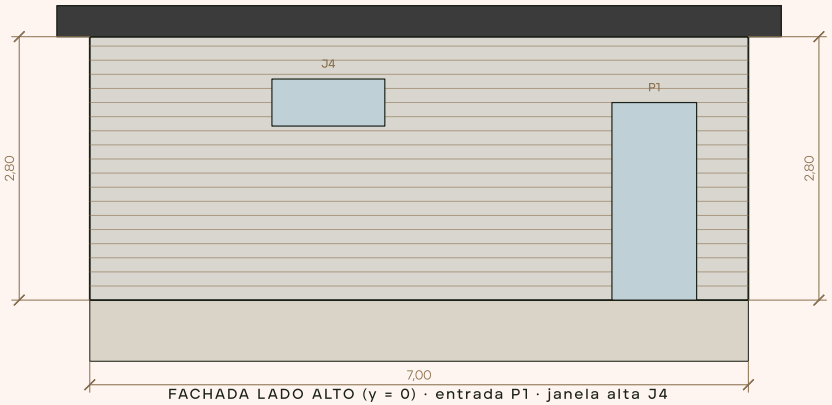

FACHADA LADO ALTO (y = 0) · entrada P1 · janela alta J4

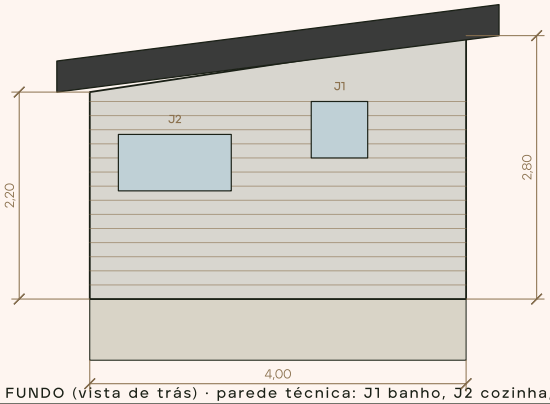

HADA FUNDO (vista de trás) · parede técnica: J1 banho, J2 cozinha, entradas

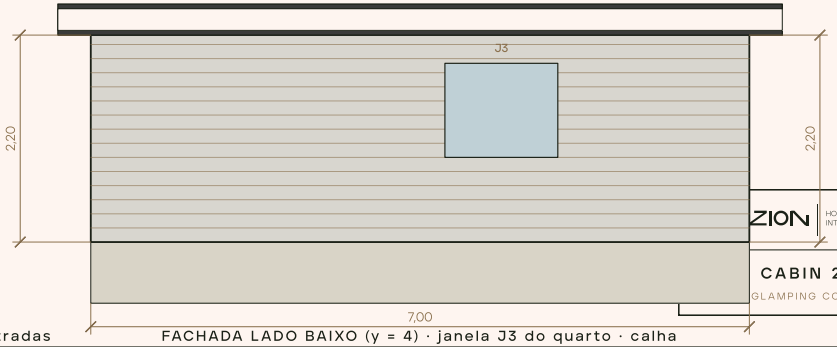

FACHADA LADO BAIXO (y = 4) · janela J3 do quarto · calha

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

CABIN 28 · LSF
GLAMPING COLLECTION


FACHADAS
Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF

ESCALA 1:75 FOLHA A-03
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · ISOMÉTRICA DO ESQUELETO LSF

Plataforma · painéis de parede · vigas de cobertura · sem fechamentos

Esqueleto completo em aço leve galvanizado: tudo parafusado, sem solda em campo, nenhuma peça maior que 4,80 m. Fechamentos (OSB, membranas, lã, gesso, telha, revestimento) e instalações nas pranchas seguintes.

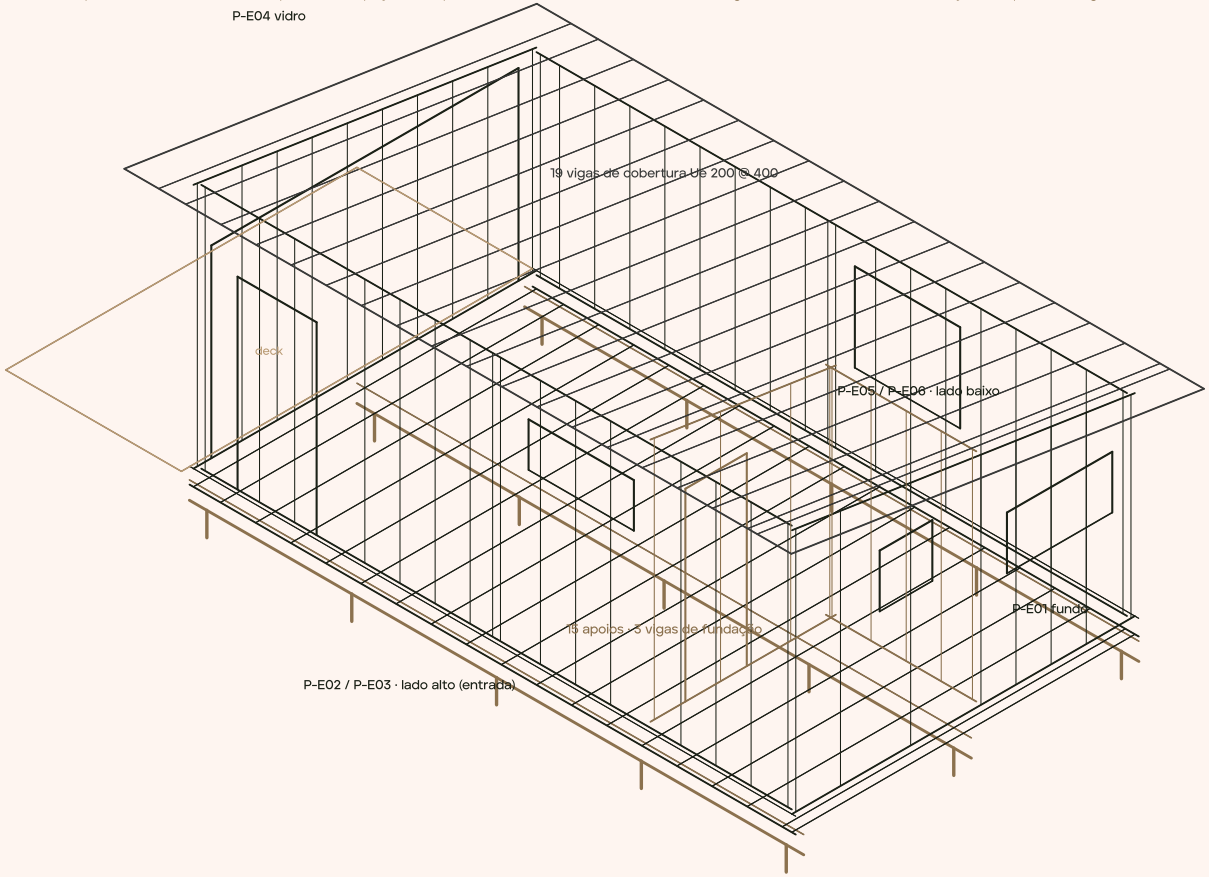

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	**ISOMÉTRICA DO ESQUELETO LSF** Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala — FOLHA E-00 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR — OUT 2026

QUADRO DE ESQUADRIAS E ÁREAS

vão bruto = medida da esquadria + 20 mm · alturas do piso acabado

CÓD.	TIPO	AMBIENTE	PAINEL	LARG. (M)	ALT. (M)	PEITORIL (M)	VÃO BRUTO (MM)
J1	Maxim-ar 600 x 600	Banho	P-E01	0,6	0,6	1,5	620 x 620
J2	Correr 2 folhas 1200 x 600	Cozinha	P-E01	1,2	0,6	1,1	1220 x 620
J3	Correr 2 folhas 1200 x 1000	Quarto (lado baixo)	P-E05	1,2	1,0	0,9	1220 x 1020
J4	Fixa alta 1200 x 500	Quarto (lado alto)	P-E02	1,2	0,5	1,9	1220 x 520
P1	Porta de abrir 900 x 2100, folha maciça, com visor	Entrada lateral	P-E03	0,9	2,1	0,0	920 x 2120
V1	Fachada de vidro 3,50 m: correr 2 folhas 1800 x 2200 + fixos laterais 850 + bandeira fixa até o telhado	Frente / deck	P-E04	3,5	até o telhado (2,20 a 2,80)	0,0	3 520 x vão até a verga
P2	Porta de abrir 700 x 2100	Banho	P-I02	0,7	2,1	0,0	720 x 2120

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO espessura e tipo do vidro de V1 (laminado 8 mm, insulado opcional) e fixação da bandeira trapezoidal.

ITEM	MEDIDA	M2
Área construída (externa)	7,0 x 4,0	28
Área útil interna	6,7 x 3,7	24,8
· banho	1,60 x 2,00	3,2
· cozinha	1,60 x 1,58	2,5
· quarto / sala / estar	5,0 x 3,70 (livre)	18,6
Deck (à parte)	4,00 x 2,00	8
Projeção da cobertura	7,6 x 4,7	35,7

COTAS DE NÍVEL

NÍVEL	M
Terreno (referência)	-0,65
Topo dos pedestais / face inferior das vigas de fundação	-0,38
Topo das vigas de fundação	-0,18
Piso acabado (0,00)	0
Deck	-0,03
Topo da guia superior · lado baixo	2,2
Topo da guia superior · lado alto	2,8
Telha · lado alto (beiral)	3,19

CAMADAS E MATERIAIS DE FECHAMENTO

quantidades estimadas pela geometria (sem perdas além das indicadas) · sem preços

PLATAFORMA

ITEM	UN.	QTD
OSB 18,3 mm estrutural 1,20 x 2,40	m2	29,2
Placa cimentícia 8 mm (face inferior)	m2	28,3
Lã de PET 50 mm entre vigas	m2	27
Piso vinílico / madeira engenheirada (quarto, sala, cozinha)	m2	23,6
Banho: cimentícia 10 mm + impermeabilização + porcelanato	m2	3,5
Tela de ventilação do vão sob a plataforma (saia)	m	22

PAREDES EXTERNAS

ITEM	UN.	QTD
OSB 11,1 mm (fábrica, nos painéis)	m2	45,5
Membrana hidrófuga (manta de polietileno de alta densidade)	m2	60,5
Ripas 25 mm da câmara ventilada	m	95
Revestimento externo: placa cimentícia 10 mm ripada ou siding de madeira tratada	m2	44,5
Lã de vidro 90 mm (ou PET) entre montantes	m2	41,5
Gesso ST 12,5 (RU no banho e na cozinha)	m2	41,5
Pingadeira / rufos / cantoneiras de arremate	m	28

PAREDES INTERNAS

ITEM	UN.	QTD
Gesso RU 12,5 (duas faces)	m2	19,9
Lã de PET 50 mm acústica	m2	10

COBERTURA

ITEM	UN.	QTD
OSB 18,3 mm	m2	37,9
Membrana hidrófuga / subcobertura	m2	39,8
Ripa metálica + contra-ripa (câmara 30 mm)	m	72
Telha metálica trapezoidal galvalume pré-pintada 0,50 mm	m2	39
Lã de vidro 100 mm entre vigas	m2	30,7
Barreira de vapor + forro de gesso ST 12,5 (RU no banho)	m2	27,3
Calha + descida Ø 75 + cumeeira / rufo do lado alto	m	14
Testeiras e forro dos beirais ventilados (tela)	m	25

ESQUADRIAS E VIDROS

ITEM	UN.	QTD
V1 fachada de vidro 3,50 x (2,20 a 2,68): alumínio preto, correr 2 folhas + fixos + bandeira, vidro laminado 8 mm ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO	cj	1
P1 porta de entrada 0,90 x 2,10 com visor	un	1
J1 maxim-ar 0,60 x 0,60 · J2 correr 1,20 x 0,60 · J3 correr 1,20 x 1,00 · J4 fixa 1,20 x 0,50	cj	1
P2 porta interna 0,70 x 2,10	un	1

DECK (À PARTE)


ITEM	UN.	QTD
6 apoios + vigas tratadas + assoalho de madeira tratada / cumaru 4,00 x 2,00	m2	8
Guarda-corpo (se exigido pela altura ≥ 1,00 m) ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO	m	8

Perfis de aço: ver CB28-EST-001 (lista de perfis e quadro de painéis). Mobiliário: cama Zion Canopy ZF-BD-01, mesa, poltronas e bancada conforme ZG-FFE-001. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : desempenho térmico e acústico das camadas (NBR 15575) para Urubici e Florianópolis.

ZION CABIN 28 · HIDRÁULICA · ÁGUA FRIA E QUENTE

Pontos, prumadas na parede molhada, entrada pela parede de fundo · alturas do piso acabado

1. Água fria PVC soldável 25 mm (ramal) / 20 mm (sub-ramais) dentro do vão dos montantes, furos com anel
2. Água quente PEX 16 mm (tracejado) do aquecedor até chuveiro, lavatório e pia; base do kit: chuveiro elétrico (sem AQ)
3. Registro geral + ponto de medição na face externa do fundo (AF-0) · pressão mínima 10 m.c.a. da rede do empreendimento (ou pressurizador)
4. Sem reservatório na cabana: reservatório e tratamento ficam no sítio (projeto hidráulico do empreendimento ⚠)
5. Todos os pontos no núcleo: prumadas na parede molhada P-I01 e na parede de fundo P-E01 · uma só descida
6. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: diâmetros e pressões conforme NBR 5626 e projeto do sítio

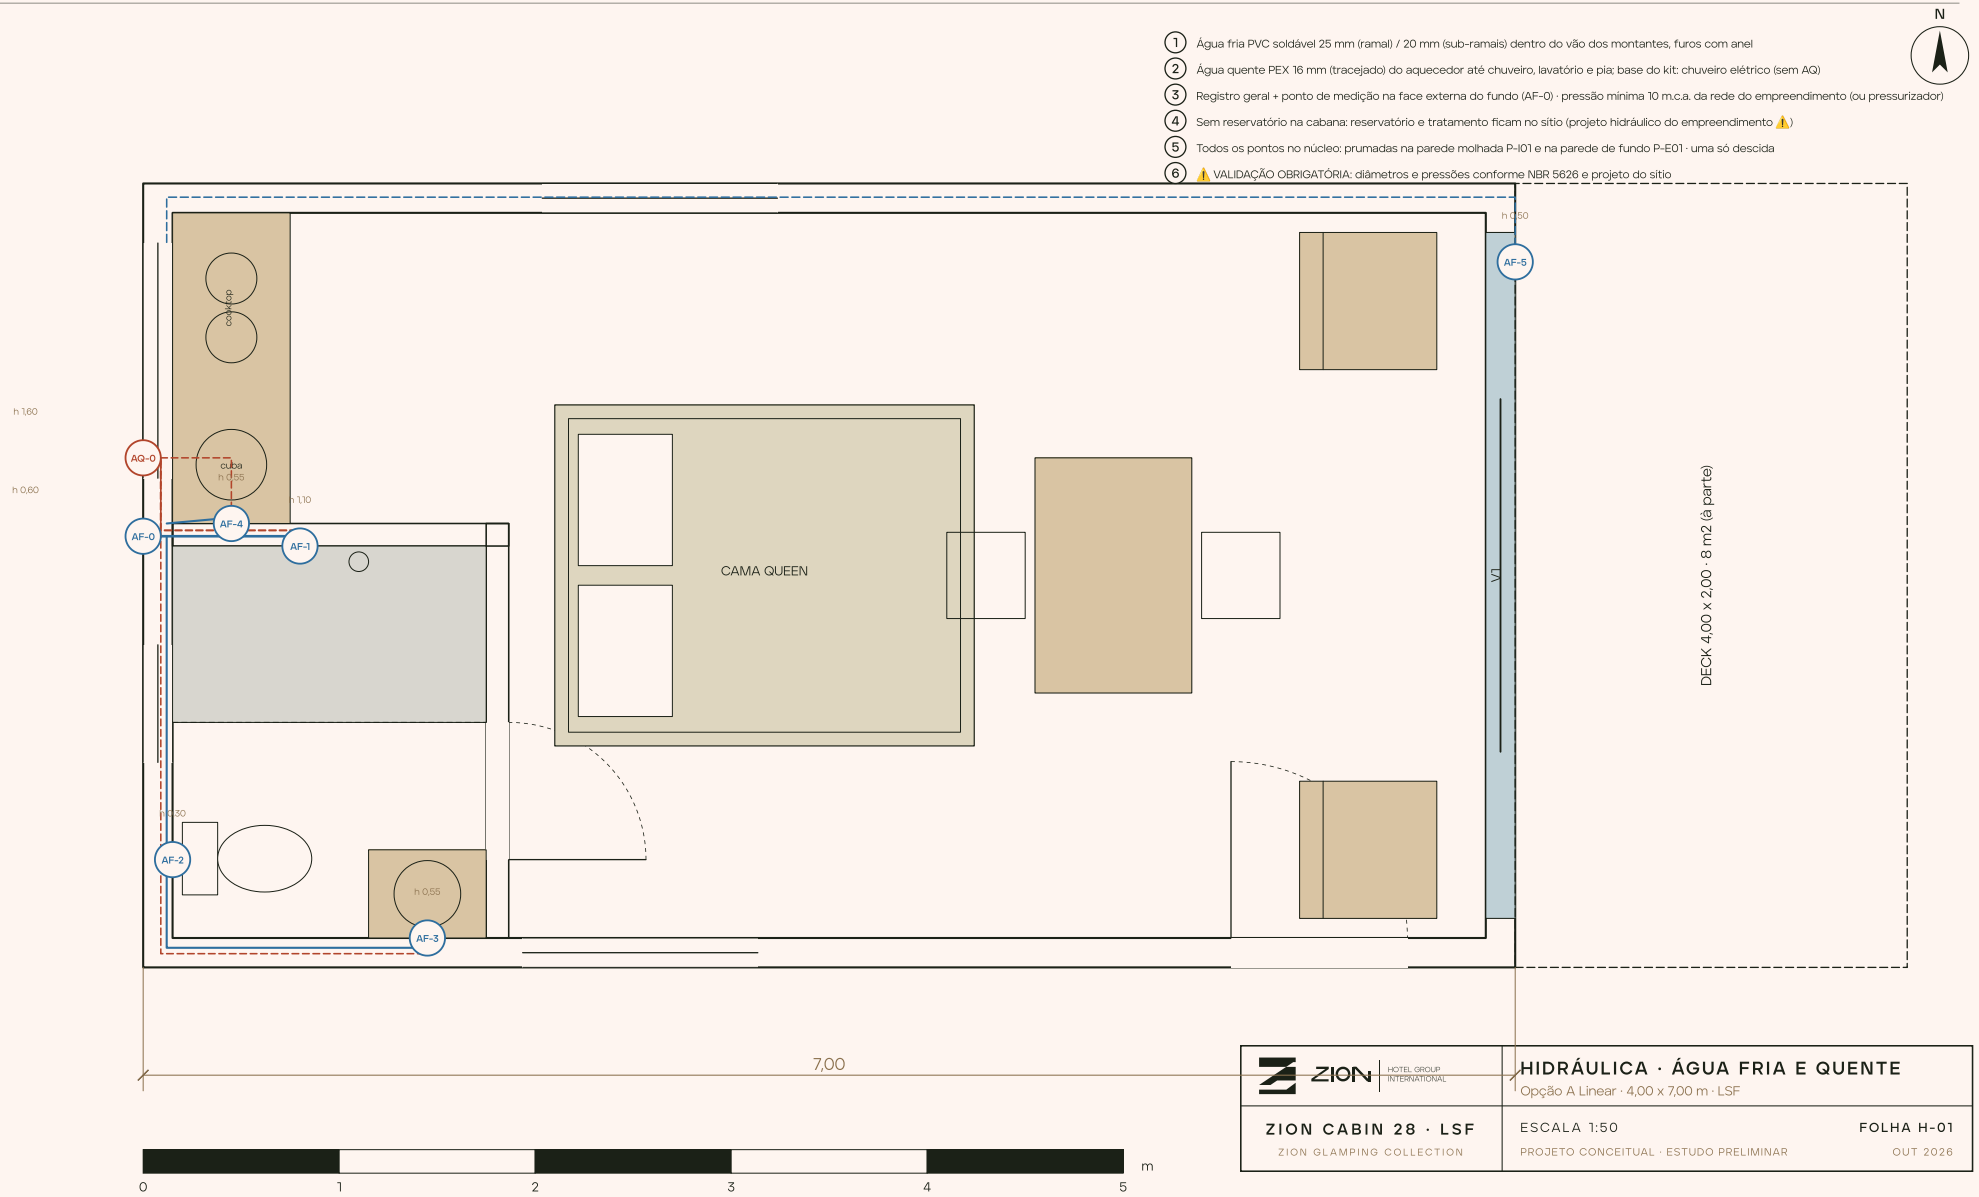

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	HIDRÁULICA · ÁGUA FRIA E QUENTE Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA H-01 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

HIDRÁULICA · PONTOS, REDES E PREMISSAS

coordenadas (x; y) em m a partir do canto externo fundo / lado alto · h do piso acabado

CÓD.	PONTO	X	Y	H	REDE	Ø
AF-0	Entrada de água fria (registro geral + ponto de medição do empreendimento) · parede de fundo, externa	0,0	2,2	0,6	AF	25 mm
AF-1	Chuveiro · misturador / registro (parede molhada P-I01, lado do banho)	0,8	2,1	1,1	AF+AQ	20 / 16 mm
AF-2	Vaso sanitário (caixa acoplada) · parede de fundo	0,1	0,6	0,3	AF	20 mm
AF-3	Lavatório · parede lateral alta P-E02	1,4	0,1	0,6	AF+AQ	20 / 16 mm
AF-4	Pia da cozinha · parede molhada P-I01, lado da cozinha	0,5	2,3	0,6	AF+AQ	20 / 16 mm
AF-5	Torneira externa do deck (opcional)	7,0	3,6	0,5	AF	20 mm
AQ-0	Origem da água quente: chuveiro elétrico (base) ou aquecedor de passagem no nicho externo da parede de fundo (opção)	0,0	2,6	1,6	AQ	16 mm PEX

REDE E MATERIAIS

Ramal de água fria PVC soldável 25 mm da entrada AF-0 (registro geral + ponto de medição do empreendimento) até a parede molhada; sub-ramais 20 mm.

Água quente em PEX 16 mm com conexões de engate rápido, isolado, do aquecedor ao chuveiro, lavatório e pia.

Tubos passam pelos furos de fábrica dos montantes (alma) com anel plástico; nunca pela mesa do perfil.

Registros de gaveta na entrada e de pressão no chuveiro; registro de esfera para a cozinha e para a torneira do deck.

PREMISSAS DO SÍTIO

Pressão mínima na entrada 10 m.c.a. (rede do empreendimento ou pressurizador); sem reservatório na cabana.

Água quente: base = chuveiro elétrico 7 500 W (circuito C4); opção = aquecedor de passagem a gás 15 L em nicho ventilado na parede de fundo, com abrigo de botijão P13 fora da cabana (projeto de gás à parte).

Reservatório, tratamento, pressurização e medição são do projeto hidráulico do empreendimento


⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

Diâmetros e pressões conforme NBR 5626; esta prancha é de pontos e traçado para orçamento.

ZION CABIN 28 · ESGOTO E VENTILAÇÃO

Sob a plataforma de piso · caixa sifonada · tubo ventilador · saída única no fundo

1. Tubulação de esgoto PVC branco sob a plataforma (vão ventilado de 0,65 m, acessível): vaso Ø 100 direto ao coletor; box e lavatório na caixa sifonada CS-1
2. Caixa sifonada 100 x 150 x 50 com tampa cega no piso do box · caimento ≥ 2 % (Ø 40/50) e ≥ 1 % (Ø 100) conforme NBR 8160
3. Pia da cozinha Ø 50 para caixa de gordura externa (obra do sítio) e desta ao coletor
4. Tubo ventilador Ø 50 na parede molhada P-01, saindo 0,30 m acima da telha com terminal
5. Saída S Ø 100 na face de fundo a – 0,25 m do piso · a cabana entrega esgoto num só ponto; destino, tratamento e licenças são do sítio
6. ⚠ Regra do projeto: fossa não é solução universal; depende do terreno e da prefeitura

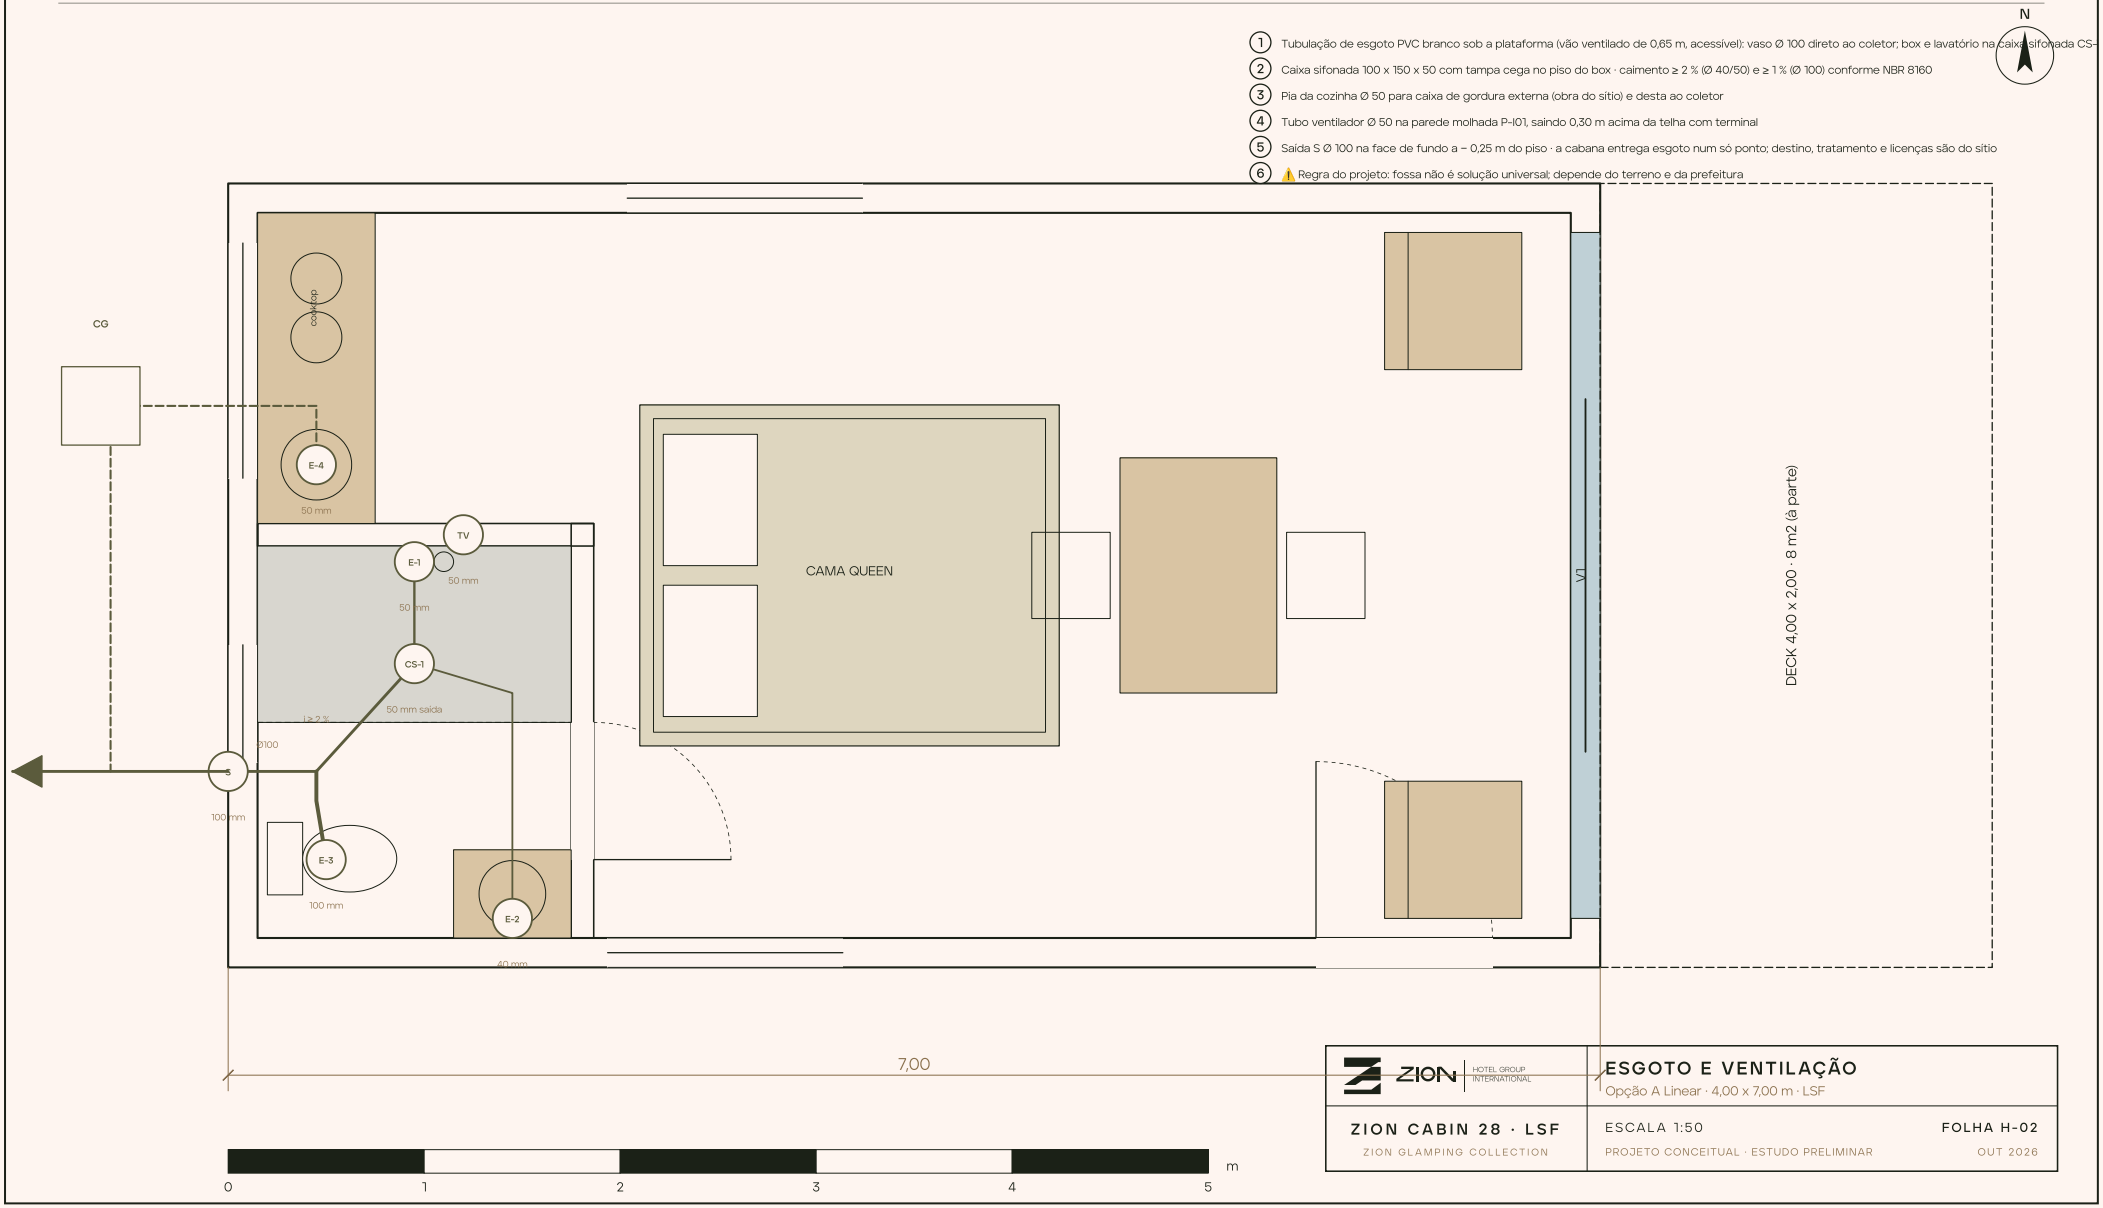

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

ESGOTO E VENTILAÇÃO

Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF

ZION CABIN 28 · LSF

ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 **FOLHA H-02**

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ESGOTO · PONTOS E DESTINO

tubulação PVC branco sob a plataforma, no vão ventilado (acessível)

CÓD.	PONTO	X	Y	Ø	DESTINO
E-1	Ralo linear do box	0,9	2,1	50 mm	CS-1
E-2	Lavatório (sifão)	1,4	0,2	40 mm	CS-1
E-3	Vaso sanitário	0,5	0,6	100 mm	Coletor
E-4	Pia da cozinha (sifão)	0,5	2,6	50 mm	Caixa de gordura externa (obra do sítio)
CS-1	Caixa sifonada 100 x 150 x 50 sob o piso do banho (tampa cega acessível pelo box)	0,9	1,6	50 mm saída	Coletor
TV	Tubo ventilador na parede molhada, saída 0,30 m acima do telhado	1,2	2,2	50 mm	Atmosfera
S	Saída de esgoto da cabana · face de fundo, 0,25 m abaixo do piso · destino conforme terreno e prefeitura	0,0	1,0	100 mm	Rede / ETE / fossa+filtro+sumidouro

TRAÇADO

Vaso sanitário Ø 100 direto ao coletor, caimento ≥ 1 %.

Ralo do box e lavatório na caixa sifonada CS-1 (100 x 150 x 50) com tampa cega no piso do box; saída Ø 50, caimento ≥ 2 %.

Pia da cozinha Ø 50 para caixa de gordura externa (obra do sítio) e desta ao coletor.

Tubo ventilador Ø 50 na parede molhada, 0,30 m acima da telha com terminal; conforme NBR 8160.

Saída única S Ø 100 na face de fundo, 0,25 m abaixo do piso, com ponto de inspeção.

REGRA DO HANDOFF

A cabana entrega o esgoto num só ponto. O destino depende do terreno e da prefeitura: rede pública, ETE compacta do empreendimento ou fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro (só onde o solo permite e com licença).

Fossa não é solução universal e não faz parte do kit.


Águas pluviais (calha Ø 75) vão para a drenagem do sítio, nunca para o esgoto.

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : projeto de esgoto e licenciamento ambiental do sítio.

ZION CABIN 28 · ELÉTRICA · PONTOS E CIRCUITOS

Iluminação, tomadas, chuveiro, cooktop, split · alturas do piso acabado · alimentação pela parede de fundo

1. ⊗ ponto de luz · ● interruptor · ⏢ tomada · ▮ QDC · ◎ entrada de energia · ▭ split
2. Entrada 220 V monofásica (padrão Celesc no sítio) · eletroduto 32 mm pela parede de fundo até o QDC na cozinha
3. QDC 12 posições: geral + DR 30 mA + DPS · 6 circuitos + 2 reservas (tabela na memória)
4. Eletrodutos corrugados 25 mm nos furos dos montantes (anel plástico) · caixas 4 x 2 nas alturas indicadas · cabos flexíveis 750 V
5. Chuveiro elétrico 7 500 W (C4, 6 mm2) é a base; com aquecedor a gás, C4 vira reserva · Split 9 a 12 k BTU
6. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: dimensionamento, disjuntor geral e aterramento conforme NBR 5410 e concessionária

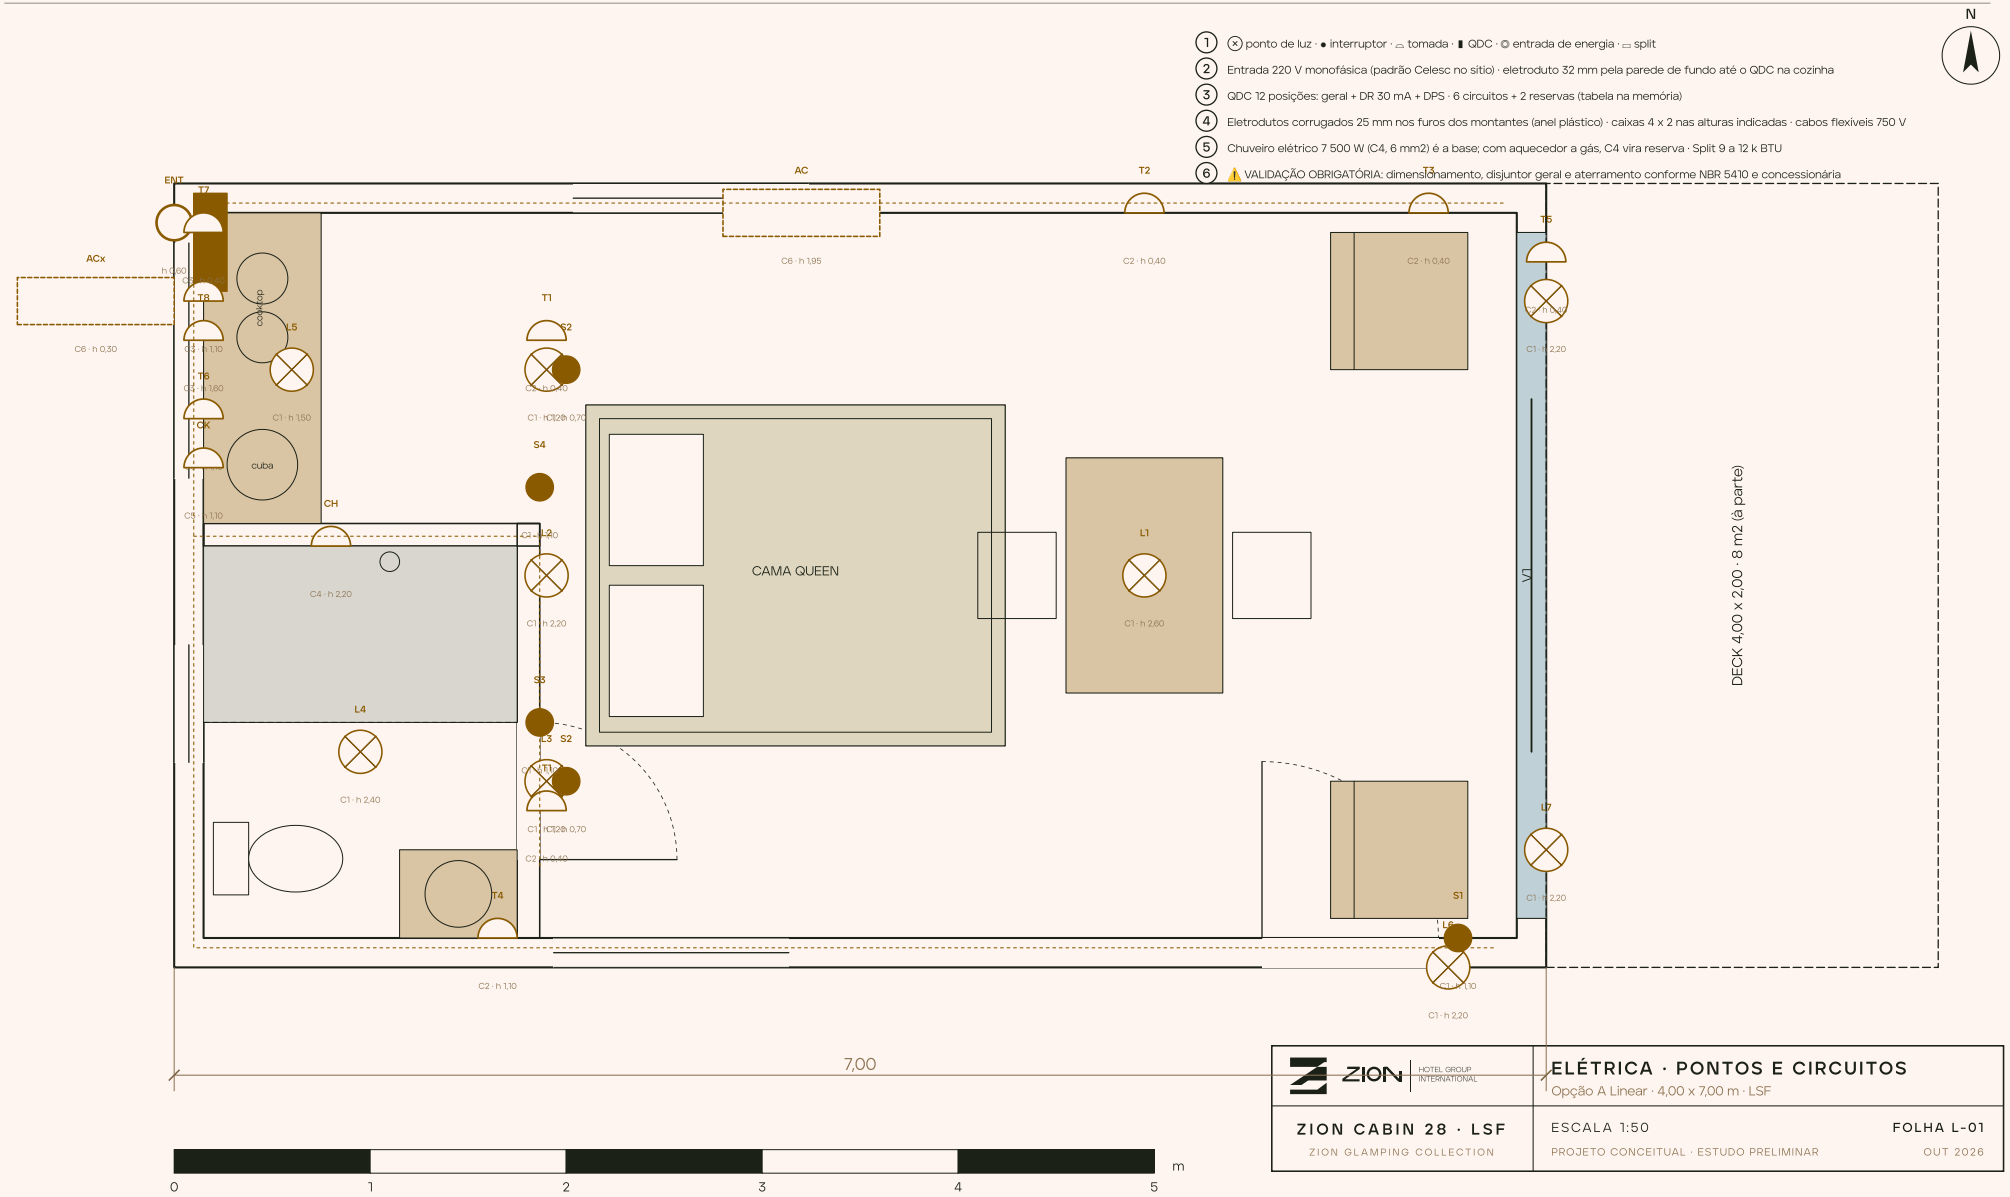

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ELÉTRICA · PONTOS E CIRCUITOS Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA L-01 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ELÉTRICA · PONTOS

coordenadas (x; y) em m · h do piso acabado · circuito

CÓD.	PONTO	X	Y	H	CIRC.
QDC	Quadro de distribuição 12 circuitos, DR 30 mA + DPS · parede de fundo (cozinha)	0,1	3,7	1,6	—
ENT	Entrada de energia 220 V monofásica · eletroduto 32 mm pela parede de fundo (padrão da concessionária fica no sítio)	0,0	3,8	0,6	—
L1	Pendente sobre a mesa	5,0	2,0	2,6	C1
L2	Fita LED na cabeceira (parede P-I02)	1,9	2,0	2,2	C1
L3	Arandela de cabeceira (2)	1,9	0,9	1,2	C1
L3	Arandela de cabeceira (2)	1,9	3,0	1,2	C1
L4	Plafon do banho (IP44)	0,9	1,1	2,4	C1
L5	Fita LED sob o armário da cozinha	0,6	3,0	1,5	C1
L6	Arandela externa da entrada	6,5	0,0	2,2	C1
L7	Arandela do deck (2)	7,0	0,6	2,2	C1
L7	Arandela do deck (2)	7,0	3,4	2,2	C1
S1	Interruptor 2 teclas na entrada (L1, L6)	6,5	0,1	1,1	C1
S2	Interruptor de cabeceira (2) (L2, L3)	2,0	0,9	0,7	C1
S2	Interruptor de cabeceira (2) (L2, L3)	2,0	3,0	0,7	C1
S3	Interruptor do banho (L4)	1,9	1,2	1,1	C1
S4	Interruptor cozinha + deck (L5, L7)	1,9	2,5	1,1	C1
T1	Tomada de cabeceira 2P+T 10 A (2)	1,9	0,8	0,4	C2
T1	Tomada de cabeceira 2P+T 10 A (2)	1,9	3,2	0,4	C2
T2	Tomada da mesa (parede baixa)	5,0	3,9	0,4	C2
T3	Tomada da sala (parede baixa)	6,4	3,9	0,4	C2
T4	Tomada do banho 2P+T 10 A (junto ao lavatório)	1,6	0,1	1,1	C2
T5	Tomada externa do deck IP55	7,0	3,6	0,4	C2
T6	Tomadas da bancada 2P+T 20 A (2)	0,1	2,8	1,1	C3
T6	Tomadas da bancada 2P+T 20 A (2)	0,1	3,4	1,1	C3
T7	Tomada do frigobar	0,1	3,8	0,4	C3
T8	Tomada do micro-ondas	0,1	3,2	1,6	C3
CH	Ponto do chuveiro elétrico 220 V (base) · 7 500 W	0,8	2,1	2,2	C4
CK	Ponto do cooktop de indução 2 bocas 220 V	0,1	2,5	1,1	C5
AC	Split 9 000 a 12 000 BTU · evaporadora na parede baixa (sobre J3) · condensadora no fundo	3,2	3,9	1,9	C6
ACx	Condensadora do split (externa, fundo)	-0,4	3,4	0,3	C6

ELÉTRICA · CIRCUITOS, QUADRO E CARGAS

entrada 220 V monofásica · QDC 12 posições na cozinha

CIRC.	USO	CABO	PROTEÇÃO	PONTOS
C1	Iluminação	1,5 mm2	10 A	L1 a L7, interruptores
C2	Tomadas de uso geral (quarto, sala, banho, deck)	2,5 mm2	20 A · DR	T1 a T5
C3	Tomadas da cozinha (bancada, frigobar, micro-ondas)	2,5 mm2	20 A · DR	T6 a T8
C4	Chuveiro elétrico 7 500 W 220 V	6 mm2	40 A · DR	CH
C5	Cooktop de indução 2 bocas	4 mm2	25 A	CK
C6	Ar-condicionado split	2,5 mm2	20 A	AC
R	Reserva (aquecedor a gás / bomba / iluminação externa)	—	—	2 posições

QUADRO DE CARGAS (ESTIMATIVA)

CIRC.	CARGA	W
C1	Iluminação (LED)	200
C2	Tomadas de uso geral	1200
C3	Tomadas da cozinha (frigobar, micro-ondas, bancada)	2500
C4	Chuveiro elétrico	7500
C5	Cooktop de indução 2 bocas	3500
C6	Split 9 000 a 12 000 BTU	1300
	Total instalado	16200

PREMISSAS

Padrão de entrada e medição da concessionária ficam no sítio; a cabana recebe um ramal em eletroduto 32 mm pela parede de fundo até o QDC.

QDC: disjuntor geral, DR 30 mA geral (ou por circuito nas áreas molhadas), DPS classe II, barramentos de neutro e terra; aterramento com haste no pé da parede de fundo.

Eletrodutos corrugados 25 mm pelos furos de fábrica dos montantes; caixas 4 x 2 fixadas nos montantes; cabos flexíveis 750 V.

Chuveiro elétrico (C4) é a base; com aquecedor a gás, C4 vira reserva e a carga cai para ≈ 8,7 kW.

Iluminação quente (2 700 K), dimerizável na cabeceira e no pendente; arandelas externas IP65.

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : dimensionamento dos condutores, disjuntor geral, demanda e ramal conforme NBR 5410 e normas da concessionária.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO DE ENGENHARIA E PENDÊNCIAS

o que o engenheiro / arquiteto confirma antes do protótipo · o que o Bruno decide

ENGENHEIRO / ARQUITETO

- ☐ Fundação: tipo, dimensão e profundidade pela sondagem; vigas de fundação em caixão
- ☐ Plataforma: vigas Ue 150 @ 400 em dois vãos de 1,93 m para sobrecarga de hospedagem
- ☐ Paredes: Ue 90 x 0,95 @ 400, vergas em caixa, ombreiras, hold-downs e fita X; contraventamento da fachada de vidro (pórtico)
- ☐ Cobertura: vigas Ue 200 @ 400 em 4,0 m + beirais, ancoragem ao vento (sucção nos beirais)
- ☐ Vento e sismo da região (Urubici / Florianópolis) · NBR 6123
- ☐ Desempenho térmico e acústico (NBR 15575) das camadas
- ☐ Vidro de V1 e bandeira trapezoidal
- ☐ Hidráulica (NBR 5626), esgoto (NBR 8160) e elétrica (NBR 5410)
- ☐ Projeto legal e aprovação municipal; ART / RRT do profissional

BRUNO

- ☐ Opção A (linear) ou B (núcleo no meio) para a Cabin 28
- ☐ Medidas do núcleo: 2,00 + 1,58 (como aqui) ou alargar a cabana
- ☐ Chuveiro elétrico ou aquecedor a gás
- ☐ Revestimento externo: cimentícia ripada ou siding de madeira
- ☐ Telha metálica pré-pintada (cor) ou shingle (muda a inclinação)
- ☐ Piso interno: vinílico ou madeira engenheirada
- ☐ Enviar CB28-EST-001 para Semente, SteelTek, Certech, Prime Steel, Nexin e Polisteel (ZG-RFQ-002 REV 01)
