Do número redondo *à conta que você explica*

Aula F01 · CAPEX e Necessidade de Capital.

CURIOSIDADE

Mesmo terreno: um tem palpite; o outro, projeto.

REFLEXÃO

Quem calculou o seu número redondo?

DICA

Traga toda cotação que já tem.

REVISÃO DO F00

SEM CONSULTAR

Três perguntas *de memória*

1
Régua
Em que nível os dois saíram?

Estimador, nota 1 no F01

2
Lacuna
Lacuna e cobertura de Marina?

R$ 730.000 e **26,3%**

3
Portão
Condições do portão do capital?

Cinco, todas pendentes

MAPA DA AULA

O caminho *de hoje*



EM QUE DEGRAU VOCÊ ESTÁ?

Quatro degraus, *um só perigoso*

1	2	3	4
Sonhador	**Estimador**	**Calculista**	**Developer**
visão, sem números	números por alto	CAPEX aberto e premissas	cenários, Score e estrutura

Marina (A) e Rafael (B): **Estimadores**. O F01 sobe **do 2 para o 3**.

O projeto não morre sem dinheiro. *Morre sem números.*

CURIOSIDADE

Palpite menos conta: o tamanho do risco.

REFLEXÃO


Quem assinou a sua maior linha?

DICA

Cote por escrito a maior linha.

PREVISÃO · ONDE FICA O TERRENO?

Uma vez antes de abrir, *todo mês depois*

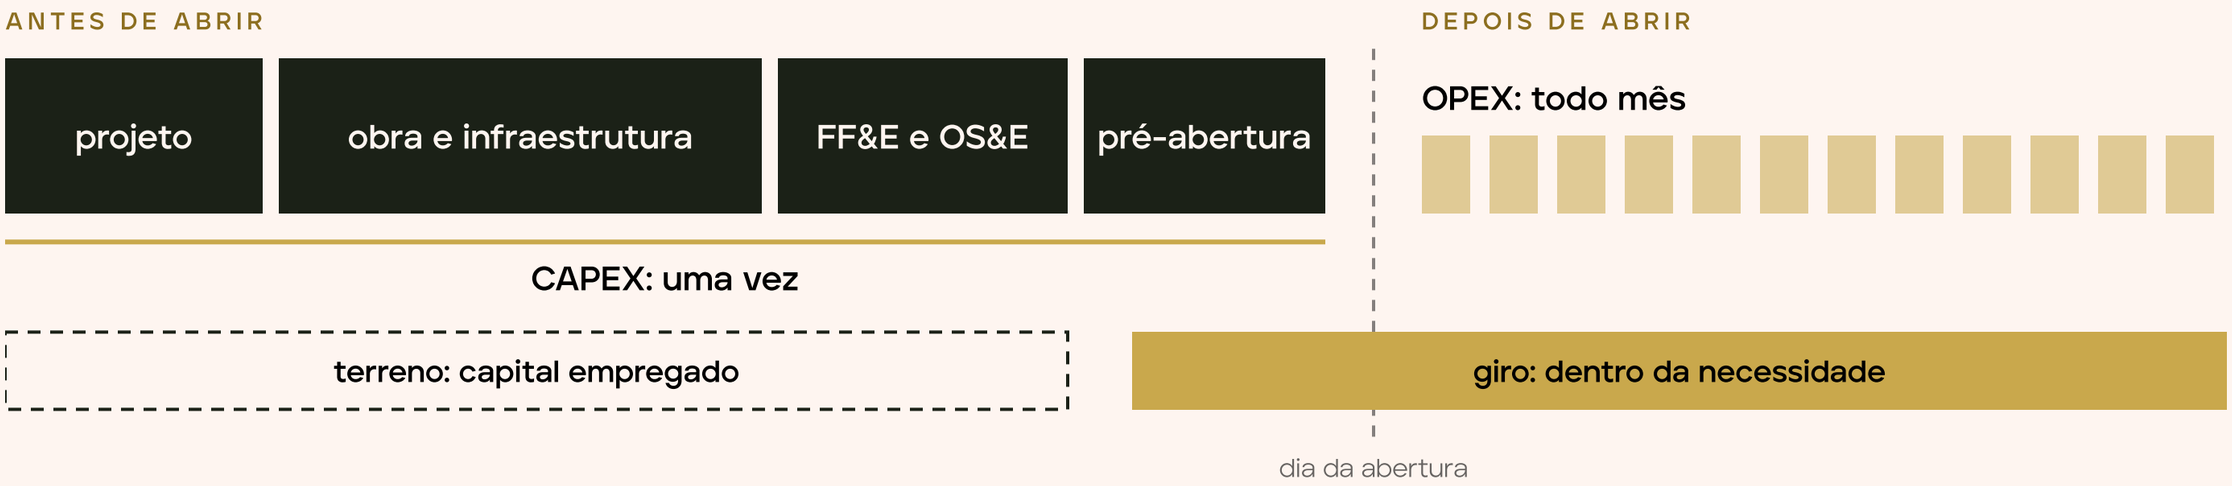

«Inauguram bonitos. **E quebram operando.**»

EVIDÊNCIA POR LINHA

NOTA DA SUA MAIOR LINHA?

Cada linha *recebe uma nota*

0
Não sei
linha em branco

1
Palpite
redondo, sem origem

2
Estimativa
faixa com origem

3
Cotação
escrita, até 90 dias

Calculista: maioria das linhas em 2 ou 3, **as maiores em 3**.

PREVISÃO · ABAIXO OU ACIMA?

A soma fecha. *As linhas, não.*



OS&E e apoio: R$ 0 · nenhuma nota 3

Aberta: **R$ 1.237.400**, cerca de 25% a mais.

Quatro camadas, *e cada real no seu lugar.*

CURIOSIDADE

No glamping, «cada unidade é o produto inteiro».

REFLEXÃO

Quantas linhas você preenche sem inventar?

DICA

Pinte o orçamento por componente.

OS QUATRO COMPONENTES

O CAPEX e *o que fica à parte*

ONDE MORA O SEU MAIOR NÚMERO?

4 · Pré-abertura e contingência — o imprevisto

3 · OS&E — a operação consome

2 · FF&E — vira hospedagem

1 · Hard costs
fixa o projeto no território

Projeto e licenciamento, à parte

TERRENO

fora do CAPEX

na necessidade
só se a pagar

CAPITAL DE GIRO

fora do CAPEX

dentro da
necessidade

METODOLOGIA ZION DE ANÁLISE

QUAL PASSO VOCÊ PULOU?

Seis passos *até o número*

1 · DEFINIR
tipologia

2 · HARD COSTS
área total × m²

3 · FF&E
unidades × custo

4 · OS&E
10% a 15% do FF&E

5 · PRÉ-ABERTURA
5% a 10% dos hard costs

6 · CAPEX
soma + contingência

«Quem pula este passo **calcula um hotel com números de pousada**.»

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Energia do primeiro mês de operação. *Onde entra?*

A Hard costs

B Pré-abertura


C Contingência

D OPEX, coberto pelo giro — CORRETA

D. Sai depois de abrir: **fora do CAPEX**, dentro da necessidade.

QUAL É A SUA PORTA?

Cada porta, *um CAPEX diferente*

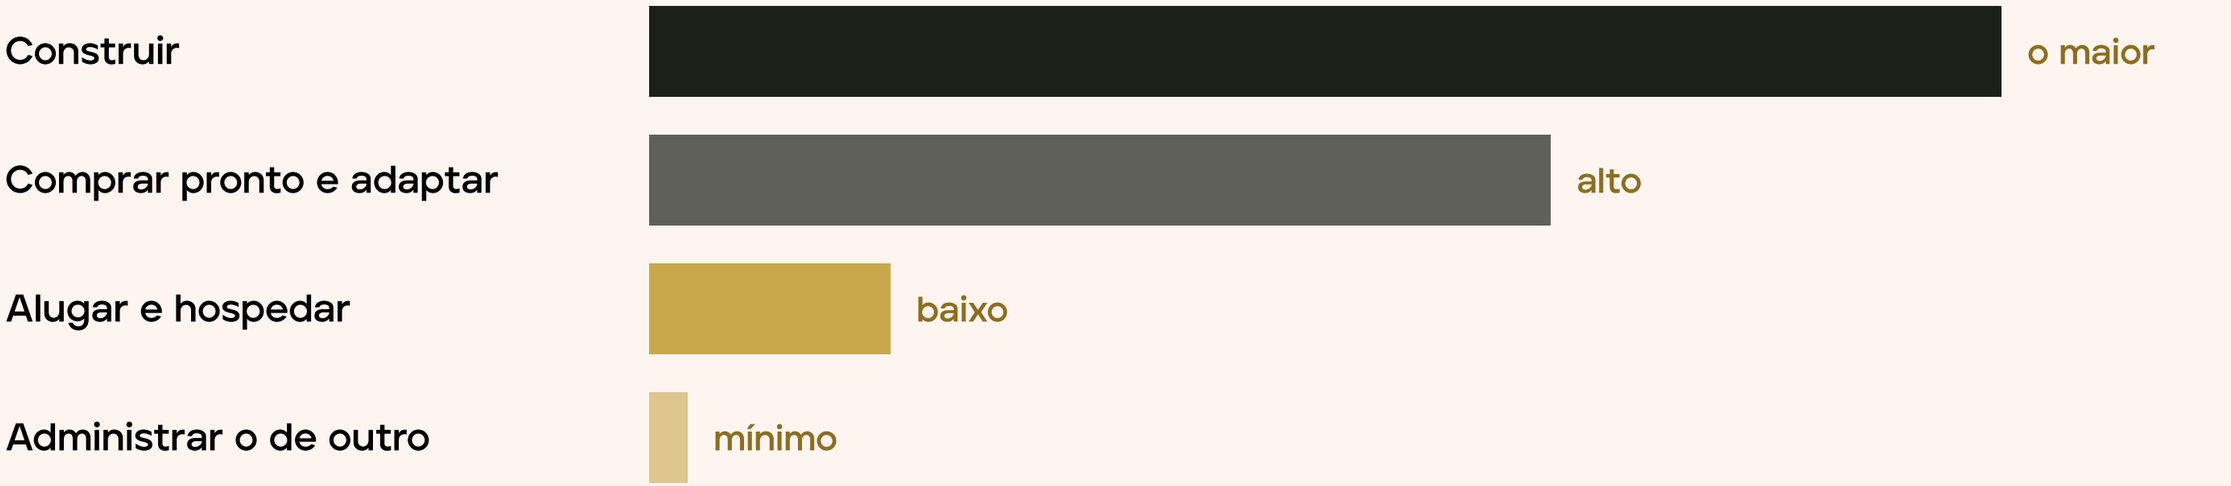

«a exigência de capital cai **em ordens de magnitude**, não em percentuais»

PREVISÃO · PASSA DE R$ 990.000?

Cada número *na camada certa*

Infraestrutura para 5	R$ 250.000
Obra: 3 × 130.000	R$ 390.000
Apoio: 30 × 3.000	R$ 90.000
Projeto e licenciamento	R$ 70.000
FF&E: 3 × 65.000	R$ 195.000
OS&E: 12% do FF&E	R$ 23.400
Pré-abertura: 5% dos hard costs	R$ 36.500
Subtotal	**R$ 1.054.900**

Acima por **R$ 64.900**, sem contingência.

O amador orça o chalé. *O developer orça o que faz o chalé funcionar.*

CURIOSIDADE

A pergunta mais barata é gratuita.

REFLEXÃO

Qual linha pode errar mais?

DICA

Ligue para a concessionária.

PREVISÃO · QUANTO FICOU DE FORA?


Área construída *é a área total*



«Cada metro esquecido no papel aparece na obra. **Com juros.**»

Cinco redes *fora da foto*

METROS ATÉ A ÚLTIMA CABANA?

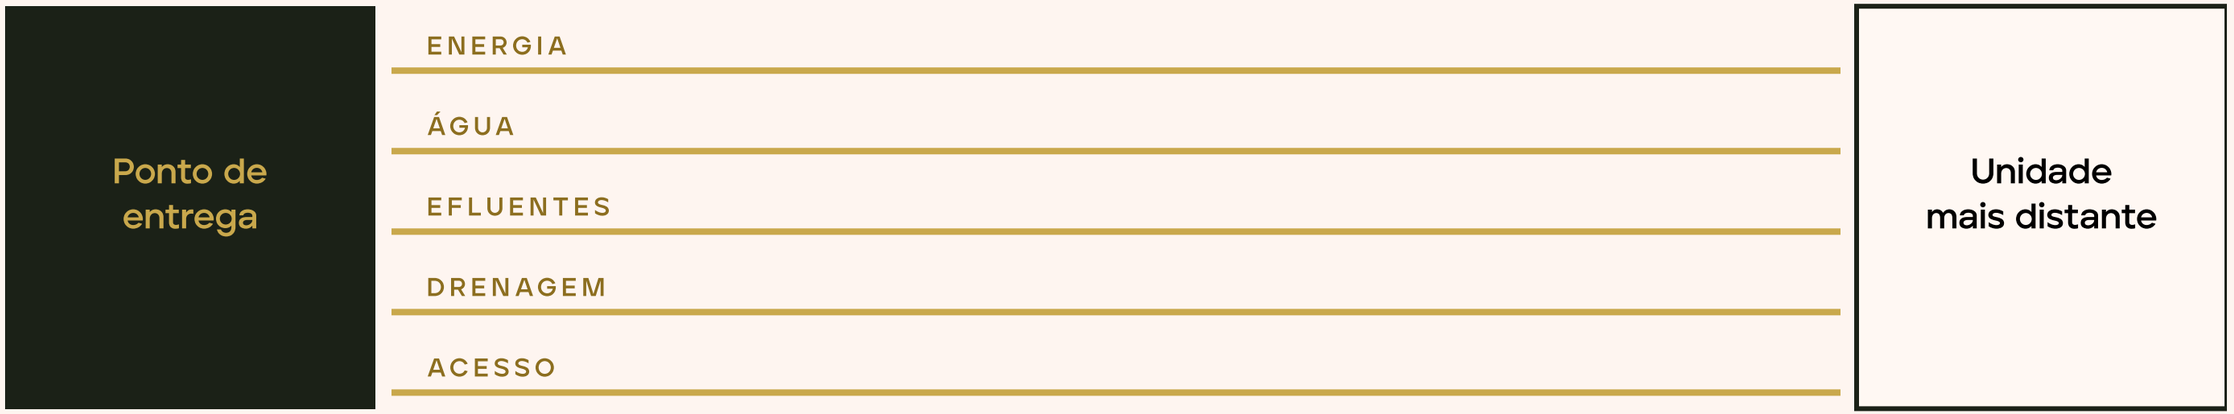

Orça-se por **distância e capacidade**, não por metro quadrado.

FAÇA COMIGO

Hard costs, *linha por linha*

LINHA	VALOR	EVIDÊNCIA
Cabanas: 3 × 130.000	R$ 390.000	2
Apoio: 30 m² × 3.000	R$ 90.000	2
Infraestrutura para cinco	R$ 250.000	1
Hard costs	**R$ 730.000**	

A rede: **34,2%**, e ainda palpite.

PREVISÃO · CAI QUANTO?

O erro da rede *se multiplica*

REDE		PRÉ-ABERTURA 5%		CONTINGÊNCIA 25%		CAPEX
– 70.000	+	– 3.500	+	– 17.500	=	– 91.000

Cada real de hard cost pesa **R$ 1,30** no CAPEX.

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

240 m² de chalés, 60 de apoio, 12 de máquinas. *Quanto é chalé?*

A 100%, como o construtor

B 80,0%: 240 ÷ 300

C 76,9%: 240 ÷ 312 — CORRETA

D 70,0%, como na pousada

C. Os 72 m² esquecidos são **23,1%**.

A obra entrega paredes. *O negócio precisa abrir pronto.*

CURIOSIDADE

«Ninguém posta uma foto do rodo.»

REFLEXÃO

Caixa apertado no fim da obra: o que você corta?

DICA

Simule um dia de operação.

CAMA OU LENÇOL?

O hóspede toca, *a operação usa*

FF&E · O HÓSPEDE TOCA

cama · banheira · climatização · mobiliário

OS&E · A OPERAÇÃO USA

rouparia · amenities · louça · carrinhos

Fronteira: **o enxoval mora numa só linha**.

Marina: FF&E de **R$ 195.000**, 15,8% do CAPEX.

Para cada cama, *três jogos*



UM JOGO

4 × 950 = R$ 3.800

TRÊS JOGOS

4 × 2.850 = R$ 11.400

Depois da inauguração, **descobre-se com hóspede na casa**.

QUEM ENTRA AOS 90 DIAS?

O vale *antes da primeira diária*




Marina, equipe: 2 × 5.200 = R$ 10.400

«Contratar cedo demais queima caixa. **Tarde demais, queima a estreia.**»

PREVISÃO · PASSA NAS DUAS?

Calcula por uma, *confere pela outra*

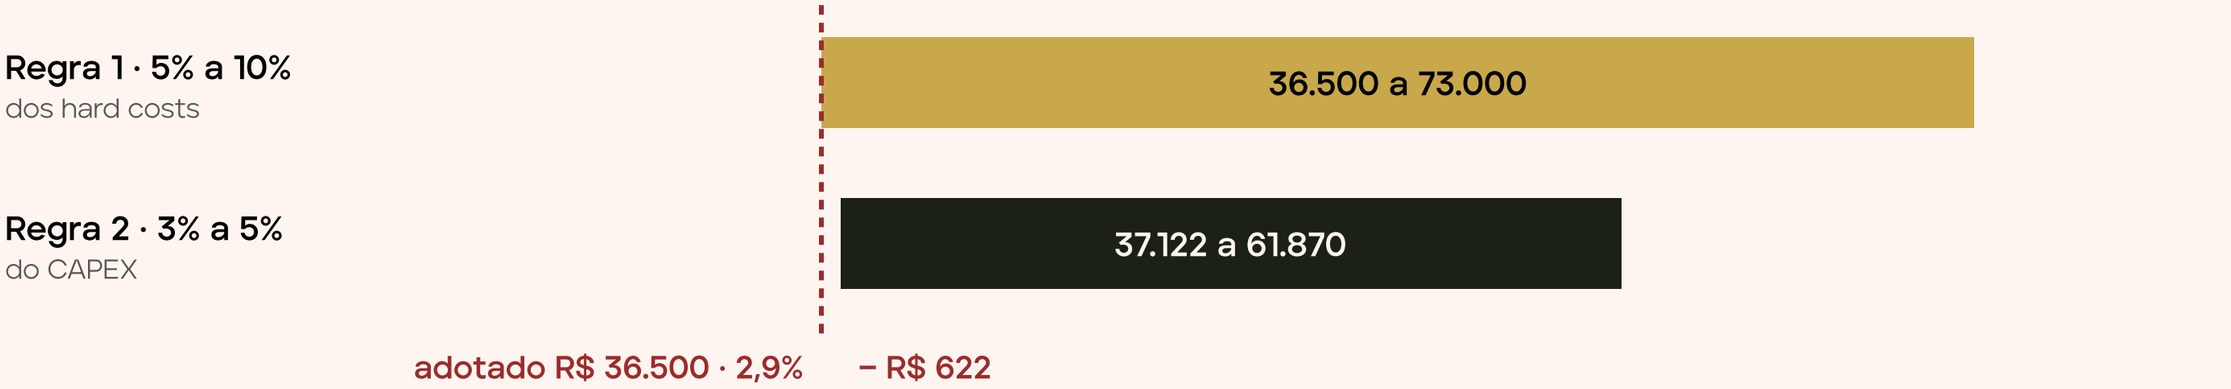

Divergem: **a lista decide**.

A contingência não é pessimismo. *É maturidade.*

CURIOSIDADE

Reserva e captação: 15% a 20% do pedido.

REFLEXÃO

Obra 20% mais cara: para quem ligar?

DICA

A regra de uso antes do valor.

EM QUE DEGRAU VOCÊ ESTÁ?

Escolha o degrau, *confira pelo CAPEX*

10% a 15%
com experiência

15% a 20%
imóvel pronto

20% a 25%
primeira obra

Marina · 25%
Rafael · 20%

sobre os hard costs

25% × 730.000
= R$ 182.500

182.500 ÷ 1.237.400
= 14,7% do CAPEX

passou

Reserva sem fronteira *vira caixa livre*

COBRE	NÃO COBRE · ONDE FICA
Solo que pede fundação	Escopo novo: linha nova
Reajuste e câmbio	Linha esquecida: CAPEX
Exigências do licenciamento	Déficit do mês: giro

«A regra importa **tanto quanto o valor**.»

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Imóvel pronto: 15% sobre 200 mil, CAPEX de 390 mil. *Passa?*

A Passa: 15% é o piso do degrau

B Passa: menos risco

C Não: 7,7%; com 20%, 10,0% — CORRETA

D Não: precisa de 25%

C. 30.000 ÷ 390.000 = 7,7%. Com 20%: **10,0%**.

EXEMPLO RESOLVIDO · 1

PREVISÃO · PASSA DE R$ 120.000?


Primeiro, *o que a noite deixa*

POR NOITE

$680 \times 0{,}82 - 120 = \text{R\$ } 437{,}60$

MÊS MÉDIO


$90 \times 38{,}5\% \times 437{,}60 = \text{R\$ } 15.162{,}84$

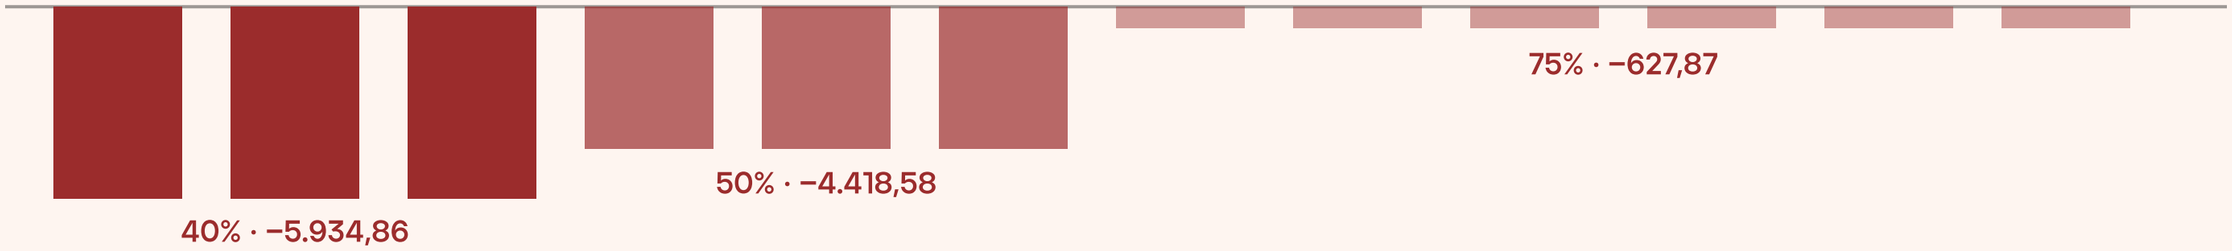

Rampa: 3 × 5.934,86 + 3 × 4.418,58 + 6 × 627,87 = R$ 34.828

FAÇA COMIGO

Rampa, baixa e segurança. *Fica a maior regra.*

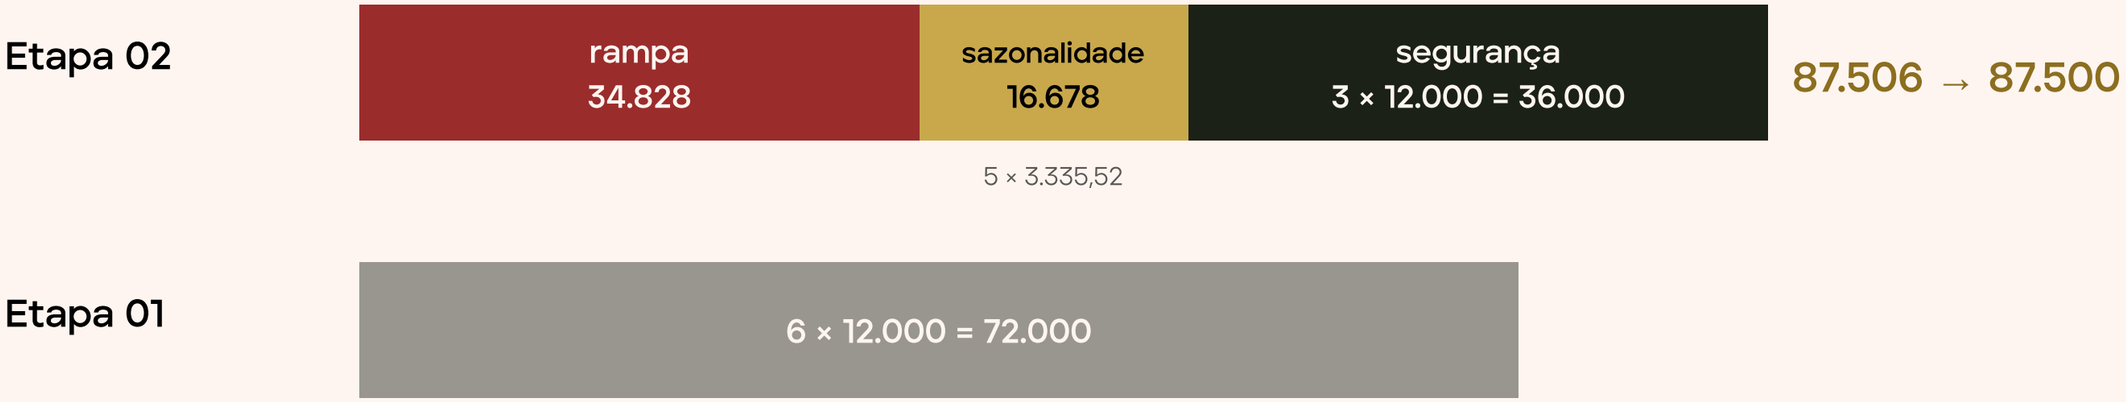

Adota-se **R$ 87.500**. Necessidade: 1.237.400 + 87.500 = **R$ 1.324.900**.


Você não precisa ter todo o capital no dia um. *Precisa ter o capital certo, na fase certa.*

CURIOSIDADE
Um gráfico de cinco segundos.

REFLEXÃO
Número exato ou redondo?

DICA
Percentual, faixa e frase.

O investidor começa *pelos percentuais*

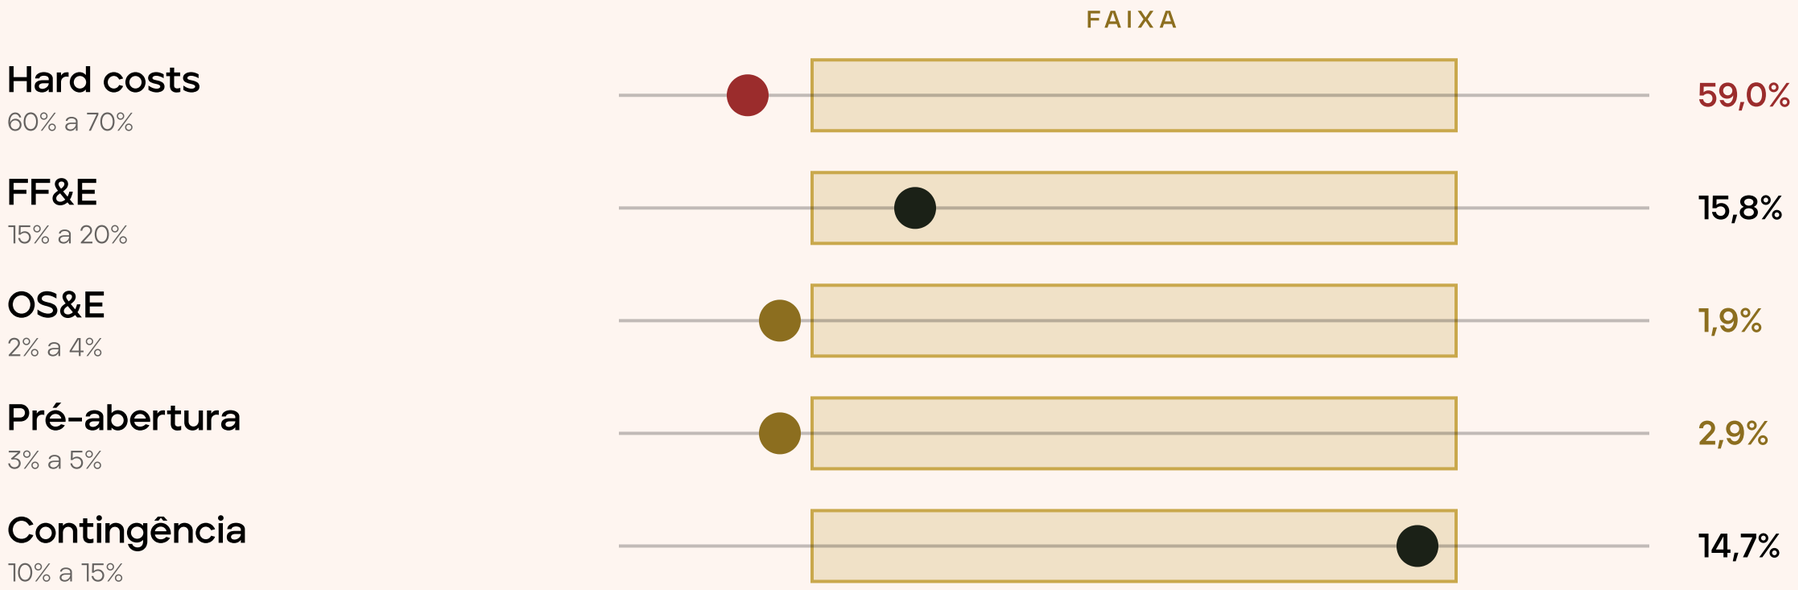

Explicação: com o projeto, **64,7%**.

A rede custa o mesmo. *Muda quem a carrega.*




Os três: **só o mais bonito** gera desconfiança.

DESEMBOLSO POR MARCO

ONDE ACABA O SEU?

A lacuna começa *no meio da rede*

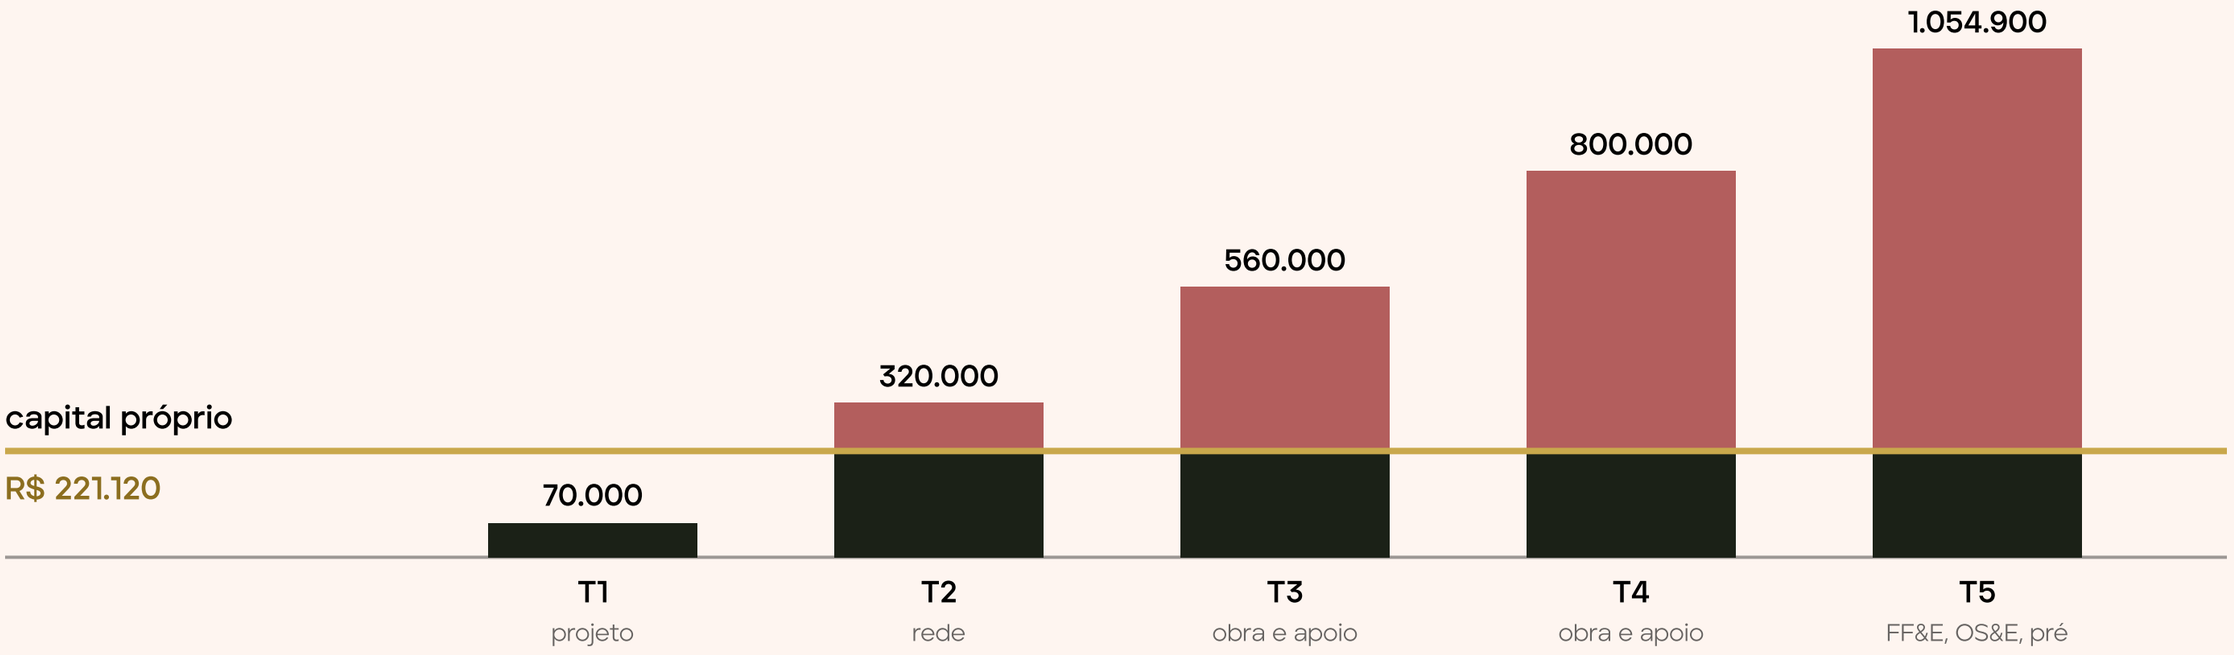

Fora dos marcos: **contingência**. Na abertura: **giro**.

A operação ajuda. *Não paga sozinha.*

FASE DOIS

R$ 266.700

necessidade: **R$ 305.700**

RESERVA MENSAL

R$ 5.664


presa ao retrofit: 15,2 meses

Conservador: −R$ 174,40

Um ano de reserva: **cerca de 22%**. O giro nunca vira obra.

FAÇA COMIGO

Da necessidade *ao número do pedido*

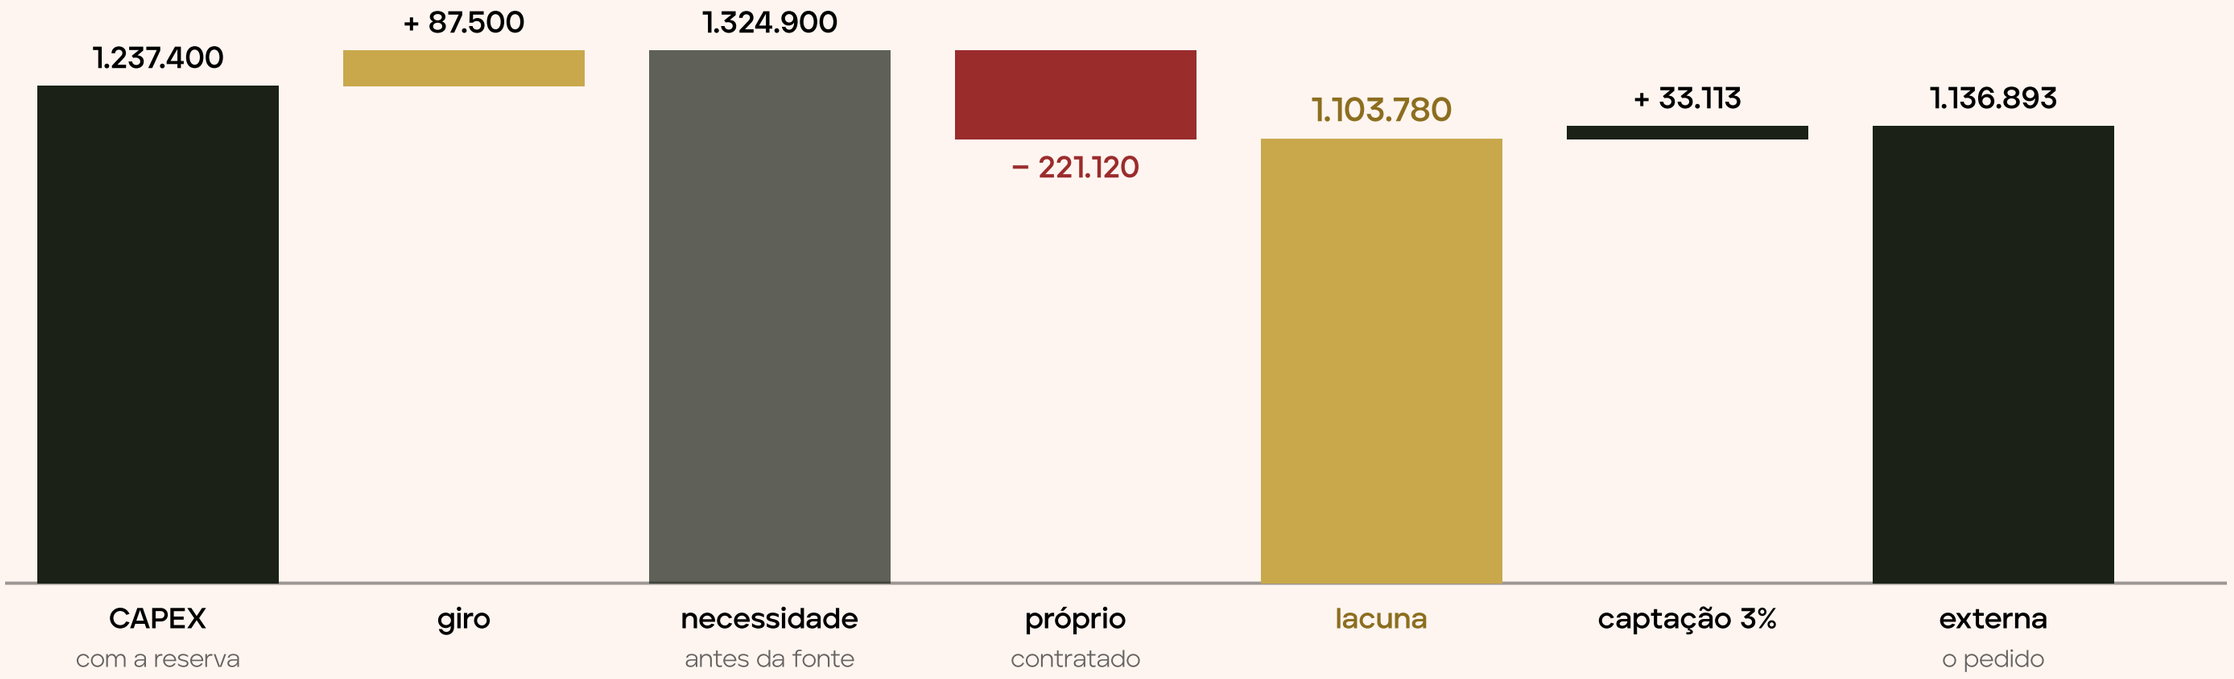

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Conta de 1,2 milhão; o sócio quer meia reserva e pedir 1,5. *E agora?*

A Aceita: sobra folga

B Meia reserva, pede o exato


C Reserva inteira, pede o exato — CORRETA

D Reserva inteira, arredonda

C. Redondo acima da conta: **a conta não foi feita**.

DE MEMÓRIA

Uma regra *por bloco*

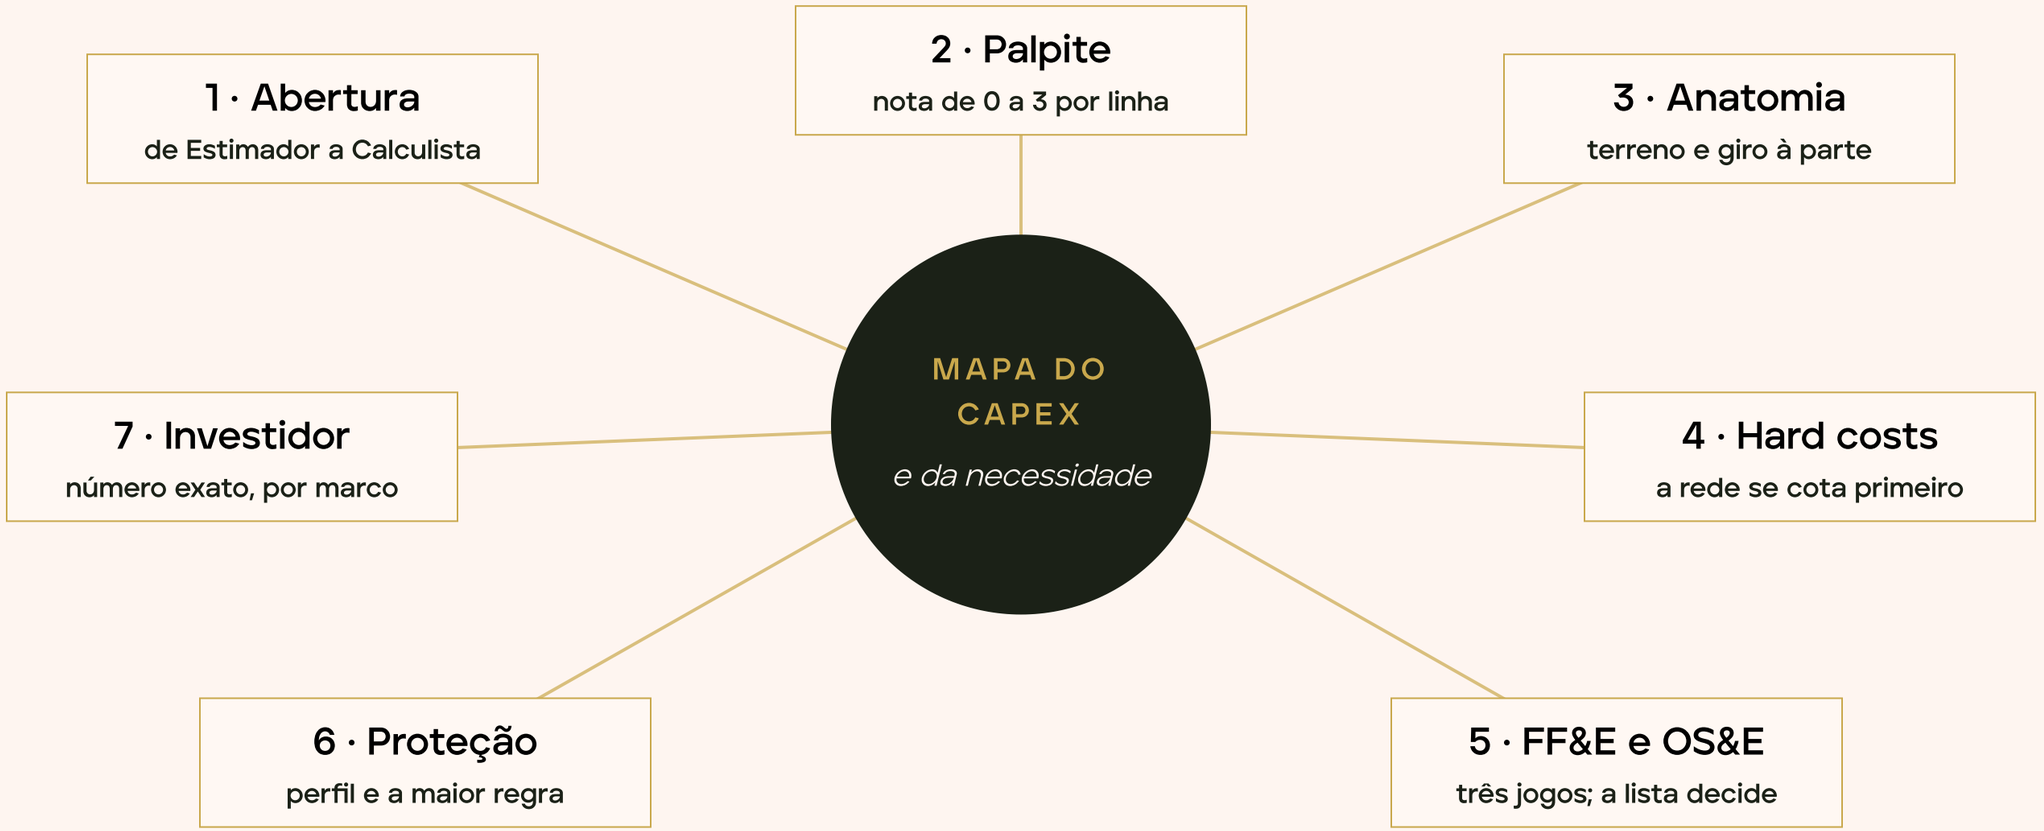

FERRAMENTA DO CAPÍTULO 8

EXERCÍCIO FINAL

O seu Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital, *em quatro grupos, oito peças*

1
CAPEX e faixas
nota por linha

2
Proteção e chave
reserva, giro, chave

3
Marcos e lacuna
cronograma e régua

4
Pedido e pendências
dono e data

PDF AO MENTOR

PRÓXIMO: F02
