ZION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL

MENTORIA ZION 360° · PILAR F · FINANCIAR · MÓDULO F01

01

CAPEX e Necessidade de *Capital*

Quanto custa de verdade e quanto falta: o investimento aberto linha por linha, com o que ninguém orça, a contingência, o capital de giro e o cronograma, até a frase do pedido, antes de conversar com qualquer fonte de capital.

MÉTODO ZION 360°

DA IDEIA AO NEGÓCIO. DA HOSPEDAGEM AO DESTINO.

EDIÇÃO COMPLETA · VERSÃO 1.0 · OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

00 **Abertura** — 5 MIN
Carta, objetivos, como usar e as duas jornadas no F01

01 **Do palpite ao orçamento.** — 14 MIN
Por que o CAPEX vem primeiro

02 **Quatro camadas, e cada real no seu lugar.** — 16 MIN
A anatomia do CAPEX

03 **Hard costs: o que faz a cabana funcionar.** — 14 MIN
Hard costs e a infraestrutura invisível

04 **FF&E, OS&E e pré-abertura: o que transforma obra em negócio.** — 16 MIN
O que equipa, o que opera, o que abre

05 **Proteção: a reserva da obra e o fôlego do primeiro ano.** — 15 MIN
Contingência e capital de giro

06 **Ler o CAPEX como investidor.** — 16 MIN
Ler o CAPEX como investidor

07 **Quem já opera: reposição, retrofit e expansão.** — 15 MIN
Reposição, retrofit e expansão

08 **O seu Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital.** — 18 MIN
Entregável do módulo

\+ **Glossário e referências** — 7 MIN
Termos do módulo, fontes e o que conferir no seu caso

ABERTURA

F01 · CAPEX E NECESSIDADE DE CAPITAL

Do número redondo *à conta que você explica.*

Primeiro módulo de conteúdo do pilar F · Financiar da Mentoria Zion 360° | Negócios de Hospedagem. Ensina a abrir o investimento linha por linha, protegê-lo e chegar ao número exato que falta.

UMA CARTA PARA QUEM JÁ TEM UM NÚMERO NA CABEÇA

«Fala comigo, Hoteleiro!» É assim que abro a carta do Volume 05 · Investimento, e é assim que abro este módulo, porque a conversa agora é sobre dinheiro. Você chega do Marco Zero do Capital com um número, quase sempre redondo, e com a sensação de que ele basta.

Passei mais de vinte anos na hotelaria internacional, com passagens por Meliá, Barceló e Wyndham na Espanha e nas ilhas Canárias e Baleares. Vi orçamento bonito virar obra parada, quase sempre porque o número foi fechado antes de ser aberto. O F01 inverte essa ordem: o seu número vira uma conta aberta, com a origem de cada linha escrita ao lado, e você sabe quanto falta antes de pedir um real a banco, sócio ou investidor.

Bruno Chaerk
Fundador · Zion Hospitality Business School

O que você vai aprender neste módulo

Ao terminar o F01, você deverá ser capaz de fazer sete coisas.

OBJETIVOS DO MÓDULO

1. Distinguir CAPEX de OPEX e explicar por que o terreno, o capital de giro e a contingência são tratados à parte.
2. Abrir um investimento nos quatro componentes do CAPEX e nas sete linhas da Conta do Investimento Necessário™, reconhecendo o que costuma ficar fora.
3. Estimar hard costs, FF&E, OS&E e pré-abertura com as regras da fonte e dar a cada linha um grau de evidência.
4. Dimensionar contingência e capital de giro pelo perfil de risco, com rampa e sazonalidade, e justificar a regra escolhida.
5. Ler um CAPEX como investidor: faixas de sanidade, custo por chave, efeito de escala e cronograma de desembolso.
6. Na Jornada B, calcular o CAPEX de reposição e de expansão e quanto o caixa da operação pode financiar sem comprometer a operação.
7. Produzir o Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital com a lacuna, a cobertura própria e a frase do pedido.

Como usar este e-book

São cerca de cento e trinta páginas, em oito capítulos. Os sete primeiros seguem a ordem de um orçamento sério, do palpite à leitura do investidor, com um capítulo para quem já opera. O oitavo junta tudo na ferramenta e chega à lacuna.

- **Leia com o Marco Zero do Capital e o Conceito e Masterplan Faseado ao lado.** Sem escopo, não existe orçamento.
- **Dê nota de evidência a cada linha.** A régua está no Capítulo 1.
- **Caixas verdes são exemplos ilustrativos**, não resultados da Zion nem projeções para o seu caso.
- **Caixas douradas trazem os frameworks do método** e as regras. Os nomes com ™ seguem as fontes; quando a regra é do módulo, o texto diz.
- **Responda às perguntas de recuperação sem olhar** e faça o exercício de cada capítulo. As respostas ficam salvas só neste navegador.

Tempo estimado. Cerca de duas horas e quinze minutos de leitura, mais os exercícios e o tempo de pedir cotações.

As duas jornadas no F01

Marina e Rafael, personagens ilustrativos, chegam do Marco Zero do Capital como Estimadores.

A

Quero começar

Marina no F01: terreno herdado, três cabanas de casal de 38 m^2 com 16 m^2 de deck, apoio de 30 m^2 e infraestrutura para cinco. Fase um de 3 × R$ 330.000 = R$ 990.000, lacuna de R$ 730.000, cobertura própria de 26,3%. Nota 1 no F01: rede com dois valores, R$ 180.000 e R$ 250.000, e giro e rampa nunca calculados.

Resultado: o CAPEX da fase um aberto, contingência e giro justificados, cronograma e lacuna recalculada.

B

Quero crescer

Rafael no F01: quatro chalés a R$ 480, 54,2% de ocupação no ano, receita de R$ 380.160. Retrofit dos chalés 1 a 3, R$ 86.250, pago pela reserva mensal. Fase dois, chalé 5 e efluente, de R$ 205.000, sem projeto, contingência, pré-abertura nem giro. Capital real de R$ 56.000, lacuna de R$ 149.000.

Resultado: fundo de reposição, fase dois aberta, lacuna corrigida e o limite do que o caixa pode financiar.

Onde o F01 se encaixa

A pergunta do pilar F é "quanto custa, quanto rende e como pagar?" (pergunta do pilar, Z00). O F01 responde a primeira parte e faz a ponte para quanto falta. No Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade, cujo índice você montou no F00, ele preenche o **bloco 4 · CAPEX e necessidade de capital**.



Figura 0.1 · O lugar do F01 no pilar F: recebe a estimativa e a lacuna do F00 e do pilar D e entrega o Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital aos módulos F02 a F06. Organização da mentoria.

O F01 não diz se o projeto fecha nem escolhe a fonte. Entrega o número que os outros módulos vão usar, e por isso precisa ser honesto: «CAPEX estourado dói para sempre — ele muda o denominador de todas as contas» (Volume 05).

A escala de evidência, agora por linha

A escala de 0 a 3 que você usa desde o D00 passa a valer para cada linha do CAPEX, e a nota do conjunto é a das linhas que mais pesam. O Capítulo 1 mostra a régua e a regra para chegar a Calculista.

O entregável: o Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital

CAPEX aberto por linha, com nota, faixas de sanidade, contingência e giro justificados, custo por chave, cronograma por marco, necessidade, lacuna, cobertura própria e a frase do Volume 05: «preciso de X para a Fase 1, assim distribuído, liberado em» tais marcos. O Mapa não escolhe a fonte do dinheiro. Diz quanto pedir.

AVISO AO LEITOR QUE VEM DA BASE

Os números de Marina e Rafael serão reabertos

Até aqui, o investimento dos dois era estimativa de Estimador. Neste módulo, o que era estimativa vira conta aberta.

- Os R$ 330.000 por cabana vieram de cinco cabanas, com a rede diluída por cinco; o giro de R$ 120.000 também.
- A reserva de Rafael vinha de antes do custo da responsável pela rotina.

O Capítulo 1 adianta quanto cada número muda. São exemplos ilustrativos, não referências de custo. Quem descobre a diferença no papel ainda pode decidir. Quem descobre na obra só pode pagar.

O que trazer

O QUE TRAZER	DE ONDE VEM	PARA QUE SERVE NO F01
Marco Zero do Capital	F00	Nível na régua, nota do F01 e lacuna estimada.
Conceito e Masterplan Faseado	D05	O que entra em cada fase e a infraestrutura para o projeto completo.
Conta do Investimento Necessário™ e capital real	Z02	As sete linhas estimadas, o capital disponível e o limite de perda.

Traga também toda cotação que já tem. Na Jornada B, doze meses de extrato e o saldo de cada reserva. Uma linha escrita "não sei" vale mais do que um número inventado.

AVISO IMPORTANTE

Este e-book não promete crédito, sócio, investidor, retorno, faturamento nem aprovação de licença. Os exemplos são ilustrativos, e as faixas de custo citadas são ilustrativas da fonte, a validar com cotação da sua região e do ano. Tributos, licenças, contratos e financiamento se decidem com profissionais habilitados.

CAPÍTULO 01

POR QUE O CAPEX VEM PRIMEIRO

Do palpite *ao orçamento.*

Antes de perguntar quem empresta, quem investe ou quanto rende, existe uma conta que precisa estar aberta, linha por linha, com a origem de cada número.

NESTE CAPÍTULO

- A régua de maturidade financeira: Sonhador, Estimador, Calculista e Developer.
- O erro que mata projetos antes da inauguração.
- CAPEX e OPEX sem confusão, e o que fica fora dos dois.
- A Conta do Custo Invisível™ e por que ela precisa de um CAPEX ao lado.
- De onde vêm números confiáveis e a escala de evidência de 0 a 3, linha por linha.
- Onde o F01 entra no pilar F e o ponto de partida de Marina e de Rafael.

Imagine dois empreendedores visitando o mesmo terreno. O Volume 05 · Investimento descreve a cena. O primeiro enxerga a vista, imagina as acomodações e diz: «isso deve custar uns dois milhões». O segundo abre uma planilha, calcula a área construída, multiplica pelo custo por metro quadrado, soma móveis, equipamentos e suprimentos, provisiona a pré-abertura e protege tudo com uma contingência. A fonte conclui: «O primeiro tem um palpite. O segundo tem um projeto.»

O que separa os dois é o idioma: um fala em número redondo, o outro em linhas com origem.

Um projeto hoteleiro não morre quando falta dinheiro. Morre quando os números nunca foram feitos.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 01

A régua de maturidade financeira

O Volume 05 propõe um diagnóstico em quatro níveis. Você já o usou no Marco Zero do Capital, no F00. Aqui ele mostra o que falta no orçamento para subir um degrau.

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 01

A régua de maturidade financeira

- **Nível 1 · O sonhador.** «tem a visão, não tem números. Todo projeto começa aqui. Nenhum deveria captar aqui»
- **Nível 2 · O estimador.** «tem números "por alto". É o nível mais perigoso: a confiança sem o fundamento»
- **Nível 3 · O calculista.** «tem CAPEX aberto e projeções com premissas. Pronto para conversas sérias»
- **Nível 4 · O developer.** «tem tudo isso mais cenários, Score e estrutura. Não procura capital; escolhe capital»

É método, não talento.



Figura 1.1 · A régua de maturidade financeira (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 01). Marcações de Marina, Rafael e do F01: leitura do módulo.

Repare no nível 2. O Estimador sabe o suficiente para se sentir seguro: tem um número, às vezes com centavos, e assina o primeiro contrato com ele. O Sonhador, pelo menos, sabe que não sabe. O F01 faz uma subida, do 2 para o 3; o nível 4 se constrói no resto do pilar.

O erro que mata projetos antes da inauguração

O Volume 05 aponta a causa sem rodeio: «A causa raramente é a obra. É o orçamento que ficou pronto depois da obra começar.» E descreve a sequência: «O empreendedor estima "por alto". A realidade cobra por baixo. Cada item esquecido vira uma surpresa. Cada surpresa consome o caixa.»

A Etapa 02 da Jornada do COMO mostra de onde vem a maior parte das surpresas: «O orçamento que o construtor entrega cobre a obra. Ele não inclui infraestrutura de sítio, mobiliário, enxoval, pré-operação, contingência nem capital de giro — que juntos costumam somar tanto quanto a própria obra.» Por isso o CAPEX vem primeiro. Diária, ocupação e canal se ajustam depois de abrir. Uma rede elétrica esquecida não se ajusta: se paga.

O custo de calcular errado é sempre maior do que o custo de calcular.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 01

CAPEX e OPEX, sem confundir


A definição da fonte: «CAPEX — Capital Expenditure — é o investimento necessário para construir e equipar o seu projeto até ele estar pronto para receber o primeiro hóspede.» Em português, despesa de capital. O OPEX, de Operational Expenditure, é a despesa operacional. A diferença está no tempo: «CAPEX é o que você investe uma vez para construir. OPEX é o que você gasta todos os meses para operar.»

O Volume 05 abre o CAPEX em quatro componentes, detalhados no Capítulo 2. **Hard costs** são os custos físicos da construção, «Tudo aquilo que fixa o projeto no território». **FF&E** (Furniture, Fixtures & Equipment) são móveis e equipamentos. **OS&E** (Operating Supplies & Equipment) são os suprimentos da operação: rouparia, utensílios, limpeza. E há **pré-abertura e contingência**. O glossário nomeia ainda os **soft costs**, os custos não físicos, que no F01 viram a linha projeto e licenciamento, como na Conta do Investimento Necessário™ da Etapa 02 (Capítulo 2).

Duas coisas ficam fora do CAPEX e não podem sumir da conta. O **terreno**, porque entra por compra, permuta, sociedade ou arrendamento («Repare que tratamos o terreno fora do CAPEX.»), e mesmo herdado tem custo: «Imóvel que você já possui tem custo — é capital empregado.» (Etapa 02). E o **capital de giro**, o dinheiro que sustenta a operação depois de abrir e antes de a receita cobrir os custos: fora do CAPEX, dentro da necessidade de capital.

ITEM	ONDE ENTRA	QUANDO SAI DO CAIXA
Hard costs, projeto e licenciamento	CAPEX	Antes e durante a obra
FF&E, OS&E, pré-abertura	CAPEX	Nos meses antes de abrir
Contingência	CAPEX	Quando o imprevisto chega
Terreno	Fora do CAPEX, dentro do capital empregado	Na compra, ou nunca, se já é seu
Capital de giro	Fora do CAPEX, dentro da necessidade de capital	Depois de abrir, até a receita cobrir
OPEX	Custo da operação (F02)	Todo mês, enquanto operar

Tabela 1.1 · CAPEX, OPEX e o que fica entre os dois. Volume 05 · Investimento, edição do projeto, caps. 01 e 02; Jornada do COMO, Etapa 02. Organização do módulo.

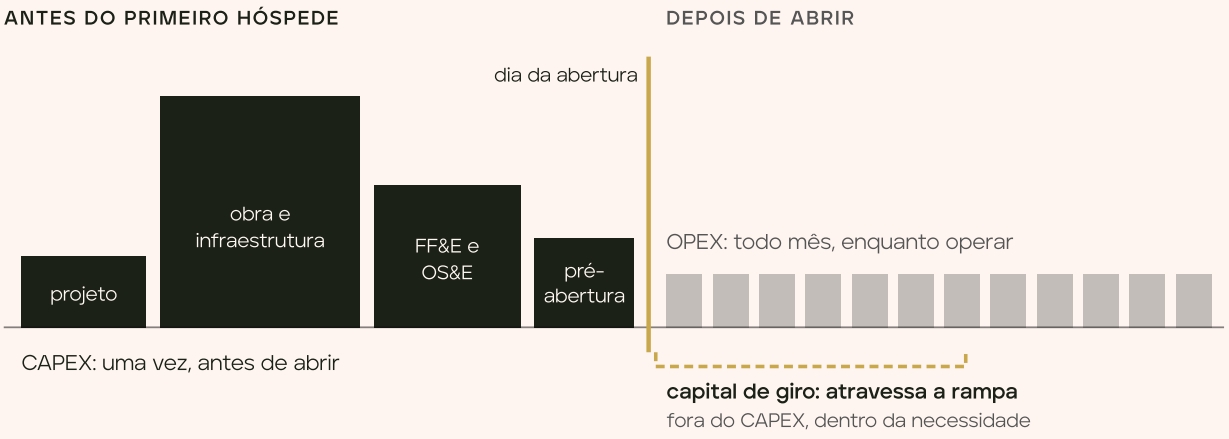

«Inauguram bonitos. E quebram operando.»

Figura 1.2 · CAPEX e OPEX no tempo, com o capital de giro na ponte entre os dois. Alturas sem escala. Frase: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 01. Organização do módulo.

A frase inteira é: «Muitos projetos calculam bem o primeiro e ignoram o segundo. Inauguram bonitos. E quebram operando.» Na Jornada A, chama-se de CAPEX só a obra, e o mês seguinte à inauguração nem aparece. Na Jornada B, o erro é o espelho: reforma e unidade extra são CAPEX, mas saem do caixa do

mês. O Diagnóstico do Caixa Apertado™, da Etapa 09, chama isso de «5 · Investimento pago com caixa operacional». O Manual Oficial resume: «Misturar essas finalidades normalmente gera desequilíbrios financeiros.»

O custo de não calcular

Há um segundo motivo para fazer o CAPEX agora, e ele pesa contra quem adia. «Existe uma conta que quase ninguém faz. O custo de esperar.», diz o Volume 05. Enquanto o projeto não sai do papel, o terreno gera imposto, manutenção e nenhuma receita. «A inação parece prudência. Na planilha, ela é o maior custo do projeto.» A Ordem das Coisas transforma a ideia em instrumento.

FRAMEWORK DO MÉTODO · A ORDEM DAS COISAS, CAP. 07

Conta do Custo Invisível™

«dado real × tempo = o que a espera já custou». O dado real é o resultado operacional anual que uma operação adequada produziria no lugar; para quem já opera, a diferença para um concorrente comparável e melhor posicionado.

- Resultado operacional anual estimado × anos de travamento = resultado não gerado.
- Mais a valorização de aquisição perdida e o custo de recuperação de posição, se houver.
- A soma, o custo invisível acumulado, se compara com o CAPEX estimado para abrir.

A inação não emite boleto. É por isso que ela é o item mais caro do orçamento de quase todo projeto parado.

A ORDEM DAS COISAS, CAP. 07

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Três anos parados, uma conta honesta

Um terreno próprio com potencial para quatro unidades, parado há três anos. Valores inventados para mostrar o raciocínio.

LINHA	VALOR	COMO SE OBTÉM
Resultado operacional anual	R$ 80.000	Receita de R$ 260.000 menos custo operacional de R$ 180.000
Resultado não gerado	R$ 240.000	80.000 × 3 anos
Valorização perdida	R$ 0	O terreno já é do dono
Recuperação de posição	R$ 30.000	Lançamento extra para alcançar quem abriu antes
Custo invisível acumulado	**R$ 270.000**	240.000 + 0 + 30.000
CAPEX estimado para abrir	R$ 1.000.000	Palpite do dono, sem linhas

Tabela 1.2 · Conta do Custo Invisível™ (A Ordem das Coisas, cap. 07) com valores ilustrativos do módulo.

Leitura: o custo invisível é 27% do CAPEX (270.000 ÷ 1.000.000). A espera ainda não é a decisão mais cara, mas cada ano soma R$ 80.000. E a última linha é um palpite: se o CAPEX real for outro, a comparação muda.

A Ordem das Coisas dá a régua: «Se o custo invisível já superou o CAPEX, a espera não é a decisão conservadora — ela é a decisão mais cara disponível». Três cuidados protegem o raciocínio. Use **resultado, não receita**: com a receita no lugar, o exemplo daria 260.000 × 3 + 30.000 = R$ 810.000 e pareceria emergência. Confira a **unidade de tempo**: um valor mensal tratado como anual erra a conta por doze. E, ponto central do F01, a conta da espera só decide algo quando o **CAPEX ao lado tem origem**.

De onde vêm números confiáveis

«Orçamento profissional não nasce de pesquisa no navegador. Nasce de fontes com compromisso», diz o Volume 05, e lista quatro:

- «Construtoras da região: cotação formal por m², com escopo escrito».
- «Fornecedores de FF&E: proposta por unidade-modelo, com prazo».
- «Operadores em atividade: os custos reais que nenhum relatório publica».
- «Projetos executivos: cada indefinição resolvida no papel é um aditivo evitado na obra».

A regra: um número sem fonte é um palpite com pontuação decimal.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 01

Cotação sem escopo escrito é preço sem objeto: inclui fundação, frete, montagem? A mais barata costuma ser a que deixou mais coisa de fora. O prazo vem do Volume 05, edição de captação: «Cotação de mais de noventa dias precisa ser refeita.» As faixas de custo dos livros servem para estimar no começo e conferir no fim (Capítulo 6), nunca como o seu preço.

A escala de evidência, linha por linha

No D00 e no F00 você deu a cada módulo uma nota de evidência de 0 a 3. O F01 usa a mesma escala em cada linha do CAPEX, com sentido mais preciso. A

régua é uma elaboração do módulo sobre a regra das fontes com compromisso.

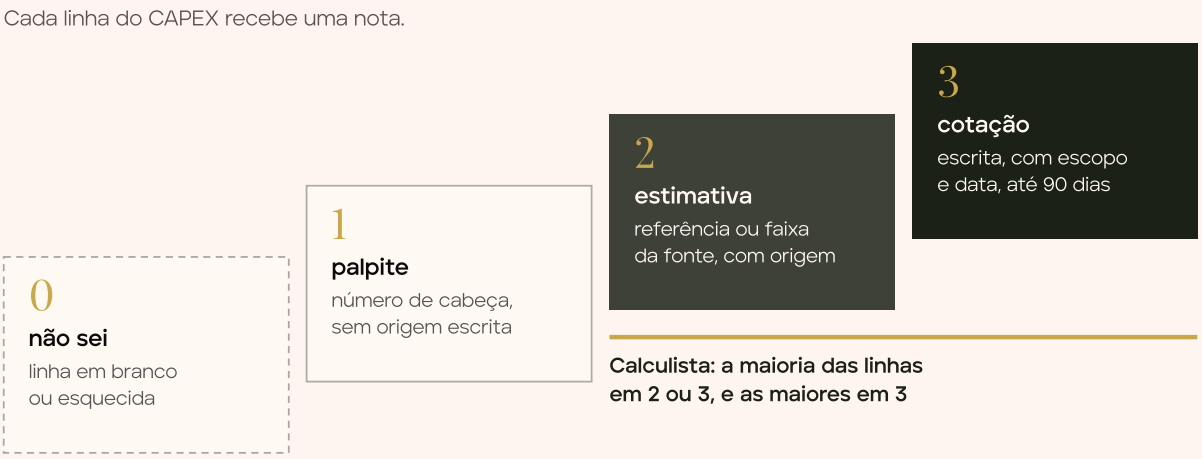


Figura 1.3 · A escala de evidência por linha do CAPEX. Escala do D00 e do F00 aplicada a cada linha; validade de noventa dias: Volume 05 · Investimento, edição de captação, cap. 04. Regra do Calculista: elaboração do módulo.

REGRA DO MÓDULO

Quando você passa a Calculista

O CAPEX está aberto em linhas, a maioria tem nota 2 ou 3, e as maiores têm nota 3. Por que as maiores? Porque errar 10% na obra pesa mais do que errar 50% nas amenidades. Quarenta linhas cotadas com a rede de energia em palpite continuam sendo a planilha de um Estimador.

Onde o F01 entra no pilar F

A Figura 0.1, na abertura, mostra o lugar do módulo: o F01 responde quanto custa, faz a ponte para quanto falta e preenche o bloco 4 do Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade. O F01 não escolhe a fonte (F05 e F06), não projeta receitas, custos nem retorno (F02 e F03) e não substitui engenheiro, arquiteto, contador e advogado. Termina numa frase de pedido com um número exato, não redondo (Capítulo 8).

REVISITE · F00

Sem consultar: em que nível da régua Marina e Rafael saíram do Marco Zero do Capital, e que nota deram ao F01? Confira: os dois no Nível 2 · Estimador, os dois com nota 1 no F01. Marina, pela rede com dois valores (R$ 180.000 no Z02, R$ 250.000 no D05) e pelo giro nunca calculado; Rafael, pela fase dois sem contingência, projeto nem giro.

Marina chega como Estimadora

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Marina chega com R$ 990.000 para a fase um: três cabanas a R$ 330.000. Escreva o seu palpite: aberta linha por linha, a conta vai ficar abaixo, perto ou acima disso? Quanto?

O número não nasceu de descuido, mas de uma fase em que ordem de grandeza bastava. Cada módulo deu um passo sensato; juntos, produziram um número que ninguém consegue abrir.

PASSO	MÓDULO	CONTA	VALOR
Cinco cabanas de uma vez, sem terreno e sem giro	Z02	Linhas mais contingência	R$ 1.431.146
Média por cabana	D01	1.431.146 ÷ 5	R$ 286.229
Ordem de grandeza	D01	Arredondada para cima	R$ 300.000
Hidromassagem e lareira	D03	300.000 + 18.000 + 12.000	R$ 330.000
Fase um	D04	3 × 330.000	**R$ 990.000**

Tabela 1.3 · De onde vinham os R$ 330.000 por cabana (exemplo ilustrativo; números dos módulos Z02, D01, D03 e D04).

Dentro de cada R$ 286.229 estão as linhas do Z02 divididas por cinco (Tabela 1.4), com a contingência calculada sobre uma base de cinco cabanas que incluía terreno e giro. Daí três problemas: a fase um constrói a rede para cinco, mas os R$

990.000 só levam R$ 108.000 dela (3 × 36.000); a contingência veio de outra base; e o apoio de 30 m² do D05 não tem custo.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina tenta dividir os R$ 990.000

COMPONENTE	DE ONDE VEM	VALOR	%	NOTA
Hard costs	3 × (rede 36.000 + obra 130.000)	R$ 498.000	50,3%	rede 1, obra 2
Projeto e licenciamento	3 × 14.000	R$ 42.000	4,2%	1
FF&E	3 × (35.000 + 30.000)	R$ 195.000	19,7%	1
OS&E e apoio	Linhas inexistentes	R$ 0	0,0%	0
Pré-abertura	3 × 9.000	R$ 27.000	2,7%	1
Contingência	3 × 62.229, de outra base	R$ 186.687	18,9%	1
Arredondamento	3 × 13.771, sem objeto	R$ 41.313	4,2%	0
Total		**R$ 990.000**	**100%**	

Tabela 1.4 · Os R$ 990.000 de Marina abertos pelas linhas do Z02 (exemplo ilustrativo). Notas de evidência: leitura do módulo.

Conferência: 498.000 + 42.000 + 195.000 + 27.000 + 186.687 + 41.313 = 990.000. A divisão fecha, mas é retrato de Estimador: linhas inexistentes, R$ 41.313 sem objeto e nenhuma nota 3. A obra tem nota 2 porque vem do custo de referência do D03 (38 m² a R$ 3.000 mais 16 m² de deck a R$ 1.000).

Marina abre cada linha nos Capítulos 3 a 5. Nos Capítulos 5 e 6 ela descobre que a fase um custa **R$ 1.237.400**, sem terreno e antes do giro: R$ 247.400 a mais, cerca de 25%. E só passa a Calculista quando rede, obra, apoio e FF&E tiverem cotação escrita.

Rafael chega com uma fase dois pela metade

Rafael opera quatro chalés há três anos e conhece seus custos. Entra como Estimador pelo motivo inverso: faltam linhas no investimento, não dado operacional.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Os R$ 205.000 da fase dois

O D05 somou efluente de R$ 45.000 (a confirmar com orçamento) e o chalé 5: R$ 125.000 de obra e R$ 35.000 de mobiliário. Conferência: 45.000 + 125.000 + 35.000 = R$ 205.000. Notas: efluente 1, obra 2, mobiliário 2. Projeto e licenciamento, OS&E, pré-abertura, contingência e capital de giro ficam com nota 0. É a soma das partes visíveis do chalé, não um orçamento.

Há um segundo sinal: o retrofit dos chalés 1 a 3, de R$ 86.250, é CAPEX pago com o caixa do mês, a causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™. No Capítulo 7, Rafael abre a fase dois e chega a R$ 266.700 de CAPEX (R$ 61.700 a mais) e a R$ 305.700 de necessidade, com giro de três meses de custo fixo.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Escreva o número que você tem para a próxima fase e a origem de cada parte. Separe CAPEX, terreno e capital de giro. Divida o CAPEX nos componentes e dê nota de 0 a 3 a cada linha. Número herdado de outro desenho (mais unidades, outra área, outro ano) precisa ser refeito.

B

Quero crescer

Liste o que investiu nos últimos doze meses e de qual conta saiu cada valor. No próximo investimento, procure as linhas que ninguém soma: projeto, licenças, suprimentos, pré-abertura, contingência e giro.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os quatro níveis da régua de maturidade, e por que o segundo é o mais perigoso?

2. Qual é a diferença entre CAPEX e OPEX, e onde ficam o terreno e o capital de giro?

3. Como se monta a Conta do Custo Invisível™, e por que ela precisa de um CAPEX com origem?

4. O que significa cada nota da escala de evidência, e o que é preciso para ser Calculista?

5. Por que os R$ 330.000 por cabana não servem para a fase um de Marina?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O F01 leva do Estimador ao Calculista; o pilar F inteiro leva ao Developer.
- Projetos morrem pelo orçamento que fica pronto depois de a obra começar.
- CAPEX se investe uma vez; OPEX se gasta todo mês. Terreno e giro ficam fora do CAPEX e dentro da conta.
- A Conta do Custo Invisível™ usa resultado, não receita, e só decide ao lado de um CAPEX com origem.
- Número confiável vem de fonte com compromisso, com escopo escrito e prazo.
- Cada linha recebe nota de 0 a 3; as maiores precisam de cotação escrita.
- Marina tem R$ 990.000 que não se abrem; Rafael, R$ 205.000 sem metade das linhas.

CURIOSIDADE

O exercício do Capítulo 1 do Volume 05 manda guardar o palpite e compará-lo, no fim do livro, com o CAPEX calculado: «A diferença entre os dois é o tamanho do risco que você estava prestes a correr.»

REFLEXÃO

Qual é a maior linha do seu investimento, e quem assinou o número que está nela?

DICA

Nesta semana, peça uma única cotação escrita, a da sua maior linha, com escopo detalhado e data.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 01

1. O palpite. Sem pesquisar, escreva quanto acha que custa a sua próxima fase. Anote a data e guarde para comparar com o Mapa do Capítulo 8.

2. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Em que componente entra: rouparia em três jogos, hidromassagem, licença da obra, treinamento antes de abrir, energia do primeiro mês de operação? Já feito: rouparia é OS&E. Classifique os outros.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Divida o seu palpite: hard costs, projeto e licenciamento, FF&E, OS&E, pré-abertura e contingência. Onde não souber, escreva "não sei".

4. Dê nota de 0 a 3 a cada linha e marque as duas maiores. Em que nível da régua você está? Qual cotação pediria primeiro?

5. A sua Conta do Custo Invisível™ (na Jornada B, contra o concorrente melhor posicionado), comparada com o seu palpite.

CAPÍTULO 02

A ANATOMIA DO CAPEX

Quatro camadas, *e cada real no seu lugar.*

O número redondo não tem anatomia. O orçamento tem: quatro componentes, a linha de projeto que a fórmula esquece, o terreno e o giro à parte.

NESTE CAPÍTULO

- Os quatro componentes do CAPEX, cada um em uma frase.
- Os seis passos da Metodologia Zion de Análise de Investimento e os cinco erros do orçamento amador.
- O terreno fora do CAPEX e o capital empregado; projeto e licenciamento como linha própria.
- A ponte com a Conta do Investimento Necessário™ e o giro fora do CAPEX.
- O Mapa das Quatro Portas™; a primeira tabela de Marina; o que falta na fase dois de Rafael.

No Capítulo 1, Marina descobriu que os R$ 330.000 por cabana eram um número de Estimador: vinham de cinco cabanas, já traziam contingência dentro e dividiam a rede por cinco. Número fechado não se corrige; número aberto se corrige linha por linha. A definição de CAPEX está no Capítulo 1: o que se investe uma vez para construir e equipar o projeto até o primeiro hóspede. Este capítulo abre esse número.

Qualquer pessoa pode chutar um orçamento. O método

existe para que você nunca precise chutar.

Quatro componentes, quatro perguntas

O Volume 05 divide o CAPEX em quatro componentes. As siglas vêm do inglês, a língua dos orçamentos de hotelaria; vale aprender uma vez.

Hard costs (custos físicos de construção): «Tudo aquilo que fixa o projeto no território.» É o maior componente e, diz o volume, «o mais sensível a erros de estimativa».

FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment: móveis, instalações fixas e equipamentos): «Tudo aquilo que transforma uma construção em uma hospedagem.» É onde o produto desenhado no pilar D vira objeto que o hóspede toca.

OS&E (Operating Supplies & Equipment: suprimentos e equipamentos operacionais): «Tudo aquilo que a operação consome para funcionar.» O volume avisa: «É o componente mais esquecido dos orçamentos amadores.»

Pré-abertura e contingência: o que sai entre a obra pronta e o primeiro hóspede, mais a reserva para o imprevisto. A fonte resume cada metade em uma frase: «O projeto não termina quando a obra termina.» e «A contingência não é pessimismo. É maturidade.»

COMPONENTE	A PERGUNTA	ITENS QUE A FONTE CITA	COMO SE ESTIMA (PASSO DA METODOLOGIA)
1 · Hard costs	O que fica no chão?	Terraplenagem, fundações, estrutura, acabamento, água, energia e saneamento	Área construída × custo por m^2 (passo 2)
2 · FF&E	O que transforma obra em hospedagem?	Camas, mesas, cadeiras, louças e metais, equipamentos de cozinha, móveis das áreas comuns	Número de unidades × custo por unidade (passo 3)
3 · OS&E	O que a operação consome e repõe?	Utensílios de cozinha, rouparia, equipamentos de limpeza	10% a 15% do FF&E (passo 4)
4 · Pré-abertura e contingência	O que vem antes do primeiro hóspede, e o imprevisto?	Treinamento, marketing de lançamento, licenças e permissões, contingência	Pré-abertura: 5% a 10% dos hard costs (passo 5); contingência no passo 6

Tabela 2.1 · Os quatro componentes do CAPEX (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, caps. 01 e 02). Coluna "A pergunta": organização do módulo.

Componente não é fornecedor: a loja da cama (FF&E) vende também o lençol (OS&E). Separar importa porque cada componente tem regra, momento de compra e erro próprios.

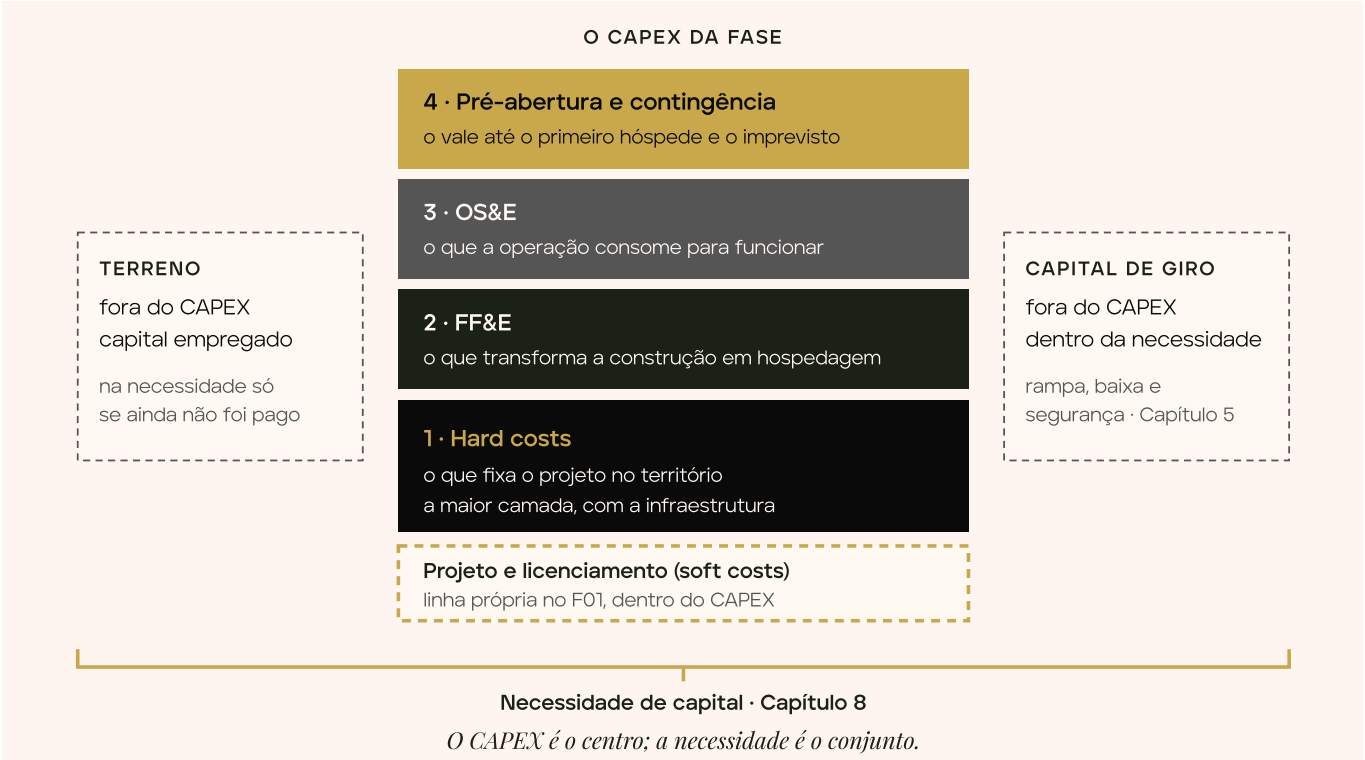


Figura 2.1 · As quatro camadas do CAPEX (Volume 05, edição do projeto, cap. 01), a linha de projeto e licenciamento e, à parte, terreno e giro, lidos juntos pela Régua do Quanto Captar™ (Volume 05, edição de captação, cap. 04). Organização do módulo.

Seis passos entre o terreno e o número

Para montar as peças numa ordem que impeça o esquecimento, o Volume 05 traz a Metodologia Zion de Análise de Investimento, seis passos que valem para pousada, glamping, hotel ou resort. «Não é uma fórmula mágica. É uma disciplina.»

O passo 1 pergunta «O que exatamente vamos construir?», e a resposta decide o custo por m^2, o padrão de FF&E, a equipe e o modelo de operação. Os outros cinco são fórmulas.



Figura 2.2 · Os seis passos da Metodologia Zion de Análise de Investimento (Volume 05, edição do projeto, cap. 02). Faixa de baixo: regra do módulo.

Três cuidados. No passo 2, a área é a construída total, não a das unidades, e a infraestrutura de sítio (acesso, energia, água, esgoto) é hard cost mesmo sem metro quadrado (Capítulo 3). O passo 1 é o mais pulado: «Quem pula este passo calcula um hotel com números de pousada.» E as regras do OS&E e da pré-abertura são atalhos até existir a lista; depois, viram conferência (Capítulo 4).

Para os primeiros valores, o volume oferece faixas por tipologia.

TIPOLOGIA	PORTE TÍPICO	CUSTO POR M² DE CONSTRUÇÃO	FF&E POR UNIDADE
Pousada	10 a 30 quartos	R$ 3.000 a 4.500	R$ 25 a 50 mil
Glamping premium	10 a 50 unidades	R$ 3.500 a 5.000	R$ 40 a 80 mil
Hotel	50 a 200 quartos	R$ 4.500 a 7.000	R$ 30 a 60 mil
Resort	100 a 500 quartos	R$ 5.000 a 8.000	R$ 50 a 100 mil

Tabela 2.2 · Faixas por tipologia (Volume 05, edição do projeto, cap. 02). Faixas ilustrativas da fonte, a validar com cotação da sua região e do ano; não são dado de mercado. A fonte as chama de «pontos de partida para orçamento inicial».

Faixa sem data e sem lugar dá ordem de grandeza, não fecha orçamento: na

escala do Capítulo 1, é evidência 2, no máximo.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Uma pousada de 8 quartos em seis passos

Passo 1 · Tipologia. Pousada de 8 quartos de 28 m^2, com café da manhã. Abaixo do porte típico da tabela: mais um motivo para usar a faixa só como referência.

Passo 2 · Hard costs. Área total: quartos 8 × 28 = 224 m^2, recepção e café 60, rouparia e lavanderia 20, depósito e máquinas 16: 320 m^2 × R$ 3.500 (custo inventado) = R$ 1.120.000. Infraestrutura de sítio à parte: R$ 120.000. Hard costs: **R$ 1.240.000**.

Passo 3 · FF&E. 8 × R$ 30.000 = R$ 240.000, mais R$ 40.000 de móveis e equipamentos do café e da recepção: **R$ 280.000**.

Passo 4 · OS&E. 12% × 280.000 = **R$ 33.600**.

Passo 5 · Pré-abertura. 5% × 1.240.000 = **R$ 62.000**.

Linha própria · Projeto e licenciamento. R$ 90.000 (valor inventado para o exemplo).

Passo 6 · CAPEX. Soma: 1.240.000 + 90.000 + 280.000 + 33.600 + 62.000 = **R$ 1.705.600**. Contingência provisória de 20% sobre os hard costs (primeira obra, piso do degrau; Capítulo 5): R$ 248.000. CAPEX: **R$ 1.953.600**. A contingência fica em 12,7% do CAPEX, dentro dos 10% a 15% do Volume 05.

Conferência: 224 + 60 + 20 + 16 = 320; 320 × 3.500 = 1.120.000; 0,12 × 280.000 = 33.600; 0,05 × 1.240.000 = 62.000; 0,20 × 1.240.000 = 248.000; 1.705.600 + 248.000 = 1.953.600; 248.000 ÷ 1.953.600 = 0,127.

Lida ao pé da letra, a fórmula deixaria de fora os 96 m^2 que não são quarto e a infraestrutura: 96 × 3.500 + 120.000 = R$ 456.000. É o primeiro dos cinco erros:

Os cinco erros do orçamento amador

O Volume 05 aponta «os cinco buracos onde os orçamentos caem», e os seis passos existem «exatamente para tornar esses erros impossíveis».

- «Orçar só as unidades — e esquecer áreas comuns, serviço e infraestrutura». Fecha no passo 2: área total e infraestrutura em linha própria.
- «Usar custo/m^2 de outra região — ou de outro ano». Fecha no passo 2, com cotação local e recente (Capítulo 1).
- «Ignorar o OS&E». Fecha no passo 4, mesmo antes da lista.
- «Tratar contingência como opcional — otimismo não paga aditivo». Fecha no passo 6. Aditivo é o acréscimo cobrado ao contrato de obra.
- «Esquecer a pré-abertura — obra pronta não é negócio funcionando». Fecha no passo 5.

A raiz é uma só: o orçamento parou onde o construtor parou.

O orçamento que o construtor entrega cobre a obra.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02 · PASSO 11

O terreno fica fora do CAPEX, não fora da conta

No exemplo da pousada não há terreno, e não é esquecimento: como no Capítulo 1, o terreno fica fora do CAPEX. Ele pode entrar por compra (sai dinheiro antes de tudo), permuta (o dono recebe parte do empreendimento), integralização em sociedade (vira capital da empresa e o dono entra como sócio) ou arrendamento

(uso por contrato, pago como custo da operação). «Cada formato muda a estrutura do investimento — e a conversa com o investidor.» São estruturas jurídicas e societárias: aqui só nomeadas, com desenho no F06 e redação com advogado e contador.

Fora do CAPEX não quer dizer de graça: mesmo herdado, o terreno é capital empregado, o valor preso no projeto, e conta quando se mede o retorno. Na pergunta "quanto falta?", a Régua do Quanto Captar™ (Volume 05, edição de captação, cap. 04) só o põe se ele «ainda não foi pago»: «Zero se permuta, arrendamento ou já quitado». Regra do F01: fora do CAPEX, na necessidade só se houver desembolso a fazer, sempre declarado como capital empregado. Escritura, registro e tributos da aquisição não têm regra nas fontes: liste à parte e confirme com o contador.

Projeto e licenciamento: a linha que a fórmula não traz

Na fórmula do passo 6, onde estão arquitetura, engenharia e aprovações? Em nenhum componente. O Volume 05 só os nomeia no glossário, como **soft costs**: «Custos não-físicos do projeto: arquitetura, engenharia, licenças, jurídico.» A Conta do Investimento Necessário™, da Etapa 02, dá a eles uma linha: «Projeto e licenciamento: arquitetura, engenharia, taxas, aprovações, consultorias.» O F01 segue a Etapa 02: projeto e licenciamento é linha própria do CAPEX, antes da contingência. Cada indefinição de projeto volta como aditivo.

> NOTA DO EDITOR · ONDE MORA CADA LICENÇA
>
> O Volume 05 põe as licenças na pré-abertura (alvarás, ambientais, bombeiros, vigilância sanitária, cadastros de turismo); a Etapa 02 põe aprovações em projeto e licenciamento. Regra de trabalho do F01: o que aprova projeto e obra vai para projeto e licenciamento; o que autoriza a operar fica na pré-abertura. Quais licenças o seu caso exige, pergunte a arquiteto, engenheiro e advogado.

Das sete linhas aos quatro componentes

> REVISITE · Z02, CAPÍTULO 3

> Sem consultar: quais são as sete linhas da Conta do Investimento Necessário™ de Marina, e qual não saía do bolso? Confira: imóvel, infraestrutura, projeto e licenciamento, obra, mobiliário com enxoval e equipamentos, pré-operação e capital de giro, mais a contingência. O imóvel (R$ 250.000) era capital empregado: entrava no investimento total, não no desembolso.

A Conta pergunta quanto sai antes e depois da abertura; os componentes, que tipo de coisa cada real compra. A Tabela 2.3 liga uma à outra, para nenhum real ficar sem lugar nem aparecer em dois.

LINHA DA CONTA DO INVESTIMENTO NECESSÁRIO™	ONDE ENTRA NO CAPEX	CUIDADO
Imóvel	Fora do CAPEX	Capital empregado; na necessidade só se a pagar
Infraestrutura	Hard costs	Linha própria, não diluída no m^2
Projeto e licenciamento	Soft costs, linha própria	Licenças de operação ficam na pré-abertura
Obra ou adequação	Hard costs	Unidades e também apoio e áreas comuns
Mobiliário, enxoval, equipamentos e decoração	FF&E e OS&E	Móvel no FF&E; rouparia no OS&E
Pré-operação	Pré-abertura	Estoque inicial vai ao OS&E
Capital de giro	Fora do CAPEX	Dentro da necessidade de capital (Capítulo 5)
Contingência	Componente 4, com a pré-abertura	Regra pelo perfil de risco (Capítulo 5)

Tabela 2.3 · Conta do Investimento Necessário™ (Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 11) × quatro componentes (Volume 05, edição do projeto). Coluna "Cuidado": regras de trabalho do F01.

A linha traiçoeira é o enxoval: a Etapa 02 o junta ao mobiliário, o Volume 05 põe a rouparia no OS&E. Deixá-lo no mobiliário e ainda aplicar a regra do OS&E conta duas vezes. A regra de trabalho do F01 está na Tabela 2.3: rouparia no OS&E, móvel no FF&E (detalhe no Capítulo 4).

A outra é o capital de giro: fora do CAPEX, porque não compra nada que fique no projeto, e dentro da necessidade, porque precisa existir no dia da abertura (Capítulo 1). Em hospedagem nova, diz a Etapa 02, ele «costuma representar de 15% a 30% do investimento total — e quase nunca aparece no orçamento inicial». O Capítulo 5 calcula o de Marina. O Manual Oficial do Método Zion 360° também separa capital de implantação e capital de giro (Capítulo 7).

Cada porta, um CAPEX diferente

Até aqui, o CAPEX pressupôs construir, uma porta entre quatro. «A conta é a mesma; o que muda é a linha do investimento», lembra a Etapa 02. O que muda, mostra o Mapa das Quatro Portas™, de A Ordem das Coisas.

FRAMEWORK DO MÉTODO · A ORDEM DAS COISAS, CAP. 11

Mapa das Quatro Portas™

- **Construir:** terreno, projeto, licença, obra, mobília. Capital: o maior dos quatro.
- **Comprar pronto e adaptar:** troca risco de obra por preço de aquisição. Capital: alto. «Uma adaptação mal avaliada custa mais do que uma obra nova».
- **Alugar e hospedar:** «Exige capital de mobiliário, enxoval e adequação, não de imóvel». Capital: baixo.
- **Administrar o de outro:** «Exige quase nenhum capital próprio». Capital: mínimo.

	Imóvel fora do CAPEX	Hard costs	Soft costs	FF&E e OS&E dentro do CAPEX	Pré-abertura	Giro fora do CAPEX
Construir	terreno	infraestrutura e obra	projeto e licenças	mobiliário e enxoval	sim	sim
Comprar pronto e adaptar	aquisição	adequação	projeto da adequação	mobiliário e enxoval	sim	sim
Alugar e hospedar	luvas, se houver	adequação	se a obra pedir	mobiliário e enxoval	sim	sim
Administrar o de outro		estrutura de gestão: quase nenhum capital próprio				giro operacional

A exigência de capital cai de cima para baixo.

Figura 2.3 · O que entra no CAPEX em cada porta (A Ordem das Coisas, caps. 04 e 11; luvas: Etapa 02). Distribuição por componente: organização do módulo. Sem valores, como na fonte.

A fonte deixa a tabela sem valores de propósito, «porque eles variam por destino e por porte, e um número aqui seria promessa, não ensino». A direção não varia: «do primeiro ao último caminho, a exigência de capital cai em ordens de magnitude, não em percentuais». Em Construir, todas as camadas estão cheias. Em Comprar pronto e adaptar, o imóvel fica fora do CAPEX como o terreno, e os hard costs viram adequação (a Etapa 02 pede contingência de 15% a 20%). Em Alugar e hospedar, quase tudo é FF&E e OS&E; o aluguel é custo do mês. Em Administrar o de outro, sobram gestão e giro. Por isso, quando o investimento passa do capital real, uma das saídas da Etapa 02 é «mudar de porta de entrada».

A primeira tabela de Marina

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Aberta por componente, sem contingência e sem giro, a fase um de Marina (três cabanas, rede para cinco, apoio de 30 m^2) fica abaixo ou acima dos R$ 990.000 da estimativa? Escreva o palpite.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

A fase um de Marina por componente, primeira versão

Marina põe cada número dos módulos anteriores na camada certa. O terreno herdado fica fora: é capital empregado (R$ 250.000 pela parte usada, Z02) e não entra na necessidade, porque já é dela. Contingência e giro ficam para o Capítulo 5.

COMPONENTE	LINHA	CONTA	VALOR	DE ONDE VEM
Hard costs	Infraestrutura para 5 (acesso, energia, água, esgoto)	premissa	R$ 250.000	Premissa conservadora do D05
	Obra das 3 cabanas	3 × (38 × 3.000 + 16 × 1.000)	R$ 390.000	Custo por m^2 do D03
	Apoio de 30 m^2	30 × 3.000	R$ 90.000	Novo, mesmo custo por m^2
Soft costs	Projeto e licenciamento do conjunto	projeto completo	R$ 70.000	Z02
FF&E	Mobiliário, hidromassagem e lareira	3 × (35.000 + 30.000)	R$ 195.000	Z02 e D03
OS&E	Rouparia, utensílios, limpeza	12% × 195.000	R$ 23.400	Regra da fonte
Pré-abertura	Equipe, lançamento, licenças de operação	5% × 730.000	R$ 36.500	Regra da fonte
Subtotal antes da contingência			**R$ 1.054.900**	Contingência e giro: Capítulo 5

Tabela 2.4 · Primeira versão do CAPEX da fase um de Marina (exemplo ilustrativo). Hard costs: R$ 730.000.

Conferência: 38 × 3.000 + 16 × 1.000 = 130.000, vezes 3 = 390.000; 250.000 + 390.000 + 90.000 = 730.000; 0,12 × 195.000 = 23.400; 0,05 × 730.000 = 36.500;

730.000 + 70.000 + 195.000 + 23.400 + 36.500 = 1.054.900; 1.054.900 − 990.000 = 64.900.

Resposta da previsão: acima. Mesmo sem contingência, a soma passa a estimativa em R$ 64.900. A estimativa tinha contingência dentro e deixava de fora o apoio, parte da rede e o OS&E: uma coisa escondia a outra. Aberta, a conta mostra onde está o risco: a infraestrutura é um terço dos hard costs e não tem orçamento de ninguém. O Capítulo 3 compara os R$ 250.000 do D05 com os R$ 180.000 do Z02.

Rafael: a fase dois posta nos componentes

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

O que os R$ 205.000 não dizem

No D05, a fase dois de Rafael somou R$ 205.000: efluente 45.000, obra do chalé 5 125.000, mobiliário 35.000. Nos componentes:

- **Hard costs:** 45.000 + 125.000 = R$ 170.000. **FF&E:** R$ 35.000. Preenchidos.
- **Projeto e licenciamento:** vazio, embora chalé e efluente peçam aprovação.
- **OS&E:** vazio; pela regra, 12% × 35.000 = R$ 4.200.
- **Pré-abertura:** vazia; pela regra, 5% × 170.000 = R$ 8.500.
- **Contingência:** vazia (Capítulo 5). **Capital de giro:** fora do CAPEX, dentro da necessidade.

Só as linhas que a regra já calcula somam 4.200 + 8.500 = R$ 12.700; as outras ainda não têm número. A lacuna de R$ 149.000 do F00 é um piso. Quem já opera tende a achar que o chalé novo não tem OS&E nem pré-abertura: tem, menores. O Capítulo 7 fecha a conta.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

B

Quero crescer

Abra o seu número por componente, com infraestrutura e apoio em linhas próprias e a origem de cada valor; contingência e giro em branco. Anote a porta, a forma de entrada do terreno e se ele ainda será pago.

Ponha cada valor orçado da próxima obra num componente e marque as camadas vazias, quase sempre projeto, OS&E e pré-abertura. Calcule as que a regra permite. O giro da operação atual não paga obra (Capítulo 7).

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os quatro componentes do CAPEX, e o que define cada um?

2. Quais são as fórmulas dos passos 4 e 5 da Metodologia Zion de Análise de Investimento?

3. Por que o terreno fica fora do CAPEX, e em que caso ele entra na necessidade de capital?

4. Quais linhas da Conta do Investimento Necessário™ não cabem nos quatro componentes, e para onde vão?

5. Cite três dos cinco erros do orçamento amador e o passo que fecha cada um.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Quatro componentes: hard costs, FF&E, OS&E, pré-abertura e contingência, cada um com regra e erro próprios.
- Os seis passos usam a área construída total, e as faixas por tipologia só valem validadas com cotação local e do ano.
- O terreno fica fora do CAPEX, é sempre capital empregado e entra na necessidade só se ainda houver pagamento.
- Projeto e licenciamento é linha própria; o giro fica fora do CAPEX e dentro da necessidade.

> — A porta decide quais camadas existem: do Construir ao Administrar, o capital cai em ordens de magnitude.

CURIOSIDADE

No Volume 05, o glamping pode carregar FF&E por unidade maior que o de um hotel, «porque em um produto de 15 unidades, cada unidade é o produto inteiro.»

REFLEXÃO

Quantas linhas do seu número você preencheria hoje sem inventar?

DICA

Pinte cada linha do orçamento do construtor com a cor de um componente. O que ficar sem cor ninguém orçou.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 02

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Quatro chalés de 40 m^2 e 40 m^2 de apoio a R$ 3.200 por m^2, FF&E de R$ 28.000 por chalé. Já feito: edificação 200 m^2 × 3.200 = R$ 640.000. Calcule FF&E, OS&E (12%) e pré-abertura (5%), some e diga o que falta para o CAPEX.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O seu número aberto: hard costs (infraestrutura, unidades, apoio), projeto e licenciamento, FF&E, OS&E e pré-abertura, cada linha com a origem do valor.

3. O terreno ou imóvel: forma de entrada, valor como capital empregado e se entra na necessidade de capital, com o motivo.

4. A ponte: o componente de cada uma das sete linhas da Conta do Investimento Necessário™ no seu caso, dizendo onde ficam o enxoval e cada licença.

5. Jornada A: a porta escolhida e as camadas que ela cria. Jornada B: a próxima obra nos componentes, com as camadas vazias.

CAPÍTULO 03

HARD COSTS E A INFRAESTRUTURA INVISÍVEL

Hard costs: *o que faz a cabana funcionar.*

A maior linha do CAPEX parece a mais simples: área vezes preço. Os dois fatores escondem quase todos os erros, e a parte que mais varia nem aparece nas fotos.

NESTE CAPÍTULO

- A fórmula dos hard costs e a área construída total.
- O custo por metro quadrado e as três forças que o movem.
- Os sistemas construtivos comparados.
- A infraestrutura invisível e as obras de sítio que mudam com o terreno.
- As perguntas do terreno e as quatro disciplinas que seguram o orçamento.
- Os R$ 730.000 de Marina, o peso da rede no CAPEX e o efluente de Rafael.

Quando alguém diz "a obra vai custar tanto", quase sempre fala só das unidades: o chalé, a cabana, os quartos. A Ordem das Coisas nomeia o tropeço entre as inversões que custam caro: «Construiu antes de saber quanto o lugar cobra.» Este capítulo abre o maior componente do CAPEX e mostra onde o lugar apresenta a conta.

O metro quadrado não mente. Mas só responde o que você perguntar antes da obra.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 04

A fórmula é simples; os dois fatores, não

Hard costs são os custos da construção física. O glossário do Volume 05 lista: «terraplanagem, fundações, estrutura, acabamento, instalações.» Ficam de fora os **soft costs**, custos não físicos como arquitetura, engenharia e licenças, que o F01 trata na linha de projeto e licenciamento (Capítulo 2), e também o FF&E e o OS&E, do Capítulo 4.

REGRA DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, CAPS. 02 E 04

Hard costs = área construída × custo por m²

É o passo 2 da Metodologia Zion de Análise de Investimento. A fonte comenta: «A fórmula é simples. Os dois fatores, não.» E sobre o segundo: «O custo por m^2 é a variável mais sensível do orçamento inteiro.»

Área construída é a área total

A fórmula não pergunta quantas unidades você terá. Pergunta quanto você vai construir. O Volume 05 avisa que a área construída «parece óbvia», até você lembrar que ela inclui recepção e áreas comuns; cozinha e serviço; deck, trilhas e acessos internos; casa de máquinas, reservatórios e tratamento de efluentes. Esquecer essa lista é o primeiro dos cinco erros do orçamento amador (Capítulo 2).

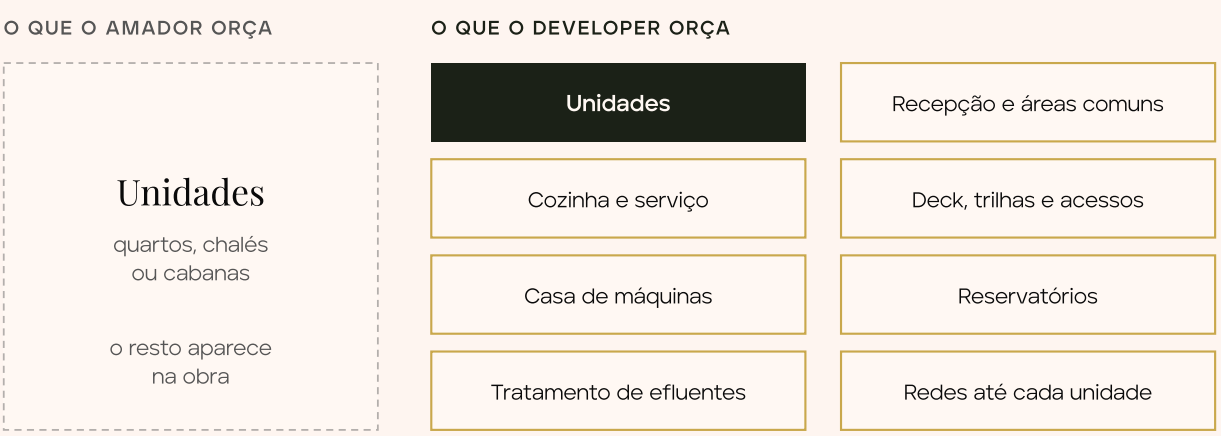


Figura 3.1 · O que a área total inclui além das unidades (lista e citação do Volume 05 · Investimento, cap. 04).

Nem toda área tem o mesmo preço: deck e trilha custam menos por metro; casa de máquinas e efluente se orçam como sistema. A conta separa a área em grupos. O que não pode é um grupo sumir.

GRUPO DE ÁREA	ÁREA (M^2)	COMO SE ORÇA
Quartos (8 × 28 m^2)	224	Por m^2, padrão das unidades
Recepção, estar e café	60	Por m^2, padrão de área comum, mais instalações de cozinha
Rouparia e lavanderia	20	Por m^2, padrão de serviço
Depósito e casa de máquinas	16	Por m^2 mais equipamentos
Área coberta total	**320**	Quartos = 70,0%
Deck, varandas e trilhas	à parte	Custo próprio, por m^2 ou por metro

Tabela 3.1 · Área total da pousada de oito quartos do Capítulo 2 (exemplo ilustrativo). Grupos a partir do Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 04.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

A pousada que tinha 320 m², e não 224

Um casal pede preço para oito quartos de 28 m²: 224 m². Listando tudo o que vai erguer, a área coberta chega a 320 m². Quem multiplicasse só os quartos esqueceria 96 m², 30,0% da obra, qualquer que fosse o preço do metro.

Conferência: 8 × 28 = 224; 224 + 60 + 20 + 16 = 320; 224 ÷ 320 = 0,70; 96 ÷ 320 = 0,30.

O custo por metro quadrado e as três forças

O segundo fator, diz a fonte, «muda com três forças». São elas que decidem se um número de referência vira o seu número.

O padrão construtivo. «Cada sistema tem seu custo, seu prazo e sua cara.» E a ordem está escrita: «O produto desenhado no Volume 3 define o sistema — e o sistema define o preço.»

O território. «Topografia acidentada encarece fundação.» «Acesso difícil encarece cada caminhão de material.» «Distância da rede elétrica encarece a infraestrutura.» A leitura do território do pilar D volta convertida em reais: «O Volume 1 ensinou a ler o território como destino. Este capítulo o lê como canteiro.»

A região. «O mesmo projeto muda de preço conforme o endereço». A fonte compara três destinos: num, mão de obra acessível, mas logística de serra e energia e saneamento pesados; noutro, mercado construtivo aquecido e mão de obra disputada; no terceiro, restrições de patrimônio e ambientais que alongam o licenciamento.



«Três territórios extraordinários. Três faturas completamente diferentes.»

Figura 3.2 · As três forças do custo por metro quadrado (Volume 05 · Investimento, cap. 04; destinos da fonte sem nome).

Daí o segundo erro do orçamento amador (Capítulo 2): o custo por m^2 de outra região ou de outro ano. A fonte manda: «sempre valide com cotações reais da sua região».

Sistemas construtivos: o certo raramente é o mais barato

SISTEMA	CUSTO RELATIVO	PRAZO	MELHOR USO
Alvenaria convencional	Base	Longo	Áreas comuns, serviço
Madeira engenheirada	de +10% a +25%	Médio	Chalés, integração à mata
Modular industrializado	de −10% a +10%	Curto	Faseamento, expansão rápida
Domes e estruturas leves	Variável	Curto	Experiência-assinatura

Tabela 3.2 · Sistemas construtivos comparados, sobre a alvenaria. Volume 05 · Investimento, cap. 04: «Faixas ilustrativas para o padrão premium de natureza». A validar com cotação da sua região e do ano.

Leia pela última coluna. A fonte fecha o quadro: «O sistema certo raramente é o mais barato por m^2 — é o que entrega a experiência do Volume 3 no prazo da sua estratégia.» E dá para misturar: alvenaria no apoio, madeira nas unidades. Marina escolheu no D03 a cabana de madeira,

com a modular como alternativa até os três orçamentos.

A infraestrutura invisível

«Existe uma categoria de Hard Costs que não aparece nas fotos.» É tudo o que leva energia, água, esgoto e acesso de fora do terreno até cada unidade. «Em territórios remotos — exatamente onde os melhores glampings nascem — a infraestrutura invisível pode consumir uma fatia relevante dos Hard Costs.» A fonte lista cinco sistemas:

- **Rede elétrica e transformadores**, da rede pública até cada unidade.
- **Captação, tratamento e reserva de água**: ligação, ou poço, bomba e reservatório.
- **Saneamento e efluentes**: o esgoto tratado, dentro da regra.
- **Drenagem**: a chuva que desce o terreno e ataca estrada, fundação e trilha.
- **Estradas internas**: caminhão da obra, carro do hóspede, lavanderia.

A Etapa 02 da Jornada do COMO dá o peso dessa linha na Conta do Investimento Necessário™: «Infraestrutura: acesso, energia, água, esgoto, terraplenagem. É a linha de maior variação entre terrenos e a mais subestimada em área rural.»

Poste de energia a dois quilômetros, estrada que vira barro na chuva, poço que não dá vazão. É aí que o orçamento estoura.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO, PARTE I

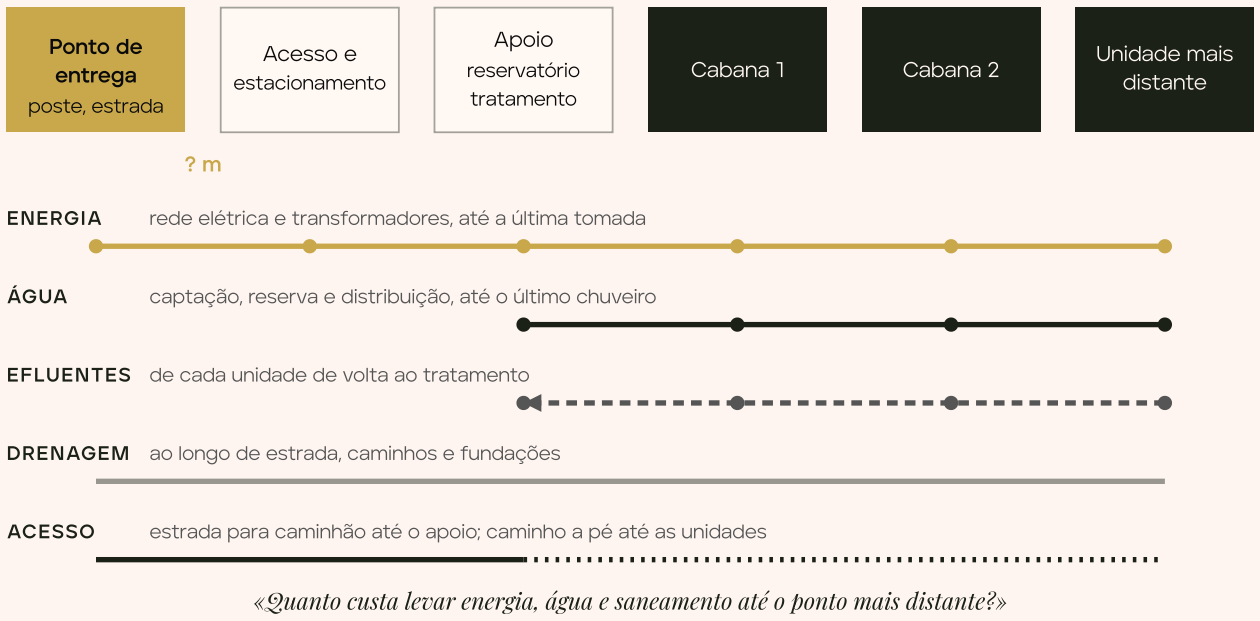


Figura 3.3 · Mapa da infraestrutura invisível, do ponto de entrega até a unidade mais distante (esquema do módulo, sem escala; sistemas e pergunta do Volume 05 · Investimento, cap. 04).

A infraestrutura não se orça por metro quadrado, e sim por distância e capacidade: quantos metros separam o ponto de entrega da unidade mais distante, e para quantas unidades cada sistema é dimensionado.

Obras de sítio: a parte que muda com o terreno

Vale separar duas famílias. A **obra da unidade** se repete: a mesma cabana custa parecido aqui ou no terreno vizinho. A **obra de sítio** é única: extensão de rede, poço, terraplenagem, fundação especial, estrada, drenagem e efluente dependem do chão, da distância e da chuva daquele lugar. Para a primeira, uma boa referência chega perto do real. Para a segunda, referência de outro terreno quase não vale. O Panorama resume: «O desconto na compra vira custo na obra.»

As perguntas do terreno, antes de qualquer cotação

«O custo por m² responde ao território. Interrogue-o antes de orçar». A tabela traz as seis perguntas da fonte, quem responde por escrito e o que Rafael, que já opera, sabe de antemão.

PERGUNTA DA FONTE	O QUE MOVE	QUEM RESPONDE	RAFAEL JÁ SABE?
«Qual a distância real do ponto de energia trifásica?»	Rede, transformador	Concessionária	Em parte: atende quatro chalés; mais um, só a concessionária confirma
«Existe água em vazão suficiente — ou perfuração e outorga entram na conta?»	Poço, reservatório, licença de uso	Projetista habilitado e órgão competente	Quase: três anos de consumo, inclusive na alta
«O solo pede fundação especial?»	Fundação	Engenheiro, com sondagem	Só uma pista: os quatro chalés não são laudo do canto livre
«O acesso aguenta caminhão de obra nos meses de chuva?»	Frete, atraso	Visita em dia de chuva	Sim: três invernos de estrada
«Qual a declividade média das áreas construíveis?»	Terraplenagem, drenagem	Levantamento topográfico	Conhece o terreno; a medida vem do levantamento
«O que a legislação local permite — e em quanto tempo licencia?»	Prazo e projeto	Arquiteto, órgãos, advogado se preciso	Conhece o caminho que fez; a regra pode ter mudado

Tabela 3.3 · As perguntas do terreno (Volume 05 · Investimento, cap. 04). Demais colunas: leitura do módulo; a de Rafael é exemplo ilustrativo.

A primeira pergunta é a mais barata do orçamento. O Panorama manda: «Pergunte a distância até o poste mais próximo e a tensão disponível.» E completa: «A concessionária local informa, e é gratuito.» O motivo da pressa: «Estender rede elétrica por conta própria se cobra por quilômetro, e o número surpreende quem não perguntou à concessionária antes de comprar o terreno.»

REVISITE · D05, CAPÍTULO 7

Sem consultar: por que o D05 fez a infraestrutura de Marina para cinco cabanas já na fase um, que abre com três? Confira: no exemplo do Z02 (outro terreno), cinco de uma vez custavam R$ 250.000, contra R$ 330.000 em duas etapas. A frase do Volume 05: «Refazer infraestrutura é a forma mais cara de economizar.»

Marina: R$ 730.000 de hard costs

A fase um tem três cabanas, o apoio de 30 m^2 do D05 e a infraestrutura para cinco. Cada linha leva a sua nota de evidência (Capítulo 1).

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Os hard costs da fase um de Marina

Passo 1 · Área total. Cabanas: 3 × 38 = 114 m^2. Decks: 3 × 16 = 48 m^2, com custo próprio. Apoio: 30 m^2, que nenhum módulo anterior tinha precificado.

Passo 2 · Cabanas. 38 × R$ 3.000 + 16 × R$ 1.000 = R$ 130.000 cada, o teto do D03; três: **R$ 390.000**. Evidência 2.

Passo 3 · Apoio. 30 × R$ 3.000 = **R$ 90.000**. Evidência 2.

Passo 4 · Infraestrutura para cinco. Acesso, energia, água e esgoto: **R$ 250.000**, premissa conservadora do D05. Evidência 1: veio de outro terreno.

Passo 5 · Total. 250.000 + 390.000 + 90.000 = **R$ 730.000**. A infraestrutura é 34,2% dos hard costs e a única linha grande ainda em palpite.

Conferência: 114.000 + 16.000 = 130.000; 3 × 130.000 = 390.000; 250.000 ÷ 730.000 = 0,342.

A rede: R$ 250.000 ou R$ 180.000?

Há dois números para a mesma linha. O Z02 estimou R$ 180.000 para o terreno de Marina; o D05 adotou R$ 250.000 como premissa conservadora. Nenhum é cotação.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

> Se a rede cair R$ 70.000, quanto cai o CAPEX da fase um? Escreva o palpite antes de olhar a tabela.

LINHA DO CAPEX	REDE DE 250.000	REDE DE 180.000	DIFERENÇA
Infraestrutura para cinco	250.000	180.000	70.000
Cabanas e apoio	480.000	480.000	0
Hard costs	**730.000**	**660.000**	**70.000**
Projeto e licenciamento, FF&E e OS&E	288.400	288.400	0
Pré-abertura, 5% dos hard costs	36.500	33.000	3.500
Contingência, 25% dos hard costs	182.500	165.000	17.500
CAPEX da fase um	**1.237.400**	**1.146.400**	**91.000**

Tabela 3.4 · O efeito da rede no CAPEX de Marina (exemplo ilustrativo, em reais). Projeto 70.000, FF&E 195.000 e OS&E 23.400 (Capítulos 2 e 4); regras de pré-abertura e contingência adotadas no F01 (Capítulos 4 e 5).

A rede cai R$ 70.000 e o CAPEX cai R$ 91.000, porque duas linhas se apoiam nos hard costs: a pré-abertura (5%) cai R$ 3.500 e a contingência de primeira obra (25%) cai R$ 17.500. Nesta conta, cada real de hard cost pesa R$ 1,30 no CAPEX. Quem erra a infraestrutura erra junto o que se apoia nela.

Conferência: 70.000 + 195.000 + 23.400 = 288.400; 660.000 + 288.400 + 33.000 + 165.000 = 1.146.400; 70.000 + 3.500 + 17.500 = 91.000.

O F01 fica com os R$ 250.000, não por serem certos, mas por serem prudentes enquanto ninguém mediu nada. A lição, porém, é outra.

O amador orça o chalé. O developer orça o que faz o chalé funcionar.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 04

A linha de maior variação recebe orçamento escrito primeiro. Antes de cotar mobiliário, Marina pede à concessionária o ponto de entrega e a tensão e encomenda a projetista habilitado o desenho de água e efluente para cinco unidades. Com esses papéis, a linha sobe do nível 1 para o 3, e o CAPEX deixa de oscilar R$ 91.000 conforme quem faz a conta.

As quatro disciplinas que seguram o orçamento

O número precisa sobreviver à obra. «Quatro disciplinas separam orçamentos que seguram da planilha que estoura»:

DISCIPLINA DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, CAP. 04

As quatro disciplinas de proteção do orçamento

- **Projeto executivo.** «Projeto executivo antes da obra. Cada indefinição de projeto vira aditivo de obra.» Aditivo é o acréscimo de preço no meio do contrato.
- **Cotação real.** «Cotação real, não referência genérica.» E recente: noventa dias, no máximo (Capítulo 1).
- **Contrato claro.** «Contrato claro com quem constrói. Escopo, prazo, reajuste.»
- **Cronograma físico-financeiro.** «A obra certa, na ordem certa, com o desembolso certo.»

O Panorama, no Pilar 06, leva as duas últimas ao campo: «Pagamento vinculado a medição física. É o que impede a obra de consumir setenta por cento do orçamento com quarenta por cento pronto.» E A Ordem das Coisas lembra que, na porta Construir, o risco é o «desvio de orçamento de obra, que é a regra e não a exceção». Contrato, medição e licenças são do pilar E · Implantar, com engenheiro, arquiteto e, se houver dúvida jurídica, advogado. O F01 só exige que as quatro disciplinas existam antes de o número ir para o Mapa do CAPEX. O desembolso no tempo volta no Capítulo 6.

Rafael: o efluente vem antes do chalé

Na Jornada B, a infraestrutura invisível tem endereço. O D05 mostrou que o efluente de Rafael segura quatro unidades: o chalé 5 só existe se essa obra vier antes.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Os hard costs da fase dois de Rafael

Efluente para cinco: R$ 45.000, evidência 1 (estimativa do D05, a confirmar com orçamento). **Obra do chalé 5:** R$ 125.000, evidência 2: vem do Z02 e da experiência dos quatro chalés, mas preço antigo não é cotação. **Hard costs: 45.000 + 125.000 = R$ 170.000.** O efluente é 26,5% deles e a linha mais incerta. A ordem é a de Marina: primeiro o orçamento escrito do efluente, com projetista habilitado; depois as cotações do chalé. A contingência fica para o Capítulo 5.

Conferência: 45.000 ÷ 170.000 = 0,265.

Rafael responde muitas perguntas do terreno com dados da operação, como mostrou a Tabela 3.3. Mas a operação cria uma pergunta que Marina não tem: a obra vai dividir estrada, barulho e água com hóspedes pagantes. O Capítulo 7 volta a isso.

Os hard costs são o maior componente, não o CAPEX inteiro: o orçamento do construtor para aqui (Capítulo 1). O Capítulo 4 abre o resto.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Liste tudo o que vai construir além das unidades, com área e forma de orçar. Desenhe o caminho do ponto de entrega até a unidade mais distante. Faça as seis perguntas do terreno e ligue para a concessionária. Dê a cada linha um grau de evidência e peça primeiro o orçamento escrito da que mais varia.

B

Quero crescer

Descubra qual sistema limita a próxima unidade: energia, água, efluente ou acesso. Separe o que a operação já responde do que só laudo ou concessionária confirmam. Troque preços de obra antigos por cotação nova. Escreva como a obra vai conviver com os hóspedes.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Qual é a fórmula dos hard costs, e que áreas entram além das unidades?

2. Quais são as três forças do custo por metro quadrado?

3. Quais são os cinco sistemas da infraestrutura invisível, e como ela se orça?

4. Por que R$ 70.000 a menos na rede de Marina viram R$ 91.000 a menos no CAPEX?

5. Quais são as quatro disciplinas que seguram o orçamento?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Hard costs são área construída vezes custo por metro quadrado, com a área total, não só a das unidades.
- O custo por metro quadrado responde ao padrão construtivo, ao território e à região; referência de outro lugar ou de outro ano é palpite.

- O sistema certo entrega a experiência no prazo da estratégia, não o menor preço por metro.
- A infraestrutura invisível se orça por distância e capacidade e é a linha de maior variação entre terrenos.
- Obra da unidade se repete; obra de sítio é única do terreno.
- A linha que mais varia recebe orçamento escrito primeiro: em Marina, cada real de hard cost pesa R$ 1,30 no CAPEX.
- Projeto executivo, cotação real, contrato claro e cronograma físico-financeiro protegem o número; a execução é do pilar E.

CURIOSIDADE

A pergunta mais barata do orçamento responde à linha mais variável. Rede elétrica se cobra por quilômetro, mas, diz o Panorama, a pergunta à concessionária «é gratuita e leva uma ligação».

REFLEXÃO

Qual linha dos seus hard costs pode errar mais, e que documento a transformaria em cotação?

DICA

Nesta semana, ligue para a concessionária e anote o ponto de entrega e a tensão disponível. Depois, visite o acesso num dia de chuva.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 03

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Seis chalés de 40 m^2; o construtor orçou 240 m^2. Já feito: apoio e recepção somam 60 m^2, a casa de máquinas 12 m^2. Qual é a área fechada total, quanto dela são chalés, e que linhas ainda faltam?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A área total do seu projeto, em grupos, com a forma de orçar cada um.

3. As seis perguntas do terreno respondidas, com quem confirmou e se por escrito. Jornada B: marque o que a operação já respondeu.

4. O seu mapa da infraestrutura invisível: ponto de entrega, distâncias até a unidade mais distante e capacidade de cada sistema.

5. Os hard costs por linha, com evidência de 0 a 3. Qual linha mais varia, quanto pesa no CAPEX pelas regras do F01, e que orçamento você pede primeiro?

CAPÍTULO 04

O QUE EQUIPA, O QUE OPERA, O QUE ABRE

FF&E, OS&E e pré-abertura: *o que transforma obra em negócio.*

A obra entrega paredes. O hóspede dorme na cama, usa a toalha e chega por um anúncio feito antes da inauguração. Três linhas pequenas do orçamento, três lugares onde o caixa costuma acabar.

NESTE CAPÍTULO

- FF&E: o que compõe, por que trabalha em dobro e onde não se corta.
- Disciplina de compra, unidade-modelo, prazo de fornecimento e reposição.
- OS&E: o que a operação usa, a regra dos três jogos e as cinco listas.
- Pré-abertura: o vale entre a obra entregue e o primeiro hóspede pagante.
- As duas regras da pré-abertura e por que divergem.

O Volume 05 · Investimento abre o capítulo do mobiliário assim: «O hóspede nunca verá a sua fundação. Mas vai dormir na sua cama, fotografar a sua banheira e postar a sua luminária.» No Capítulo 3 você abriu os hard costs, o custo de construir. Agora vem o que fica dentro da construção, o que a operação usa e o dinheiro que sai entre o fim da obra e a primeira diária.

FF&E: a linha que trabalha em dobro

FF&E é a sigla de *Furniture, Fixtures & Equipment*: mobiliário, instalações e equipamentos. Para a fonte, é «tudo aquilo que transforma uma construção entregue em um lugar desejado»: camas, colchões e enxoval de dormir, mesas, poltronas e armários, louças e metais dos banheiros, banheiras, climatização, iluminação decorativa, equipamentos de cozinha, móveis e decoração das áreas comuns.

É uma linha que «trabalha em dobro. Ela é custo na planilha. E é receita na experiência.» A Metodologia Zion de Análise de Investimento a estima pela unidade: FF&E = número de unidades × custo por unidade. Em hospedagem pequena, o FF&E por unidade pode superar o de um hotel (Capítulo 2); em três cabanas, ainda mais.

GRUPO	FAIXA POR UNIDADE	PONTO MÉDIO	NOTA DA FONTE
Cama, colchão e enxoval	R$ 8 a 15 mil	R$ 11.500	O sono é o produto básico
Banheira e experiência	R$ 6 a 12 mil	R$ 9.000	O item mais fotografado
Climatização silenciosa	R$ 4 a 8 mil	R$ 6.000	Silêncio é luxo na natureza
Mobiliário sob medida	R$ 10 a 18 mil	R$ 14.000	Uso hoteleiro, não residencial
Iluminação e atmosfera	R$ 3 a 6 mil	R$ 4.500	A diferença entre quarto e cena
Decoração e identidade	R$ 5 a 10 mil	R$ 7.500	A assinatura da marca
Soma	**R$ 36 a 69 mil**	**R$ 52.500**	

Tabela 4.1 · O FF&E de uma unidade premium por grupo (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 05). Faixas ilustrativas da fonte, a validar com cotação da sua região e do ano. Pontos médios e soma: conta do módulo.

Os pontos médios somam R$ 52.500, não um número redondo, e a faixa vai de R$ 36 mil a R$ 69 mil. A tabela serve para lembrar o que precisa estar na lista. O preço vem da sua cotação.

O erro de economizar no lugar errado

No fim da obra, «O caixa apertou. Onde cortar?» O FF&E é a última grande compra e vira a vítima. O projeto gastou para trazer o hóspede até a porta e economiza exatamente no que ele toca e fotografa.

Corte metros quadrados no projeto. Nunca corte a experiência dentro deles.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 05

Se precisa cortar, corte antes, no desenho.

A disciplina de compra

MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 05

A disciplina de compra do FF&E

- **Conceito:** «o moodboard do Volume 3 define a atmosfera»; aqui, a frase e o briefing do D05.
- **Especificação:** «cada item descrito tecnicamente», sem «uma cama boa».
- **Unidade-modelo:** uma unidade completa antes de comprar as outras.
- **Cotação em lote:** «o volume negocia; a pressa paga varejo».
- **Cronograma reverso:** «da inauguração para trás, item a item».

A unidade-modelo é o passo que mais protege o dinheiro: «nela você erra barato, fotografa para a pré-venda e transforma o FF&E de aposta em decisão testada.» Ela também muda a evidência da linha no seu Mapa: FF&E pela Tabela 4.1 é evidência 2; com lista da unidade-modelo e cotação escrita do lote,

evidência 3. E cotação envelhece: «Cotação de mais de noventa dias precisa ser refeita.» (Volume 05, edição de captação, cap. 04).

Prazo é dinheiro

Mobiliário sob medida leva meses. Importado leva meses e depende do câmbio. Enxoval hoteleiro em volume leva semanas. Por isso, diz a edição do projeto, «A compra de FF&E começa muito antes da obra terminar.» Quem deixa para o fim «escolhe entre atrasar a inauguração ou inaugurar com o que tinha na loja.» Guarde para o Capítulo 6: pedido de prazo longo costuma pedir sinal, e parte do FF&E sai antes do marco em que aparece no cronograma.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

O FF&E de Marina contra a tabela

Cada cabana leva R$ 35.000 de mobiliário e R$ 30.000 de hidromassagem e lareira, os itens que o D03 acrescentou. Três cabanas: 3 × (35.000 + 30.000) = **R$ 195.000**, 15,8% do CAPEX de R$ 1.237.400 (fechado no Capítulo 5), dentro da faixa de sanidade de 15% a 20%.

Os R$ 65.000 por cabana cabem na faixa da Tabela 4.1, mas a distribuição é outra: banheira e climatização somam, na fonte, de R$ 10 a 20 mil, e Marina põe R$ 30.000. É a promessa, e a linha que mais pede cotação escrita.

E o FF&E não termina na inauguração. Colchão, enxoval e estofado têm vida útil, e a operação profissional «cria uma reserva de reposição de ativos desde o primeiro ano». O Capítulo 7 faz essa conta.

OS&E: o que a operação usa

OS&E é a sigla de *Operating Supplies & Equipment*, suprimentos e equipamentos de operação. A fonte separa as duas linhas numa frase: «Se o FF&E é o que o hóspede vê, o OS&E é o que a operação usa.» Entram utensílios de cozinha, rouparia em vários jogos, equipamentos de limpeza e governança (o setor de arrumação e rouparia), carrinhos e cestos, segurança e monitoramento, amenities e itens de recepção.

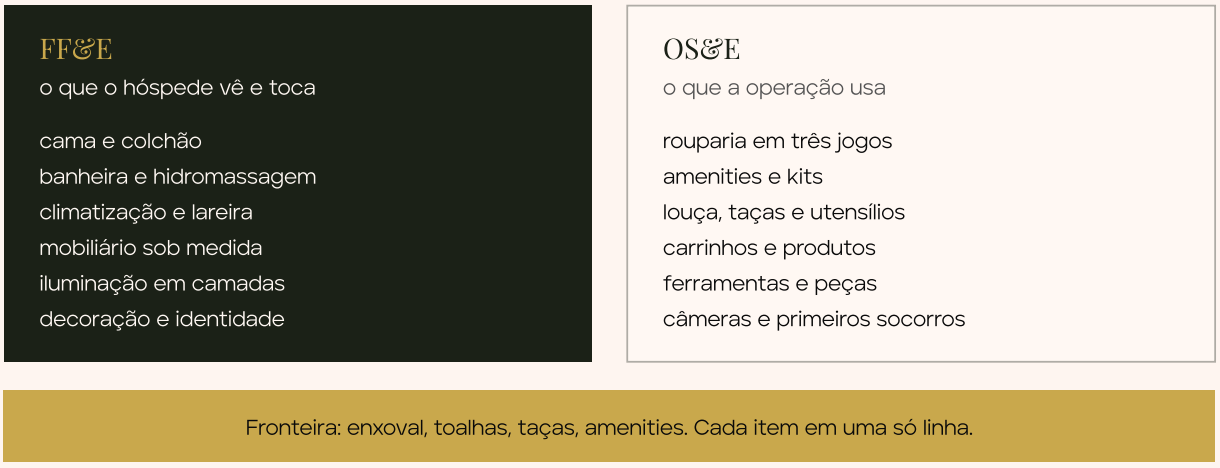


Figura 4.1 · FF&E e OS&E (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, caps. 05 e 06). A faixa de fronteira é organização do módulo.

A faixa dourada é onde mora a confusão. A tabela de FF&E da fonte põe «Cama, colchão e enxoval» no FF&E; a de OS&E põe a rouparia no OS&E. O seu Mapa não pode contar o enxoval nas duas linhas, nem em nenhuma. A regra de trabalho do F01 é a do Capítulo 2: rouparia dos três jogos no OS&E; no FF&E, cama e colchão. Se a cotação do mobiliário já traz o enxoval, tire-o de lá ou baixe o OS&E, e escreva ao lado.

A regra dos três jogos

Para cada cama, você não compra um jogo de cama. «Compra três. Um está em uso. Um está no estoque. Um está na lavanderia.»

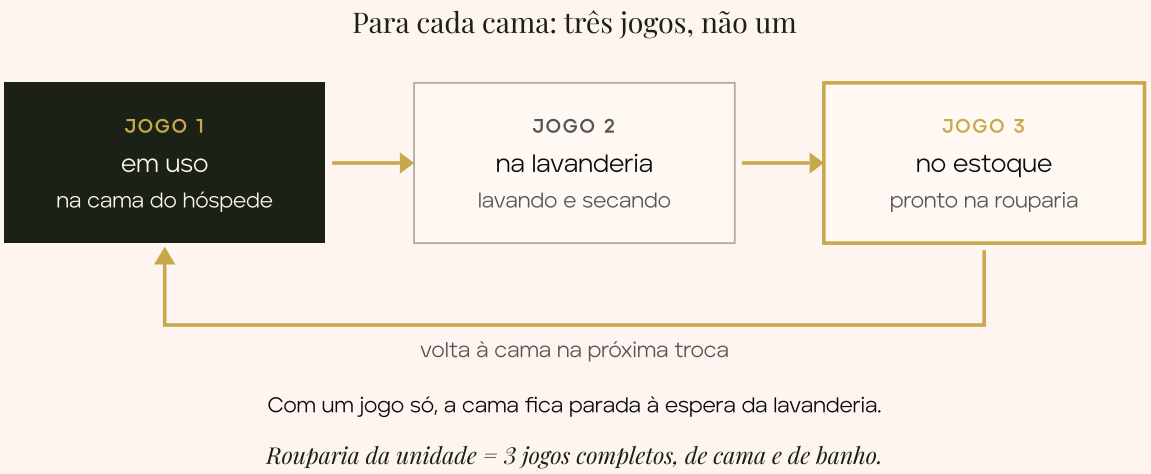


Figura 4.2 · A regra dos três jogos (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 06). Ciclo: organização do módulo.

Some toalhas, piso e roupões, e o «detalhe» vira uma das maiores linhas do OS&E. A fonte dá, como faixas ilustrativas, de R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil por unidade para os três jogos e de R$ 500 a R$ 800 de amenities. E avisa: «Quem descobre isso depois da inauguração descobre com hóspede na casa.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO

O OS&E de quatro cabanas, com os três jogos

Quatro cabanas de casal, uma cama cada, FF&E cotado de 4 × R$ 45.000 = R$ 180.000.

Passo 1 · Um jogo completo: cama (lençóis, fronhas, capa de edredom) R$ 420 + banho (toalhas e piso) R$ 230 + dois roupões R$ 300 = **R$ 950**.

Passo 2 · Três jogos e amenities: 3 × 950 = R$ 2.850, mais R$ 650 de amenities = **R$ 3.500** por cabana; 4 × 3.500 = R$ 14.000.

Passo 3 · Rateado: cozinha, governança, manutenção e segurança do conjunto, R$ 9.000. Total: 14.000 + 9.000 = **R$ 23.000**.

Passo 4 · Conferir: 23.000 ÷ 180.000 = 12,8% do FF&E, dentro dos 10% a 15%.

Com um jogo só, seriam 4 × 950 = R$ 3.800 contra 4 × 2.850 = R$ 11.400. Os R$ 7.600 de diferença aparecem na primeira semana cheia.

Por que o OS&E derruba caixas

O orçamento contemplou a obra e os móveis. Na semana da inauguração começam as compras que ninguém orçou: «panelas, taças, rodos, ganchos, pilhas, extensões, kits de primeiros socorros.» «Individualmente, nada custa muito. Somados, consomem exatamente o caixa que deveria sustentar os primeiros meses de operação.»

O OS&E não quebra projetos pelo tamanho. Quebra pela surpresa.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 06

A defesa é a regra de 10% a 15% do FF&E, «orçado desde o primeiro dia, comprado com a mesma disciplina da obra», e uma lista montada como a operação trabalha, por jornada.

LISTA	O QUE ENTRA	QUEM RESPONDE
Governança	Rouparia nos três jogos, carrinhos, produtos, equipamentos	Quem arruma e limpa
Cozinha e F&B	Utensílios, louça, taças, equipamentos de serviço	Quem prepara o café
Recepção e hóspede	Amenities, chaves e fechaduras, kits de boas-vindas	Quem recebe
Manutenção	Ferramentas, peças de reposição, estoque mínimo	Quem conserta

LISTA	O QUE ENTRA	QUEM RESPONDE
Segurança	Câmeras, alarmes, primeiros socorros, sinalização	Quem responde pelo imprevisto

Tabela 4.2 · O inventário operacional em cinco listas (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 06). F&B: alimentos e bebidas. Terceira coluna: leitura do módulo.

Simule um dia de operação, da chegada ao café e à trilha, e anote cada objeto que a operação tocou. «Essa lista é o seu OS&E.» E não a trate como compra de supermercado: «A toalha é parte do ritual do banho.» Num produto diferenciado, o OS&E segue a curadoria do FF&E; «só muda a prateleira da planilha».

O OS&E de Marina: 1,9% e uma pergunta

Marina aplicou 12%: 12% × 195.000 = **R$ 23.400**, no meio da faixa de R$ 19.500 a R$ 29.250. Mas a faixa de sanidade pede de 2% a 4% do CAPEX, e o dela pesa 23.400 ÷ 1.237.400 = 1,9%. As réguas não brigam: 10% a 15% de um FF&E de 15% a 20% dá de 1,5% a 3% do CAPEX. É aviso para conferir, não erro.

A pergunta é onde está a rouparia. Os R$ 35.000 de mobiliário vieram, no Z02, da linha da Conta do Investimento Necessário™ que junta «Mobiliário, enxoval, equipamentos e decoração» (Jornada do COMO, Etapa 02). Se o enxoval está ali, a regra manda tirá-lo do mobiliário ou baixar o OS&E, e escrever ao lado. Se não está, os três jogos ficam na lista de governança, dentro dos R$ 23.400.

> REVISITE · D05
>
> Sem consultar: quanto mede o apoio de Marina e que espaços tem? Confira: 30 m^2, com rouparia de 12, depósito de 6, resíduo de 4 e vestiário e copa de 8. O terceiro jogo precisa de prateleira e o segundo, de lugar para secar: a regra dos três jogos já estava na planta.

Pré-abertura: o vale entre a obra e a primeira diária

O Volume 05 descreve «um vale silencioso entre dois marcos. De um lado, a obra entregue. Do outro, o primeiro hóspede pagante.» Pré-abertura é o

capital que o atravessa. A Etapa 02 da Jornada do COMO chama a linha de pré-operação: «marca, fotos, site, anúncios, sistemas, treinamento, estoque inicial.»

A obra termina no dia em que o negócio precisa começar pronto.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 07

Equipe antes da receita. Recrutar e treinar acontece semanas antes do primeiro check-in, «E essa folha de pagamento roda sem nenhuma receita do outro lado.» A equipe do fixo de Marina custa R$ 5.200 por mês (D03); 60 dias antes, são 2 × 5.200 = R$ 10.400, quase 29% da linha.

Marketing de lançamento. Fotos profissionais, site, campanhas, imprensa: «o lançamento tem custo, e esse custo é CAPEX.» «Um produto extraordinário lançado em silêncio é um segredo caro.» O lançamento em si é do pilar L · Vender.

Licenças e permissões. Alvarás, licenças ambientais, bombeiros, vigilância sanitária, cadastros de turismo, cada um com custo e prazo: «Nenhum deles aceita ser lembrado na última semana.» No F01, aqui ficam só as que autorizam a operar; as que aprovam projeto e obra estão em projeto e licenciamento (Capítulo 2). Quais se aplicam ao seu caso se confirma com engenheiro, arquiteto e advogado habilitados; o caminho é do pilar E · Implantar.

Soft opening. A abertura suave, com convidados selecionados, tarifas de abertura e capacidade parcial, é «o ensaio geral pago pelo CAPEX para que a estreia aconteça sem improviso.»

CHECKLIST · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 07

Checklist da pré-abertura

- Equipe contratada com 60 dias de antecedência.
- Treinamento concluído com hóspede-teste real.
- Fotos profissionais feitas com o produto pronto.
- Site, motor de reservas e canais configurados.
- Campanha de lançamento com data definida.
- Licenças e alvarás emitidos, não «encaminhados».
- Soft opening agendado com convidados selecionados.
- Colchão de caixa dos três primeiros meses reservado.

«Oito itens. Qualquer um esquecido cobra juros emocionais na semana da abertura.»

O último item não sai da pré-abertura: é capital de giro, fora do CAPEX e dentro da necessidade. Para Marina, são os 3 × 12.000 = R$ 36.000 que o Capítulo 5 soma à rampa e à sazonalidade.

A ordem de contratação

A pré-abertura ocupa os «últimos 60 a 90 dias», e a fonte dá a escada: aos 90 dias, a liderança, quem vai treinar os demais; aos 60, governança e manutenção; aos 45, recepção e experiência, com os rituais ensaiados; aos 30, reforços e função dupla, no soft opening.



Figura 4.3 · A ordem de contratação da pré-abertura (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 07), em escala de dias até a abertura.

Contratar cedo demais queima caixa. Tarde demais, queima a estreia.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 07

Em operação pequena, cada degrau é uma função, não uma pessoa. Nas três cabanas, a liderança dos 90 dias é Marina com a pessoa local da rotina; aos 60 entram camareira e zeladoria; aos 30, um reforço para o soft opening. Monte o plano de trás para frente: se algo não couber nos 90 dias, a data de abertura mudou. Melhor saber agora.

Duas regras para a mesma linha

A Metodologia Zion de Análise de Investimento manda calcular a pré-abertura como 5% a 10% dos hard costs. A tabela de sanidade, no capítulo seguinte da fonte, diz que ela deve pesar de 3% a 5% do CAPEX. Como os hard

costs pesam de 60% a 70% do CAPEX, a primeira regra dá de 3% a 7%: a metade de cima passa do teto da segunda. E quando os hard costs pesam menos de 60%, a borda de baixo também escapa. O F01 calcula pela primeira e confere pela segunda.

CONTA	MARINA · FASE UM	RAFAEL · CHALÉ 5 E EFLUENTE
Hard costs e peso no CAPEX	R$ 730.000 · 59,0%	R$ 170.000 · 63,7%
Regra 1 · 5% a 10% dos hard costs	R$ 36.500 a R$ 73.000	R$ 8.500 a R$ 17.000
Regra 2 · 3% a 5% do CAPEX	R$ 37.122 a R$ 61.870	R$ 8.001 a R$ 13.335
Adotado · 5% dos hard costs	**R$ 36.500** · 2,9%	**R$ 8.500** · 3,2%
Leitura	Abaixo da regra 2 por R$ 622: conferir pela lista	Dentro das duas

Tabela 4.3 · As duas regras da pré-abertura (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, caps. 02 e 03) nos exemplos ilustrativos. CAPEX de R$ 1.237.400 e R$ 266.700; 3% de 1.237.400 = 37.122.

Marina fica abaixo porque o CAPEX dela tem contingência de 25% sobre os hard costs e uma linha própria de projeto e licenciamento, o que faz os hard costs pesarem 59%. A regra 1 não vê isso; a regra 2 vê. A diferença não pede número novo. Pede que os R$ 36.500 tenham dono, item a item, no checklist; se a lista der mais, a linha sobe. Quem nunca operou deve perguntar se a borda de baixo basta para formar equipe do zero.

Rafael: a pré-abertura de quem já opera

O chalé 5 leva R$ 35.000 de FF&E, 13,1% do CAPEX: abaixo dos 15%, acima do alerta de 10%, porque o efluente pesa nos hard costs. O OS&E de 12% × 35.000 = **R$ 4.200** pesa 1,6%, e aqui a borda de baixo é coerente: cozinha, ferramentas e câmeras já existem; o chalé novo precisa dos três jogos da sua cama e das amenities. Uma ressalva liga ao Capítulo 7: se, depois de três anos, falta o terceiro jogo nos quatro chalés atuais, isso é reposição, não expansão.

A pré-abertura de **R$ 8.500** (5% × 170.000) muda de natureza. Rafael tem rouparia, processos e uma responsável pela rotina: não há equipe a formar do zero. Mas a linha não zera. O chalé pede fotos com o produto pronto, anúncio novo, treinamento da responsável na rotina de cinco unidades e no cuidado do efluente, as licenças que a ampliação exigir, confirmadas com profissional, e um soft opening.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Liste o FF&E da unidade-modelo pelos seis grupos e marque os itens de prazo longo. Ponha a rouparia dos três jogos no OS&E e deixe cama e colchão no FF&E. Aplique três jogos e cinco listas no OS&E e confira os 10% a 15%. Calcule a pré-abertura pelas duas regras, dê dono a cada item do checklist e monte a escada a partir da data de abertura.

B

Quero crescer

Separe o que a expansão compra do que a operação já tem. Conte a rouparia contra três jogos por cama; o que faltar nas unidades atuais é reposição. Liste a pré-abertura da unidade nova: fotos, anúncio, treinamento, licenças, soft opening. Ela encolhe, mas não zera.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Qual é a diferença entre FF&E e OS&E, em uma frase?

2. Quais são os cinco passos da disciplina de compra, e qual protege mais o dinheiro?

3. O que diz a regra dos três jogos?

4. Quais são as duas regras da pré-abertura, e por que nem sempre concordam?

5. Por que a pré-abertura de quem já opera não zera?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O FF&E é custo na planilha e receita na experiência: corte metros quadrados no desenho, nunca a experiência no fim da obra.
- A tabela por grupo é lista de conferência com faixas ilustrativas; o preço vem da cotação.
- Unidade-modelo e cotação em lote levam o FF&E à evidência 3; prazo de fornecimento antecipa compras.
- OS&E é de 10% a 15% do FF&E, com três jogos por cama e cinco listas; quebra pela surpresa.
- A rouparia dos três jogos fica no OS&E; cama e colchão, no FF&E; nada em duas linhas.
- Pré-abertura paga o vale até o primeiro hóspede: equipe, lançamento, licenças e soft opening, em oito itens.
- Calcule por 5% a 10% dos hard costs e confira por 3% a 5% do CAPEX; quando divergem, a lista decide.

CURIOSIDADE

O capítulo de OS&E do Volume 05 abre com um rodo: «Ninguém posta uma foto do rodo. Mas nenhuma operação cinco estrelas existe sem ele.»

REFLEXÃO

Se o caixa apertar no último mês da obra, o que você corta primeiro? Escreva agora, antes que a pressa escolha por você.

DICA

Nesta semana, simule por escrito um dia inteiro de operação e anote cada objeto tocado. É o rascunho do seu OS&E.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 04

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Uma pousada de seis quartos orçou FF&E de R$ 240.000 e OS&E de R$ 12.000. Já feito: 12.000 ÷ 240.000 = 5%. O que está fora da regra, qual é a faixa em reais e o que provavelmente faltou?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O FF&E da sua unidade-modelo pelos seis grupos, com valor, evidência (0 a 3) e itens de prazo longo.

3. O seu OS&E: jogo completo, três jogos, amenities e rateado das cinco listas. Onde ficou o enxoval? Ficou entre 10% e 15% do FF&E?

4. A sua pré-abertura pelas duas regras, o valor adotado e o dono de cada item do checklist.

5. Jornada A: quem entra aos 90, 60, 45 e 30 dias. Jornada B: o que a unidade nova precisa que a operação ainda não tem.

CAPÍTULO 05

CONTINGÊNCIA E CAPITAL DE GIRO

Proteção: *a reserva da obra e o fôlego do primeiro ano.*

A contingência protege a obra do imprevisto. O capital de giro protege a operação dos meses em que a receita ainda não cobre o custo. Sem as duas, o orçamento é bonito e o projeto, frágil.

NESTE CAPÍTULO

- Por que a contingência não é pessimismo, e as três réguas das fontes.
- A regra do F01: perfil de risco, conferido contra 10% a 15% do CAPEX.
- O que a contingência cobre, o que não cobre e a regra de uso escrita.
- Capital de giro pelas duas regras, com três meses de fixo como piso.
- Marina resolvida passo a passo, Rafael pela metade e um exercício em branco.

No fim do Capítulo 4, a fase um de Marina somava R$ 1.054.900. Parece completo. Não é. Faltam as duas linhas que quase todo orçamento de primeira viagem deixa de fora, porque incomodam. Uma admite que a obra vai custar mais do que o orçado. A outra admite que, aberta a porta, a receita vai demorar a chegar. Este capítulo põe as duas na conta, com regra, número e a justificativa que você vai defender diante de qualquer fonte de capital.

A contingência não é pessimismo

Contingência é a reserva para o que a obra vai custar além do orçado. O Volume 05 · Investimento a coloca no quarto componente do CAPEX, junto com a pré-abertura (Capítulo 2). A Etapa 02 da Jornada do COMO completa: «A contingência não é pessimismo: é a média histórica do desvio.» Ninguém está apostando contra o próprio projeto. Está reconhecendo um padrão: chuva além do normal, câmbio que muda o preço do importado, solo que pede mais fundação, fornecedor que atrasa, os exemplos do Volume 05.

Você não sabe qual imprevisto virá. Sabe que algum virá.

Três fontes, três réguas

As fontes divergem no tamanho e, principalmente, na base do percentual.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 07

A edição de captação do Volume 05 chama a mesma reserva de reserva de implantação, e avisa: «investidor experiente desconfia de projeto sem reserva, porque sabe que ela vai ser necessária e quer saber de onde virá.» Esconder a contingência para o número parecer menor é o caminho mais curto para perder credibilidade.

FONTE	FAIXA	BASE	EXIGÊNCIA EXTRA
Volume 05, edição do projeto	10% a 15%	«de todo o projeto»; na faixa de sanidade, o CAPEX	Teto, ou acima, com fatores de risco
Volume 05, edição de captação	10% a 15%	O CAPEX	«fora do cronograma de marcos», «com regra de uso escrita»
Jornada do COMO, Etapa 02	Primeira obra 20% a 25%; com experiência e projeto detalhado 10% a 15%; imóvel pronto 15% a 20%	«sobre a obra e a infraestrutura»	A que sobrar «vira capital de giro adicional»

Tabela 5.1 · As réguas de contingência (Volume 05 · Investimento, caps. 03 e 07, e edição de captação, cap. 04; Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 11).

Vinte e cinco por cento sobre obra e infraestrutura não é o mesmo que vinte e cinco por cento do CAPEX, porque mobiliário, suprimentos e pré-abertura ficam fora da base da Etapa 02. A Etapa 02 também é a única que separa perfis e trata do imóvel pronto: «porque o que se encontra ao abrir paredes é imprevisível.»

REVISITE · Z02

Sem consultar: como Marina chegou à contingência das cinco cabanas no Z02? Confira: pelas duas réguas, ficando com a maior. A da Etapa 02 deu 25% × (650.000 + 180.000) = R$ 207.500; a da Etapa 01, 20% sobre as demais linhas com terreno e giro na base, R$ 311.146. No F01 terreno e giro saem do CAPEX, e a régua que soma tudo perde o sentido.

REGRA ADOTADA NO F01

Contingência pelo perfil, conferida pelo CAPEX

— Escolha o degrau do seu perfil na Etapa 02 e aplique o percentual sobre os hard costs, o custo físico de obra e infraestrutura.

- Confira: a contingência precisa ficar entre 10% e 15% do CAPEX, ou acima. Abaixo, nunca.
- Fatores de risco do Volume 05 empurram para o teto do degrau.
- A reserva fica fora do cronograma de desembolso e tem regra de uso escrita.

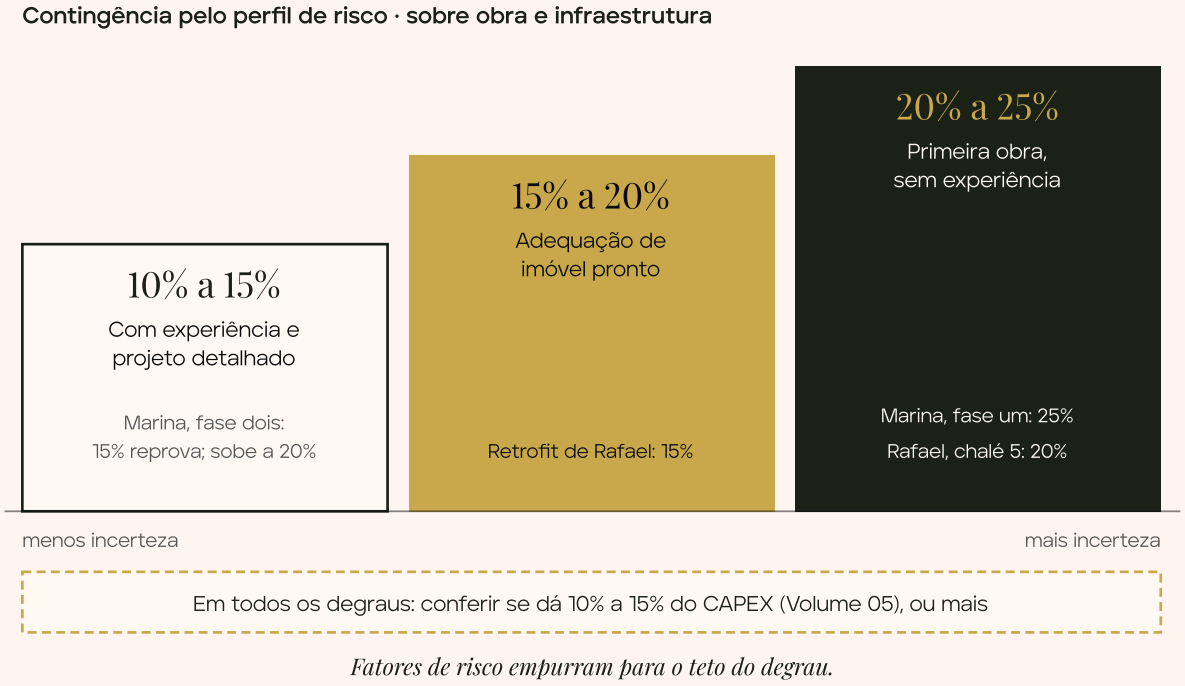


Figura 5.1 · A escada de contingência por perfil (Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 11) com a conferência do Volume 05 · Investimento. Posições de Marina e Rafael: exemplos ilustrativos; o retrofit de 15% vem do Z02 e do D03.

Quando subir para o teto

A faixa, diz o Volume 05, «não é uniforme». Suba para o teto, ou acima, quando o projeto acumular fatores de risco: território remoto ou de acesso difícil; sistema construtivo inédito para a equipe contratada; dependência de itens importados; licenciamento em área sensível; prazo apertado por sazonalidade de inauguração. «Cada fator soma incerteza. E incerteza, em orçamento, tem preço.» Conte os seus. Marina soma o primeiro fator, terreno de serra com acesso a construir e rede longa, à condição de primeira obra: 25%, o teto do degrau mais alto.

O que a contingência cobre, e o que não cobre

Reserva sem fronteira vira caixa livre, e caixa livre em obra some. A edição de captação diz o que a reserva cobre, «Exigências complementares, descoberta de solo, reajuste de material», e pede «regra de uso escrita. A regra importa tanto quanto o valor.»

COBRE (IMPREVISTO DA OBRA ORÇADA)	NÃO COBRE (E ONDE FICA)
Solo que pede mais fundação	Mudança de escopo: é decisão, vira linha nova, aprovada antes
Reajuste de material, câmbio do importado	Linha esquecida: corrige-se agora, no CAPEX
Exigências complementares do licenciamento	Resultado negativo dos primeiros meses: é capital de giro
Chuva além do normal, fornecedor que atrasa	Custo da captação: linha da Régua do Quanto Captar™
O que aparece ao abrir paredes	Desejos novos durante a obra: passam pela pergunta do Manual

Tabela 5.2 · Fronteiras da contingência. Esquerda: Volume 05 · Investimento, cap. 07, e edição de captação, cap. 04; Etapa 02. Direita: organização do módulo.

A linha que mais pesa é a primeira da direita. O Manual Oficial do Método Zion 360° lembra que, na obra, «Nem todas essas mudanças representam evolução», e dá a pergunta: «Esta decisão aumenta o valor do empreendimento ou apenas aumenta o custo?» Se aumenta o valor, vira linha nova, com orçamento e fonte. Se só aumenta o custo, fica fora. Nos dois casos, não sai da contingência.

A regra de uso cabe em quatro linhas. Exemplo ilustrativo: só imprevisto da obra orçada; cada uso registrado com causa, valor e data; quem autoriza, definido antes da obra; saldo conferido a cada medição. O que sobrar, ensina a Etapa 02, «vira capital de giro adicional, o que nunca é um problema.»

A contingência que você não provisiona não deixa de existir. Apenas muda de nome: vira dívida, atraso ou obra parada.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 07

Capital de giro: o investimento que começa depois da obra

Capital de giro é o dinheiro que paga a operação enquanto a receita não cobre os custos: fora do CAPEX, dentro da necessidade (Capítulo 2). A Etapa 02 explica: «Tudo o que sai antes de abrir, mais o que sai depois de abrir e antes de a receita cobrir. A segunda parte é a que falta em quase todo orçamento.»

Duas regras e um piso

O F01 segue o Z02: calcule pelas duas regras e adote a maior.

- **Etapa 01:** seis meses de custo fixo.
- **Etapa 02:** déficit da rampa (os meses negativos do primeiro ano), reserva de sazonalidade (os meses que, no regime, não cobrem o custo) e «uma margem de segurança de três meses de custo fixo, para o imprevisto».

E há um piso. A Régua do Quanto Captar™ põe na necessidade «três meses de custo fixo da operação, disponíveis no dia da abertura», e o Volume 05 manda «manter em caixa o equivalente a 3 meses de custos fixos.» Três meses são o mínimo, nunca a conta inteira de um projeto novo: equivalem só à segurança da Etapa 02 e não pagam a rampa nem a baixa.

Não é dinheiro parado. É o seguro que impede decisões desesperadas em abril.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 10

A rampa e a baixa

Ocupação de regime é a que o destino entrega a uma operação madura. Sem avaliações, histórico nos canais e base de hóspedes, ninguém abre nela.

FRAMEWORK DO MÉTODO · JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 06

Curva de Rampa do Primeiro Ano™

- «Meses 1 a 3 de 25% a 40% da ocupação de regime.»
- «Meses 4 a 6 de 45% a 60%.»
- «Meses 7 a 12 de 65% a 85%.»
- «Meses 13 a 18 chega ao patamar do destino.»

Sem demanda consolidada, «de dezoito a trinta meses». E: «O dinheiro para atravessar esse período precisa estar previsto, e ele é parte do investimento.»

A segunda fonte do déficit é o Calendário de Sazonalidade™, que distribui a ocupação pelos doze meses e mostra o que a média anual esconde. O destaque da Etapa 02 diz tudo: «A reserva que atravessa a baixa é parte do investimento».

Essa é a linha do investimento que mais frequentemente falta, e é a que mais fecha operações bonitas.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 05

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

No Z02, Marina reservou R$ 120.000 de giro: seis meses de R$ 20.000, para cinco cabanas. Agora abre com três e fixo de R$ 12.000. Pela Etapa 02, o giro fica acima ou abaixo de R$ 120.000? Escreva o palpite.

Exemplo resolvido: a proteção da fase um de Marina

Refaça cada conta na calculadora antes de seguir para o passo seguinte.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

A contingência das três cabanas

Passo 1 · Contingência. Primeira obra, serra, rede longa: degrau mais alto, no teto. Base: 250.000 de infraestrutura + 390.000 de cabanas + 90.000 de apoio = R$ 730.000. Contingência: 25% × 730.000 = **R$ 182.500**.

Passo 2 · CAPEX e conferência. 1.054.900 + 182.500 = **R$ 1.237.400**. A contingência é 182.500 ÷ 1.237.400 = 14,7% do CAPEX, dentro de 10% a 15%. Passou.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · CONTINUAÇÃO

O giro das três cabanas

Passo 3 · O que cada noite deixa. Diária de R$ 680, menos 18% (impostos e comissões de 15%, cancelamento de 2% e quebra de 1%, da Lista do Que Ninguém Orça™ no Z02), menos R$ 120 de custo variável: 680 × 0,82 − 120 = **R$ 437,60**.

Passo 4 · Mês médio de regime. Três cabanas × 30 = 90 noites por mês. Ocupação do calendário do D02: (3 meses × 64% + 4 × 40% + 5 × 22%) ÷ 12 = 38,5%. Contribuição: 90 × 0,385 × 437,60 = **R$ 15.162,84**, contra fixo de R$ 12.000.

Passo 5 · Déficit da rampa. Abrindo no começo da alta, 40% do regime nos meses 1 a 3, 50% nos 4 a 6 e 75% nos 7 a 12. Por simplificação, a rampa incide sobre o mês médio; a baixa entra no passo seguinte.


- 0,40 × 15.162,84 − 12.000 = −5.934,86; três meses.
- 0,50 × 15.162,84 − 12.000 = −4.418,58; três meses.
- 0,75 × 15.162,84 − 12.000 = −627,87; seis meses.

3 × 5.934,86 + 3 × 4.418,58 + 6 × 627,87 = **R$ 34.828**. Os doze meses ficam no vermelho.

Passo 6 · Sazonalidade. No regime, só o mês a 22% não cobre o fixo: 90 × 0,22 × 437,60 − 12.000 = −3.335,52. Cinco meses: **R$ 16.678**. O mês a 40% já fica positivo:

90 × 0,40 × 437,60 − 12.000 = +3.753,60.

Passo 7 · Segurança e as duas regras. 3 × 12.000 = **R$ 36.000**. Etapa 02: 34.828 + 16.678 + 36.000 = R$ 87.506 → **R$ 87.500**. Etapa 01: 6 × 12.000 = R$ 72.000. Fica a maior: **R$ 87.500**. Necessidade antes da fonte: 1.237.400 + 87.500 = R$ 1.324.900, que segue para o Capítulo 8.

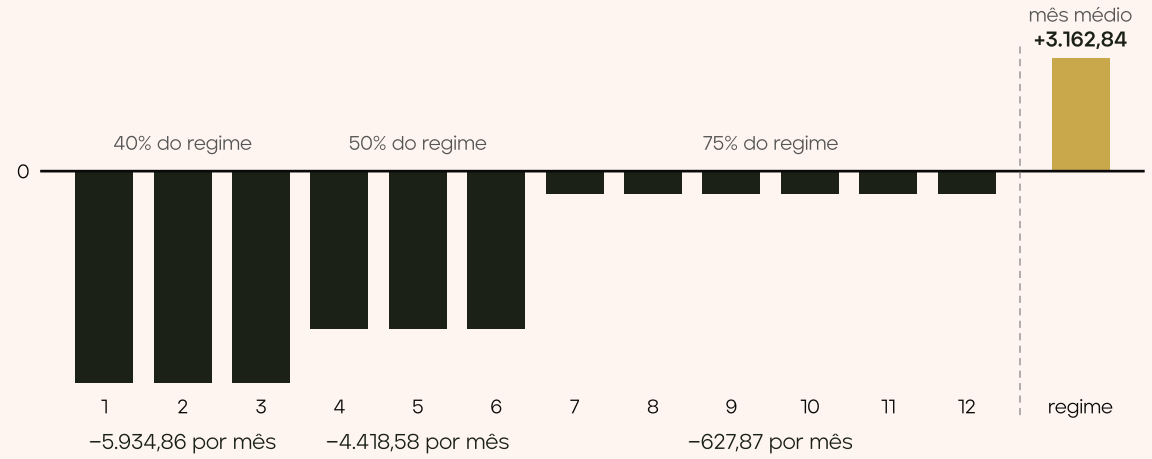

Déficit da rampa: 3 × 5.934,86 + 3 × 4.418,58 + 6 × 627,87 = R$ 34.828

Mês médio de regime: 90 × 38,5% × 437,60 = 15.162,84, contra fixo de 12.000

Figura 5.2 · A Curva de Rampa do Primeiro Ano™ (Etapa 02, Passo 06) aplicada a Marina, em escala: 2 px por R$ 100 de resultado mensal. Exemplo ilustrativo; regime a partir do mês 13.

Volte ao palpite. R$ 87.500 fica abaixo dos R$ 120.000 do Z02, sem contradição: aqueles eram seis meses de um fixo de cinco cabanas. Mas a rampa e a baixa põem a conta R$ 15.500 acima da regra simples de seis meses.

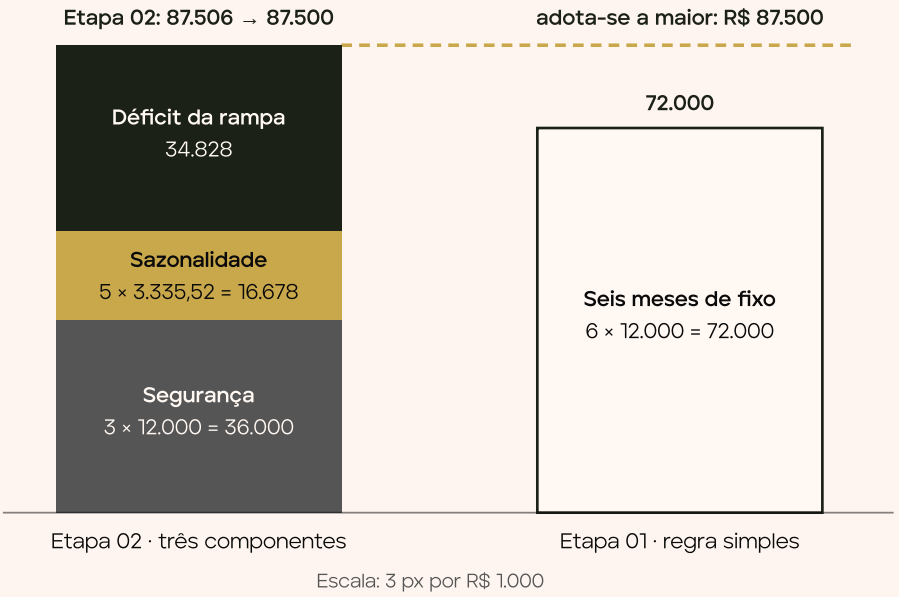


Figura 5.3 · Os três componentes do giro de Marina contra a regra de seis meses, em escala (exemplo ilustrativo). Conta do Investimento Necessário™ (Etapa 02, Passo 11) e regra da Etapa 01.

Três avisos sobre a conta de Marina

O pró-labore. O fixo de R$ 12.000 não tem pró-labore, a remuneração de quem trabalha na operação. É pendência do F02 · Receitas, custos e rentabilidade. Se entrar, as três linhas do giro sobem juntas.

O cenário. A conta é do cenário base. O conservador é do F03 · Viabilidade, cenários e estresse, e pode empurrar o giro para cima. Os R$ 87.500 são o mínimo defensável hoje, não o teto.

A rede. Com a infraestrutura de R$ 180.000 do Z02, a contingência cai para 25% × 660.000 = R$ 165.000, ou 14,4% de um CAPEX de R$ 1.146.400. Ainda passa, e o giro não muda. A rede é a linha de maior variação e precisa de orçamento escrito.

Última conferência: a Régua do Quanto Captar™ dá ao giro a ordem de grandeza de «5% a 8% do total». 87.500 ÷ 1.324.900 = 6,6%. Dentro. A Etapa 02 dá outra ordem de grandeza, de 15% a 30% do investimento total (Capítulo 2); Marina fica abaixo dela. O F01 fica com a conta feita, não com a faixa, e leva a diferença ao F03, onde o conservador pode empurrar o giro para cima.

Parcialmente resolvido: a expansão de Rafael

Rafael opera quatro chalés há três anos e quer o chalé 5 com a estação de efluente. Dois passos estão feitos; os outros dois são seus.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · PARCIALMENTE RESOLVIDO

A proteção do chalé 5

Passo 1 · Perfil (feito). Ele opera há anos, mas nunca conduziu obra nova: degrau da primeira obra, no piso, 20%. Escolha do módulo: a tipologia e o terreno ele já conhece. Se o efluente pedir solução inédita para a equipe, sobe para o teto.

Passo 2 · Contingência (feito). Hard costs: efluente 45.000 + obra 125.000 = R$ 170.000. Contingência: 20% × 170.000 = **R$ 34.000**. Com projeto e licenciamento (15.000), FF&E (35.000), OS&E (4.200) e pré-abertura (8.500), CAPEX de **R$ 266.700**.

Passo 3 · Sua vez. A contingência passa na conferência? Calcule 34.000 ÷ 266.700.

Passo 4 · Sua vez. Que giro a expansão pede? Os seis meses de fixo da operação já estão reservados? A rampa de um chalé novo precisa de reserva própria?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

Na expansão, a pergunta do giro muda: não é quanto a unidade nova consome, é se a operação inteira atravessa a rampa sem tocar no dinheiro errado. Pagar obra com o caixa do mês é a causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™, que o Capítulo 7 abre.

LINHA	MARINA, FASE UM	RAFAEL, CHALÉ 5
Perfil e degrau	Primeira obra, teto: 25%	Primeira obra nova, piso: 20%
Contingência	182.500 (14,7% do CAPEX)	34.000 (12,7% do CAPEX)
CAPEX	1.237.400	266.700
Giro	87.500 (Etapa 02, maior que 72.000)	39.000 (3 × 13.000; os seis meses já reservados)
Necessidade antes da fonte	1.324.900	305.700

Tabela 5.3 · A proteção nas duas jornadas, em

Tabela 5.3 · A proteção nas duas jornadas, em reais (exemplos ilustrativos). Regras: Jornada do COMO, Etapas 01 e 02; Volume 05 · Investimento.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Escolha o degrau, conte os fatores de risco, aplique o percentual sobre obra e infraestrutura e confira contra 10% a 15% do CAPEX. Escreva a regra de uso. Monte o giro: contribuição, mês médio, rampa, baixa e três meses de fixo; compare com seis meses e fique com a maior.

B

Quero crescer

Reforma: degrau de imóvel pronto. Unidade nova: o da primeira obra que você conduz. Confirme se os seis meses de fixo da operação já estão separados, some três meses e teste o pior caso. Se o conservador fica negativo, a operação não absorve rampa: aumente a reserva ou adie a obra.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os três degraus de contingência da Etapa 02, e sobre qual base?

2. Que conferência o F01 exige depois de aplicar o degrau?

3. Cite dois itens que a contingência cobre e dois que não cobre.

4. Quais são os três componentes do giro pela Etapa 02, e por que três meses de fixo são só o piso?

5. Por que o giro do chalé 5 não repete os seis meses de fixo?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

— Contingência é a média histórica do desvio; projeto sem reserva gera desconfiança em quem financia.

- No F01, ela sai do perfil de risco, sobre obra e infraestrutura, e precisa dar 10% a 15% do CAPEX, ou mais.
- Fatores de risco empurram para o teto; a reserva fica fora do cronograma, com regra de uso escrita.
- Mudança de escopo é decisão, com linha própria; nunca sai da contingência.
- O giro fica fora do CAPEX e dentro da necessidade: a maior entre seis meses de fixo e rampa mais baixa mais três meses.
- Marina: contingência de R$ 182.500 (14,7%), CAPEX de R$ 1.237.400, giro de R$ 87.500, sem pró-labore e no cenário base.
- Na expansão, a operação só absorve a rampa se o pior caso sobrar; para Rafael, não sobra.

CURIOSIDADE

Sobre a reserva de implantação e o custo da captação, as linhas que mais somem dos pedidos, a edição de captação do Volume 05 observa: «Juntas, as duas somam entre quinze e vinte por cento do pedido. É exatamente a ordem de grandeza do rombo que aparece no meio da obra.»

REFLEXÃO

Se a sua obra custasse 20% a mais amanhã, de onde sairia o dinheiro, e para quem você teria de ligar?

DICA

Nesta semana, escreva a regra de uso da sua contingência antes do valor dela: para quê, quem autoriza, como se registra.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 05

1. Exemplo ilustrativo, em branco. Adequação de uma casa pronta em duas unidades: hard costs de R$ 200.000 e demais linhas do CAPEX de R$ 160.000. Fixo de R$ 8.000; 60 noites possíveis por mês; contribuição de R$ 400 por noite; 3 meses a 60%, 5 a 40% e 4 a 25%; rampa de 40%, 50% e 75%. Calcule a contingência no piso e no teto do degrau, confira contra o CAPEX e calcule o giro pelas duas regras.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O seu degrau, os fatores de risco do seu projeto e o percentual escolhido, com a justificativa.

3. A sua contingência em reais e em percentual do CAPEX. Passou na conferência?

4. A regra de uso em quatro linhas: para quê, quem autoriza, como se registra, quando se confere.

5. O seu giro. Jornada A: os três componentes, as duas regras e a adotada. Jornada B: onde estão os seis meses de fixo da operação, quanto a expansão acrescenta e o pior caso.

CAPÍTULO 06

LER O CAPEX COMO INVESTIDOR

Ler o CAPEX *como investidor.*

Quem vai pôr dinheiro no projeto lê o orçamento de outro jeito: pelas proporções, pelo custo de cada chave e pela ordem em que o dinheiro sai. Faça essa leitura antes que outra pessoa a faça por você.

NESTE CAPÍTULO

- Por que o investidor começa pelos percentuais.
- A tabela de sanidade do Volume 05 e o que cada desvio revela.
- Custo por chave, infraestrutura comum e efeito de escala.
- Fasear sem refazer a rede: o custo por chave de cada fase de Marina.
- O CAPEX no tempo: cronograma de desembolso e a linha do capital próprio.
- Rafael lê a própria fase dois com a mesma régua.

Você já montou o CAPEX, linha por linha. Agora troque de cadeira: o orçamento chega de outra pessoa e você tem minutos para decidir se ele merece confiança. É o que um investidor, um banco ou um sócio fará com o seu.

Quem não sabe para onde o dinheiro vai, descobre tarde demais para onde ele foi.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 03

O investidor começa pelos percentuais

Segundo o Volume 05, quando um investidor experiente recebe um orçamento, «ele não começa pelos valores absolutos. Começa pelos percentuais.» O total sozinho não diz nada; a proporção entre os componentes, sim. Se a obra leva quase tudo, alguém esqueceu os móveis. Se não há contingência, alguém aposta que nada vai dar errado. O percentual mostra o que falta, e o que falta é o que estoura depois.

A régua não é lei: «Essas proporções não são regras fixas. São faixas de sanidade.» E quando um número foge delas: «Quando um orçamento foge muito delas, existe uma explicação — ou existe um erro.» Sua tarefa é saber qual das duas, linha por linha.

A tabela de sanidade e o que cada desvio revela

COMPONENTE	FAIXA SAUDÁVEL	SINAL DE ALERTA	O QUE O DESVIO REVELA
Hard costs	60% a 70%	«Acima de 80%: faltou algo»	Faltou FF&E, OS&E ou contingência: inaugura sem mobília ou sem caixa.
FF&E	15% a 20%	«Abaixo de 10% em produto premium»	A experiência prometida não cabe no orçamento, e o hóspede percebe.
OS&E	2% a 4%	«Ausente: surpresa garantida»	Rouparia, utensílios e limpeza chegam na semana da abertura.
Pré-abertura	3% a 5%	«Ausente: obra pronta, negócio parado»	Equipe sem treino, mercado sem saber que você existe.
Contingência	10% a 15%	«Zero: aditivo sem cobertura»	Não é otimismo: é aditivo de obra sem dinheiro para pagá-lo.

Tabela 6.1 · A tabela de sanidade (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, cap. 03). Faixas e alertas literais; última coluna resumida de «O que as proporções revelam», na mesma fonte.

Duas observações. A fonte não tem linha para projeto e licenciamento (soft costs: arquitetura, engenharia, licenças, jurídico); aqui eles vêm separados, como no Capítulo 2, e tiram pontos dos outros componentes. E o OS&E na borda de baixo é esperado pela própria regra da fonte (Capítulo 4); ausente é defeito.

Dois orçamentos, a mesma soma, e só um profissional

A fonte propõe um teste. Dois projetos pedem o mesmo valor. O primeiro diz: construção, tanto; móveis e outros, tanto. O segundo abre os hard costs por etapa, cota o FF&E por unidade-modelo, calcula o OS&E pela regra dos três jogos, dá à pré-abertura um cronograma de 90 dias e justifica a contingência pelo perfil de risco. «O valor é o mesmo. A resposta do investidor, não.» O primeiro «recebe perguntas desconfiadas. O segundo recebe perguntas interessadas.» A diferença é a prova de que a conta foi feita, a mesma que a escala de evidência por linha do Capítulo 1 registra.

O CAPEX não é só um número. É a primeira demonstração de competência do developer.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 03

Cada tipologia tem a sua assinatura

Um resort carrega áreas comuns pesadas, como restaurantes, spa e piscinas, e os hard costs sobem. Uma pousada enxuta concentra mais no FF&E por quarto. E «Um glamping desloca dinheiro da alvenaria para a experiência: menos concreto, mais design, natureza como protagonista.» Por isso o primeiro passo da Metodologia Zion de Análise de Investimento é definir a tipologia: «O mapa percentual de um não serve para o outro.» Desvio explicado pela tipologia é assinatura; sem explicação, é erro.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Os hard costs da fase um de Marina estão em 59,0%, um ponto abaixo da faixa. Erro ou explicação? Escreva o palpite antes de seguir.

Marina passa pela tabela de sanidade

No Capítulo 5, Marina fechou a fase um: três cabanas, infraestrutura para cinco, apoio de 30 metros quadrados, R$ 1.237.400. Agora cada linha vira percentual, com a faixa ao lado.

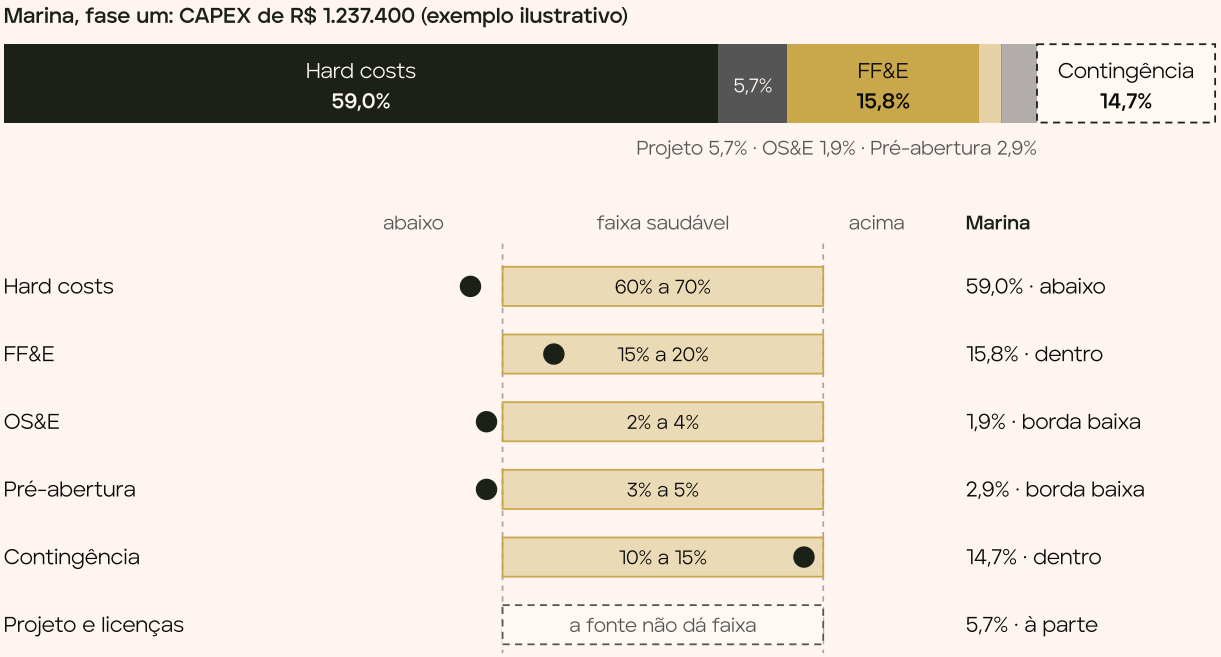


Figura 6.1 · O CAPEX de Marina contra as faixas de sanidade (exemplo ilustrativo; faixas do Volume 05, edição do projeto, cap. 03). O ponto fica na posição proporcional dentro da faixa.

LINHA	VALOR	% DO CAPEX	FAIXA	LEITURA
Hard costs (rede, obra, apoio)	R$ 730.000	59,0%	60% a 70%	Um ponto abaixo, com explicação
Projeto e licenciamento	R$ 70.000	5,7%	sem faixa	Linha própria do módulo
FF&E	R$ 195.000	15,8%	15% a 20%	Dentro, perto do piso
OS&E	R$ 23.400	1,9%	2% a 4%	Borda de baixo: conferir
Pré-abertura	R$ 36.500	2,9%	3% a 5%	Borda de baixo: conferir
Contingência	R$ 182.500	14,7%	10% a 15%	Dentro, perto do teto
CAPEX da fase um	**R$ 1.237.400**	**100%**		

Tabela 6.2 · O CAPEX de Marina em percentuais (exemplo ilustrativo; faixas do Volume 05, edição do projeto, cap. 03). Arredondados a uma casa; somam 100,0%.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

A leitura de Marina, linha por linha

Passo 1 · Hard costs a 59,0%. Não é erro. Os R$ 70.000 de projeto estão fora; se entrassem, a linha iria a 800.000 ÷ 1.237.400 = 64,7%, no meio da faixa. E a contingência de primeira obra, 25% sobre os hard costs, pesa 14,7% e empurra o resto para baixo.

Passo 2 · FF&E a 15,8%. Dentro, e longe do alerta de 10% para produto que vende experiência.

Passo 3 · OS&E e pré-abertura na borda. Pedem segunda olhada, não correção automática. Marina confere as cinco listas do inventário operacional e o checklist da pré-abertura do Capítulo 4; parte da rouparia pode estar no mobiliário. Se faltar item, a linha sobe. Se nada faltar, ela escreve isso.

Passo 4 · A frase. "Hard costs um ponto abaixo porque projeto e licenciamento estão separados e a contingência é de primeira obra; OS&E e pré-abertura na

> borda de baixo, conferidos item a item."
>
> Conferência: 730.000 + 70.000 + 195.000 + 23.400 + 36.500 + 182.500 = 1.237.400.

Custo por chave: o CAPEX dividido pelas unidades

A segunda leitura é por unidade. Em hotelaria, cada unidade hospedável é uma chave, porque é o que se entrega ao hóspede. Custo por chave é o CAPEX dividido pelas unidades que ele põe à venda. Marina, fase um: 1.237.400 ÷ 3 = **R$ 412.467 por chave**.

> VOCABULÁRIO DO MÓDULO · LACUNA DE FONTE
>
> "Custo por chave" não é termo dos volumes da Zion, que trabalham com custo por metro quadrado na obra e custo por unidade no FF&E. O F01 o usa sempre com a mesma conta: CAPEX da fase, sem terreno e sem giro, dividido pelas unidades da fase. Se incluir terreno ou giro, diga ao lado do número.

A infraestrutura comum e o efeito de escala

Infraestrutura comum é o que serve ao conjunto, não a uma unidade: acesso, energia, água, esgoto, apoio, projeto do conjunto. Dentro da capacidade para a qual foi desenhada, ela custa quase o mesmo para poucas ou muitas unidades. Dividido o CAPEX pelas chaves, cada uma carrega uma fatia dela: grande com poucas chaves, menor com mais. É o efeito de escala no CAPEX.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · NÚMEROS REDONDOS, SEM RELAÇÃO COM NENHUM PROJETO

A mesma infraestrutura, três tamanhos

Infraestrutura comum de R$ 300.000 e unidade completa de R$ 200.000. Com 3 unidades: (300.000 + 600.000) ÷ 3 = R$ 300.000 por chave. Com 6: (300.000 + 1.200.000) ÷ 6 = R$ 250.000. Com 12: (300.000 + 2.400.000) ÷ 12 = R$ 225.000. A fatia da infraestrutura cai de 100.000 para 50.000 e 25.000. O ganho perde força com o tamanho. E tem dois limites: a infraestrutura só custa o mesmo até a capacidade desenhada, e o mercado precisa comprar as noites das chaves a mais.

Nenhuma conta de CAPEX diz se haverá hóspede para mais chaves; isso Marina leu no D02. Custo por chave é lente, não argumento para construir mais.

REVISITE · D05

Sem consultar: qual é o passo 3 do Teste da Fase Mínima Viável™ (Volume 04 · Estratégia)? Confira: «Divida o custo de infraestrutura fixa pelo número de unidades da fase. Se o valor por unidade ficar acima de quinze por cento do CAPEX unitário, a fase está pequena demais para carregar a rede.» Para Marina, a rede pesava demais com três e com cinco: orçá-la ficou como tarefa. Com o CAPEX reaberto, a conta muda: com cinco passa por pouco, e com três não (a conta vem logo abaixo).

Fasear sem refazer a rede

Em Marina, a escala chega no tempo. A rede de R$ 250.000 foi dimensionada para cinco, mas na fase um só três a carregam: R$ 83.333 por chave. Com as cinco, R$ 50.000. A tentação é fazer a rede só para três. O Volume 05 responde: «Nunca desenhe um projeto que só funciona inteiro. Desenhe um organismo que cresce.» A infraestrutura da fase um se dimensiona para o projeto completo e se constrói uma vez; no exemplo da fonte, ela «não se divide por três — ela ancora a fase 1». O Volume 04, como o D05 mostrou, completa: quando a rede pesa muito, «fasear a infraestrutura não economiza, apenas adia e encarece.»

Refazer infraestrutura é a forma mais cara de economizar.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 16

A fase dois mostra o outro lado. O D05 a estimava em cerca de R$ 493.300; com as linhas do F01, são duas cabanas sobre a rede pronta: obra R$ 260.000, ampliação do apoio R$ 12.000, FF&E R$ 130.000, OS&E R$ 15.600, pré-abertura de 5% sobre os R$ 272.000 de obra e apoio (R$ 13.600), mobilização da retomada de mais 5% (R$ 13.600; a regra é do Volume 04, trazida pelo D05, que a aplicava de 5% a 10% sobre o bloco da fase; aqui ela incide sobre os mesmos R$ 272.000 de obra e apoio) e a contingência. Com experiência, o degrau seria 15% sobre os mesmos R$ 272.000 (R$ 40.800), mas a conferência reprova: daria 8,4% do CAPEX da fase, abaixo do piso de 10%. A regra do módulo manda subir até passar o piso: 20% sobre R$ 272.000, R$ 54.400, 10,9% da fase: o primeiro degrau redondo que passa (o mínimo exato seria 18,2%). Total: **R$ 499.200**, ou **R$ 249.600 por chave**, porque nenhuma das duas paga rede. As cinco cabanas somam 1.237.400 + 499.200 = R$ 1.736.600: **R$ 347.320 por chave**. «O total investido ao final é semelhante. O caminho até ele é outro universo.» (Volume 05, edição do projeto, cap. 16)

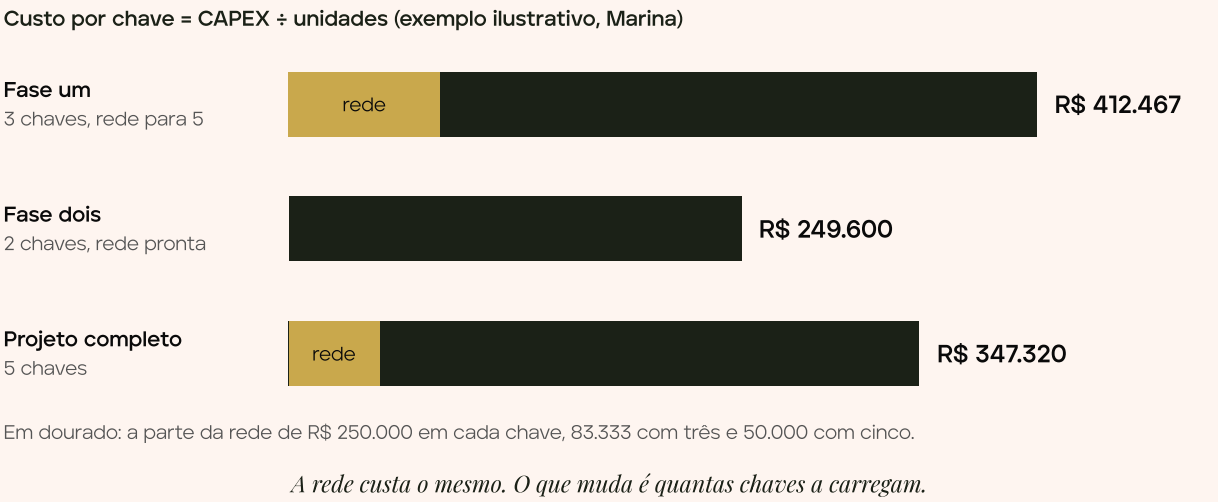


Figura 6.2 · Custo por chave de Marina por fase (exemplo ilustrativo). Conferência: 1.237.400 ÷ 3 = 412.467; 499.200 ÷ 2 = 249.600; 1.736.600 ÷ 5 = 347.320.

Qual vai para o investidor? Os três. O da fase um é a chave que o cheque de agora paga; o do projeto completo se compara com a mesma tipologia; o da fase dois é o custo de crescer sobre a base pronta. Mostrar só o mais bonito convida a pergunta desconfiada.

Volte ao teste do Volume 04. Com o CAPEX reaberto, a rede por chave com cinco, R$ 50.000, sobre o custo por chave do projeto completo, R$ 347.320, dá 14,4%: passa, por pouco. Com três chaves, não passa. O teste continua pedindo o orçamento escrito da rede.

A segunda leitura: o CAPEX no tempo

Existe, diz a fonte, uma «segunda leitura do CAPEX que quase ninguém faz»: a leitura no tempo. O CAPEX não sai de uma vez. Segue uma ordem:

- Terreno e projetos: antes de tudo.
- Terraplenagem e fundações: primeiros meses.
- Estrutura e acabamento: o corpo da obra.
- FF&E e OS&E: reta final.
- Pré-abertura: últimos 60 a 90 dias.

> *Você não precisa ter todo o capital no dia um. Precisa ter o capital certo, na fase certa.*
>
> VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 03

A edição de captação do Volume 05 acrescenta: «Desembolso no mês do marco, não distribuído linearmente.» Marco é uma etapa física verificável, como fundação pronta ou cobertura fechada; o dinheiro sai quando ela é


medida. É a medição física que segura o orçamento (Capítulo 3). Contratos e medição são do pilar E · Implantar, com engenheiro e advogado. Aqui importa saber quais trimestres pesam.

O cronograma de Marina em cinco trimestres

Marina distribui os R$ 1.054.900 anteriores à contingência pela ordem da fonte. O terreno já é dela. A contingência de R$ 182.500 fica fora: é a reserva que a Régua do Quanto Captar™ manda manter «fora do cronograma de marcos», usada só quando o imprevisto aparece.

TRIMESTRE	O QUE SAI	DESEMBOLSO	ACUMULADO	QUEM PAGA
T1	Projeto e licenciamento	R$ 70.000	R$ 70.000	Capital próprio
T2	Infraestrutura para cinco	R$ 250.000	R$ 320.000	Próprio R$ 151.120; lacuna R$ 98.880
T3	Obra das cabanas e apoio	R$ 240.000	R$ 560.000	Lacuna
T4	Obra das cabanas e apoio	R$ 240.000	R$ 800.000	Lacuna
T5	FF&E, OS&E e pré-abertura	R$ 254.900	R$ 1.054.900	Lacuna
Fora do cronograma	Contingência reservada	R$ 182.500		Lacuna
Dia da abertura	Capital de giro disponível	R$ 87.500		Lacuna

Tabela 6.3 · Cronograma de desembolso da fase um de Marina (exemplo ilustrativo; ordem do Volume 05, edição do projeto, cap. 03; contingência fora dos marcos pela Régua do Quanto Captar™, edição de captação, cap. 04). Capital próprio: R$ 380.000 investíveis (Z02) menos R$ 158.880 da Porta 3 = R$ 221.120. Conferência: 221.120 − 70.000 = 151.120; 250.000 − 151.120 = 98.880.

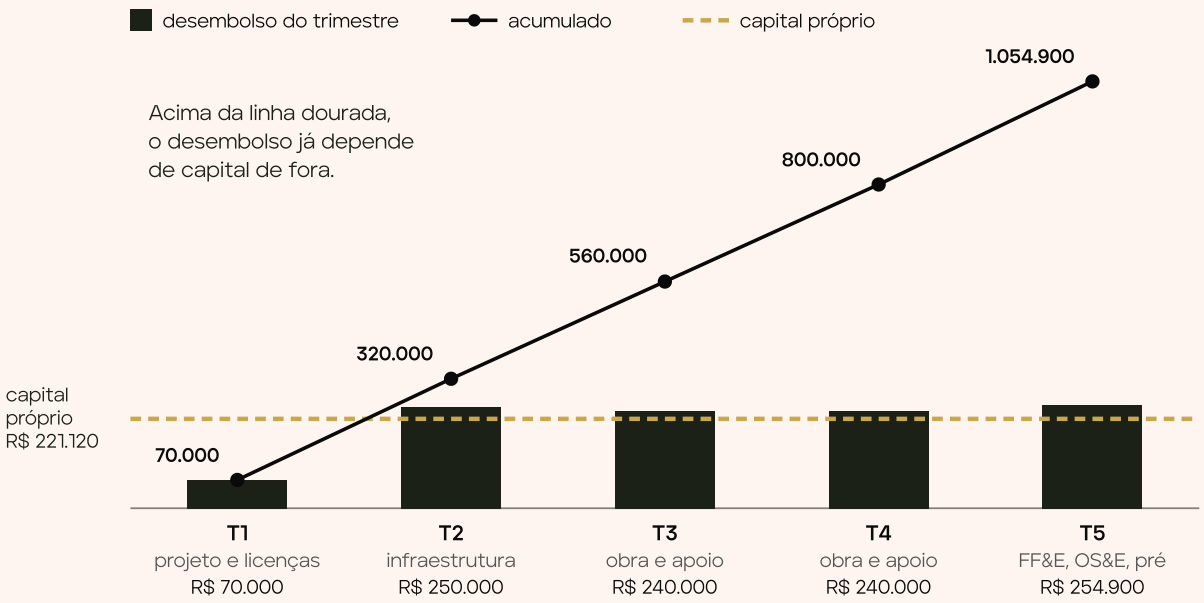

Fora do gráfico: contingência de R$ 182.500 reservada e giro de R$ 87.500 no dia da abertura.

Figura 6.3 · Desembolso de Marina em cinco trimestres, acumulado e capital próprio (exemplo ilustrativo; mesma escala; ordem do Volume 05).

A leitura: o capital próprio paga o T1 inteiro e cerca de 60% do T2 (151.120 ÷ 250.000). A lacuna não começa no fim da obra; começa no meio da infraestrutura. Marina não precisa do dinheiro de fora no dia um, mas precisa dele contratado antes de a rede chegar à metade. Sem isso, volta ao mercado com a obra parada, a pior posição de negociação, segundo a fonte.

A contingência não tem trimestre, mas precisa existir desde o T2, porque é na infraestrutura que o imprevisto mais aparece. O giro de R$ 87.500 precisa estar disponível no dia da abertura. Somados ao que falta da obra, formam a lacuna que o Capítulo 8 calcula pela Régua do Quanto Captar™: 833.780 + 182.500 + 87.500 = R$ 1.103.780.

O passo seguinte é mês a mês, juntando obra e operação: a Curva de Caixa Acumulado™, da edição de captação, que fica para o F03. Guarde duas ideias: a curva parte de caixa inicial zero, e «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.»

Jornada B · Rafael lê a própria fase dois

Rafael já opera; a régua é a mesma. A fase dois, chalé 5 com o efluente, soma R$ 266.700 com todas as linhas do F01 (o Capítulo 7 abre cada uma).

LINHA	VALOR	% DO CAPEX	FAIXA	LEITURA
Hard costs (efluente 45.000 + obra 125.000)	R$ 170.000	63,7%	60% a 70%	Dentro
Projeto e licenciamento	R$ 15.000	5,6%	sem faixa	Linha própria do módulo
FF&E	R$ 35.000	13,1%	15% a 20%	Abaixo, acima do alerta de 10%
OS&E	R$ 4.200	1,6%	2% a 4%	Abaixo: conferir a rouparia de giro
Pré-abertura	R$ 8.500	3,2%	3% a 5%	Dentro
Contingência	R$ 34.000	12,7%	10% a 15%	Dentro: 20% dos hard costs
CAPEX da fase dois	**R$ 266.700**	**100%**		

Tabela 6.4 · A fase dois de Rafael em percentuais (exemplo ilustrativo; faixas do Volume 05, edição do projeto, cap. 03). Arredondados; a soma arredondada dá 99,9%.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Uma chave carrega o efluente sozinha

O custo por chave da fase é o próprio CAPEX: 266.700 ÷ 1 = **R$ 266.700**, sem o giro de R$ 39.000. O efluente de R$ 45.000 é infraestrutura comum, condição para existir um quinto chalé, mas nesta fase uma só chave o paga: 45.000 ÷ 266.700 = 16,9%, acima dos 15% da regra do Volume 04. A base mudou desde o D05, que media 28,1% sobre os R$ 160.000 do chalé; sobre o CAPEX reaberto, o peso cai, mas continua acima. É ele também que explica o FF&E abaixo da faixa: são 26,5% dos hard costs (45.000 ÷ 170.000). A frase de Rafael: "FF&E abaixo porque a fase carrega infraestrutura do conjunto; custo por chave alto porque um só chalé paga o efluente." Comparar com os chalés existentes só vale com o investimento original aberto pelo mesmo critério.

No tempo, a ordem se repete. A tentação de quem já opera é pagar cada etapa com o caixa do mês; o Capítulo 7 mostra por que isso aperta o caixa.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Ponha cada linha do CAPEX em percentual, com a faixa ao lado, e escreva a explicação ou a correção de cada desvio. Calcule o custo por chave da fase um e do projeto completo. Distribua o CAPEX pela ordem da fonte e marque o trimestre em que o capital próprio acaba.

B

Quero crescer

Faça a mesma leitura na expansão ou no retrofit. Separe a infraestrutura do conjunto da que serve só às unidades novas e veja quantas chaves pagam cada uma. Monte a ordem do desembolso e marque o que sai do capital reservado e o que sairia do caixa da operação.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as cinco faixas da tabela de sanidade e o alerta dos hard costs?

2. Por que um OS&E na borda de baixo não é, por si só, erro?

3. Como se calcula o custo por chave, e por que o da fase um de Marina supera o do projeto completo?

4. Em que ordem o CAPEX sai do caixa, e onde fica a contingência?

5. Em que trimestre começa a lacuna de Marina, e o que isso muda?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

— O investidor lê primeiro os percentuais: as proporções mostram o que falta.

- Faixas de sanidade são referência: cada desvio pede explicação escrita ou correção.
- Mesma soma, respostas opostas: o que muda é a prova de que a conta foi feita.
- Cada tipologia tem a sua assinatura; o mapa percentual de uma não serve para outra.
- Custo por chave é o CAPEX da fase dividido pelas unidades; a infraestrutura comum pesa mais em fases pequenas.
- Fasear unidades, sim; fasear a rede, não: refazer infraestrutura é a forma mais cara de economizar.
- O CAPEX também se lê no tempo: desembolso por marco, contingência fora do cronograma, giro no dia da abertura.

CURIOSIDADE

Para a edição de captação do Volume 05, o gráfico do saldo acumulado é o único que precisa existir numa conversa de captação: «ele comunica em cinco segundos o que uma tabela leva dez minutos para dizer.» Seu cronograma é o primeiro tijolo dele.

REFLEXÃO

Se alguém recebesse o seu orçamento sem você na sala, faria perguntas desconfiadas ou interessadas? Qual linha provocaria a primeira?

DICA

Nesta semana, acrescente três colunas à planilha do CAPEX: percentual do total, faixa de sanidade e a frase que explica cada desvio.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 06

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Orçamento de R$ 1.000.000: hard costs R$ 850.000, FF&E R$ 120.000, pré-abertura R$ 30.000, sem OS&E e sem contingência. Já feito: hard costs a 85%, acima do alerta de 80%. Termine a leitura e diga o que faltou.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O seu CAPEX em percentuais: linha, faixa, leitura e a explicação ou correção de cada desvio.

3. O custo por chave da fase atual e do projeto completo, e quanto da infraestrutura comum cada chave carrega.

4. O cronograma de desembolso em cinco marcos, com o acumulado. Em que marco o capital próprio acaba? Onde ficam contingência e giro?

5. Jornada A: a frase para o investidor sobre a linha mais fora da faixa. Jornada B: a infraestrutura comum da expansão, quantas chaves a pagam e quais etapas sairiam do caixa da operação.

CAPÍTULO 07

REPOSIÇÃO, RETROFIT E EXPANSÃO

Quem já opera: reposição, *retrofit e expansão.*

Quem já opera tem três contas de obra, quatro reservas que vêm antes delas e uma pergunta honesta: quanto da obra o caixa da operação aguenta pagar?

NESTE CAPÍTULO

- Os três tipos de CAPEX de quem opera: reposição, retrofit e expansão.
- O fundo de reposição e a depreciação, explicados sem contabilês.
- As quatro reservas da Reserva de Sazonalidade™, antes de qualquer obra.
- A causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™ e os meses de fôlego da Folha Única Zion™.
- Quanto o caixa da operação pode financiar, e por que o giro nunca entra.
- O retrofit de Rafael com o CAPEX aberto e a fase dois dele, linha por linha.

Rafael opera quatro chalés há três anos. Quando pensa em obra, pensa como dono de operação: "vou pagando aos poucos, com o que entra". É uma frase sensata, e é a que mais quebra quem já opera. Quem opera tem uma vantagem, receita e dado real, e uma armadilha: a obra e as contas do mês saem do mesmo lugar. Este capítulo separa as duas e transforma o "aos poucos" numa regra com número.

Quem opera tem três contas de obra, não uma

Quem opera tem três tipos de CAPEX, cada um com a sua fonte (divisão do módulo). **Reposição**: trocar o que gastou, no mesmo padrão. **Retrofit**: requalificar o que existe para um padrão novo, como os chalés 1 a 3 de Rafael, reposicionados para casais a R$ 528. **Expansão**: somar unidades e a infraestrutura que elas exigem, como o chalé 5 e o efluente de Rafael ou a quarta e a quinta cabana de Marina.



Figura 7.1 · Os três tipos de CAPEX de quem opera, com os números de Rafael (exemplo ilustrativo; divisão em três tipos: elaboração do módulo; fundo: Etapa 02 e Volume 05; causa 5: Etapa 09).

Da esquerda para a direita crescem o dinheiro e o risco. A reposição é pequena e certa; o retrofit, médio e escolhido; a expansão, grande, pede capital que a operação sozinha raramente tem. O Manual Oficial lembra que o capital tem finalidades distintas, entre elas: «Existe o capital para expansão.» E avisa:

Misturar essas finalidades normalmente gera desequilíbrios financeiros.

Reposição: o fundo que paga o desgaste

FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment) é o que o hóspede toca. O Volume 05 resume: «FF&E se deprecia.» A Etapa 02 põe a linha nos custos fixos: «Reserva de reposição: de 3% a 5% da receita, provisionada mensalmente.» O Volume 05 repete a faixa; a Etapa 09 fala em reserva de manutenção de 3% a 6%. O F01 adota 3% a 5% e mostra a divergência: FF&E pesado pode justificar até 6%.

A provisão mensal é OPEX; o que ela paga na troca é CAPEX de reposição. O lançamento no custo é do F02. Se a provisão já está no fixo, não a desconte de novo mais abaixo: contar duas vezes engana tanto quanto esquecer.

Quem não provisiona a reposição está financiando o conforto de hoje com a decadência de amanhã.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 05

LINHA	RAFAEL	MARINA
Receita anual de referência	R$ 380.160 (quatro chalés, D04)	R$ 307.460 (três cabanas, sem rampa, D03)
Fundo a 3% por ano	R$ 11.405 (R$ 950,40 por mês)	R$ 9.224
Fundo a 5% por ano	R$ 19.008 (R$ 1.584 por mês)	R$ 15.373
O que já existe	Reserva de reposição de R$ 12.000 em caixa (Z02)	Provisão de R$ 1.500 por mês no fixo de R$ 12.000, ou R$ 18.000 por ano (D03)
Leitura	Um saldo na faixa de baixo; o fundo precisa ser alimentado todo mês	5,9% da receita: acima dos 5%, dentro dos 6% da Etapa 09

Tabela 7.1 · Fundo de reposição (exemplo ilustrativo; regras: Etapas 02 e 09, Volume 05). Conferência: 380.160 × 3% = 11.404,80; × 5% = 19.008; 307.460 × 3% = 9.223,80; × 5% = 15.373; 18.000 ÷ 307.460 = 5,85%.

Os R$ 12.000 de Rafael são saldo; os 3% a 5% são fluxo. O saldo só se mantém se a linha entrar todo mês; se ela ainda não está no fixo de R$ 13.000, vem antes de qualquer reserva para obra, e o F02 refaz a sobra. E o fundo de reposição não paga retrofit: mantém o padrão, não o muda.

Depreciação sem contabilês

Depreciação é a perda de valor do que foi construído e comprado, pelo tempo e pelo uso. Na Etapa 09: «Depreciação: o que foi construído e comprado perde valor e vai precisar ser reposto. Não sai do caixa agora, mas sai do resultado.»

FERRAMENTA DO MÉTODO · JORNADA DO COMO, ETAPA 09

Tabela de Custo Fixo™

Duas linhas quase nunca lançadas. **Depreciação:** «A conta simples é dividir o valor do que foi investido pela vida útil em meses.» No exemplo da fonte, uma cabana de R$ 180 mil com vida útil de 15 anos deprecia R$ 1.000 por mês (180.000

÷ 180). **Reserva de manutenção:** pintura, telhado, equipamento, de 3% a 6% da receita. Ignorar as duas, diz a fonte, infla o lucro.

É uma divisão. Exemplo ilustrativo, com números inventados só para a conta: enxoval e colchões de R$ 36.000 que o fornecedor diz durar seis anos depreciam 36.000 ÷ 72 = R$ 500 por mês. Sem essa linha, o mês parece R$ 500 melhor, e alguém vai querer retirar a diferença. A depreciação mede quanto patrimônio a operação consumiu; a reserva guarda, em conta separada, o dinheiro da troca. Uma mede, a outra guarda.

Lacuna honesta: as fontes dão a fórmula e um só exemplo de vida útil. Não há tabela por item, e este capítulo não inventa uma: a vida útil vem do fornecedor, da sua experiência de troca e do contador, que cuida da depreciação formal.

Operação que não lança depreciação está distribuindo como lucro um dinheiro que é reposição...

JORNADA DO COMO, ETAPA 09

As quatro reservas vêm antes de qualquer obra

De onde sai o dinheiro do retrofit? Antes, a ordem em que o dinheiro da operação anda.

FERRAMENTA DO MÉTODO · JORNADA DO COMO, ETAPA 09

Reserva de Sazonalidade™

Some o déficit dos meses negativos e divida pelos meses de alta; o valor sai da conta operacional no dia em que a receita entra, «só para cobrir déficit de mês de baixa, nunca para investimento nem para antecipar retirada.» Mais três reservas: despesas anuais (o duodécimo, um doze avos do total do ano), manutenção e reposição de 3% a 6% da receita, emergência de dois a três meses de custo fixo. As quatro podem morar na mesma conta, desde que o controle saiba quanto é de cada uma.

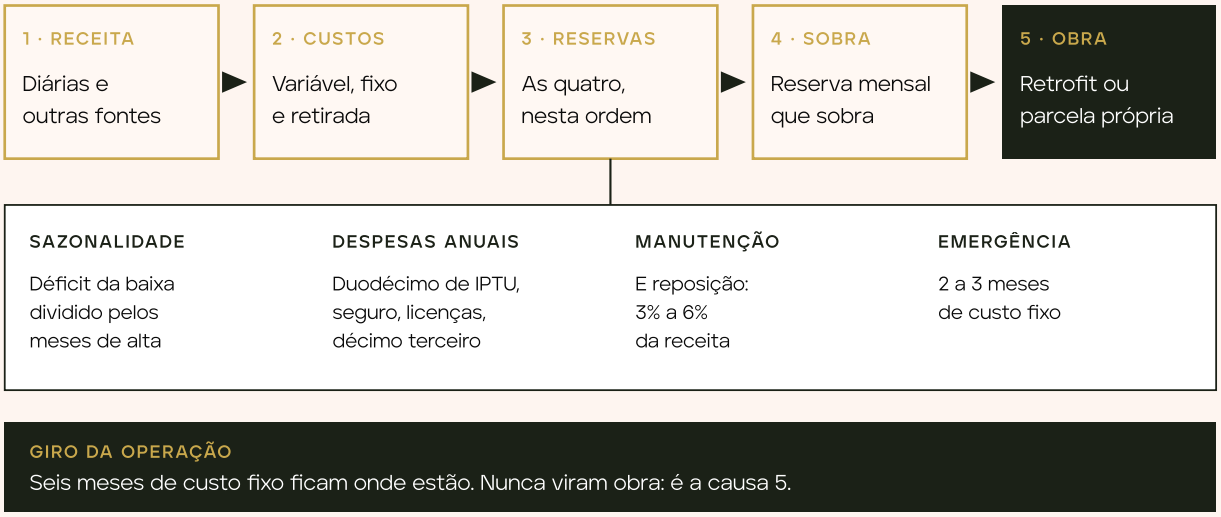


Figura 7.2 · A ordem do dinheiro na operação (quatro reservas: Reserva de Sazonalidade™, Jornada do COMO, Etapa 09; só a sobra vai para obra e o giro nunca: regra do módulo).

Cada reserva protege um mês que vai chegar. Se a obra passa na frente, esse mês fica descoberto.

Dinheiro visível na conta operacional é dinheiro gasto.

JORNADA DO COMO, ETAPA 09

RESERVA	REGRA DA FONTE	RAFAEL	MARINA
Sazonalidade	Déficit da baixa ÷ meses de alta	A calcular com os doze meses; no pior trimestre, a sobra com a responsável fica negativa	R$ 16.678, já dentro do giro de R$ 87.500 (Cap. 5)
Despesas anuais	Duodécimo do total anual	A levantar no extrato de doze meses	Seguro e taxas já são linhas mensais do fixo (D03)
Manutenção e reposição	3% a 6% da receita (F01 usa 3% a 5%)	R$ 950,40 a R$ 1.584 por mês; saldo de R$ 12.000	R$ 1.500 por mês, no fixo
Emergência	2 a 3 meses de custo fixo	R$ 26.000 a R$ 39.000, cobertos pelo giro de R$ 78.000	R$ 36.000 de segurança, dentro do giro

Tabela 7.2 · As quatro reservas nos dois personagens (exemplo ilustrativo; regras: Jornada do COMO, Etapa 09). Conferência: 2 × 13.000 = 26.000; 3 × 13.000 = 39.000; 6 × 13.000 = 78.000; 3 × 12.000 = 36.000.

A causa 5: obra paga com o dinheiro do mês

O Diagnóstico do Caixa Apertado™ (Jornada do COMO, Etapa 09) lista seis causas de faturamento alto com caixa apertado. A quinta é a de quem cresce: «5 · Investimento pago com caixa operacional. Reforma, móvel novo, unidade extra, tudo saindo do mesmo lugar de onde saem as contas do mês.» O efeito aparece nos meses de fôlego da Folha Única Zion™: saldo mais reservas, dividido pelo custo fixo mensal. «Abaixo de dois meses em operação sazonal é zona de risco; de quatro a seis é confortável.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO

A reforma que coube no saldo e não coube no ano

Pousada de seis quartos, fixo de R$ 20.000 por mês, R$ 110.000 na conta com as reservas misturadas: fôlego de 110.000 ÷ 20.000 = **5,5 meses**. O dono paga à vista uma reforma de R$ 60.000, "porque o dinheiro estava ali": 50.000 ÷ 20.000 = **2,5 meses**. Vêm três meses de baixa com déficit de R$ 8.000 cada: 26.000 ÷ 20.000 = **1,3 mês**, zona de risco. A reforma estava certa; o dinheiro que a pagou era a reserva da baixa.

Em Rafael: o F00 achou 2,9 meses de fôlego. Com o custo da responsável, o giro passa a 6 × 13.000 = R$ 78.000 e o caixa livre cai para 140.000 − 18.000 − 12.000 − 78.000 = **R$ 32.000**, cerca de 2,5 meses. Com o pessoal de R$ 18.000, o capital real é **R$ 50.000**, não os R$ 56.000 do F00.

Quanto o caixa da operação pode financiar

As fontes não trazem fórmula numérica para isso; trazem a causa 5, a régua de fôlego e a pista do Volume 05, em que a segunda fase é «Financiada em parte pelo EBITDA da Fase 1» (EBITDA: resultado antes de juros, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização). Repare no "em parte". A regra do módulo tem duas frases: a operação só financia obra com a reserva mensal que sobra depois das quatro reservas; e o giro nunca entra, porque usá-lo é a causa 5 com outro nome.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Quanto a operação de Rafael pode pagar

Passo 1 · Reserva mensal. Sobra média de R$ 8.328 (Z02) menos R$ 1.000 da responsável (D04): R$ 7.328. Metade, mais R$ 2.000 da Porta 4: 0,5 × 7.328 + 2.000 = **R$ 5.664** (o Z02 e o D05 usaram R$ 6.164, antes desse custo).

Passo 2 · Retrofit no tempo. 86.250 ÷ 5.664 = **15,2 meses**, e não os 14 do D05.

Passo 3 · Pior caso. No conservador (pior trimestre, diária de R$ 432), a sobra era R$ 825,60. Com a responsável: 825,60 − 1.000 = **−R$ 174,40 por mês**, conta que nenhum módulo tinha feito. Não há nada para financiar obra: a reserva para e quem cobre o mês é a reserva de sazonalidade.

Passo 4 · Ordem de grandeza. Um ano de reserva no cenário base: 12 × 5.664 = R$ 67.968, cerca de 22% da necessidade da fase dois (R$ 305.700). A operação ajuda; não paga a expansão sozinha.

Média não paga boleto em maio. Se a ampliação pedir dívida, a pergunta do Volume 05 (edição de captação) é se existe «operação madura gerando caixa que sustenta o serviço durante a implantação do novo». Isso é o F05; nenhum módulo promete crédito.

Retrofit também tem CAPEX aberto

Reforma parece pequena porque o imóvel já existe. A Etapa 02 dá a ela contingência própria: «Adequação de imóvel pronto: de 15% a 20%, porque o que se encontra ao abrir paredes é imprevisível.»

Rafael usou 15%, o limite de baixo: R$ 25.000 por chalé mais 15% dá R$ 28.750; três chalés, R$ 86.250. A 20%, seriam 3 × 30.000 = R$ 90.000. E os R$ 25.000 ainda são número único: precisam ser abertos em obra, FF&E e OS&E (suprimentos da operação, como rouparia), cada linha com evidência, de preferência cotação escrita.

LINHA	VALOR	SITUAÇÃO
Obra e itens dos chalés 1 a 3	3 × R$ 25.000 = R$ 75.000	Dentro; abrir por linha e cotar
Contingência de adequação, 15%	R$ 11.250	Dentro; piso da faixa de 15% a 20%
Retrofit orçado	R$ 86.250	Pago pela reserva mensal, em 15,2 meses
Receita perdida, chalé bloqueado 30 dias na baixa	3 × R$ 3.696 = R$ 11.088	Fora; custo de oportunidade (Z02)
Rouparia e área de resíduo	Orçamento a levantar	Fora; entram já (D05)
Chalé 4, casa da família	Orçamento próprio	Fora; não definido (D05)

Tabela 7.3 · O retrofit de Rafael aberto (exemplo ilustrativo; Z02, D05; contingência: Etapa 02). Conferência: 75.000 × 15% = 11.250; 12 noites × R$ 308 = 3.696 por chalé; 86.250 + 11.088 = 97.338.

Chalé em obra não vende diária. A Lista do Que Ninguém Orça™ (Jornada do COMO, Etapa 02) tem o item: «6 · O custo da unidade bloqueada para manutenção. Dias em que a unidade não pode ser vendida.» É custo de oportunidade, a receita que não entrou. Visto inteiro, o retrofit custa R$ 86.250 mais R$ 11.088, R$ 97.338. Por isso a obra vai para a baixa, um chalé por vez.

REVISITE · D05

Sem consultar: quais são as três condições do Gatilho de Expansão Zion™ de Rafael? Confira: demanda de doze meses com casais a 59% ou mais, a R$ 528; caixa com a parcela própria mais 3 × R$ 13.000 = R$ 39.000; a responsável operando com processos escritos. Os R$ 39.000 voltam aqui como giro da fase dois.

A fase dois de Rafael, aberta

O D05 deixou a fase dois em R$ 205.000: efluente de R$ 45.000 e chalé 5 de R$ 160.000. Faltam projeto e licenciamento, OS&E, pré-abertura e contingência pelo

perfil: é a primeira obra nova que Rafael conduz, então 20% sobre os hard costs (construção e infraestrutura).

LINHA	D05	F01	REGRA
Hard costs: efluente	R$ 45.000	R$ 45.000	A confirmar com orçamento
Hard costs: obra do chalé 5	R$ 125.000	R$ 125.000	Z02
Projeto e licenciamento	fora	R$ 15.000	Linha própria (Cap. 2)
FF&E	R$ 35.000	R$ 35.000	Z02
OS&E	fora	R$ 4.200	12% do FF&E
Pré-abertura	fora	R$ 8.500	5% dos hard costs
Contingência	fora	R$ 34.000	20% dos hard costs
CAPEX da fase dois	**R$ 205.000**	**R$ 266.700**	Diferença de R$ 61.700
Capital de giro	reserva do gatilho	R$ 39.000	3 × R$ 13.000
Necessidade de capital		**R$ 305.700**	A lacuna, no Capítulo 8

Tabela 7.4 · A fase dois de Rafael aberta (exemplo ilustrativo; OS&E e pré-abertura: Volume 05; contingência: Etapa 02). Conferência: 12% × 35.000 = 4.200; 5% e 20% × 170.000 = 8.500 e 34.000; soma 266.700; 34.000 ÷ 266.700 = 12,7%; + 39.000 = 305.700.

Pelas faixas de sanidade do Capítulo 6: hard costs 63,7%, dentro dos 60% a 70%; FF&E 13,1%; pré-abertura 3,2%; contingência 12,7%. O OS&E, 1,6%, fica abaixo dos 2% a 4%: conferir se parte da rouparia está no FF&E. O giro é a reserva do gatilho; a rampa de um chalé a mais, absorvida pela operação, se confere no F03.

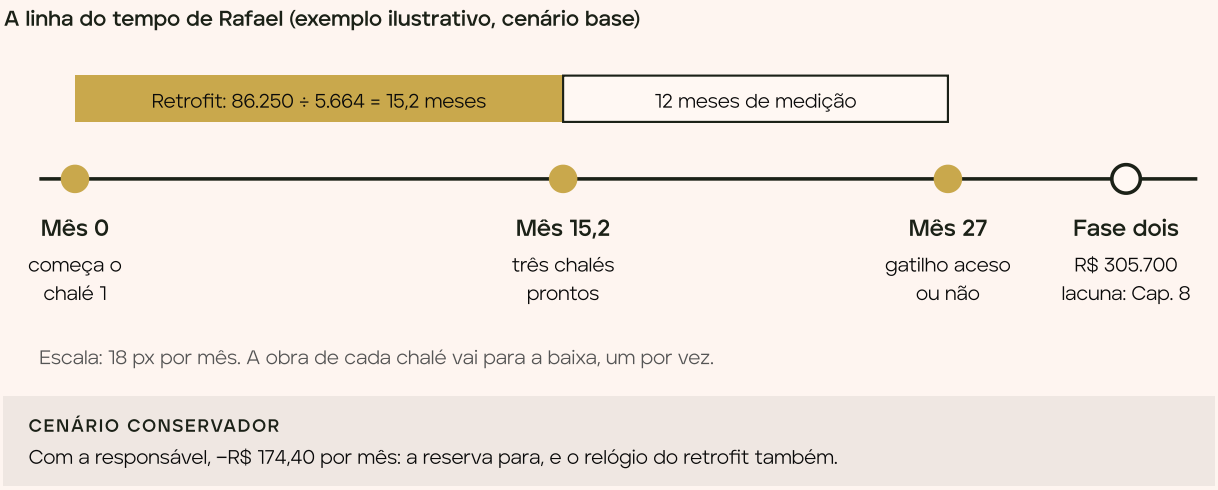


Figura 7.3 · Rafael: retrofit em 15,2 meses, doze meses de medição do gatilho (D05) e só então a fase dois (exemplo ilustrativo; mês 27 = 15,2 + 12, arredondado).

A ordem certa: o retrofit, que a operação paga devagar; a prova de doze meses; só então a fase dois, que a operação não paga sozinha. O Capítulo 8 desconta o capital real de R$ 50.000 e chega à lacuna e ao pedido. A pergunta do Manual cabe na parede da obra: «Esta decisão aumenta o valor do empreendimento ou apenas aumenta o custo?»

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Marina vai operar, e o fundo começa no primeiro mês. A provisão de R$ 1.500 por mês já está no fixo de R$ 12.000: R$ 18.000 por ano, 5,9% da receita ilustrativa de R$ 307.460, acima dos 3% a 5% (R$ 9.224 a R$ 15.373) e dentro dos 6%, coerente com hidromassagem e lareira. Provisão em conta separada desde o primeiro hóspede; o giro de R$

B

Quero crescer

Classifique cada obra em reposição, retrofit ou expansão. Calcule o fundo a 3% e a 5%, liste as quatro reservas com valor e a reserva mensal que sobra no base e no conservador. Abra o retrofit com contingência de 15% a 20% e a receita perdida; a expansão, com todas as linhas e o giro, vai para o Capítulo 8.

87.500 nunca paga obra; as cabanas 4 e 5 são expansão.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os três tipos de CAPEX de quem já opera, e de onde sai o dinheiro de cada um?

2. Como se calcula a depreciação de forma simples, e qual a diferença entre ela e a reserva de manutenção?

3. Quais são as quatro reservas, e o que a regra do módulo diz sobre o giro?

4. Por que a reserva mensal de Rafael não financia nada no cenário conservador?

5. Que linhas faltavam na fase dois de Rafael no D05?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Quem opera tem três contas de obra: reposição, retrofit e expansão. Cada uma tem a sua fonte de dinheiro.
- O fundo de reposição é de 3% a 5% da receita, todo mês, desde o primeiro ano, e não paga retrofit.
- Depreciação é o valor investido dividido pela vida útil em meses: não sai do caixa, sai do resultado.
- As quatro reservas vêm antes de qualquer obra. O giro nunca vira obra.
- A operação só financia obra com a reserva que sobra depois das reservas, e no pior caso ela pode ser zero.
- Retrofit tem CAPEX aberto, contingência de 15% a 20% e receita perdida durante a obra.
- A fase dois de Rafael, aberta, pede R$ 305.700. A lacuna é o Capítulo 8.

CURIOSIDADE

No exemplo da Tabela de Custo Fixo™, o fixo é R$ 25.790 com retirada e depreciação; sem elas, pareceria R$ 13.590, quase metade. «É exatamente essa diferença que faz tantas operações acharem que estão no azul.» (Jornada do COMO, Etapa 09)

REFLEXÃO

Da última obra que você fez, de qual conta saiu o dinheiro? Se a resposta for "da conta de sempre", que mês ficou descoberto depois dela?

DICA

Esta semana, abra uma conta separada e programe a transferência do fundo de reposição para o dia em que a receita entra, como se fosse uma conta a pagar.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 07

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Cinco cabanas, receita de R$ 400.000 por ano, fixo de R$ 18.000 por mês, reserva livre de R$ 4.000 por mês. Reforma de duas cabanas a R$ 30.000 cada, imóvel pronto. Já feito: fundo a 3% = R$ 12.000 por ano. Calcule o fundo a 5%, a reforma com 15% e com 20% de contingência, os meses de reserva para a de 15% e a emergência de dois a três meses.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Liste o que você quer fazer nos próximos 24 meses e classifique cada item como reposição, retrofit ou expansão. Para cada um, escreva de onde sai o dinheiro.

3. As suas quatro reservas: regra, valor e onde o dinheiro está hoje. Calcule também os seus meses de fôlego.

4. A sua reserva mensal livre, no cenário base e no conservador. Quanto ela paga em doze meses, e quanto da obra isso representa?

5. Abra o seu retrofit ou a sua expansão linha por linha, com contingência pelo perfil, giro e receita perdida. Na Jornada A, escreva a provisão de reposição do primeiro ano e onde ela vai morar.

CAPÍTULO 08

ENTREGÁVEL DO MÓDULO

O seu Mapa do CAPEX e da Necessidade *de Capital.*

O módulo em um documento: o CAPEX aberto e conferido, a proteção justificada, o desembolso por marco e o número exato que falta, numa frase que você defende linha por linha.

NESTE CAPÍTULO

- As oito peças do Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital.
- A Régua do Quanto Captar™: do CAPEX da fase à necessidade de capital externo.
- Lacuna, cobertura própria e a frase do pedido, sem escolher a fonte.
- Cinco alavancas para reduzir a necessidade sem mentir; o limite de perda.
- Ferramenta, caderno, autoavaliação, atividade aplicada e checklist.

Sete capítulos responderam a primeira metade da pergunta do pilar: quanto custa. Falta a segunda: quanto falta. Aqui tudo vira o bloco 4 do Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade, que termina numa frase com o número exato.

Um documento, oito peças

Quase tudo já está nos exercícios dos Capítulos 1 a 7. Agora você organiza para quem não estava junto: o engenheiro, o contador, quem olhar o seu capital no F05 e no F06.

PEÇA	O QUE CONTÉM	NO F01
1 · CAPEX por componente e por linha	Quatro componentes, projeto e licenciamento, evidência de 0 a 3 em cada linha	Caps. 1 a 4
2 · Conferência das faixas	Faixas de sanidade, OS&E contra FF&E, pré-abertura pelas duas regras	Caps. 4 e 6
3 · Contingência e giro justificados	Perfil de risco; giro pela maior das duas regras	Cap. 5
4 · Custo por chave	CAPEX da fase dividido pelas unidades	Cap. 6
5 · Cronograma por marco	Desembolso em marcos verificáveis, reserva fora do cronograma	Caps. 6 e 8
6 · Necessidade, lacuna e cobertura	Régua do Quanto Captar™; na Jornada B, o que o caixa sustenta	Caps. 7 e 8
7 · Frase do pedido	Número exato, distribuição e marcos de liberação	Cap. 8
8 · Pendências, com dono e data	Cotações, regras a confirmar, o que segue para F02 a F06	Todos

Tabela 8.1 · As oito peças do Mapa. Elaboração do F01 sobre o Volume 05 · Investimento (edição do projeto, Caps. 01 a 07; edição de captação, Cap. 04) e a Jornada do COMO, Etapa 02.

A Régua do Quanto Captar™

Captar de menos é o erro mais comum, e o mais caro, porque a segunda rodada acontece no pior momento de negociação da sua vida.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO

O instinto é pedir pouco: «Parece modesto, parece mais fácil de conseguir e parece que dilui menos.» Quem pede de menos volta ao mercado com a obra parada. A régua tira o número da conta, e não do medo.

FERRAMENTA DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 04

Régua do Quanto Captar™

- **CAPEX da fase.** «Inclui terreno, se ele ainda não foi pago.»
- **Capital de giro.** «três meses de custo fixo da operação, disponíveis no dia da abertura.»
- **Reserva de implantação.** «de dez a quinze por cento do CAPEX, fora do cronograma de marcos.» Com regra de uso escrita.
- **Custo da própria captação.** Honorários, laudos, estruturação, registro: «Entre dois e cinco por cento da captação, e sai do seu bolso se não estiver no pedido.»
- **Menos** o capital próprio disponível e o que já existe contratado. «Contratado, não esperado.»

«O resultado é a necessidade de capital externo.»

Duas linhas somem dos pedidos. A reserva, porque «parece que admitir imprevisto enfraquece o pedido». O custo da captação, porque ninguém o vê como projeto: sai do giro, e a operação abre sem fôlego.

NOTA DA ESCOLA · COMO O F01 PREENCHE A RÉGUA

A reserva de implantação já está no CAPEX: é a contingência do Capítulo 5; somá-la de novo contaria duas vezes. **Três meses de fixo são o piso do giro:** vale a maior entre a Etapa 01 e a Etapa 02. **O custo da captação incide sobre a lacuna**, 3% como aproximação declarada, até chegar o orçamento do advogado e do avaliador, pedido «antes, não depois». **O terreno** só entra se ainda não foi pago.

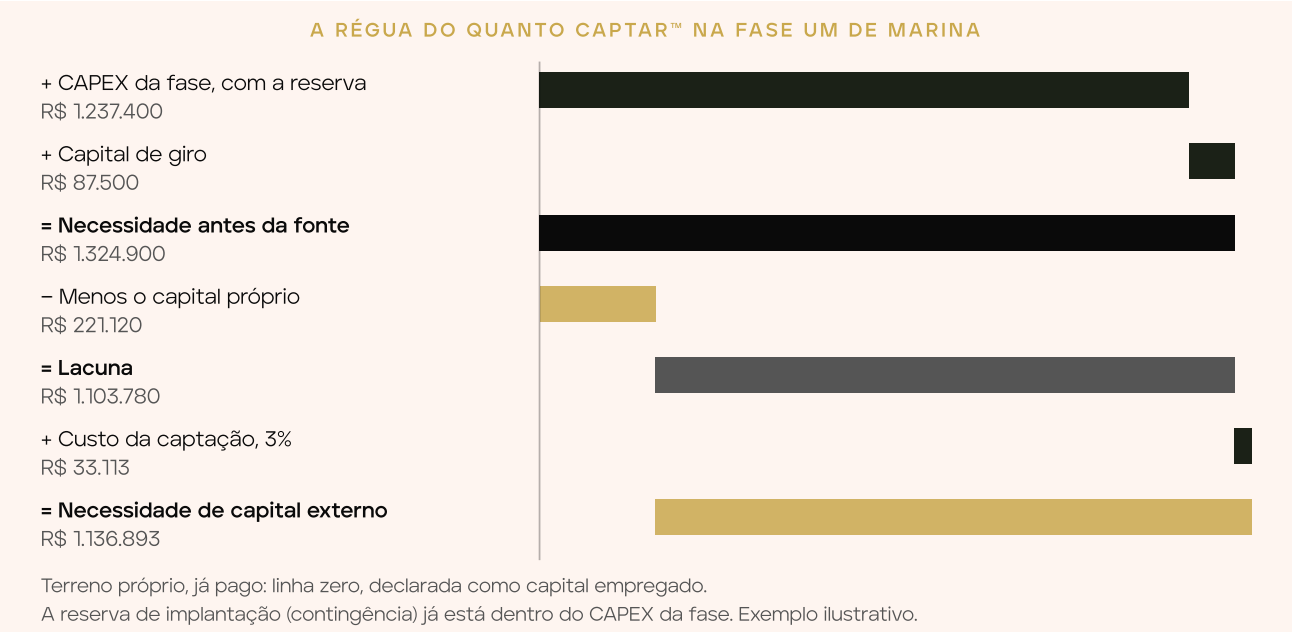


Figura 8.1 · A Régua do Quanto Captar™ na fase um de Marina, em cascata. Linhas: Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 04; regras de contingência e giro do F01. Exemplo ilustrativo.

A conta de Marina e a de Rafael

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina chega ao número do pedido

Hard costs de R$ 730.000 (rede para cinco, três cabanas e apoio), projeto e licenciamento de R$ 70.000, FF&E de R$ 195.000, OS&E de R$ 23.400, pré-abertura de R$ 36.500 e contingência de 25% sobre obra e infraestrutura, R$ 182.500: CAPEX de **R$ 1.237.400**. O terreno é dela e fica fora. Giro pela Etapa 02: 34.828 + 16.678 + 3 × 12.000 = R$ 87.506, ou **R$ 87.500**. Capital próprio: 380.000 menos 158.880 da Porta 3 = **R$ 221.120**.

LINHA DA RÉGUA	MARINA · FASE UM	RAFAEL · FASE DOIS
CAPEX da fase, com a reserva	1.237.400 (reserva de 182.500)	266.700 (reserva de 34.000)
Terreno, se ainda não pago	0, próprio	0, próprio
Capital de giro	87.500	39.000
Necessidade antes da fonte	**1.324.900**	**305.700**
Menos o capital próprio e o contratado	221.120 + 0	50.000 + 0
Lacuna	**1.103.780**	**255.700**
Custo da captação, 3% da lacuna	33.113	7.671
Necessidade de capital externo	**1.136.893**	**263.371**
Cobertura própria	16,7%	16,4%

Tabela 8.2 · A régua de Marina e a de Rafael, em reais. Linhas: Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 04; contingência e giro pelas regras do F01. Exemplos ilustrativos; contas conferidas.

O resultado é a necessidade de capital externo. Esse número, e não um valor redondo próximo dele, é o que vai no pedido.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO

Arredondar para cima também cobra, em diluição ou juro sobre dinheiro parado: «Pedir um número redondo acima da conta é um sinal de que a conta não foi feita, e investidor atento pergunta exatamente isso.»

Rafael abriu a fase dois no Capítulo 7: os R$ 205.000 do D05 viraram R$ 266.700. O giro é de três meses do fixo de R$ 13.000, porque os seis meses da operação já estão guardados. A operação paga a lacuna? Só com a reserva que sobra depois das quatro reservas, R$ 5.664 por mês, já presa ao retrofit por 15,2 meses; mesmo livre, seriam 45,1 meses, e no conservador com a responsável sobram −R$ 174,40. Obra paga com o caixa do mês é a causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™: «Investimento pago com caixa operacional.» E o fundo de reposição dos chalés atuais, de R$ 11.405

a R$ 19.008 por ano (3% a 5% da receita), não vai para a obra.

Lacuna e cobertura própria

Três números, três perguntas. A **lacuna** é a necessidade antes da fonte menos o próprio e o contratado: quanto falta. A **necessidade de capital externo** soma o custo de captar: quanto se pede. A **cobertura própria** divide o próprio pela necessidade: quanto do projeto é seu.

No F00, Marina tinha lacuna de R$ 730.000 e cobertura de 26,3%; agora, R$ 1.103.780 e 16,7%. A diferença, R$ 373.780, soma o CAPEX reaberto (247.400), o giro (87.500) e o capital próprio, R$ 38.880 menor (os R$ 158.880 da Porta 3 descontados, compensados em parte pelos R$ 120.000 de giro do Z02, que deixam o capital e passam para a necessidade): linhas que existiam e não estavam escritas.

Sem a Porta 3, o capital volta a R$ 380.000: lacuna de R$ 944.900 e cobertura de 28,7%. O F01 mostra as duas contas e não escolhe. A promessa do irmão, R$ 100 mil sem contrato, fica fora: «Capital que depende de vender outra coisa não é capital disponível: é uma premissa, e vai para a matriz de risco.»



Figura 8.2 · Cobertura própria de Marina, com e sem a Porta 3, e de Rafael. Elaboração do F01. Exemplos ilustrativos.

A frase do pedido

O tutorial do Volume 05 fecha com o número exato numa frase: «preciso de X para a Fase 1, assim distribuído, liberado em sete marcos verificáveis.» E: «Essa frase é a primeira que você diz em qualquer conversa de capital.» Numa fase pequena, cinco marcos bastam. Cada um é uma entrega verificável, e o dinheiro sai no mês do marco.



Figura 8.3 · O desembolso da fase um de Marina, com o capital próprio entrando primeiro e a reserva fora do cronograma. Lógica: Volume 05 · Investimento (edição do projeto, Cap. 03; edição de captação, Cap. 08). Valores: exemplo ilustrativo.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · A FRASE DE MARINA

"Preciso de R$ 1.136.893 para a fase um, assim distribuído: R$ 833.780 para obra e equipamento, R$ 182.500 de reserva de implantação fora do cronograma, R$ 87.500 de capital de giro disponível no dia da abertura e R$ 33.113 de custo da captação; liberado em cinco marcos verificáveis: projeto e licenciamento aprovados (R$ 70.000, todo próprio); infraestrutura pronta (R$ 250.000, dos quais R$ 98.880 de fora); duas medições de obra e apoio (R$ 240.000 cada); FF&E, OS&E e pré-abertura (R$ 254.900). O capital próprio, de R$ 221.120, entra primeiro e cobre 16,7% da necessidade."

Conferência: 833.780 + 182.500 + 87.500 + 33.113 = 1.136.893.

A de Rafael segue o molde: R$ 263.371 para a fase dois, sendo R$ 182.700 para obra e equipamento, R$ 34.000 de reserva, R$ 39.000 de giro e R$ 7.671 de custo da captação, em cinco marcos, com o efluente (R$ 45.000) no segundo.

A frase não diz de quem vem o dinheiro. Banco, fomento, sócio ou investidor cobram de jeitos diferentes; escolher é do F05 (crédito e garantias) e do F06 (sócios e captação), com contador e advogado. O F01 entrega quanto, para quê e quando.

Cinco alavancas para reduzir a necessidade sem mentir

Um número desse tamanho empurra para o atalho: tirar uma linha, chamar promessa de capital, arredondar para baixo. Isso só a esconde até o meio da obra. A Etapa 02 dá as saídas honestas: «Se o investimento necessário exceder o capital real, as opções são reduzir o escopo, faseamento, captar ou mudar de porta de entrada.» Antes de captar, cinco alavancas mexem na conta.

ALAVANCA	O QUE MUDA NA CONTA	EM MARINA
1 · Orçar a rede	Troca a premissa pela cotação da linha de maior variação	Com R$ 180.000: CAPEX de R$ 1.146.400, necessidade externa de R$ 1.043.163
2 · Fasear	Fase um é o menor conjunto que opera, com infraestrutura para o projeto completo	Já em 3 + 2: a fase dois, de R$ 499.200, espera o gatilho
3 · Mudar de porta	Cada porta do Mapa das Quatro Portas™ exige outra ordem de capital	Decidir a Porta 3: sem ela, lacuna de R$ 944.900
4 · Rever o escopo	Metros e itens que o programa não exige	Cada metro contra o programa do D05, sem tocar no momento assinatura
5 · Antecipar as cotações	Evidência 3 nas maiores linhas firma o número	Rede, obra, apoio e FF&E cotados: de Estimador a Calculista

Tabela 8.3 · As alavancas. Fontes: Jornada do COMO, Etapa 02 (Passo 11); A Ordem das Coisas (Mapa das Quatro Portas™); Volume 05 · Investimento, edição do projeto (Caps. 05 e 16). Valores de Marina: exemplo ilustrativo, contas conferidas.

A primeira é a mais barata: com a rede a R$ 180.000, como estimou o Z02, contingência e pré-abertura caem junto e o CAPEX desce R$ 91.000. Só a cotação

escrita autoriza esse número. A quarta tem a regra do Capítulo 4: cortar metros quadrados no desenho, nunca a experiência dentro deles.

AS DUAS LINHAS QUE NUNCA SE CORTAM

Contingência e giro são as primeiras vítimas do susto. Do giro, diz a edição de captação: «Essa é a linha que mais gente corta quando o número total assusta, e é a que mais custa cortar.» Da contingência, o Capítulo 5 já deu a regra: a que você não provisiona muda de nome.

O portão do capital e o limite de perda

> REVISITE · F00
>
> Sem consultar: quais são as cinco condições do portão do capital? Confira: estrutura antes do capital; conta completa, com contingência e giro; conservador que paga as contas; perda dentro do limite; fonte nomeada. Marina saiu do Marco Zero com as cinco pendentes: "Estruturar antes de captar" (leitura do portão no F00).

O Mapa responde à condição 2: com todas as linhas, contingência pelo perfil e giro com rampa e sazonalidade, a conta de Marina fica completa e a condição pode passar a aprovada na leitura do F01. Completa não é comprovada: a rede ainda pede cotação.

A condição 4 ganha um alerta: os R$ 221.120 próprios passam o limite de perda do Z02, R$ 180.000, em R$ 41.120, se tudo der errado. Se a Porta 3 seguir, a exposição soma os R$ 158.880 dela: R$ 380.000 no total, R$ 200.000 acima do limite. O F01 só sinaliza. As cabanas não somem, e a perda possível depende de garantias e contratos: é conta do F03 e do F06. Rafael tem o mesmo sinal, R$ 50.000 contra R$ 30.000.

A ferramenta

Preencha com os exercícios dos Capítulos 1 a 7. Com o exemplo de Marina, a ferramenta acusa três faixas na borda, o limite de perda e as quatro linhas a cotar.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Monte as oito peças na ordem da Tabela 8.1 e só então escreva a frase. Decida por escrito o destino do capital comprometido em outra frente e cote a linha de maior variação antes de conversar com capital de terceiros.

B

Quero crescer

Faça a régua da próxima fase com o giro da operação já separado e confira o que a reserva mensal sustenta. Se o conservador não deixa sobra, a lacuna vai inteira para o F05 e o F06.

CADERNO DO F01

Com o seu caso real; fica salvo só neste navegador. O que você não souber vira pendência.

1. O CAPEX por componente e por linha, com a evidência de cada linha.

2. A conferência das faixas, com o motivo de cada linha fora delas.

3. A contingência e o capital de giro, com a regra usada.

4. O custo por chave e o que a infraestrutura comum explica nele.

5. O cronograma por marco e onde começa a lacuna.

6. Necessidade, lacuna, necessidade externa e cobertura própria.

7. A frase do pedido.

8. As pendências, cada uma com dono e data.

Autoavaliação do módulo

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as linhas da Régua do Quanto Captar™, e o que se subtrai no fim? (objetivo 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Por que a reserva de implantação de Marina não aparece separada do CAPEX? (objetivo 4)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. O irmão de Marina prometeu R$ 100 mil, sem contrato. Entra no capital próprio? (objetivo 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Exemplo ilustrativo: necessidade antes da fonte de R$ 800.000, próprio de R$ 200.000, nada contratado, custo da captação de 4%. Lacuna, necessidade externa e cobertura? (objetivo 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

5. Se a rede de Marina for cotada em R$ 180.000, quanto ela pede? (objetivos 3 e 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

6. Exemplo ilustrativo: o sócio quer cortar a contingência pela metade e pedir R$ 1,5 milhão, "para sobrar", quando a conta dá R$ 1,2 milhão. Avalie. (objetivo 4)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

7. Rafael tem R$ 5.664 por mês de reserva. Por que ela não cobre a lacuna da fase dois? (objetivo 6)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

8. Marina herdou o terreno. Ele entra no CAPEX? E o capital de giro? Onde cada um aparece no Mapa? (objetivos 1 e 2)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O Mapa junta oito peças, e a frase do pedido vem por último.
- Régua do Quanto Captar™: CAPEX da fase, terreno não pago, giro, reserva e custo da captação, menos o próprio e o contratado.
- No F01, a reserva é a contingência já dentro do CAPEX, e três meses de fixo são o piso do giro.
- Lacuna é quanto falta; necessidade externa, quanto se pede; cobertura própria, quanto do projeto é seu.
- A frase do pedido leva número exato, distribuição e marcos, e não escolhe a fonte.

- Reduza a necessidade com rede orçada, fases, porta, escopo e cotações; nunca com contingência ou giro.
- Capital próprio acima do limite de perda é um sinal para o F03 e o F06.

ATIVIDADE APLICADA

Entregue o seu Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital

Ao mentor, em PDF: o Caderno do F01 (botão Imprimir), com a leitura da ferramenta e as cotações que você já tem.

CRITÉRIO	PESO	O QUE SE OBSERVA
Coerência	40%	CAPEX, giro, lacuna, cronograma e frase fecham entre si; nada contado duas vezes.
Justificativa	30%	Toda linha tem evidência; contingência e giro citam a regra; linha fora da faixa tem motivo.
Riscos	20%	Linha de maior variação, capital não contratado e limite de perda escritos, com dono e data.
Clareza	10%	Alguém de fora repete o número, o uso e os marcos.

Tabela 8.4 · Rubrica da atividade aplicada.

CURIOSIDADE

A edição de captação do Volume 05 compara a mesma fase pedida de dois jeitos: «O pedido incompleto é cinquenta e três por cento menor e parece mais fácil de conseguir. No mês sete falta exatamente a soma das três linhas omitidas, com a obra em andamento.»

REFLEXÃO

Se alguém perguntasse hoje quanto você precisa, você diria um número exato, com marcos, ou um redondo que ainda não sabe defender?

DICA

Nesta semana, peça por escrito a cotação da sua linha de maior variação, com escopo e data. Ela vale noventa dias: anote quando vence.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 08

1. Escreva a sua régua linha por linha, com o número exato e a fonte de cada número.

2. Calcule quanto duas das cinco alavancas mudam a sua necessidade externa. Qual exige uma cotação que você não tem?

3. Compare o capital próprio posto na fase com o seu limite de perda. O que vai para o F03 e o F06?

4. Diga a frase do pedido a alguém de fora. O que ele não conseguiu repetir?

Checklist: estou pronto para o F02?

- [ ] CAPEX aberto nos quatro componentes, com projeto e licenciamento à parte.
- [ ] Evidência de 0 a 3 em cada linha; cotação pedida nas maiores.
- [ ] Faixas conferidas, com motivo para cada linha fora.
- [ ] Contingência pelo perfil, entre 10% e 15% do CAPEX ou acima.
- [ ] Giro pelas duas regras, com rampa e sazonalidade.
- [ ] Cronograma por marco, com a reserva fora dele.
- [ ] Lacuna, necessidade externa e cobertura só com capital

contratado.

- [ ] Frase do pedido com o número exato, sem escolher a fonte.
- [ ] Jornada B: reserva mensal conferida e fundo de reposição mantido.

PRÓXIMA ATIVIDADE

F02 · Receitas, Custos e Modelos de Rentabilidade

Leve o Mapa inteiro. O F02 trata do que vem depois da abertura: receita, custo de cada noite vendida, a Lista do Que Ninguém Orça™ completa e a depreciação do que você orçou. Depois, o F03 põe a necessidade sob estresse, e o F05 e o F06 decidem de onde ela vem.

APOIO

F01

Glossário e *referências.*

Termos na ordem em que aparecem no módulo. Entre « », a definição literal da fonte indicada; sem aspas, a explicação deste e-book em linguagem simples.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital	O entregável do F01, bloco 4 do Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade: CAPEX aberto por linha, com nota, até a lacuna e a frase do pedido.
Régua de maturidade financeira	Sonhador, Estimador, Calculista e Developer (Volume 05). O Estimador tem números «por alto», «o nível mais perigoso: a confiança sem o fundamento»; o Calculista «tem CAPEX aberto e projeções com premissas».
CAPEX e OPEX	«CAPEX é o que você investe uma vez para construir. OPEX é o que você gasta todos os meses para operar.» (Volume 05)
Escala de evidência por linha	A escala do D00 e do F00 em cada linha do CAPEX: 0 · não sei; 1 · palpite; 2 · estimativa por faixa ou referência; 3 · cotação escrita, válida por noventa dias.
Hard costs	«A construção física: terraplanagem, fundações, estrutura, acabamento, instalações.» (Volume 05). Área construída total, com áreas comuns e apoio, vezes o custo por m^2, mais a infraestrutura.
Soft costs (projeto e licenciamento)	«Custos não-físicos do projeto: arquitetura, engenharia, licenças, jurídico.» (Volume 05). No F01, linha própria do CAPEX.
FF&E	Furniture, Fixtures & Equipment: «Móveis, equipamentos e tudo que transforma obra em hospedagem.» (Volume 05). Unidades vezes o custo por unidade.

TERMO	O QUE QUER DIZER
OS&E	Operating Supplies & Equipment: «Suprimentos operacionais: rouparia, utensílios, equipamentos de limpeza.» (Volume 05). De 10% a 15% do FF&E.
Pré-abertura	O que se gasta entre a obra entregue e o primeiro hóspede: equipe antes da receita, lançamento, licenças de operação, soft opening. Regra adotada: 5% a 10% dos hard costs, conferida pela faixa de 3% a 5% do CAPEX.
Soft opening	«O soft opening é o ensaio geral pago pelo CAPEX para que a estreia aconteça sem improviso.» (Volume 05)
Infraestrutura comum	Acesso, energia, água, esgoto, terraplenagem e apoio que servem a todas as unidades. Para a Etapa 02, «a linha de maior variação entre terrenos». Dimensiona-se para o projeto completo: «Refazer infraestrutura é a forma mais cara de economizar.» (Volume 05)
Obras de sítio	As obras que dependem daquele terreno: contenção, drenagem, acesso interno, extensão de rede. Só se orçam depois das perguntas do terreno e da sondagem.
Capital empregado	O valor do terreno ou imóvel que você já tem (Etapa 02). Não sai do caixa, mas entra na medida do retorno. Fica fora do CAPEX.
Conta do Investimento Necessário™	Sete linhas, de imóvel a capital de giro, mais a contingência (Jornada do COMO, Etapa 02). «A segunda parte é a que falta em quase todo orçamento.»
Unidade-modelo	«monte UMA unidade completa antes de comprar quinze» (Volume 05), para testar especificação, prazo e preço.
Regra dos três jogos	Rouparia por cama: «Um está em uso. Um está no estoque. Um está na lavanderia.» (Volume 05)
Contingência ou reserva de implantação	A reserva para o imprevisto. Regra adotada, sobre obra e infraestrutura (Etapa 02): 20% a 25% na primeira obra; 10% a 15% com experiência; 15% a 20% em imóvel pronto. Nunca abaixo de 10% do CAPEX (Volume 05).
Capital de giro	O que sustenta a operação até a receita cobrir. Fora do CAPEX, dentro da necessidade. Regra adotada: a maior entre seis meses

TERMO	O QUE QUER DIZER
	de fixo (Etapa 01) e rampa, mais sazonalidade, mais três meses de fixo (Etapa 02).
Déficit da rampa	A soma dos meses negativos do primeiro ano, lida na Curva de Rampa do Primeiro Ano™ (Etapa 02).
Reserva de sazonalidade	A soma dos meses negativos de um ano em regime, pelo Calendário de Sazonalidade™ (Etapa 02). Na operação, a Reserva de Sazonalidade™ da Etapa 09.
Faixas de sanidade	Hard costs 60% a 70%, FF&E 15% a 20%, OS&E 2% a 4%, pré-abertura 3% a 5%, contingência 10% a 15% do CAPEX. «Essas proporções não são regras fixas. São faixas de sanidade.» (Volume 05)
Custo por chave	CAPEX dividido pelas unidades vendáveis, as chaves. Elaboração do F01: as fontes não definem a métrica. Na fase um que carrega a infraestrutura das seguintes, sai alto, e isso precisa estar explicado.
Cronograma físico-financeiro	«O casamento entre as etapas da obra e as saídas de caixa.» (Volume 05)
Desembolso por marco	«Desembolso no mês do marco, não distribuído linearmente.» (Volume 05, edição de captação)
Fundo de reposição	O que se separa da receita para trocar enxoval, colchão e equipamento. Regra adotada: 3% a 5% da receita (Etapa 02); a Etapa 09 usa 3% a 6%.
Depreciação	«o que foi construído e comprado perde valor e vai precisar ser reposto. Não sai do caixa agora, mas sai do resultado.» (Etapa 09)
Retrofit	A renovação de unidades que já operam, para devolver ou subir o padrão sem mudar o uso. As fontes tratam o tema como adequação de imóvel pronto, com contingência de 15% a 20% (Etapa 02).
Necessidade de capital	CAPEX da fase, com a contingência, mais capital de giro, mais o terreno se ainda não foi pago. É o número antes de qualquer fonte.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Régua do Quanto Captar™	CAPEX da fase, giro, reserva de implantação e custo da captação, menos o capital próprio e o contratado (Volume 05, edição de captação). «Esse número, e não um valor redondo próximo dele, é o que vai no pedido.»
Lacuna	A necessidade menos o capital próprio disponível e o já contratado. «Contratado, não esperado.» (Volume 05, edição de captação)
Cobertura própria	Capital próprio dividido pela necessidade de capital, em porcentagem. Elaboração da mentoria.
Custo da captação	«Entre dois e cinco por cento da captação» (Volume 05, edição de captação). O F01 usa 3% sobre a lacuna como aproximação.

Fontes

- Zion. *Volume 05 · Investimento*, edição do projeto, Zion Hospitality Academy, 2026, caps. 01 a 07, 10, 16 e 23: régua de maturidade financeira, os quatro componentes do CAPEX, Metodologia Zion de Análise de Investimento, faixas de sanidade, OS&E e regra dos três jogos, pré-abertura, contingência, colchão de três meses, faseamento e glossário. Os números do projeto-exemplo da fonte não são usados.
- Zion. *Volume 05 · Investimento*. Zion Hotel Academy, primeira edição, outubro de 2026, edição de captação, caps. 04 e 08: Régua do Quanto Captar™, reserva de implantação, custo da captação, validade da cotação e desembolso por marco.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 02: Como eu sei se dá certo aqui?*. Outubro de 2026. Conta do Investimento Necessário™, Curva de Rampa do Primeiro Ano™, Calendário de Sazonalidade™ e contingência por perfil.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 09: Como eu sei se estou lucrando?*. Outubro de 2026. Reserva de Sazonalidade™, Tabela de Custo Fixo™ e Diagnóstico do Caixa Apertado™, base da Jornada B.
- Zion. *A Ordem das Coisas*. Outubro de 2026. Conta do Custo Invisível™ e Mapa das Quatro Portas™.
- Zion. *Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro*. Outubro de 2026. Trilha A, Pilares 04, 05 e 06.
- Zion. *Manual Oficial do Método Zion 360°*. 2026. Capítulo 14, as finalidades do capital.

- Elaborações do F01: a escala de evidência por linha e a regra do Calculista; as regras adotadas onde as fontes divergem (giro pela maior das duas regras, contingência por perfil com conferência pela faixa, pré-abertura de 5% dos hard costs, OS&E de 12% nos exemplos, custo da captação de 3%, fundo de reposição de 3% a 5%); projeto e licenciamento como linha própria; o tratamento do terreno; o custo por chave. Marco Zero do Capital e Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade são elaborações da mentoria. Marina, Rafael e os números dos exemplos foram criados para fins didáticos.

Para conferir no seu caso

Antes de contratar obra ou levar o seu número a uma fonte de capital, confirme estes pontos com quem responde por eles, e anote a data.

- **Cotações escritas.** Três propostas com a mesma especificação, escopo e data. Mais de noventa dias, refaça.
- **Solo e sítio.** Sondagem, terraplenagem, contenção e fundações: engenheiro habilitado, antes de fechar o custo por m^2.
- **Rede e acesso.** Energia, água, efluente e estrada para o projeto completo: projetista habilitado e consulta escrita à concessionária.
- **Licenças.** O que aprovar e em que ordem: arquiteto ou engenheiro e órgão competente, no pilar E.
- **Tributos.** Sobre obra, equipamentos e aquisição de imóvel: contador, antes de fechar o CAPEX.
- **Contratos.** Obra, fornecimento, medição e garantias: advogado, antes de assinar.
- **Terreno.** Matrícula, inventário e servidão: advogado, como no D06.
- **Capital.** A lacuna se resolve no F05 e no F06, com assessoria. Nenhuma fonte é prometida aqui.

Receitas e custos ficam para o F02; viabilidade e cenários, para o F03;

planejamento e valor, para o F04; crédito e garantias, para o F05; sócios e captação, para o F06; projeto executivo, licenças e obra, para o pilar E.

Este material é educativo. Ele não constitui orçamento, projeto, laudo, estudo de viabilidade nem parecer técnico, contábil, tributário, jurídico ou de investimento, e não promete crédito, financiamento, sócios, investidores, retorno, faturamento nem aprovação de licença. Os exemplos são ilustrativos, e as faixas de custo citadas são ilustrativas das fontes, a validar com cotação da sua região e do ano. Custos, preços e exigências legais mudam com o tempo e o lugar e devem ser conferidos na origem, com data. Decisões de obra, compra, licenciamento, contrato, tributação e investimento devem ser validadas com profissionais habilitados.
