ZION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL

MÉTODO ZION 360° · BASE · MÓDULO Z02

02

Como Começar com os Recursos que Você *Tem*

Com o quê, e em que ordem: o capital que você tem de verdade, a porta que cabe, a primeira fase e de onde pode vir o resto. Sem paralisia e sem aposta grande demais.

MÉTODO ZION 360°

DA IDEIA AO NEGÓCIO. DA HOSPEDAGEM AO DESTINO.

EDIÇÃO COMPLETA · VERSÃO 1.0 · OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

00 **Abertura** — 10 MIN
Carta, objetivos, como usar e as duas jornadas no Z02

01 **O que você tem de verdade** — 16 MIN
Capital Real Disponível™, risco suportável, tempo e competência

02 **As quatro portas, com as suas contas** — 18 MIN
Mapa das Quatro Portas™, comparador e tempo até o primeiro real

03 **Quanto custa começar de verdade** — 19 MIN
Investimento necessário, o que ninguém orça, contingência, giro e rampa

04 **Começar pequeno sem começar errado** — 16 MIN
Fases, critérios de passagem e adiamento legítimo

05 **De onde pode vir o dinheiro** — 20 MIN
Mapa das Seis Fontes™, custo real do capital e o que cada fonte leva

06 **Testar antes de comprometer** — 16 MIN
Premissas defensáveis, três cenários, estresse e caixa acumulado

07 **Quem já opera: crescer com o que já tem** — 15 MIN
Consertar, crescer sem obra, reformar e ampliar em ordem

08 **O seu Plano Inicial** — 18 MIN
Ferramenta, caderno, autoavaliação e checklist

\+ **Glossário e referências** — 5 MIN
Termos do módulo, fontes e o que conferir no seu caso

ABERTURA

Z02 · COMO COMEÇAR COM OS RECURSOS QUE VOCÊ TEM

Com o quê, e em que *ordem?*

Este é o terceiro e último módulo da base do Método Zion 360° | Negócios de Hospedagem. O Z01 terminou numa decisão escrita. O Z02 transforma essa decisão num caminho que cabe no seu capital, no seu tempo e no risco que você consegue suportar.

UMA CARTA PARA QUEM JÁ TEM UMA DECISÃO ESCRITA

Se você chegou até aqui, tem nas mãos uma coisa que pouca gente tem: uma decisão escrita sobre o próprio lugar. No Z01, você leu o terreno, o imóvel ou a operação, mediu o mercado, fez a conta em três cenários e fechou o Diagnóstico de Potencial com uma de três palavras: seguir, ajustar ou parar. Aquele trabalho respondeu à pergunta "o que este lugar sustenta?". Agora a pergunta muda: com o quê, e em que ordem?

Parece uma pergunta menor. Não é. É nela que muita gente trava. Há quem fique anos parado esperando ter tudo: todo o capital, toda a segurança, o momento certo. E há quem faça o contrário e aposte de uma vez um valor que não aguentaria perder. São dois erros opostos com a mesma origem. No Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro, escrevi: «Terreno parado quase nunca é falta de dinheiro. É falta de ordem.» E em *A Ordem das Coisas*: «A maioria dos projetos de hospedagem não trava por falta de dinheiro. Trava porque decisões que vinham depois foram tomadas antes, e decisões que vinham antes nunca foram tomadas.»

Passei mais de vinte anos na hotelaria internacional, com passagens por Meliá, Barceló e Wyndham, na Espanha e nas ilhas Canárias e Baleares. Hoje a Zion opera bolhas transparentes dentro de uma mata de araucária em Urubici, na serra catarinense, e também em Floria-

nópolis. O Manual Oficial resume o caso Zion em três frases: «Primeiro compreendemos o lugar. Depois desenhamos a experiência. Somente então estruturamos o restante do negócio.» O Z01 cuidou do lugar. O Z02 entra na terceira frase, e estruturar o restante começa por saber quanto você tem de verdade.

Essa primeira descoberta costuma incomodar. Na Etapa 01 da Jornada do COMO está escrito: «O dinheiro que você pode investir é menor que o dinheiro que você tem, e a diferença não é pequena.» Da conta saem a reserva pessoal, as dívidas caras, os compromissos dos próximos dois anos e o capital de giro do negócio. Depois vem uma pergunta que nenhuma planilha responde por você: quanto você pode perder sem mudar de vida? A mesma Etapa 01 é direta: «Coragem não paga aluguel de vale, e não cobre aporte de obra estourada.»

A segunda descoberta costuma aliviar. Construir não é a única forma de começar. Comprar pronto, alugar para hospedar e administrar o imóvel de outra pessoa também são portas de entrada, cada uma com o seu capital, o seu prazo e o seu risco. Está na carta da Etapa 01: «Você não precisa construir um hotel para viver de hospedagem. Precisa escolher, com a conta na mão, qual das quatro portas cabe no seu capital, no seu risco e no seu tempo.»

Fasear não é falta de ambição. É o que faz a ambição caber no caixa.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

A terceira descoberta é sobre tamanho. Quase nenhum projeto precisa de todo o capital no primeiro dia. Precisa de uma primeira fase bem escolhida, de um critério escrito para liberar a segunda e de dinheiro para atravessar os meses em que a receita ainda não cobre os custos. O Volume 05 do método, sobre investimento, diz por quê: «Projeto não quebra por prejuízo. Quebra por falta de caixa num mês específico, e esse mês dá para saber qual é.»

Só depois disso faz sentido falar em capital de terceiros. Sócio, banco, familiar, permuta, arrendamento, pré-venda: este e-book apresenta cada caminho em nível introdutório, com o que ele cobra e o que ele arrisca, sem prometer crédito nem investidor. A regra de partida, da Etapa 01 da Jornada do COMO: «Capital de sócio, de familiar ou de banco não é o seu capital: ele tem custo e tem prazo.» O aprofundamento fica para o pilar Financiar. Se você já opera, a pergunta é como crescer com o que já existe sem uma obra maior do que a operação aguenta, e o Panorama dá a regra: «resolva primeiro o que já está custando dinheiro hoje, não o que vai custar no ano que vem.»

No fim, você terá o terceiro entregável do método: o **Plano Inicial de Desenvolvimento e Alternativas de Capital**. Ele diz qual é a sua porta, qual é a primeira fase, quanto ela custa de verdade, de onde vem cada parte do dinheiro, o que acontece se as coisas saírem piores do que o previsto e o que você decide nos próximos noventa dias. Ele não garante nada. Ele mostra o tamanho da aposta antes de você fazê-la.

Bruno Chaerk
Fundador · Zion Hospitality Business School

O que você vai aprender neste módulo

Ao terminar o Z02, você deverá ser capaz de fazer sete coisas. Elas são o critério para saber se a leitura cumpriu o seu papel.

OBJETIVOS DO MÓDULO

- Calcular o seu capital real disponível e o seu limite de perda aceitável.
- Comparar as quatro portas de entrada, ou de crescimento, pelo capital, pelo prazo até o primeiro real, pelo risco e pela competência que cada uma pede.
- Montar a conta do investimento necessário, com o que ninguém orça, a contingência, o capital de giro e a rampa, a partir de um exemplo ilustrativo.
- Explicar por que fasear reduz o risco e definir a sua primeira fase com um critério de passagem escrito.
- Distinguir as seis fontes de capital e os riscos de cada uma, em nível introdutório.
- Testar o plano em três cenários e num teste de estresse antes de comprometer dinheiro.
- Escrever o Plano Inicial com porta, fase, quanto, de onde e o que decidir nos próximos noventa dias.

Como usar este e-book

São cerca de cento e quarenta páginas, escritas para serem usadas com o seu Diagnóstico de Potencial aberto ao lado.

- **Leia com a sua decisão do Z01 na cabeça.** Em cada capítulo, pergunte: isso cabe no que o meu lugar sustenta? Muda a minha decisão?

- **Use os seus números, não os do livro.** As caixas verdes trazem exemplos ilustrativos: mostram a lógica de uma conta, não um resultado da Zion nem uma projeção para o seu caso. As caixas douradas trazem os frameworks, as regras e os checklists do método.
- **Escreva a fonte e a data de cada número.** O Volume 05 é duro com isso: «Linha sem fonte e sem data não é premissa, é chute, e vai ser tratada como tal.»
- **Responda às perguntas de recuperação sem olhar.** Tentar lembrar fixa mais do que reler. As caixas "Revisite" retomam ideias do Z00 e do Z01 pelo mesmo motivo.
- **Faça o exercício do fim de cada capítulo.** As respostas alimentam o Plano Inicial do Capítulo 8 e ficam salvas só neste navegador, no seu aparelho. Se trocar de aparelho ou limpar os dados do navegador, elas não vão junto. Quando terminar, imprima ou salve em PDF.

Tempo estimado. A leitura leva cerca de duas horas e meia, e os exercícios pedem outro tanto, em sessões de quarenta minutos a uma hora. Reserve tempo à parte para juntar os seus dados: os saldos que você resgata em trinta dias, as despesas pessoais reais dos últimos três meses, as dívidas e os compromissos dos próximos dois anos e, se já tiver, orçamentos de obra, mobília ou aluguel. Quem já opera vai precisar do resultado mês a mês dos últimos doze meses.

As duas jornadas no Z02

O método continua sendo um só. Muda a pergunta que cada jornada responde e o peso de cada capítulo, e todo capítulo traz uma caixa de **Aplicação** para as duas. Marina e Rafael, os personagens ilustrativos do Z01, continuam com você: ela decidiu ajustar o projeto de cinco cabanas; ele decidiu seguir com os quatro chalés que já opera.

A

Quero começar

O que fazer no Z02: calcular o capital real e o limite de perda, passar as quatro portas pelos filtros de capital, risco, tempo e competência, montar a conta do investimento necessário, dividir o projeto em fases, conhecer as fontes de capital e testar tudo antes de assinar. Os Capítulos 1 a 4 pedem mais de você.

O que trazer do Z01: o Diagnóstico de Potencial com a decisão escrita, a conta em três cenários e os sinais de alerta pendentes. Se a decisão foi ajustar, a lista do que precisa mudar.

Resultado: o Plano Inicial com a porta, a primeira fase, o investimento necessário, as fontes e os próximos noventa dias.

B

Quero crescer

O que fazer no Z02: separar o caixa da operação do caixa pessoal, refazer o capital real disponível, olhar as quatro portas como portas de crescimento e testar o próximo passo contra os números reais. O Capítulo 7 foi escrito para você; os Capítulos 1, 3 e 6 explicam a conta que ele usa.

O que trazer do Z01: o Diagnóstico de Potencial da operação, o elo fraco encontrado e o resultado dos últimos doze meses, com receita e custos fixos e variáveis.

Resultado: o Plano Inicial de crescimento, com o próximo passo, o seu custo real, as fontes e o que precisa estar provado antes do seguinte.

Se a sua decisão foi parar, o módulo também serve. *A Ordem das Coisas* lembra que, quando a análise foi feita e deu negativo, «adiar não é adiar, é decidir — e decidir não fazer é um resultado tão válido quanto o outro.» O Z02 ajuda a separar esse adiamento legítimo do indefinido e a escrever a condição verificável para retomar.

Onde o Z02 se encaixa

O Método Zion 360° tem uma base e sete pilares. A base tem três módulos: o **Z00 · Universo dos Negócios de Hospedagem** abriu o mapa; o **Z01 · Da Propriedade ao Negócio de Hospedagem** aplicou o diagnóstico ao seu caso; o **Z02 · Como Começar com os Recursos que Você Tem** fecha a base, transformando o diagnóstico num caminho que cabe no que você tem.

O entregável do Z02 abre os dois primeiros pilares. O **D · Desenvolver** recebe a porta e a primeira fase e aprofunda território, produto e estratégia. O **F · Financiar** recebe o investimento necessário e as alternativas de capital e aprofunda modelagem, dívida, sociedade, instrumentos de captação e dossiê. Depois vêm **E · Implantar**, **M · Marca e Experiência**, **L · Vender**, **G · Gerir** e **O · Operar**, cada um com um Marco Zero e seis módulos.

O caminho, capítulo a capítulo

Os capítulos seguem a ordem das decisões: primeiro o que você tem, depois a porta, o custo e a primeira fase, e só então o dinheiro de terceiros.

CAPÍTULO	A PERGUNTA QUE ELE RESPONDE
1 · O que você tem de verdade	Quanto capital, tempo, competência e risco eu tenho de fato para pôr no negócio?
2 · As quatro portas, com as suas contas	Construir, comprar pronto, alugar para hospedar ou administrar o de outro: qual cabe em mim?
3 · Quanto custa começar de verdade	Qual é o investimento necessário, com o que ninguém orça, a contingência, o giro e a rampa?
4 · Começar pequeno sem começar errado	Qual é a minha primeira fase, e o que precisa estar provado para liberar a segunda?
5 · De onde pode vir o dinheiro	Quais fontes de capital existem, o que cada uma cobra e o que cada uma arrisca?
6 · Testar antes de comprometer	O plano atravessa um cenário pior do que o previsto, e onde ele para de funcionar?
7 · Quem já opera	Como crescer com o que já tenho sem uma aposta maior do que a operação aguenta?
8 · O seu Plano Inicial	Qual é a minha porta, a minha fase, quanto, de onde e o que decido nos próximos noventa dias?

AVISO IMPORTANTE

Este e-book não promete retorno, ocupação, valorização, crédito, investidor nem aprovação de licença. Os exemplos com números são ilustrativos, construídos para ensinar a lógica de uma conta, e vêm sempre identificados como tal. Não são resultados da Zion nem projeções para o seu projeto.

Sócio, dívida, permuta, arrendamento, pré-venda, condo-hotel, multipropriedade e qualquer outra forma de captação aparecem aqui apenas em nível introdutório. Antes de oferecer participação, unidade, cota ou diária a terceiros, e antes de assinar contrato ou dar garantia, converse com advogado. Regime tributário e estrutura societária se decidem com contador. Temas ambientais, urbanísticos e regulatórios se confirmam com profissional habilitado e com a prefeitura.

CAPÍTULO 01

CAPITAL, RISCO, TEMPO E COMPETÊNCIA

O que você tem *de verdade.*

Antes de escolher porta, fase ou fonte de dinheiro, meça os quatro recursos que decidem o que cabe em você. O número que importa quase sempre é menor do que o saldo.

NESTE CAPÍTULO

- Paralisia e aposta grande demais: dois erros, a mesma causa.
- O Capital Real Disponível™, com um exemplo resolvido.
- O limite de perda aceitável e o Teste de Risco Suportável™.
- A Agenda Real por Semana™ e o Mapa de Competência™.
- Para quem já opera: caixa não é faturamento.

Quem chega ao Z02 já tem uma decisão escrita. O Diagnóstico de Potencial do Z01 terminou em seguir, ajustar ou parar, e falou do lugar: território, mercado, conta em uma folha. Falta falar de você. Um terreno pode sustentar cinco cabanas e o dono não sustentar a obra delas. Este capítulo mede o outro lado da mesa.

Dois erros opostos, a mesma falta de medida

Quem começa costuma errar de um de dois jeitos. A **paralisia** deixa o projeto anos na gaveta, à espera de um momento que não chega. A **aposta grande demais** junta tudo o que a pessoa tem, às vezes o que não tem, numa obra que não pode dar errado. Os dois erros têm a mesma raiz: ninguém mediu os próprios recursos antes de decidir.

A Ordem das Coisas descreve o medo que trava como o que não distingue entre «avançar sem informação, que é imprudência, e avançar com informação, que é decisão». O problema é esperar sem conta: «O que não é legítimo é adiar sem ter feito a análise, porque aí não há decisão: há apenas a manutenção da dúvida, paga mensalmente.»

A inação não emite boleto. É por isso que ela é o item mais caro do orçamento de quase todo projeto parado.

A ORDEM DAS COISAS

Do outro lado, a Jornada do COMO não deixa margem: «Se o seu plano atual envolve risco de vida, ele não está maduro — e a correção é reduzir o valor ou mudar de porta, não aumentar a coragem.» **Risco de vida** é perder a casa, a reserva de emergência, a tranquilidade da família, a saúde. **Risco de negócio** é perder capital que você podia perder. Hospedagem não precisa do primeiro.

Medir resolve os dois erros: quem sabe quanto pode investir e quanto pode perder troca a espera pelo momento certo pela escolha do tamanho certo. E número pequeno não impede ninguém: «E se esse número for pequeno, isso não encerra a Jornada: ele aponta para as Portas 3 e 4, que foram desenhadas exatamente para esse caso.»

REVISITE

De memória: quais são os quatro filtros pessoais do Z00 (Capítulo 3), e em que ordem o Comparador das Quatro Portas™ os aplica? Qual foi a sua decisão no Diagnóstico do Z01 (Capítulo 8)? Ela muda o uso deste capítulo:

- **Seguir:** o lugar sustenta; a pergunta agora é que porte e que porta cabem em você.
- **Ajustar:** os recursos medidos aqui costumam indicar o ajuste: porte menor, primeira fase, outra porta.
- **Parar:** os recursos servem à saída escolhida, inclusive administrar o imóvel de outro ou adiar com condição verificável e data.

Os quatro recursos, e a ordem em que filtram

A Jornada do COMO resume: «Capital, risco, tempo e conhecimento: as quatro coisas que decidem qual porta cabe em você.» Capital e risco eliminam a maior parte das opções; tempo e competência refinam o que sobrou. Aqui as ferramentas do Z00 são usadas com números, num caso só.



Figura 1.1 · Os quatro recursos, as ferramentas da Jornada do COMO · Etapa 01 e a ordem em que filtram as portas.

Capital Real Disponível™: uma conta de subtração

O dinheiro que você pode investir é menor que o dinheiro que você tem, e a diferença não é pequena.

JORNADA DO COMO · ETAPA 01

A conta parte do saldo que você resgata em até trinta dias. Casa, carro e terreno ficam fora: são patrimônio, não caixa. Desse saldo saem quatro subtrações, e a Jornada avisa que omitir qualquer uma é entrar com capital insuficiente, «que é a causa número um de hospedagem que abre e fecha».

LINHA	COMO CALCULAR
Saldo total disponível	Conta, aplicação, o que se resgata em 30 dias
(–) Reserva pessoal de emergência	6 a 12 meses das suas despesas pessoais, medidas nos últimos três meses
(–) Dívidas caras	Cartão, cheque especial, crédito pessoal
(–) Compromissos dos próximos 24 meses	Escola, tratamento, financiamento, família
(=) Capital investível	O que pode entrar no negócio
(–) Capital de giro do negócio	Necessidade técnica mais 3 meses de obrigações fixas (regra do método)
(=) Capital para o investimento	O que compra terreno, obra, imóvel ou mobília

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 01, Passo 05, Capital Real Disponível™. Linha do giro: regra do método; os seis meses de custo fixo da fonte ficam só como referência preliminar antiga.

A reserva é intocável porque nos meses de vale o negócio não distribui, porque o primeiro ano tem ocupação baixa por construção e porque uma emergência com a reserva empregada força a venda de algo no pior momento. «Quem investe a reserva de emergência não está correndo risco de negócio: está correndo risco de vida, e isso não é uma decisão de investimento.»

A dívida cara sai antes porque quitá-la rende o custo dela, garantido e imediato: «Quitar essas dívidas rende mais que qualquer hospedagem, e com risco zero.» **Há duas linhas de resultado** de propósito: o que pode entrar no negócio e o que pode virar ativo. «Confundir as duas é como operações abrem sem giro.» Capital de giro é a reserva que paga as contas enquanto a receita não chega ao regime. Pela regra do método, ele soma a necessidade técnica (o déficit acumulado da rampa e os meses negativos do ano de regime) e uma reserva operacional de três meses de obrigações fixas (custo fixo com retirada, aluguel e taxas fixas). Para as cinco cabanas de Marina, as duas partes estão calculadas no Capítulo 3; aqui entra o total.

Dinheiro dos outros só conta quando está contratado: «Capital de sócio, de familiar ou de banco não é o seu capital: ele tem custo e tem prazo.» O mais traiçoeiro: «Promessa de aporte de familiar é a mais perigosa das três, porque ela não tem contrato e tem relação.» O Volume 05 estende a regra ao bem que você pretende vender: «Capital que depende de vender outra coisa não é capital dis-

ponível: é uma premissa, e vai para a matriz de risco.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina faz a subtração

Marina, do terreno herdado na serra, saiu do Z01 com a decisão de ajustar. Tem a casa onde mora (estima R$ 700 mil), o terreno (estima R$ 600 mil) e R$ 520 mil resgatáveis em trinta dias. Gasta R$ 11 mil por mês, deve R$ 14 mil no cartão e tem R$ 38 mil de compromissos nos próximos 24 meses. O irmão prometeu "entrar com R$ 100 mil". O custo fixo das cinco cabanas, da conta do Z01, é de R$ 20 mil por mês.

- **Reserva de 8 meses:** 11.000 × 8 = R$ 88.000.
- **Capital investível:** 520.000 − 88.000 − 14.000 − 38.000 = **R$ 380.000**.
- **Giro, pela regra do método:** necessidade técnica de R$ 125.728 (déficit da rampa e meses negativos do regime) mais reserva de 3 × 20.000 = R$ 60.000: R$ 185.728 (a conta está no Capítulo 3).
- **Capital para o investimento:** 380.000 − 185.728 = **R$ 194.272**.
- **Promessa do irmão:** fora da conta. Sem contrato, é premissa.

Conferência: 88.000 + 14.000 + 38.000 + 185.728 + 194.272 = 520.000. De um patrimônio de R$ 1,82 milhão, ela pode investir em ativo cerca de 11% (194.272 ÷ 1.820.000 = 10,7%).

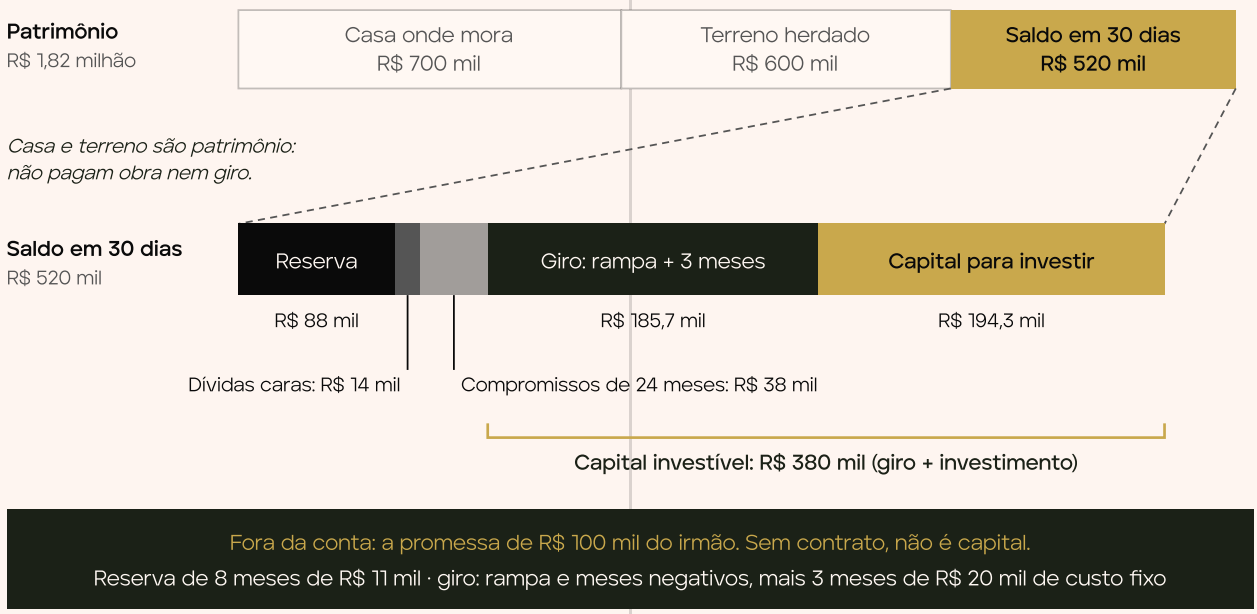


Figura 1.2 · Do patrimônio ao capital real, no exemplo ilustrativo de Marina. A barra de baixo amplia o saldo em escala própria.

Os R$ 194 mil constroem as cinco cabanas? O Capítulo 3 faz essa conta. Se não construírem, há três caminhos: fase menor (Capítulo 4), outra porta (Capítulo 2) ou capital de terceiros contratado (Capítulo 5 e pilar Financiar). O terreno dispensa a compra da terra, mas não paga cimento, mobília nem o mês de baixa temporada vazio.

O limite de perda aceitável

O Capital Real Disponível™ diz quanto pode entrar. Falta dizer quanto pode sumir. O Volume 05 · Investimento chama esse número de **limite de perda aceitável** e pede que ele seja definido antes de pensar em qualquer fonte de capital: «Não o quanto você tem: o quanto você pode perder sem comprometer a sua vida. Esse número, e não o saldo, é o seu capital de risco.»

Capital próprio: o mais barato em dinheiro e o mais caro em risco, porque concentra.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

O limite costuma ser menor que o capital para o investimento, e é ele que define o tamanho da aposta. O Manual Oficial do Método trata isso como dever: «O Developer entende que proteger capital é uma responsabilidade ética.» Um alerta: a

garantia pessoal muda a natureza do risco, e o Volume 05 explica como: «sem aval pessoal, o pior cenário é perder o investido; com aval pessoal, o pior cenário alcança a sua casa.» Garantias e contratos aparecem no Capítulo 5, em nível introdutório, e no pilar Financiar, sempre com advogado e contador.

Teste de Risco Suportável™: três perguntas

FRAMEWORK DO MÉTODO

Teste de Risco Suportável™

«Este passo mede a sua capacidade de absorver perda, que é diferente da sua disposição a correr risco.»

- **01 · O teste do valor:** se perder todo o capital investido, a sua vida muda?
- **02 · O teste do prazo:** se o negócio não distribuir nada por 24 meses, você se sustenta?
- **03 · O teste do aporte:** se precisar aportar mais 20% no meio do caminho, você tem?

Três "sim": o valor cabe. Qualquer "não": valor menor ou outra porta.

O teste não mede coragem: «A mesma pessoa suporta riscos diferentes em momentos diferentes da vida». Depois das perguntas, escreva a perda máxima de cada porta no seu caso.

PORTA	PERDA MÁXIMA	PREVISÍVEL?	EM QUANTO TEMPO
1 · Construir	Boa parte do capital	Pouco	12 a 30 meses
2 · Comprar pronto	Capital menos valor do imóvel	Médio	6 a 24 meses
3 · Alugar para hospedar	Mobília + aluguéis contratados	Sim, calculável	6 a 18 meses
4 · Administrar o de outro	Investimento em estrutura	Sim, pequena	3 a 12 meses

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 01, Passo 06

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 01, Passo 06.

Nas Portas 3 e 4 a perda máxima se conhece antes de começar; nas Portas 1 e 2 ela tem cauda, porque obra estoura e imóvel demora a vender. «Saber a perda máxima antes de decidir é o que transforma um risco em uma aposta calculada». A regra final do tutorial é dura: elimine as portas cuja perda máxima excede o valor da primeira pergunta. «Não discuta: elimine.»


EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Quanto Marina pode perder

Valor: R$ 180 mil, sem mudar de vida; o resto do capital tem destino. **Prazo:** sim, ela mantém o emprego. **Aporte:** depende do valor investido. O Z02 usa uma leitura conservadora: o aporte também pode se perder, então a primeira fase mais 20% precisa caber no limite.

- **Teto da primeira fase:** investimento × 1,2 ≤ 180.000, logo 180.000 ÷ 1,2 = **R$ 150.000**.
- **Aporte reservado:** 20% de 150.000 = R$ 30.000. Conferência: 150.000 + 30.000 = 180.000.
- **Não exposto:** 194.272 − 180.000 = R$ 14.272, além do giro.

Se as cinco cabanas de uma vez custarem mais de R$ 150 mil, a Porta 1 nesse tamanho sai pelo risco. Sobram a Porta 1 em fase menor e as Portas 3 e 4: o "ajustar" do Z01, agora com número.



Marina: 1ª fase de R$ 150 mil + aporte de R$ 30 mil = R$ 180 mil, o limite de perda.
O que passa de R$ 380 mil é reserva, dívida e compromisso: perder isso muda a vida.

Valores em R$ mil · exemplo ilustrativo

Figura 1.3 · A régua de risco suportável: o limite de perda, não o saldo, define o tamanho da primeira aposta.

Agenda Real por Semana™: horas em horário de hóspede

Hóspede chega na sexta à noite, tem um problema no sábado e sai no domingo. Atendimento e operação física são rígidos de horário. Por isso a ferramenta conta só as horas livres em horário de hóspede: sexta à noite, sábado, domingo e feriado.

SITUAÇÃO	HORAS POR SEMANA	EM HORÁRIO DE HÓSPEDE?
Administrar 1 imóvel de outro	4 a 8	Boa parte
Administrar 4 imóveis de outros	14 a 24	Boa parte
Alugar e operar 1 imóvel	6 a 12	Boa parte
Alugar e operar 3 imóveis	16 a 30	Boa parte
Operar 2 unidades próprias	10 a 20	Boa parte
Acompanhar uma obra	+10 a +20	Não, horário comercial

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 01, Passo 07. A obra soma às outras linhas, por 12 a 18 meses.

A última linha é a que mais quebra planos: «Obra em paralelo com trabalho integral é o plano que mais frequentemente atrasa e estoura.» A saída tem preço: «A solução é um gerenciador contratado, e ele é uma linha do orçamento, não um favor.» «Essa não é uma limitação de ambição: é aritmética de horas, e ela é o segundo filtro depois do capital.»

Marina tem 14 horas livres por semana, 8 em horário de hóspede. Cinco unidades próprias pedem mais que as 10 a 20 horas da linha de duas, e a obra somaria outras 10 a 20 em horário comercial. A agenda não elimina o projeto: acrescenta ao orçamento um gerenciador de obra e uma pessoa local na operação, duas linhas para o Capítulo 3.

Mapa de Competência™: faz, aprende ou contrata

Operar exige oito frentes, e ninguém entra com as oito. «A boa notícia é que conhecimento é o único dos quatro recursos que se adquire rápido: boa parte dessas frentes se aprende em semanas, e o que não se aprende se contrata.» O risco está no momento da descoberta: «O que não funciona é descobrir a la-

cuna no meio do caminho, com dinheiro comprometido.»

FRENTE	FAZ, APRENDE OU CONTRATA	ONDE O MÉTODO APROFUNDA
Hospitalidade	Faz	O · Operar; M · Marca e Experiência
Produto e decoração	Aprende ou contrata	M · Marca e Experiência
Fotografia e anúncio	Contrata a foto, faz o anúncio	L · Vender
Preço	Aprende, não delega	L · Vender
Canais	Aprende	L · Vender
Operação	Contrata a execução, faz o processo	O · Operar
Números	Aprende o gerencial, contrata o contábil	G · Gerir
Obra ou reforma	Contrata sempre	E · Implantar

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 01, Passo 08 (duas primeiras colunas). A última é a remissão do Z02 aos pilares.

Preço, resposta a hóspede em exceção e decisão de produto não se delegam no primeiro ano: «Delegar essas três no primeiro ano é delegar o aprendizado que torna você capaz de delegar mais tarde.» Escolha no máximo duas frentes para aprender em noventa dias e contrate o resto. A Ordem das Coisas resume: «a ignorância operacional é contratável e a desordem decisória não é.» E cada contratação vira custo de projeto: «Se "eu contrato" ficou com muitas marcações, isso não é um problema: é o seu organograma e parte do seu CAPEX.» CAPEX é o investimento para implantar, tema do Capítulo 3.

Para quem já opera: caixa não é faturamento

Na Jornada B, a ilusão é a receita de doze meses. Quase toda ela tem destino: comissões, impostos, fornecedores, reposição, meses de vale. O Volume 05 alerta

contra somar o caixa da empresa como folga, «porque aquele caixa tem outras obrigações». O que for de fato destinado ao crescimento vira decisão registrada: «Se o caixa existente for mesmo destinado ao projeto, ele entra como aporte próprio na linha de captação, com data, não como saldo de partida.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael separa receita de capital

Rafael, dos quatro chalés, saiu do Z01 com a decisão de seguir, crescendo sem obra: administrar imóveis de terceiros. Receita de doze meses no cenário base do Z01: 31.680 × 12 = **R$ 380.160**. Caixa da empresa hoje: R$ 140.000.

- **Caixa livre:** 140.000 − 18.000 (contas do mês) − 11.405 (reserva de reposição: 3% da receita de doze meses, 0,03 × 380.160 = 11.404,80) − 36.000 (giro: três meses do fixo de R$ 12.000; sem rampa e sem mês negativo no regime, a necessidade técnica é zero) = **R$ 74.595**.
- **Capital real pessoal:** 90.000 − 72.000 (reserva de 8 meses de R$ 9.000), sem dívidas nem compromissos = **R$ 18.000**.
- **Capital real total:** 74.595 + 18.000 = **R$ 92.595**, 24,4% da receita (92.595 ÷ 380.160).

Para a Porta 4, cuja perda máxima é a estrutura, pequena e calculável, o número cabe. Cada imóvel administrado pede de 4 a 8 horas por semana, e antes vem o teste dos trinta dias do Z00. Como diz a Jornada: «Você escala adicionando imóveis, sem capital, limitado pela sua capacidade de operar.»

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** preencha o Capital Real Disponível™ com despesas reais e sem promessas. Escreva o limite de perda, responda ao Teste de Risco Suportável™ e calcule o teto da primeira fase com o aporte dentro do limite. Some as horas em horário de hóspede e escolha as duas frentes dos próximos noventa dias.
- **Jornada B · Quero crescer:** do caixa de hoje, tire as contas do mês, a reserva de reposição (3% da receita) e o capital de giro (três meses de obrigações fixas, mais a necessidade técnica se houver meses negativos); some o capital pessoal. Registre quanto vai para o crescimento, com data. Refaça a agenda com as horas que a operação já consome.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Paralisia e aposta grande demais nascem da mesma falta de medida.
- Capital Real Disponível™ = saldo em 30 dias − reserva − dívidas caras − compromissos − giro.
- Há duas linhas de resultado: o que entra no negócio e o que vira ativo.
- Dinheiro de terceiros só conta contratado; promessa é premissa.
- O limite de perda, e não o saldo, define o tamanho da aposta.
- Tempo se conta em horário de hóspede; obra em paralelo pede gerenciador no orçamento.
- Para quem opera, capital real é caixa livre mais capital pessoal, nunca faturamento.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda de memória, por escrito, antes de abrir a resposta.

1. Quais são as quatro subtrações do Capital Real Disponível™?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Exemplo ilustrativo: saldo de R$ 300 mil, despesas de R$ 8 mil por mês, reserva de 8 meses, R$ 10 mil de cheque especial, R$ 20 mil de compromissos, custo fixo de R$ 9 mil. Qual é o capital para o investimento?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Qual é a diferença entre capital para o investimento e limite de perda aceitável?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Doze horas livres, todas de segunda a quinta, emprego mantido, plano de construir. O que diz a Agenda Real por Semana™?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

No exemplo ilustrativo da Jornada do COMO, duas pessoas com os mesmos R$ 400 mil terminam a subtração com R$ 256 mil e R$ 69 mil para investir: «Mesmo saldo e capitais de investimento quase quatro vezes diferentes.»

REFLEXÃO

Que valor você poderia perder amanhã sem mudar nada em casa? É maior ou menor que o projeto que você imagina?

DICA

Nesta semana, some nos extratos as despesas pessoais reais dos últimos três meses. É o número que define a sua reserva.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 01

1. Preencha o Capital Real Disponível™, linha a linha, e circule o último número.

2. Que dinheiro de terceiros você vinha contando? Qual está contratado?

3. Escreva o limite de perda, as três respostas do Teste de Risco Suportável™, o teto da primeira fase e as portas eliminadas.

4. Quantas horas livres você tem em horário de hóspede? Que situações cabem?

5. Quais duas frentes do Mapa de Competência™ você aprende nos próximos 90 dias, e o que contrata?

6. Jornada B: qual é o seu caixa livre, e quanto dele vai para o crescimento, a partir de quando?

CAPÍTULO 02

AS QUATRO PORTAS

As quatro portas, *com as suas contas.*

No Zoo as quatro portas apareceram com faixas e adjetivos. Aqui elas recebem os seus números. E a porta que sobra no fim da conta nem sempre é a que você sonhou.

NESTE CAPÍTULO

- Por que as quatro portas são quatro negócios, e não quatro preços do mesmo negócio.
- As contas de cada porta, passo a passo, e a diferença entre investimento total e capital próprio exigido.
- O Comparador das Quatro Portas™ e a Linha do Tempo até o Primeiro Real™ aplicados a uma mesma pessoa.
- O que fazer quando a porta certa não é a dos sonhos, e como as portas servem a quem já opera.

"Capital alto", "prazo curto" e "perda calculável" são adjetivos, e adjetivo não cabe em extrato bancário. A decisão só aparece quando cada coluna recebe um valor em reais, em semanas e em horas. A Jornada do COMO é explícita: «Preencha esta tabela com os seus números absolutos no exercício, não com as faixas. A decisão fica evidente quando as quatro colunas têm valores reais em lugar de adjetivos.» Este capítulo faz essa troca.

REVISITE · Z00, CAPÍTULO 3, E Z02, CAPÍTULO 1

Tente responder de memória: quais são as quatro portas e em que ordem o comparador aplica os filtros? Depois, separe os quatro números do Capítulo 1: o capital de investimento do Capital Real Disponível™, a perda suportável do Teste de Risco Suportável™, as horas úteis da Agenda Real por Semana™ e as frentes não cobertas do Mapa de Competência™. Tudo o que segue se apoia neles.

Quatro negócios, não quatro preços

O erro mais comum é ler as portas como versões mais caras ou mais baratas da mesma coisa. A Jornada separa a natureza de cada uma: construir e comprar são «negócios de patrimônio com operação acoplada»; alugar é um «negócio de operação pura, com contrato longo como principal risco»; administrar é um «negócio de serviço, que escala sem capital e sem ativo». Quem escolhe a porta escolhe também o tipo de empresário que vai ser.

A Ordem das Coisas acrescenta que todas constroem algo, mas não a mesma coisa. As Portas 1 e 2 constroem patrimônio imobiliário; as Portas 3 e 4, patrimônio operacional: processo, reputação, conhecimento real do destino. Ao desempatar, o próprio comparador pergunta o que cada uma constrói: «patrimônio, operação ou reputação de gestor».

PORTA	ONDE O CAPITAL ENTRA	NATUREZA	O QUE CONSTRÓI
1 · Construir	Terreno, projeto, obra, mobiliário, giro	Patrimônio com operação acoplada	Patrimônio imobiliário
2 · Comprar pronto e adaptar	Aquisição, adequação, mobiliário, giro	Patrimônio com operação acoplada	Patrimônio imobiliário
3 · Alugar para hospedar	Mobiliário, enxoval, adequação, giro	Operação pura	Patrimônio operacional
4 · Administrar o de outro	Estrutura de gestão e giro operacional	Serviço	Operação e reputação de gestor

Tabela 2.1 · A natureza das quatro portas. Fontes: A Ordem das Coisas, Caps. 04 e 11; Jornada do COMO, Etapa 01, Passos 01 e 09.



Figura 2.1 · As quatro portas por capital exigido e prazo até a primeira receita, com os prazos da Jornada do COMO, Etapa 01. A seta resume uma regra da mesma fonte, citada adiante: construir depois, com operação rodando.

Repare nos quadrantes vazios. Nenhuma porta combina capital alto com prazo de semanas, e nenhuma combina capital baixo com prazo de anos: mais dinheiro não compra começo rápido, e começar com pouco não condena ninguém a esperar. A ordem das portas pode ser também uma ordem de vida.

FRAMEWORK DO MÉTODO

Mapa das Quatro Portas™

O primeiro uso do mapa é descobrir em qual porta você pensava sem saber. Os sete passos da Etapa 01:

- Escreva, em uma frase, o que você imaginou quando pensou em hospedagem, sem editar.
- Identifique a porta que essa imagem descreve. Quase sempre é a 1.
- Leia as outras três com atenção.
- Marque a que você nunca tinha considerado. Normalmente é a 4.
- Não decida nada ainda: a decisão vem depois da conta.
- Anote por que a porta imaginada atraiu você. Patrimônio? Controle? Orgulho?
- Guarde a folha para comparar com a decisão final.

Escolher sem ter visto as quatro não é ousadia — é escolher no escuro uma decisão que contamina todas as seguintes.

A ORDEM DAS COISAS

As contas de cada porta

No Z00 você viu o que cada conta contém. Agora importa como se preenche, em que ordem e onde o número costuma mentir.

PORTA 1 · CONTA DE CONSTRUIR™

FRAMEWORK DO MÉTODO

Conta de Construir™ · os sete passos

- **01** · Escreva o valor do terreno; se você já tem, o valor de mercado.
- **02** · Peça orçamento de infraestrutura de sítio: acesso, terraplenagem, água, energia, esgoto.
- **03** · Peça orçamento de projeto e licenciamento a um arquiteto da região.
- **04** · Peça orçamento de obra, por metro quadrado, a dois construtores, não a um.
- **05** · Liste mobiliário, enxoval e equipamento, item a item, com preços de hoje.
- **06** · Calcule o capital de giro pela regra do método: necessidade técnica (déficit acumulado da rampa mais os meses negativos do ano de regime) mais reserva operacional de três meses de obrigações fixas (custo fixo com retirada, aluguel e taxas fixas). A fonte usa seis meses de custo fixo, hoje só referência preliminar antiga.
- **07** · Acrescente de 15% a 20% de contingência sobre o total das seis linhas.

Três cuidados. O terreno herdado entra na conta: «Terreno que você já possui tem custo — ele é capital empregado.» A contingência tem duas regras nas fontes, com bases diferentes; o Capítulo 3 as compara, e aqui usamos o teto da Etapa 01, 20%. E há um custo que a tabela não mostra: «Na Porta 1, o custo de capital corre desde o primeiro desembolso, e ele é o custo mais esquecido da conta.»

PORTA 2 · CHECKLIST DO IMÓVEL PRONTO™

«Comprar pronto troca o risco de obra pelo risco do que vem junto com o imóvel.» O tutorial põe primeiro o que pode matar o negócio a custo baixo: 01 · consulta prévia de zoneamento na prefeitura, antes de qualquer proposta; 02 · matrícula atualizada, com ônus e averbação; 03 · laudo estrutural com engenheiro seu, não o do vendedor; 04 · água, esgoto e energia verificados fisicamente; 05 · certidões negativas de IPTU e taxas; 06 · dois anos de avaliações, em todos os canais, se o imóvel opera; 07 · adequação orçada item a item, de 15% a 30% do valor do imóvel. O último passo existe porque «Uma adaptação mal avaliada custa mais do que uma obra nova, e essa é a armadilha específica desta porta.» Confirme cada item com advogado, engenheiro e prefeitura.

ATENÇÃO À CONTA

Investimento total não é capital próprio exigido

Somar o valor inteiro do imóvel mede o **investimento total**. Com parte da compra financiada, sairia do seu bolso a entrada mais aquisição, adequação, mobília, giro e contingência: o **capital próprio exigido**. Mas a regra do Capítulo 1 continua valendo: «Capital de sócio, de familiar ou de banco não é o seu capital: ele tem custo e tem prazo.» Ele conta «apenas quando está contratado, não quando é uma possibilidade». No comparador, use o capital próprio só com financiamento contratado; enquanto for hipótese, use o total. E as parcelas correm antes da primeira reserva. Crédito e garantias são tema do pilar F · Financiar, com contador e advogado. Nada aqui é promessa de crédito.

PORTA 3 · CONTA DE ALUGAR PARA HOSPEDAR™

FRAMEWORK DO MÉTODO

Conta de Alugar para Hospedar™ · os sete passos

- **01** · Verifique a convenção do condomínio, se for apartamento.
- **02** · Consulte o zoneamento municipal para o endereço.
- **03** · Negocie a cláusula de autorização expressa, por escrito. Sem ela, não avance.
- **04** · Negocie prazo de 30 a 60 meses e a condição de reajuste.
- **05** · Orce mobília, enxoval, equipamento e adequação leve, item a item.
- **06** · Calcule o aluguel dos meses de vale como reserva.
- **07** · Some tudo: é o capital da Porta 3 para aquele imóvel.

O contrato vem antes da mobília, e o passo 03 é o centro: «É o item que decide se a Porta 3 é um negócio ou uma exposição.» A locação para temporada tem regra própria na Lei nº 8.245/1991, e a cláusula certa depende do imóvel e do município: decisão de advogado, antes de qualquer móvel. Há ainda a perda máxima, que o Teste de Risco Suportável™ define como a mobília mais os aluguéis contratados: some o que você deveria ao proprietário se saísse antes, multa incluída.

PORTA 4 · A CONTA DE ADMINISTRAR O DE OUTRO

A conta é curta. O capital é «quase nenhum: sistema, fotografia, material de limpeza e o seu tempo». A remuneração é «um percentual da receita, tipicamente entre quinze e vinte e cinco por cento, ou um valor fixo mais participação». As horas vão de quatro a oito por semana para um imóvel e de quatorze a vinte e quatro para quatro.

Um cuidado de leitura: no exemplo da Jornada, R$ 28 mil é o capital para **seis** imóveis, e a fonte não traz o custo por imóvel. Não copie esse valor para outro porte. Separe uma parte fixa (sistema, estrutura mínima) e uma parte por imóvel (fotografia, material), e o capital acompanha o porte que os filtros permitirem. O risco é a dependência do proprietário: «Os dois se mitigam com contrato — prazo mínimo, multa, obrigação de reinvestimento — e nunca se eliminam.»

O comparador e a linha do tempo

O **Comparador das Quatro Portas**™ elimina. Os sete passos: traga o capital de investimento, a perda suportável, as horas úteis e as frentes não cobertas; aplique os quatro filtros na ordem (capital, risco, tempo, competência); se sobrar mais de uma porta, compare retorno, prazo e o que cada uma constrói; escreva as portas possíveis, «Uma ou duas, normalmente.» A ordem tem razão: «A maior parte das eliminações acontece no primeiro ou no segundo filtro.»



Figura 2.2 · Os filtros do Comparador das Quatro Portas™, na ordem da Jornada do COMO, Etapa 01, Passo 09. À direita, o resultado de cada filtro no exemplo ilustrativo de Helena.

O porte também é resultado dos filtros, e não só a porta.

JORNADA DO COMO · ETAPA 01

No desempate, a Jornada manda comparar «pelo retorno sobre o capital empregado no segundo ano, não pelo resultado absoluto», sem dar fórmula. Usamos a mais simples, rotulada como nossa: resultado anual do segundo ano dividido pelo capital empregado. Depois vem o prazo, com a **Linha do Tempo até o Primeiro Real**™: para cada porta possível, escreva o prazo até a primeira reserva; acrescente o prazo até a ocupação de regime; liste as despesas que correm antes da primeira receita; multiplique-as pelos meses de espera, porque o resultado «É capital de giro adicional»; confira se cabe no seu capital («Se não cabe, o prazo é longo demais para você»); pergunte se você atravessa o período sem desistir; e, se sobrar mais de uma, escolha a de menor prazo.

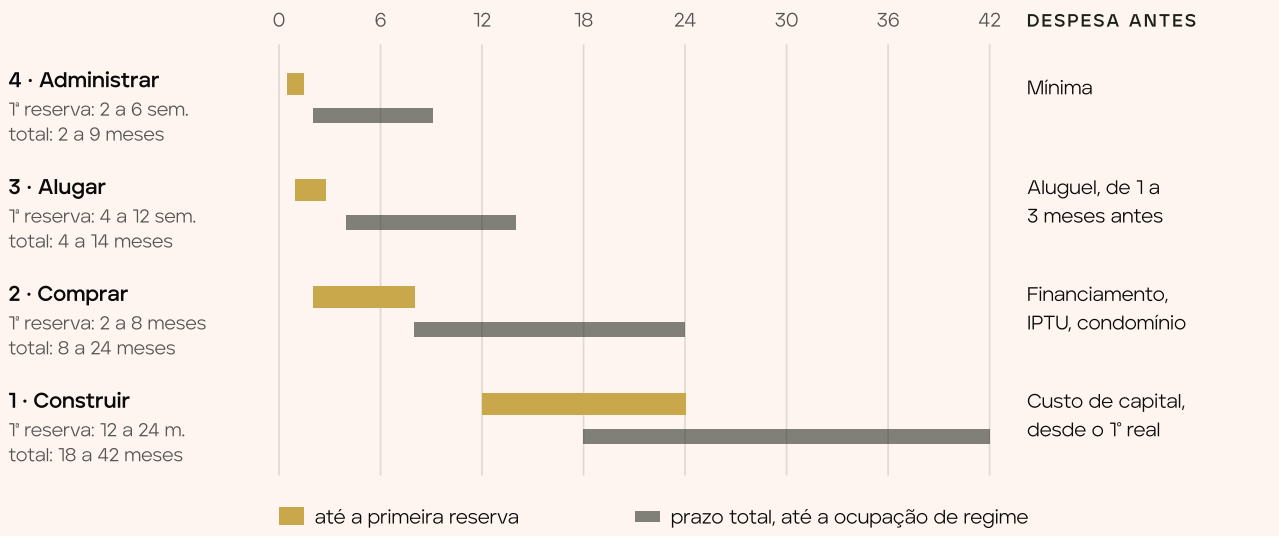


Figura 2.3 · A Linha do Tempo até o Primeiro Real™ por porta, com a despesa que corre antes da primeira receita. Faixas da Jornada do COMO, Etapa 01, Passo 10; escala em meses.

Exemplo resolvido: quatro portas, uma pessoa

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Helena e as duas cabanas que ela imaginou

Helena trabalha em horário integral e imaginou duas cabanas num destino de serra: Porta 1. Pelo Capítulo 1, ela tem **R$ 180.000 de capital de investimento**, **perda suportável de R$ 120.000**, **9 horas úteis** por semana e duas frentes não cobertas: obra, que não pode acompanhar, e avaliação de imóvel, que pode contratar. Os valores são inventados para ensinar a conta; não são referência para o seu destino.

Porta 1. Terreno R$ 150.000; infraestrutura R$ 110.000; projeto e licenciamento R$ 50.000; obra R$ 360.000; mobiliário R$ 80.000; giro de 3 × R$ 8.000 = R$ 24.000 (só a reserva de três meses: neste comparador rápido, a rampa ainda não foi calculada e se soma depois). Seis linhas: R$ 774.000. Contingência de 20%: R$ 154.800. Total: **R$ 928.800**, com a obra em 38,8% dele.

Porta 2. Casa de três quartos R$ 520.000; aquisição R$ 31.000; laudo e certidões R$ 5.000; adequação R$ 88.000 (16,9% do imóvel); mobiliário R$ 66.000; giro de 3 × R$ 6.000 = R$ 18.000. Seis linhas: R$ 728.000; contingência de 15%: R$ 109.200. Investimento total: **R$ 837.200**. Só para testar a leitura, com uma entrada hipotética de 40% (R$ 208.000), o capital próprio seria R$ 208.000 + R$ 208.000 + R$ 109.200 = **R$ 525.200**.

Porta 3. Casa alugada por R$ 3.000 ao mês, com autorização expressa: mobília R$ 52.000; adequação R$ 9.000; sistema e fotografia R$ 4.000; reserva de quatro aluguéis R$ 12.000. Capital: **R$ 77.000**. Perda máxima, com multa de saída de três aluguéis: **R$ 86.000**.

Porta 4. Parte fixa de R$ 6.000 mais R$ 3.000 por imóvel. Dois imóveis: **R$ 12.000**, que é também a perda máxima.

FILTRO	PORTA 1	PORTA 2	PORTA 3	PORTA 4
Capital exigido	R$ 928.800	R$ 837.200	R$ 77.000 (1 imóvel)	R$ 12.000 (2 imóveis)
Passa no capital (R$ 180.000)?	Não	Não	Sim	Sim
Perda máxima	Não se aplica	Não se aplica	R$ 86.000; com 2 imóveis, R$ 172.000	R$ 12.000
Passa no risco (R$ 120.000)?	Não se aplica	Não se aplica	Só com 1 imóvel	Sim
Horas exigidas	Não se aplica	Não se aplica	6 a 12	4 a 8 por imóvel: 8 a 16 em 2; 14 a 24 em 4
Passa no tempo (9 horas)?	Não se aplica	Não se aplica	Apertado, com limpeza terceirizada	Apertado com 2 (8 a 16 horas para 9); folga com 1
Resultado	Eliminada	Eliminada	Possível, 1 imóvel	Possível, 2 imóveis

Tabela 2.2 · Comparador das Quatro Portas™ de Helena. Exemplo ilustrativo. Conferência: 774.000 × 1,20 = 928.800; 728.000 × 1,15 = 837.200; 52.000 + 9.000 + 4.000 + 12.000 = 77.000; 77.000 + 3 × 3.000 = 86.000; 2 × 86.000 = 172.000.

A Porta 2 sairia mesmo na leitura mais favorável: R$ 525.200 é quase três vezes o capital de Helena. E sem financiamento contratado, a leitura correta é pelo total. A Porta 3 passa no capital também com dois imóveis (R$ 154.000), mas não no risco: fica com um. Na Porta 4, quatro imóveis não cabem nas horas; dois cabem só no limite de baixo (8 a 16 horas para as 9 de Helena), com limpeza terceirizada, como a Porta 3. A competência não elimina nada: nenhuma das duas exige obra, o contrato vai ao advogado, e preço e operação se aprendem em semanas. Sobram duas portas. O desempate usa o segundo ano, já em ocupação de regime.

SEGUNDO ANO	PORTA 3 · 1 IMÓVEL ALUGADO	PORTA 4 · 2 IMÓVEIS ADMINISTRADOS
Receita	R$ 90.000 (200 noites × R$ 450)	R$ 200.000 dos imóveis; a ela cabem 20%: R$ 40.000
Aluguel	− R$ 36.000	Não há
Custo de operar	− R$ 36.000 (40% da receita)	− R$ 20.000
Resultado anual	R$ 18.000	R$ 20.000
Resultado ÷ capital (cálculo nosso)	23,4%	166,7%
Prazo total até o regime	4 a 14 meses	2 a 9 meses
Despesa antes da 1ª receita	Até 3 aluguéis: R$ 9.000	Mínima
O que constrói	Operação com produto sob controle	Reputação de gestor

Tabela 2.3 · O desempate. Exemplo ilustrativo; prazos da Jornada do COMO, Etapa 01, Passo 10. Conferência: 90.000 − 36.000 − 36.000 = 18.000; 18.000 ÷ 77.000 = 23,4%. 200.000 × 0,20 = 40.000; 40.000 − 20.000 = 20.000; 20.000 ÷ 12.000 = 166,7%. Aluguel antecipado: 3 × 3.000 = 9.000.

Os resultados absolutos são parecidos, e é por isso que a Jornada manda não olhar para eles. Por capital empregado, a Porta 4 rende cerca de sete vezes mais (166,7 ÷ 23,4 = 7,1), tem o prazo mais curto e a menor despesa antes da receita. As duas cabem no fôlego: na Porta 3, capital mais espera somam R$ 86.000. A escolha é a **Porta 4, com dois imóveis**. Helena entra com R$ 12.000 e mantém R$ 168.000 para a decisão seguinte. A Porta 3 fica anotada como provável segunda porta, depois de um ano completo na primeira: «Escolha uma, opere por um ano completo — com uma alta e um vale — e some a segunda depois, se ainda fizer sentido.»

Quando a porta certa não é a dos sonhos

Helena imaginou cabanas e saiu administrando a casa de outras pessoas. É normal que doa. Volte ao motivo anotado no Mapa. Se era **patrimônio**, a porta de baixo

capital não o nega: adia, e gera caixa e informação que tornam a Porta 1 mais possível depois. Se era **controle**, a Porta 3 entrega controle total do produto; a 4 não. Se era **orgulho**, a pergunta honesta é se ele vale o risco de vida que o Teste de Risco Suportável™ mandou eliminar. «E a porta que cabe em você não é a mais barata nem a mais ambiciosa: é a que cabe no seu capital, no seu risco e no seu tempo.»

Construir depois, com operação rodando e dinheiro próprio, é mais fácil que construir primeiro.

JORNADA DO COMO · ETAPA 01

A Jornada mostra a vantagem: «Quem opera dois anos por uma dessas portas e depois constrói, constrói sabendo o que importa — e a conta do Passo 02 fica muito mais precisa.» A porta dos sonhos não sai da folha; muda de lugar na linha do tempo. E se nenhuma porta sobrar: «Isso acontece, e é informação valiosa: significa que o momento não é agora, e o que falta está identificado.» Se faltou capital ou risco, a Porta 4 com um imóvel quase sempre passa; se faltou tempo, libere horas antes de assinar. A resposta nunca é aumentar a coragem.

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** preencha as quatro contas com números do seu destino. Se você tem terreno, como a Marina do Z01, lance o valor de mercado dele na Conta de Construir™, mesmo sem desembolso. Marina saiu do Diagnóstico com a decisão de ajustar, com energia, área intocável e plano diretor pendentes, a confirmar com concessionária, profissional habilitado e prefeitura. Enquanto isso, compare a Porta 1 no terreno com uma Porta 3 ou 4 na mesma região, que devolve diária e ocupação reais antes da obra.
- **Jornada B · Quero crescer:** as portas viram portas de crescimento. Rafael, dos quatro chalés do Z01, decidiu seguir sem obra. A porta natural dele é a 4: administrar casas de vizinhos na mesma região, com o padrão e os canais que já tem. Exemplo ilustrativo: duas casas com receita bruta de R$ 72.000 por ano cada (15 noites a R$ 400 por mês), a 20%, rendem R$ 28.800 brutos por ano (2 × 72.000 × 0,20), antes do custo de operar e de 4 a 8 horas semanais por imóvel. Antes, o teste: «Se você se ausentasse por trinta dias sem aviso, a operação funcionaria e você saberia o resultado do mês ao voltar?» E uma escolha consciente: administrar o de outro «é um negócio legítimo e lucrativo, mas não acumula valor de venda, e isso precisa ser uma escolha consciente, não uma descoberta no ano cinco». O Capítulo 7 aprofunda; governança fica no pilar G · Gerir.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- As quatro portas são quatro negócios: patrimônio com operação acoplada (1 e 2), operação pura (3) e serviço (4).
- A decisão aparece quando cada coluna recebe números absolutos, não adjetivos.
- Cada conta tem ordem: orçamentos de terceiros na Porta 1, zoneamento e matrícula antes da proposta na 2, contrato antes da mobília na 3.
- Investimento total não é capital próprio exigido; financiamento só entra no filtro quando contratado.
- Na Porta 4, o capital acompanha o porte: parte fixa mais parte por imóvel.
- O comparador elimina portas e reduz portes; o desempate é retorno sobre o capital no segundo ano, prazo e o que cada porta constrói.
- A porta dos sonhos muda de lugar na linha do tempo; não sai da folha.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda sem consultar o capítulo. Depois, abra a resposta de referência e compare.

1. Em que ordem o comparador aplica os filtros, e por quê?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Por que a Porta 2 de Helena foi lida pelo investimento total?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. O que a perda máxima da Porta 3 soma além da mobília?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Por que os R$ 28 mil da Jornada não servem como capital da Porta 4 para qualquer porte?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

A Jornada do COMO resume a Linha do Tempo até o Primeiro Real™ numa frase: «A coluna de total é a que importa para o seu fôlego: ela vai de dois meses a três anos e meio.»

REFLEXÃO

A porta que você imaginou atraiu você por patrimônio, controle ou orgulho? Qual das outras três entrega esse motivo mais tarde, com menos risco agora?

DICA

Nesta semana, peça um orçamento de terceiro para a porta imaginada e uma consulta de zoneamento para o endereço. Duas respostas reais trocam dois adjetivos por números.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 02

1. Qual foi a sua primeira imagem de hospedagem, que porta ela descreve e por que ela atraiu você?

2. Monte a conta da porta imaginada, linha a linha. Qual é o total, e quanto é capital próprio exigido?

3. Monte as contas das Portas 3 e 4: na 3, com reserva de aluguel e perda máxima; na 4, com parte fixa e parte por imóvel.

4. Aplique os quatro filtros na ordem. Quais portas sobraram, e com que porte?

5. Para cada porta possível, escreva o prazo total, a despesa de espera e se você atravessa o período. Qual porta você escolhe, e qual fica como segunda?

CAPÍTULO 03

O INVESTIMENTO NECESSÁRIO

Quanto custa começar *de verdade.*

O orçamento da obra é a parte visível do investimento. O resto fica debaixo da água: o que sai antes de abrir e o que sai depois, até a receita pagar a operação.

NESTE CAPÍTULO

- A Conta do Investimento Necessário™: sete linhas, mais a contingência.
- A Lista do Que Ninguém Orça™ e como ela entra no investimento.
- Contingência e capital de giro: duas regras nas fontes, e qual usar em cada uma.
- A Curva de Rampa do Primeiro Ano™ e por que o capital acaba no meio.
- Um exemplo resolvido, um parcialmente resolvido e uma conta em branco.

No Capítulo 1 você descobriu quanto capital tem de verdade; no Capítulo 2, quais portas cabem nele. Agora, o outro lado da balança: quanto custa a porta escolhida, inteira, e não só o que aparece no orçamento do construtor.

Tudo o que sai antes de abrir, mais o que sai depois de abrir e antes de a receita cobrir. A segunda parte é a que falta em quase todo orçamento.

JORNADA DO COMO · ETAPA 02

Quase todo mundo sabe que precisa pagar a obra. Pouca gente reserva o dinheiro dos meses em que a operação já abriu e ainda não se paga. É esse dinheiro que decide se a hospedagem atravessa o primeiro ano. Todas as contas deste capítulo aparecem passo a passo, para você refazer com os seus números.

Duas partes, sete linhas

FRAMEWORK DO MÉTODO

Conta do Investimento Necessário™

Primeira parte, o que sai até a abertura. Segunda, o que sai depois de abrir e antes de a operação se sustentar. Sete linhas, orçadas uma a uma:

- **Imóvel:** compra, valor do que você já tem, ou luvas e adequação no caso de aluguel.
- **Infraestrutura:** acesso, energia, água, esgoto, terraplenagem; segundo a fonte, a linha de maior variação e a mais subestimada em área rural.
- **Projeto e licenciamento.**
- **Obra ou adequação.**
- **Mobiliário, enxoval, equipamentos e decoração.**
- **Pré-operação:** marca, fotos, site, anúncios, sistemas, treinamento, estoque inicial.
- **Capital de giro:** déficit da rampa, reserva de sazonalidade e três meses de custo fixo.

Mais a **contingência**. Fonte: Jornada do COMO · Etapa 02, Passo 11.

Capital de giro é o dinheiro reservado para pagar a operação enquanto a receita não cobre os custos. **Contingência** é a reserva para o que a obra vai custar além do orçado. Nenhuma das duas é sobra: são linhas do investimento, com valor calculado.

A primeira linha engana quem já tem terreno, como lembra a Etapa 01: «Terreno que você já possui tem custo — ele é capital empregado.» Por isso a conta mostra dois números: o investimento total, com o terreno, que mede o tamanho da aposta; e o desembolso em dinheiro, sem ele, que precisa caber no seu Capital Real Disponível™.

O que fica debaixo da água

A Etapa 01 lista as cinco linhas que quem orça pela primeira vez esquece: infraestrutura de sítio, mobiliário e enxoval, capital de giro, contingência e o custo do ter-

reno próprio.

A obra em si é entre quarenta e sessenta por cento do investimento total. O resto são as linhas que não aparecem no orçamento do construtor.

JORNADA DO COMO · ETAPA 01

O orçamento do construtor não está errado: cobre a obra, que é o que ele faz. O erro é tratá-lo como o investimento. A Etapa 02 completa: «Quem planeja o investimento pelo orçamento do construtor descobre isso no meio do caminho, quando já não há como parar.»



Figura 3.1 · O iceberg do orçamento: a obra acima da linha, o restante do investimento abaixo. Síntese da Jornada do COMO, Etapas 01 e 02.

A Lista do Que Ninguém Orça™

O iceberg tem um segundo andar, que não está na obra: está na operação.

Não são linhas grandes. Somadas, elas costumam valer de dez a vinte pontos de margem.

JORNADA DO COMO · ETAPA 02

FRAMEWORK DO MÉTODO

Lista do Que Ninguém Orça™

LINHA	FAIXA TÍPICA	ONDE ENTRA
1 · Reserva de reposição	3% a 5% da receita	Custo fixo
2 · Impostos sobre a receita	6% a 16% do faturamento	Dedução da receita
3 · Cancelamento e no-show	1% a 3% da receita	Dedução da receita
4 · Comissão de parceiros	Conforme acordo	Custo variável
5 · Quebra e perda	0,5% a 1,5% da receita	Custo variável
6 · Unidade bloqueada para manutenção	2 a 5 dias por unidade por ano	Menos ocupação possível
7 · Cortesias não pagas	Política e provisão	Redução da receita
8 · Treinamento e rotatividade	Variável, alto em hospedagem	Custo fixo
9 · Reajustes anuais	Índice do período	Projeção plurianual
10 · Seu tempo não remunerado	Diferença para o mercado	Custo fixo

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 02, Passo 09. As quatro mais relevantes somam tipicamente de 12% a 22% da receita.

Por que uma lista da operação num capítulo de investimento? Porque o capital de giro é calculado com o resultado de cada mês. Cada linha esquecida melhora o mês no papel e encolhe o déficit da rampa. Quem esquece a lista erra o tamanho da reserva e descobre no primeiro inverno. Para o imposto, a mais cara das omissões: «Converse com um contador antes de fechar a conta: o enquadramento certo é uma das decisões mais rentáveis desta etapa.»

Contingência e capital de giro: duas regras

As duas linhas que mais faltam são as que as fontes calculam de jeitos diferentes. Nenhuma régua está errada; o que não se pode é escolher a mais barata por conveniência.

DIVERGÊNCIA ENTRE AS FONTES

Etapa 01 × Etapa 02

LINHA	JORNADA DO COMO · ETAPA 01	JORNADA DO COMO · ETAPA 02
Contingência	15% a 20% na primeira obra, sobre o total das demais linhas	Primeira obra: 20% a 25% sobre obra e infraestrutura. Com experiência e projeto detalhado: 10% a 15%. Imóvel pronto: 15% a 20%
Capital de giro	Seis meses de custo fixo	Déficit da rampa + reserva de sazonalidade + três meses de custo fixo

Regra deste e-book: na contingência, calcule pelas duas réguas e adote a maior. O excesso não pesa: «A contingência que não for usada vira capital de giro adicional, o que nunca é um problema.» No capital de giro, vale a regra do método, que é a da Etapa 02: necessidade técnica (déficit acumulado da rampa mais os meses negativos do ano de regime) mais reserva operacional de três meses de obrigações fixas (custo fixo com retirada, aluguel e taxas fixas). Os seis meses da Etapa 01 ficam só como referência preliminar antiga.

A contingência, diz a Etapa 01, «não é pessimismo: é a média histórica de desvio de obra pequena.» Os três componentes do giro da Etapa 02 saem assim: o **déficit da rampa** soma os meses negativos do primeiro ano; a **reserva de sazonalidade** soma as diferenças dos meses ruins do ano em regime; a **margem de segurança** são três meses de custo fixo. Aqui, mês ruim é mês com resultado negativo depois de impostos, variáveis e fixo, a leitura mais exigente. Sobre a reserva da baixa:

Essa é a linha do investimento que mais frequentemente falta, e é a que mais fecha operações bonitas.

JORNADA DO COMO · ETAPA 02

A Curva de Rampa do Primeiro Ano™

O déficit da rampa nasce de um fato simples: sem avaliações, histórico nos canais e base de hóspedes, ninguém abre cheio.

Nenhuma hospedagem nova abre na ocupação do destino. Ela chega lá em doze a dezoito meses, e o caminho até lá consome caixa.

JORNADA DO COMO · ETAPA 02

FRAMEWORK DO MÉTODO

Curva de Rampa do Primeiro Ano™

PERÍODO DEPOIS DA ABERTURA	OCUPAÇÃO REAL, EM % DA DE REGIME
Meses 1 a 3	25% a 40%
Meses 4 a 6	45% a 60%
Meses 7 a 12	65% a 85%
Meses 13 a 18	Patamar do destino
Destino sem demanda consolidada	Rampa de 18 a 30 meses

Fonte: Jornada do COMO · Etapa 02, Passo 06, para lazer em destino com demanda existente.

Ocupação de regime é a que o destino entrega a uma operação madura, medida no Z01. A rampa é um percentual dela: regime de 60% com rampa de 40% dá 60 × 0,40 = 24% de ocupação real. Segundo a fonte, a receita do ano 1 costuma ficar de 35% a 45% abaixo da de regime, com os mesmos custos fixos, e «O dinheiro para atravessar esse período precisa estar previsto, e ele é parte do investi-

mento.» A rampa encurta com cinco atalhos da fonte: abrir no começo da alta, preço de entrada agressivo nos primeiros sessenta dias, pedir avaliação a todo hóspede, comunicar antes de abrir e boa foto. Eles diminuem o buraco; não dispensam a reserva.

Exemplo resolvido: as cinco cabanas de Marina

Marina saiu do Z01 com "ajustar": território com potencial, conservador negativo e três alertas, entre eles a energia. Antes de fasear ou mudar o projeto, ela precisa do custo do projeto inteiro.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

As premissas de Marina

Do Z01: cinco cabanas (150 noites por mês), diária de R$ 600, fixo de R$ 20.000 por mês, variável de R$ 120 por noite, deduções de 17% (impostos e comissões de 15%, cancelamento e no-show de 2%) e quebra de 1%, ocupação de regime de 40% (60 noites por mês).

Novas: no regime, 3 meses de alta com 100 noites vendidas, 4 de média com 60 e 5 de baixa com 36; conferência: (300 + 240 + 180) ÷ 12 = 60. Pela Lista do Que Ninguém Orça™, reposição e pró-labore já estão no fixo, e cancelamento e quebra já estão nos 18%. Números didáticos, não dados de operação real.

Passo 1 · O que cada noite deixa. Saem da diária 17% + 1% = 18%: 600 × 0,82 − 120 = **R$ 372**, como no Z01. O fator 0,82 é 1 − deduções − quebra; as deduções mudam com o regime tributário e o canal.

Passo 2 · O regime, mês a mês (noites × 372 − 20.000). Alta: **R$ 17.200**. Média: **R$ 2.320**. Baixa: **− R$ 6.608**. Ano: 51.600 + 9.280 − 33.040 = **R$ 27.840**. Conferência: 720 × 372 − 240.000 = 27.840, a sobra base do Z01 (R$ 2.320 por mês) vezes doze: o regime só distribui as mesmas 720 noites pelas estações.

Passo 3 · O ano 1, com a rampa. Marina abre no começo da alta e usa 40%, 50% e 75% do regime, dentro das faixas da curva. Por simplificação, o regime começa no mês 13.

MESES	ESTAÇÃO	NOITES NO REGIME	RAMPA	NOITES VENDIDAS	RESULTADO DO MÊS	NO PERÍODO
1 a 3	Alta	100	40%	40	– R$ 5.120	– R$ 15.360
4 e 5	Média	60	50%	30	– R$ 8.840	– R$ 17.680
6	Baixa	36	50%	18	– R$ 13.304	– R$ 13.304
7 a 10	Baixa	36	75%	27	– R$ 9.956	– R$ 39.824
11 e 12	Média	60	75%	45	– R$ 3.260	– R$ 6.520
Ano 1		720		396		**– R$ 92.688**

Exemplo ilustrativo. Mês 1: 40 × 372 – 20.000 = – 5.120.

Todos os meses ficam negativos, até os da alta. A receita do ano 1, 396 × 600 = R$ 237.600, fica 45% abaixo dos R$ 432.000 do regime, no limite da faixa da fonte. O **déficit da rampa** é a soma: **R$ 92.688**.

Passo 4 · O giro pela regra do método. Necessidade técnica: déficit da rampa de 92.688 mais os meses negativos do regime (5 × 6.608 = 33.040). Reserva operacional: 3 × 20.000 = 60.000. Giro: 92.688 + 33.040 + 60.000 = **R$ 185.728**. A referência preliminar antiga, seis meses de fixo, daria R$ 120.000 e deixaria a rampa sem cobertura.

Passo 5 · A contingência pelas duas regras. As seis linhas até a abertura somam **R$ 1.370.000**; a infraestrutura pesa pelo alerta de energia, porque, lembra o Panorama, rede estendida se cobra por quilômetro. Etapa 02: 25% × (650.000 + 180.000) = R$ 207.500. Etapa 01: 20% × (1.370.000 + 185.728) = R$ 311.145,60. Fica o maior, **R$ 311.146**.

CONTA DO INVESTIMENTO NECESSÁRIO™	VALOR	% DO TOTAL
Imóvel · parte do terreno herdado usada pelas cinco cabanas (o terreno inteiro vale R$ 600 mil, Capítulo 1), valor de oportunidade	R$ 250.000	13,4%
Infraestrutura · acesso, energia, água, esgoto	R$ 180.000	9,6%
Projeto e licenciamento	R$ 70.000	3,7%
Obra · 5 × R$ 130.000	R$ 650.000	34,8%
Mobiliário, enxoval e equipamentos · 5 × R$ 35.000	R$ 175.000	9,4%
Pré-operação	R$ 45.000	2,4%
Contingência · 20% sobre as demais (Etapa 01)	R$ 311.146	16,7%
Capital de giro · regra do método (rampa, meses negativos e três meses)	R$ 185.728	9,9%
Investimento total necessário	**R$ 1.866.874**	100%
Desembolso em dinheiro · sem o terreno	**R$ 1.616.874**	

Exemplo ilustrativo; percentuais arredondados. Com a contingência só pela Etapa 02, o total seria R$ 1.763.228.

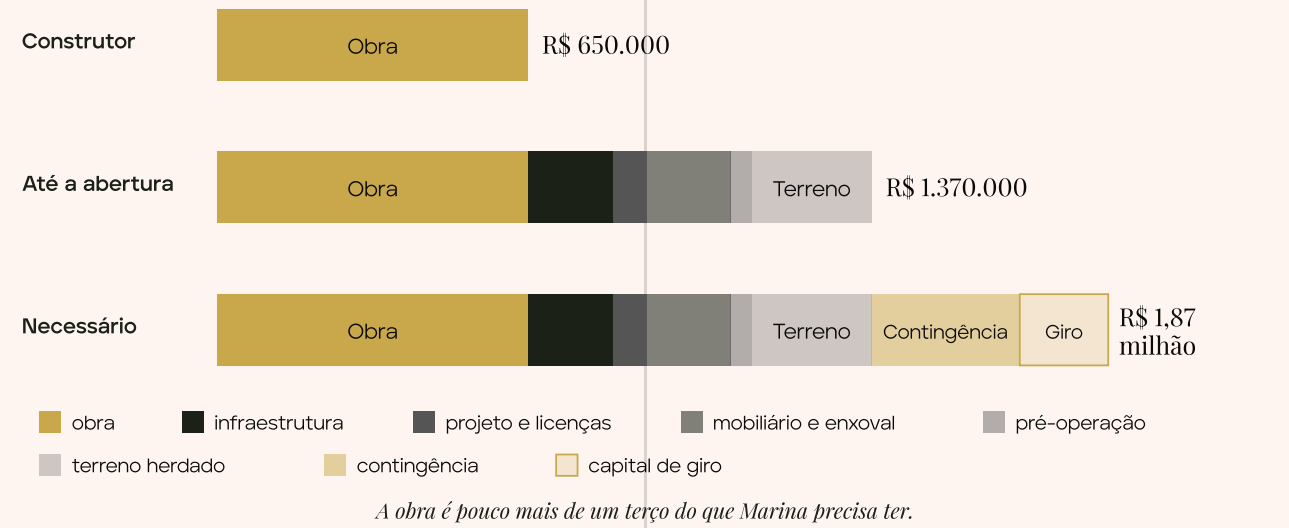


Figura 3.2 · O investimento necessário em barras empilhadas, em escala (500 px para R$ 1.866.874). Números do exemplo ilustrativo das cinco cabanas de Marina.

Passo 6 · A leitura. A obra, o que o construtor orçou, é 650.000 ÷ 1.866.874 = 34,8% do total, abaixo da faixa da Etapa 01 porque a contingência seguiu a régua mais exigente e o giro cobre a rampa; juntas, essas duas linhas somam R$ 496.874, ou 26,6%. O número que se compara com o capital de Marina é o desembolso, R$ 1.616.874. E a fonte dá o próximo passo: «Se o investimento necessário exceder o capital real, as opções são reduzir o escopo, faseamento, captar ou mudar de porta de entrada.»

REVISITE · Z01, CAPÍTULO 5

A Folha de Viabilidade Zion™ tem duas versões. Tente lembrar antes de ler: qual delas entra no capital de giro, e qual entra na decisão de seguir? A do ano 1, com a rampa, diz quanto caixa você precisa; a do regime, se o negócio vale a pena. Para Marina, a sobra de regime de R$ 27.840 é 27.840 ÷ 1.866.874 = 1,5% do investimento por ano. A conta de retorno fica para o pilar Financiar, mas a ordem de grandeza confirma o "ajustar".

Por que o capital acaba no meio

O dinheiro de uma obra sai numa ordem, descrita no Volume 05 · Investimento: terreno e projetos; terraplenagem e fundações; estrutura e acabamento; mobiliário e equipamentos; e, nos últimos meses, a pré-abertura. As linhas esquecidas estão

no fim. Quem orçou só a obra fica sem dinheiro justamente quando chegam a mobília, a pré-operação, o desvio e a rampa.

Fazer tudo de uma vez para não parecer pequeno. O dinheiro acaba no meio, a obra para, e obra parada continua custando aluguel, juros e equipe.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

Depois de abrir, o perigo muda de forma: o ano pode fechar positivo e faltar dinheiro num mês. «Projeto não quebra por prejuízo. Quebra por falta de caixa num mês específico, e esse mês dá para saber qual é.» A Curva de Caixa Acumulado™, do Volume 05, soma o resultado mês a mês e procura o menor saldo: é esse o número que decide.

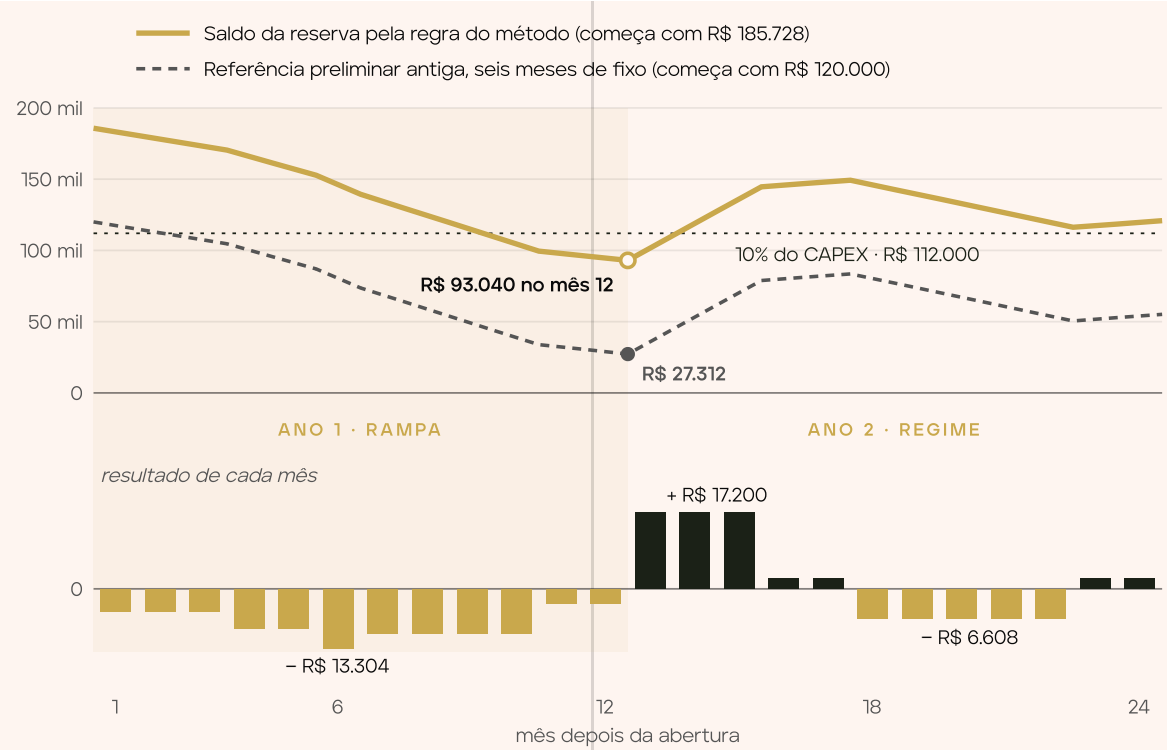


Figura 3.3 · A rampa e o caixa acumulado das cinco cabanas de Marina, em escala (0,8 px por R$ 1 mil no saldo; 2,5 px por R$ 1 mil no resultado do mês). Exemplo ilustrativo; o regime começa no mês 13 por simplificação.

No ano 1, doze degraus para baixo: a reserva cai de R$ 185.728 para R$ 93.040 no mês 12, exatamente a reserva da baixa mais a segurança (33.040 + 60.000). No ano 2, a alta recompõe e a baixa volta a consumir: «Modelo com sazonalidade real mostra dentes de serra, e é entre dois dentes que o projeto morre.» Com a referência preliminar antiga, seis meses de fixo, o saldo desceria a R$ 27.312: qualquer atraso ou mês de chuva o levaria ao vermelho.

O Volume 05 propõe um teste: «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.» Contando como CAPEX o que sai até a abertura, menos o terreno, Marina tem R$ 1.120.000; 10% são R$ 112.000. Se a obra consumir toda a contingência, nem a regra do método passa; se sobrar contingência, ela reforça o colchão. Sem folga, avisa a Etapa 01, «a operação toma crédito caro ou corta o que não deveria».

Exemplo parcialmente resolvido: os dois chalés de Rafael

Rafael saiu do Z01 com "seguir" e a recomendação de crescer sem obra. Antes de decidir, quer saber quanto custariam dois chalés novos no próprio terreno. Na

Jornada B, a operação existente paga boa parte do fixo; o risco é os chalés novos só dividirem a demanda dos antigos.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

As premissas de Rafael

Do Z01: quatro chalés, diária de R$ 480, variável de R$ 100, deduções e quebra de 18%, ocupação de 40% no pior trimestre, fixo de R$ 12.000; cada noite deixa 480 × 0,82 − 100 = R$ 293,60. **Novas:** com seis chalés, o fixo da operação inteira sobe para R$ 14.000; é a primeira obra que ele conduz; os chalés novos seguem a rampa de Marina.

Pior mês do ano 1: os quatro chalés no pior trimestre (48 noites × 293,60 = R$ 14.092,80) mais os dois novos no começo da rampa (60 × 40% × 40% = 9,6 noites × 293,60 = R$ 2.818,56), menos o fixo. Complete antes de abrir a resposta.

LINHA	VALOR
Imóvel · parte do terreno, valor de oportunidade	R$ 60.000
Infraestrutura · extensão das redes	R$ 45.000
Projeto e licenciamento	R$ 25.000
Obra · 2 × R$ 125.000	R$ 250.000
Mobiliário e equipamentos · 2 × R$ 35.000	R$ 70.000
Pré-operação · fotos e anúncio	R$ 10.000
Subtotal até a abertura	R$ 460.000
Resultado do pior mês do ano 1	_____
Capital de giro (regra do método)	_____
Contingência (a maior das duas regras)	_____
Investimento total necessário	_____

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

Agora é a sua vez: a conta em branco

A Etapa 02 pede orçamento, não estimativa. Onde ainda não houver, anote quem vai consultar e até quando.

LINHA	ETAPA 01	ETAPA 02	ADOTADO
Seis linhas até a abertura			
Déficit da rampa	Não se aplica: giro pela regra do método		
Reserva de sazonalidade			
Três meses de segurança			
Contingência			
Investimento total e **desembolso**			
Menor saldo da reserva e mês			

Modelo baseado na Conta do Investimento Necessário™ e na Curva de Rampa do Primeiro Ano™ (Jornada do COMO · Etapa 02). A ferramenta do Capítulo 8 recebe esses totais em percentuais e meses; o déficit da rampa se calcula aqui.

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** monte a conta da porta que sobrou no Capítulo 2, com orçamento escrito de infraestrutura, obra e mobiliário. Faça o ano 1 mês a mês com a rampa e a lista, aplique as regras de contingência e de giro e compare o desembolso com o seu Capital Real Disponível™.
- **Jornada B · Quero crescer:** faça a conta da ampliação, reforma ou novo imóvel com os números dos últimos doze meses, num só fluxo com a operação atual e o fixo total. Escreva de onde virá a demanda das unidades novas.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O investimento tem duas partes: até abrir, e depois, até a receita cobrir. A segunda é a que falta.
- São sete linhas mais a contingência; terreno próprio entra como capital empregado.
- A Lista do Que Ninguém Orça™ é custo da operação, mas aumenta o déficit da rampa e o giro.
- Na contingência, calcule pelas duas regras e use a maior; no giro, some a necessidade técnica e três meses de obrigações fixas.
- Ninguém abre cheio: a rampa define o déficit que precisa estar reservado.
- Projeto quebra num mês específico: procure o menor saldo do caixa acumulado.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda sem consultar o capítulo. Depois, compare com a resposta de referência.

1. Quais são as sete linhas da Conta do Investimento Necessário™?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Quais são os três componentes do giro na Etapa 02?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Obra de R$ 400.000 e infraestrutura de R$ 100.000, primeira obra. Qual a contingência pela faixa máxima da Etapa 02?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Por que um ano positivo não garante atravessar o ano?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

Segundo a Etapa 02 da Jornada do COMO, boa foto é o fator isolado de maior efeito na conversão de um anúncio novo, e abrir no começo da alta é a decisão de maior efeito sobre a rampa. As duas custam pouco ou nada.

REFLEXÃO

Quantas linhas do iceberg estavam no seu orçamento antes deste capítulo?

DICA

Nesta semana, peça à concessionária de energia e a um construtor da região orçamentos por escrito: são as linhas que mais mudam o total.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 03

1. Antes de calcular: quanto você imagina que custa começar, e quanto disso é obra?

2. Liste as seis linhas até a abertura com o valor e a origem de cada número.

3. Quais linhas da Lista do Que Ninguém Orça™ faltavam? Quanto mudam o que cada noite deixa?

4. Qual é o seu déficit da rampa e qual o pior mês do ano 1?

5. Contingência pelas duas regras e giro pela regra do método: quais valores adotou, qual o total e qual o desembolso?

6. O desembolso cabe com folga, apertado ou não cabe no seu capital? O que vai testar primeiro: reduzir o escopo, fasear, captar ou mudar de porta?

CAPÍTULO 04

FASES E CRITÉRIOS DE PASSAGEM

Começar pequeno *sem começar errado.*

Abra primeiro o menor conjunto que já opera e gera caixa, com o projeto inteiro pensado desde o início e um critério escrito para cada passo seguinte.

NESTE CAPÍTULO

- Por que fasear não é falta de ambição, e o que a fase um precisa ter.
- O gate: o critério de passagem escrito antes de cada fase.
- Um plano em três fases resolvido, com investimento, conta e critérios.
- Capital exposto no tempo: tudo de uma vez ou em fases.
- Seguir, ajustar ou parar no gate; adiar, paralisar ou fasear.
- Caminhos sem obra e o que se pensa inteiro desde a fase um.

Há dois jeitos opostos de errar no começo. O primeiro é fazer tudo de uma vez, e o Panorama descreve o desfecho: «Fazer tudo de uma vez para não parecer pequeno. O dinheiro acaba no meio, a obra para, e obra parada continua custando aluguel, juros e equipe.» O segundo é nunca começar, porque o projeto inteiro não cabe no capital de hoje.

O terceiro caminho é dividir o projeto em fases, abrir a primeira com o capital que você tem de verdade (Capítulo 1) e só avançar quando ela provar o que precisava provar, segundo um critério escrito antes.

Fasear não é falta de ambição

Fasear não é falta de ambição. É o que faz a ambição caber no caixa.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

A frase abre o Pilar 04 do Panorama, o da estratégia, que o Panorama define como «a ordem das coisas: o que vem primeiro, sob qual estrutura societária, com qual posicionamento e em quantas fases». O custo de ignorá-la: «Sem faseamento, o projeto depende de captar tudo antes de provar qualquer coisa.»

O primeiro passo é dividir o projeto, e a definição da primeira fase é precisa: «Fase um é o menor conjunto que já opera e gera caixa. Nem sempre é a mais bonita; é a que abre mais cedo.» Pequena, mas operando.

A edição completa do Volume 05 · Investimento resume a atitude: «O amador espera juntar todo o capital para começar. O developer desenha um projeto onde a primeira fase paga a segunda.» O volume trata o faseamento como a primeira manobra de estrutura financeira, em três fases típicas: **Provar**, com poucas unidades; **Crescer**, financiada em parte pelo caixa da primeira; e **Consolidar**, que completa o conjunto.

PEQUENO, MAS NÃO PEQUENO DEMAIS

A Etapa 02 da Jornada do COMO põe um limite: «Para hospedagem de lazer com estrutura própria, esse mínimo costuma estar entre três e cinco unidades. Abaixo disso, o modelo precisa ter custo fixo muito enxuto para funcionar.» O motivo: «Uma operação de duas unidades e uma de quatro têm custo fixo parecido — o que significa que a margem de quatro unidades é muito melhor.» O Panorama resolve a tensão: «Menos do que você quer e mais do que paga a operação: esse é o ponto.» A fase um é a menor operação que se sustenta, não a menor obra possível.

O gate: o critério escrito antes de começar

O quarto passo do Pilar 04 separa faseamento de improviso: escrever o **gate** de cada fase. Gate, portão em inglês, é o critério de passagem, o que precisa estar comprovado para a fase seguinte começar. O Panorama aplica a mesma lógica aos próprios pilares: «reprovado num pilar, não se avança, muda-se a premissa».

O que precisa estar comprovado para a fase dois come-

çar. Sem gate escrito, a fase dois começa por ansiedade.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

Sem critério escrito, a fase dois começa porque o verão foi bom ou o vizinho ampliou. Escrito antes, o gate decide com a cabeça fria. O Panorama não fixa um número padrão, que depende do seu projeto; exige que o critério seja verificável: número, fonte, período e data.

CRITÉRIO VAGO	CRITÉRIO VERIFICÁVEL	O QUE PROTEGE
"Quando estiver indo bem"	Ocupação média real de pelo menos 45% nos últimos seis meses fechados	Usa o seu calendário, não a impressão da temporada
"Quando der lucro"	Sobra média de pelo menos R$ 5.000 por mês, depois de impostos, comissões e fixo	Mede margem, não faturamento
"Quando sobrar dinheiro"	Caixa gerado igual a 20% da fase dois, com o giro intacto	A obra nova não consome a reserva da operação
"Quando o banco liberar"	Restante com fonte contratada, não esperada	Ninguém começa obra com promessa
"Quando o mercado melhorar"	Doze meses fechados, com uma alta e um vale	O critério viu o ano inteiro

Elaboração do módulo a partir do Panorama (Pilar 04), do Volume 05 · Investimento ("contratado, não esperado") e da Jornada do COMO · Etapa 01 (um ano com uma alta e um vale). Números ilustrativos.



Figura 4.1 · A escada de fases com gates. Números do exemplo ilustrativo deste capítulo; o contorno lembra que o conjunto é desenhado inteiro antes da primeira obra.

Um plano em três fases, resolvido

Para simplificar, o orçamento usa uma régua só: contingência de 20% sobre obra e infraestrutura (piso da Etapa 02 da Jornada do COMO para primeira obra) e, no giro, só a reserva operacional de três meses de custo fixo. Pela regra do Capítulo 3, a contingência da Fase 1, a maior das duas, seria 20% × 1.072.000 = R$ 214.400, e não R$ 158.000, e o giro somaria a necessidade técnica (déficit da rampa e meses negativos do regime). No seu plano, use a regra do Capítulo 3.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Cinco cabanas e uma área comum, em três fases

Um terreno próprio (não é o caso de Marina), já lido no Z01, comporta cinco cabanas e uma área comum. Diária base de R$ 700, medida nos comparáveis; ocupação de regime de 50%; deduções e quebra de 18% (fator 0,82); custo variável de R$ 120 por noite; custo fixo de R$ 14.000 por mês com três cabanas e R$ 18.000 com cinco; meses de 30 dias. O terreno não entra como desembolso, embora seja capital empregado.

LINHA	FASE 1 · PROVAR	FASE 2 · CRESCER	FASE 3 · CONSOLIDAR
Projeto e licenciamento do conjunto	R$ 80.000	(feito)	(feito)
Infraestrutura de sítio	R$ 250.000 (para as cinco)	R$ 20.000 (ligações)	(feita)
Obra	R$ 540.000 (3 × 180.000)	R$ 360.000 (2 × 180.000)	R$ 150.000
Mobiliário, enxoval, equipamento	R$ 120.000 (3 × 40.000)	R$ 80.000 (2 × 40.000)	R$ 50.000
Pré-operação	R$ 40.000	(feita)	(feita)
Contingência · 20% de obra e infraestrutura	R$ 158.000	R$ 76.000	R$ 30.000
Capital de giro · reserva de 3 meses de fixo	R$ 42.000 (3 × 14.000)	R$ 12.000 (3 × 4.000 a mais)	(sem fixo novo)
Total	**R$ 1.230.000**	**R$ 548.000**	**R$ 230.000**

Exemplo ilustrativo. Conferência: 0,20 × (540.000 + 250.000) = 158.000; 0,20 × (360.000 + 20.000) = 76.000; 0,20 × 150.000 = 30.000. Fase 1: 80 + 250 + 540 + 120 + 40 + 158 + 42 = 1.230 mil. Fase 2: 20 + 360 + 80 + 76 + 12 = 548 mil. Fase 3: 150 + 50 + 30 = 230 mil. Total: 2.008.000.

Na Fase 1, projeto, licenciamento e infraestrutura já servem às cinco cabanas, embora só três abram.

EXEMPLO RESOLVIDO · NÚMEROS ILUSTRATIVOS

Quanto a fase um gera, e quanto paga da fase dois

- **Fase 1, base:** 3 × 30 = 90 noites; 50% = 45 noites; 45 × 700 = R$ 31.500; menos R$ 5.670 (18%), R$ 5.400 (45 × 120) e R$ 14.000: sobra de **R$ 6.430** por mês.
- **Fase 1, conservador** (diária 10% e ocupação 20% abaixo): R$ 630 e 40%, 36 noites; 36 × 630 = R$ 22.680; menos R$ 4.082,40, R$ 4.320 e R$ 14.000: sobra de **R$ 277,60**. Equilíbrio: 14.000 ÷ (630 × 0,82 − 120) = 35,3, ou 36 noites; vende 36.
- **Fase 2, base:** 5 × 30 = 150 noites; 75 vendidas; 75 × 700 = R$ 52.500; menos R$ 9.450, R$ 9.000 e R$ 18.000: sobra de **R$ 16.050**. O equilíbrio cai de 31 noites em 90 (34,4%) para 40 em 150 (26,7%): o fixo subiu R$ 4.000, a capacidade subiu dois terços.

O conservador segue o Teste dos Três Cenários™ da Etapa 02 da Jornada do COMO: «Conservador: diária 10% abaixo e ocupação 20% abaixo do cenário base. É o cenário que precisa funcionar.» Funciona, sem folga: vende as 36 noites do equilíbrio e sobram R$ 277,60.

A conta desfaz uma ilusão. Sozinha, a fase um levaria 548.000 ÷ 6.430 = cerca de 85 meses para juntar a fase dois. Ela raramente paga a fase dois inteira: paga uma parte, prova a demanda e muda a conversa sobre o resto. O Panorama: «Duas unidades abertas e vendendo financiam a terceira, e ainda provam a demanda que nenhuma planilha provava.» De onde vem o resto é o Capítulo 5.


EXEMPLO ILUSTRATIVO · OS GATES, ESCRITOS ANTES DA PRIMEIRA OBRA

- **G1, para a Fase 1:** Z01 em seguir, ou ajuste concluído; licenças da Fase 1 emitidas; energia para a carga final por escrito; R$ 1.230.000 contratados, reserva pessoal intocada; conservador positivo (vende 36 noites; o equilíbrio é 35,3).
- **G2, para a Fase 2:** doze meses fechados; ocupação real de 45% ou mais e sobra de R$ 5.000 ou mais nos últimos seis meses; R$ 109.600 de caixa gerado (20% de 548.000), com giro intacto, o que no base leva 109.600 ÷ 6.430 = 17,0 meses; os outros R$ 438.400 com fonte contratada.
- **G3, para a Fase 3:** doze meses com cinco cabanas e 45% ou mais; seis meses de teste sem obra, com café da manhã em cesta comprado em uma de cada três reservas; R$ 230.000 de caixa sem tocar no giro (cerca de 14 meses no base: 230.000 ÷ 16.050).

No G3, a demanda pela área comum é testada antes da obra: provar com o menor gasto antes de imobilizar capital.

Capital exposto: tudo de uma vez ou em fases

A Figura 4.2 compara os dois desenhos. Para simplificar, o "tudo de uma vez" custa a mesma soma, R$ 2.008.000, e leva dezoito meses até o primeiro hóspede. Em fases, a primeira abre no mês 12; o G2 é atingido no mês 30, e o G3, no 48.

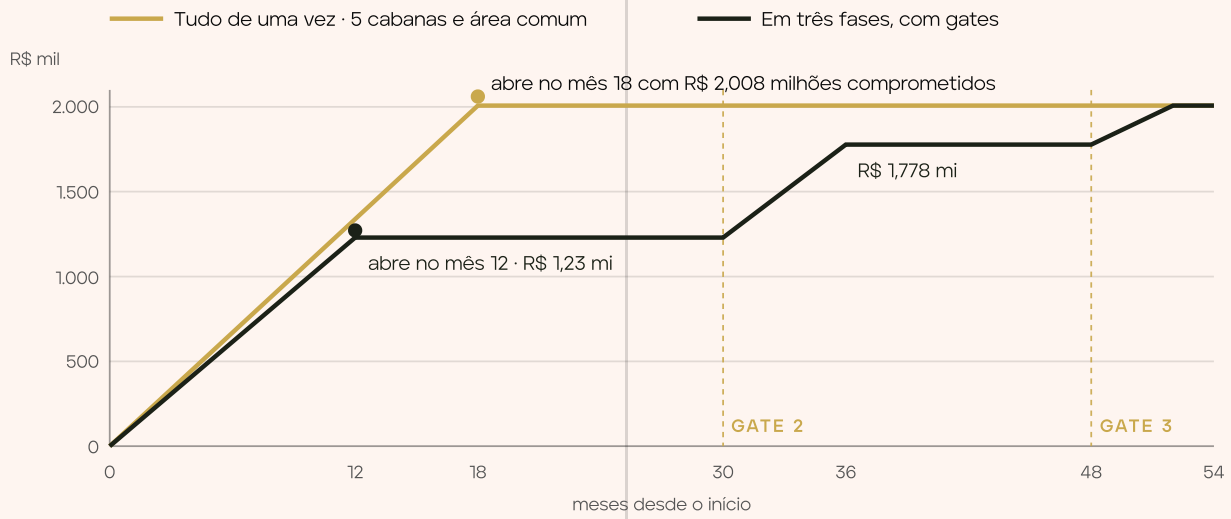

Antes da primeira receita: R$ 2,008 milhões de uma vez, contra R$ 1,23 milhão em fases, 39% a menos.

Figura 4.2 · Capital comprometido acumulado nos dois desenhos. Exemplo ilustrativo; a linha mostra o que já foi gasto ou contratado, sem descontar o caixa gerado pela operação.

Três leituras. A exposição antes da primeira receita cai R$ 778.000, 39% (778 ÷ 2.008 = 0,387). O tempo sem receita cai de dezoito para doze meses. E o preço é real: o conjunto completo só fica pronto no mês 52. Fasear troca velocidade por exposição; o método não proíbe a outra escolha, proíbe escolher sem ver a troca.

E se algo der errado no mês 20? Em fases, há três cabanas operando; de uma vez, uma obra pela metade, e «Obra parada continua custando. É a forma mais cara de esperar», diz o Panorama. O Volume 05 mede esse risco mês a mês com a Curva de Caixa Acumulado™, construída no pilar F · Financiar.

No gate: seguir, ajustar ou parar



Figura 4.3 · A decisão no gate. Síntese do módulo a partir do Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro (Pilar 04) e da decisão de seguir, ajustar ou parar do Z01.

Seguir é o critério atingido com dado real, não pressa. **Ajustar** segue o Panorama, «não se avança, muda-se a premissa»: diária, custo fixo, prazo ou fonte. Nunca baixar a régua para o critério passar. **Parar**, no exemplo, é ficar com três cabanas de conservador positivo e sem dívida de obra: um negócio menor, mas um negócio, e não um esqueleto de concreto. Cada fase é desenhada para poder ser a última.

Adiar, paralisar ou fasear

> REVISITE · Z01, CAPÍTULO 6
>
> No Z01 você viu os três casos de adiamento legítimo e o teste "eu retomo quando ___". Tente lembrar os três casos e o que torna uma condição verificável; depois confira na tabela.

	ADIAMENTO LEGÍTIMO	PARALISIA	FASE
O que é	Esperar com razão nomeada: capital de sobrevivência, pendência jurídica ou análise negativa	Esperar sem análise pelo "momento certo"	Abrir o que cabe; o resto espera o gate
Como se reconhece	Condição verificável e data	"Quando eu estiver mais seguro"	Critério com número, fonte e data
Enquanto isso	Preparo sem gastar capital	Custo invisível, todo mês	Operação gerando dado e caixa
Onde termina	Na condição cumprida ou no "não" assumido	Em lugar nenhum	No gate

Síntese do módulo a partir de A Ordem das Coisas (Caps. 05 e 07) e do Panorama (Pilar 04).

Momento é externo e preparo é interno. Eu vou trabalhar no preparo agora, porque é a única das duas coisas que depende de mim.

A ORDEM DAS COISAS

Há ainda a paralisia que parece trabalho, nomeada no Volume 05: «Ficar polindo a planilha: análise sem fim é procrastinação com cara de diligência». Fasear ajuda: refina-se a conta da fase um; a das seguintes espera dado real.

Caminhos que não exigem obra

Às vezes a melhor fase um nem é obra. Das cinco saídas para a terra do Panorama (Z01, Capítulo 6), quatro não exigem o capital da terra: arrendar testa o mo-

delo antes de imobilizar capital; parceria e permuta tiram o terreno do primeiro cheque; não fazer vale quando a leitura diz não. Alugar para hospedar ou administrar o imóvel de outro (Capítulo 2) podem ser uma fase zero. A Etapa 01 da Jornada do COMO: «Construir depois, com operação rodando e dinheiro próprio, é mais fácil que construir primeiro.» Contratos que mexem com patrimônio e imposto se desenham com advogado e contador (Capítulo 5 e pilar F · Financiar).

O que se pensa inteiro desde a fase um

Fasear a obra não é fasear o projeto. A edição completa do Volume 05 alerta que a infraestrutura da fase um deve ser dimensionada para o projeto completo.

Refazer infraestrutura é a forma mais cara de economizar.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO (EDIÇÃO DO PROJETO)

EXEMPLO ILUSTRATIVO

A economia que sai cara

Se a infraestrutura do exemplo fosse feita só para três cabanas, por R$ 170.000, e a ampliação na fase dois custasse R$ 160.000 (valas refeitas, transformador trocado, caminhos reabertos com hóspedes no terreno), o total seria 170.000 + 160.000 = R$ 330.000: R$ 80.000 a mais que os R$ 250.000 feitos de uma vez. A economia da fase um voltou inteira na fase dois, com obra ao lado de quem paga para descansar.

Pensa-se inteiro, desde a fase um: onde fica cada fase e o que nunca será construído; por onde a obra futura passa sem cruzar hóspedes; energia para a carga final, água, esgoto e acesso; licenciamento do conjunto; e o veículo societário. Confirme com engenheiro, concessionária e prefeitura. O desenho do conjunto tem nome no método: o Volume 01 · Território, base do Z01, dedica um capítulo ao **Mas-**

ter Plan Territorial™, que organiza o terreno inteiro antes de qualquer obra e alerta contra construir em etapas sem planejamento; ele é aprofundado no pilar D · Desenvolver. Sobre o veículo societário (SPE, SCP ou permuta do terreno), o Pilar 04 avisa: «Cada um muda o risco e o imposto.» É tema de advogado e contador. E o Manual Oficial: «Uma das responsabilidades do Developer é compreender que diferentes fases do empreendimento exigem diferentes estruturas de capital.»

APLICAÇÃO

A

Quero começar · Marina

Marina saiu do Z01 com ajustar, e um dos alertas era a energia. Abrir duas cabanas sem refazer a conta não resolve: o fixo não cai na mesma proporção. Ela define a fase um como o menor conjunto que paga o próprio fixo, pede à concessionária viabilidade para as cinco cabanas e escreve o G1 antes de qualquer orçamento de obra. Faça o mesmo.

B

Quero crescer · Rafael faseia a expansão

Rafael saiu do Z01 com seguir, mas sem folga no conservador: vende as 48 noites do equilíbrio. Fase 1: administrar dois imóveis de terceiros, de 8 a 16 horas por semana pela Agenda Real da Etapa 01, com uma pessoa da equipe nos chalés (Capítulo 7). G2: um ano positivo e "sim" à pergunta de A Ordem das Coisas: «Se você se ausentasse por trinta dias sem aviso, a operação funcionaria e você saberia o resultado do mês ao voltar?» Fase 2: reformar um chalé por vez, com caixa. Só na Fase 3, a ampliação de dois chalés do Capítulo 3.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Fasear faz a ambição caber no caixa e evita captar tudo antes de provar qualquer coisa.
- Fase um é o menor conjunto que já opera e gera caixa: menos do que você quer, mais do que paga a operação.
- Cada fase tem um gate escrito antes, com número, fonte, período e data.
- Fase um raramente paga a fase dois inteira: paga parte, prova a demanda e muda a conversa.
- Fasear troca velocidade por exposição.
- No gate: seguir, ajustar ou parar; cada fase deve poder ser a última.
- Desenho do conjunto, infraestrutura e estrutura societária se pensam inteiros desde a fase um.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda sem consultar.

1. Como o Panorama define a fase um, e que duas condições ela impõe?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O que é um gate, e o que o torna verificável?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. No exemplo, quanto capital fica comprometido antes da primeira receita nos dois desenhos, e qual é o preço de fasear?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Por que parar no gate não é fracasso?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

5. O que precisa ser pensado inteiro desde a fase um?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

Para o Panorama, a operação convence mais do que o papel: «O investidor que recusou o projeto no papel costuma voltar quando vê o calendário cheio das duas primeiras.» É uma tendência descrita pela fonte, não uma garantia: crédito e investidor são tema do pilar Financiar.

REFLEXÃO

Se o seu projeto parasse depois da primeira fase, você teria um negócio que se paga ou uma obra pela metade?

DICA

Nesta semana, escreva o seu G1 em quatro linhas, com números. A linha que só aceitar "não sei" é o seu próximo trabalho.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 04

1. Divida o seu projeto em fases. O que abre em cada uma? (Jornada B: o que expande em cada uma?)

2. Mostre a conta da fase um no base e no conservador: noites, diária, deduções e quebra, variável, fixo e sobra.

3. Quanto a fase um gera por mês, que parte da fase dois isso paga e de onde viria o resto?

4. Escreva G1, G2 e G3 com número, fonte, período e data.

5. Compare o capital comprometido antes da primeira receita, de uma vez e em fases. Quanto tempo a mais o faseamento custa?

6. O que precisa ser pensado inteiro desde a fase um? Algum caminho sem obra serviria como fase de teste?

CAPÍTULO 05

ALTERNATIVAS DE CAPITAL

De onde pode *vir o dinheiro.*

Existem seis fontes de capital, não duas, e cada uma cobra um preço diferente. Antes de escolher, você precisa saber quanto pode perder, quanto precisa pedir e o que cada fonte leva junto com o dinheiro.

NESTE CAPÍTULO

- A ordem que protege você: capital próprio e limite de perda antes de qualquer capital de terceiros.
- O Mapa das Seis Fontes™ e o Custo Real do Capital™: quanto cada fonte demora e o que cobra de verdade.
- A Régua do Quanto Captar™, com um exemplo resolvido.
- Dívida e Mapa de Dívida Zion™ em nível introdutório; o que o equity leva junto.
- Permuta, arrendamento, pré-venda, condo-hotel, multipropriedade, gestão e franquia, só definidos.
- Um exemplo de custo real de duas alternativas e uma tabela comparativa.

Quando se fala em dinheiro para hospedagem, a cabeça vai direto para banco ou sócio. O Volume 05 · Investimento observa que essas são as duas mais difíceis para quem está começando, e que existem outras quatro. Mas nenhuma vem antes de uma pergunta mais desconfortável: quanto do seu próprio dinheiro você pode perder sem mudar de vida?

Este capítulo é introdutório. Não substitui advogado nem contador, e não promete crédito nem investidor: ensina a chegar a essas conversas sabendo o que você

está trocando. Instrumentos e contratos são aprofundados no pilar F · Financiar.

Primeiro o seu dinheiro, e o seu limite

Antes de qualquer banco ou investidor, dois números: o capital que é realmente seu e quanto dele pode ser perdido. A Etapa 01 da Jornada do COMO é direta: «Capital de sócio, de familiar ou de banco não é o seu capital: ele tem custo e tem prazo.» O Volume 05 descreve assim a primeira fonte:

> *Capital próprio: o mais barato em dinheiro e o mais caro em risco, porque concentra.*
>
> VOLUME 05 · INVESTIMENTO

Sem juro nem participação, mas com toda a perda em você. Por isso o volume troca a pergunta: «A pergunta certa não é quanto você tem, é quanto você pode perder sem comprometer a sua vida.» Esse valor tem nome no método: **limite de perda aceitável**. «Esse número, e não o saldo, é o seu capital de risco.»

Daí a ordem deste capítulo, nas duas jornadas: primeiro o capital próprio contratado e o limite de perda; depois a conta do quanto falta; só então as fontes de terceiros. Inverter é pedir dinheiro sem saber para quê. A Ordem das Coisas resume: «Por isso a sequência correta não é captar para estruturar. É estruturar para captar.»

REVISITE

Do Zoo, Capítulo 2, e do Capítulo 1 deste módulo

No Z00 você viu três decisões independentes: o que se constrói, quem opera e de quem é o dinheiro. Tente lembrar as cinco alternativas da terceira coluna. E, do Capítulo 1, o seu Capital Real Disponível™ e o resultado do Teste de Risco Suportável™: tudo o que vem a seguir parte deles.

Duas armadilhas aparecem já aqui. Contar o dinheiro que ainda não chegou: o Volume 05 manda subtrair só o capital próprio «Contratado, não esperado.» E confiar em promessa de alguém próximo: «Promessa de aporte de familiar é a mais perigosa das três, porque ela não tem contrato e tem relação.»

O Mapa das Seis Fontes™

FRAMEWORK DO MÉTODO

Mapa das Seis Fontes™

Sem terceiro profissional: capital próprio, pessoa física do seu círculo e comprador de unidade. Com instituição ou investidor: dívida bancária, linha de fomento ou crédito direcionado e investidor. Fonte: Volume 05 · Investimento.

- Classifique cada fonte em **disponível, possível ou fora**, com uma linha de justificativa. «Fora também é informação, e evita meses perseguindo o que não existe.»
- Dívida: pergunte a três bancos taxa, carência e garantia. Fomento: descubra as linhas da região e o prazo real de desembolso. Investidor: escreva o perfil que faz sentido.
- Monte a combinação: qual fonte cobre qual parte do investimento, e se as garantias exigidas conflitam.



Figura 5.1 · O Mapa das Seis Fontes™ em roda, com a velocidade e o melhor uso de cada fonte. Fonte: Volume 05 · Investimento.

A **pessoa física do seu círculo** é a que mais estraga relação, porque parece simples. A regra do volume: «contrato escrito, com as mesmas cláusulas que você

exigiria de um desconhecido.» E: «Trate quem te empresta por confiança com mais rigor contratual, não com menos.»

O **comprador de unidade** financia a obra comprando a unidade antes de ela existir: «Capital rápido, custo alto em obrigação futura e o maior risco reputacional de todas as fontes se a entrega atrasar.» O **fomento**, crédito com condições especiais para turismo, infraestrutura, energia ou área rural, oferecido por agências e bancos de desenvolvimento, é ignorado por falta de antecedência. «Quem começa cedo tem acesso a um capital que os outros não têm.»

A combinação: «Na prática, um projeto faseado de pequeno porte raramente é financiado por uma fonte só.» Arranjo frequente: capital próprio no terreno, fomento ou dívida na infraestrutura, investidor nas unidades. Antes de assinar a primeira, verifique se as exigências de garantia de cada fonte conflitam.

O Custo Real do Capital™

Comparar fontes só pela taxa ignora quase tudo o que decide. O Volume 05 propõe outra régua:

Capital tem cinco componentes de custo. Juro, diluição, garantia, tempo e liberdade.

FRAMEWORK DO MÉTODO

Custo Real do Capital™

- **Juro:** o custo financeiro somado em reais ao longo do prazo, não a taxa anual.
- **Diluição:** a participação cedida vezes o valor estimado do negócio na sua saída.
- **Garantia:** o que fica comprometido se der errado; o imóvel do empreendimento é uma coisa, o aval pessoal é outra.
- **Tempo:** meses até o dinheiro estar na conta vezes o custo de cada mês de atraso.
- **Liberdade:** o que você deixa de decidir sozinho: aprovação prévia, limite de endividamento, veto a novo sócio.

Regra de soma: juro, diluição e tempo viram reais e se somam. Garantia e liberdade ficam escritas ao lado e entram no julgamento.

FONTE	JURO	DILUIÇÃO	GARANTIA	TEMPO	LIBERDADE
Capital próprio	Nenhum	Nenhuma	Todo o seu risco	Imediato	Total
Pessoa física do círculo	Baixo a médio	Às vezes	Normalmente nenhuma	Rápido	Alta, e relação em jogo
Comprador de unidade	Nenhum	Nenhuma	A unidade vendida	Rápido	Obrigação de entrega e prestação de contas
Dívida bancária	Médio a alto	Nenhuma	Real e às vezes pessoal	Lento	Limites contratuais
Fomento	Baixo	Nenhuma	Real e contrapartidas	Muito lento	Contrapartidas e fiscalização
Investidor	Nenhum	Alta	Normalmente nenhuma	Variável	Governança e aprovações

Tabela 5.1 · Os cinco componentes, por fonte. Síntese a partir do Volume 05 · Investimento, Capítulo 03.

As duas linhas sem juro, capital próprio e investidor, são as que mais custam nas outras colunas. «Juro zero nunca significa capital gratuito.»

O componente que quase ninguém precifica é o aval pessoal. Ele só cobra se der errado, mas muda a natureza do risco: «sem aval pessoal, o pior cenário é perder o investido; com aval pessoal, o pior cenário alcança a sua casa.» Não é proibido dar aval; é preciso precificá-lo.

O tempo é o que mais inverte a ordem: uma fonte barata que demora nove meses pode custar mais que uma cara que chega em dois. Daí a lição sobre o fomento: «Isso não desqualifica o fomento: desqualifica buscar fomento no último momento.» A mesma linha, procurada com um ano de antecedência, tem custo de tempo zero.

Quanto pedir: a Régua do Quanto Captar™

Antes de escolher a fonte, é preciso saber quanto falta. E o erro tem direção: «Captar de menos é o erro mais comum, e o mais caro, porque a segunda rodada acontece no pior momento de negociação da sua vida.» Quem pede pouco volta ao mercado no meio da obra, sem alternativa.

FRAMEWORK DO MÉTODO

Régua do Quanto Captar™

O texto do Volume 05 diz: «A régua do quanto captar tem quatro linhas, e a terceira e a quarta são as que somem dos pedidos.»

- **1. CAPEX da fase:** o investimento até a fase receber o primeiro hóspede, com data de cada cotação.
- **2. Capital de giro:** o que mantém a operação viva nos primeiros meses, disponível no dia da abertura.
- **3. Reserva de implantação:** de dez a quinze por cento do CAPEX, com regra de uso escrita.
- **4. Custo da própria captação:** honorários jurídicos, laudos, estruturação e registro, de dois a cinco por cento da captação.

A tabela da mesma fonte mostra seis linhas: as quatro acima, mais o **terreno ainda não pago** (que o texto inclui na linha do CAPEX) e a subtração do **capital próprio contratado**. São quatro linhas de necessidade e duas de ajuste; o resultado é a necessidade de capital externo.

Dois ajustes. O capital de giro: a Régua usa três meses de custo fixo; a regra do método soma a eles a necessidade técnica (déficit acumulado da rampa e meses negativos do ano de regime), como no Capítulo 3. Se você já separou o giro no Capital Real Disponível™, não conte duas vezes. E o limite de cima: pedir demais dilui sem precisar. O número vai exato, porque «Pedir um número redondo acima da conta é um sinal de que a conta não foi feita».

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Uma régua preenchida, linha a linha

Uma primeira fase hipotética, com terreno já quitado e custo fixo mensal previsto de R$ 15.000.

- **CAPEX da fase:** R$ 380.000.
- **Terreno ainda não pago:** R$ 0, porque já é seu (e isso fica escrito).
- **Capital de giro:** necessidade técnica de R$ 30.000 (déficit da rampa, hipotético) mais a reserva de 3 × 15.000 = R$ 45.000: R$ 75.000.
- **Reserva de implantação:** 15% × 380.000 = R$ 57.000.
- **Custo da captação:** orçamento hipotético de R$ 9.000, que equivale a 3% dos R$ 300.000 captados.
- **Total necessário:** 380.000 + 75.000 + 57.000 + 9.000 = R$ 521.000.
- **Menos o capital próprio contratado:** R$ 221.000.
- **Necessidade de capital externo:** 521.000 − 221.000 = **R$ 300.000**.

O pedido incompleto, só com o CAPEX, seria 380.000 − 221.000 = R$ 159.000. No meio do caminho faltariam 75.000 + 57.000 + 9.000 = R$ 141.000, a soma das linhas deixadas de fora.

Dívida em nível introdutório

Em dívida para obra, a taxa quase nunca é o problema. A carência é.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

Dívida é o instrumento mais barato quando funciona, porque não custa participação. O problema, diz o Volume 05, «é que ela cobra em dinheiro, todo mês, inclusive nos meses em que a obra não gera nada.» Por isso o primeiro teste é o de **fôlego**: o seu caixa paga as parcelas durante a implantação, antes da primeira receita?

FRAMEWORK DO MÉTODO

Mapa de Dívida Zion™

- **Carência:** meses sem pagar principal (paga-se só o juro) ou sem pagar nada. «Distinga carência de principal, que é comum, de carência total, que é rara e é a que resolve.»
- **Prazo total:** longo o bastante para a parcela caber no resultado da operação ainda jovem. «A conta é feita com o ano dois, não com o ano cinco.»
- **Garantia:** separe a garantia real do aval pessoal, e negocie o aval com a seriedade da taxa.
- **Cobertura do serviço da dívida:** quantas vezes o resultado operacional do ano cobre as parcelas do ano, no ano dois e no cenário conservador. Abaixo de 1,2, não há folga.

Fonte: Volume 05 · Investimento, Capítulo 10.

Se o teste falha, há três saídas: «negociar carência maior, reduzir o valor financiado por dívida e completar com outra fonte, ou trocar o instrumento por um que não cobre caixa durante a implantação». Ela é boa escolha, segundo a mesma fonte, quando há operação madura gerando caixa (a Jornada B), garantia real limpa ou prazo curto até a receita.

O que o equity leva junto

Equity é a participação societária: capital em troca de um pedaço do negócio. Costuma ser tratado como percentual do lucro, e o Volume 05 corrige:

Quem compra participação não compra só resultado. Compra decisão, informação e a sua saída.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

- **Resultado:** «a participação no lucro distribuído e no ganho de uma venda futura. É a parte óbvia e a mais fácil de calcular.»
- **Decisão:** «o direito de participar de certas decisões, e de vetar outras.» Fica definido no acordo de sócios.
- **Informação:** «o direito de receber demonstrativos, relatórios e explicações, em periodicidade definida. Isso tem custo operacional real e é subestimado.»

— **Saída:** o sócio passa a participar de quando e como você poderá vender ou sair do negócio. Esse momento deixa de ser uma decisão só sua.

Equity não é ruim, mas é preciso saber o que foi entregue, «porque nenhuma dessas quatro coisas se desfaz depois sem comprar de volta.» E o Panorama: «Ele entra com dinheiro, você com projeto e execução. A pergunta que decide não é quanto ele põe, é quanto valor você criou antes de vender participação.»

	RESULTADO	DECISÃO	INFORMAÇÃO	SAÍDA
Capital próprio não leva nada; concentra o risco	Fica com você	Fica com você	Fica com você	Fica com você
Dívida e fomento leva juro, garantia e liberdade	Não divide lucro; cobra juro fixo	Não vota; impõe limites no contrato	Documentos e contrapartidas	Não participa; acaba na quitação
Investidor equity: leva as quatro	Parte do lucro e da venda futura	Participa e veta algumas	Relatórios em prazo definido	Participa da sua saída

Figura 5.2 · O que cada tipo de fonte leva. As quatro coisas do equity vêm do Volume 05; as outras linhas são leitura do método a partir do Custo Real do Capital™.

Exemplo resolvido: o custo real de duas alternativas

Na régua do exemplo anterior faltam R$ 300.000. Duas alternativas hipotéticas, em cinco anos; condições reais dependem de proposta escrita.

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Dívida bancária ou sócio investidor para R$ 300.000

Premissas. Cada mês de atraso custa R$ 5.000. Dívida: 12% ao ano sobre o saldo, cinco amortizações anuais de R$ 60.000, sem carência, imóvel e aval pessoal em garantia, dinheiro em quatro meses. Sócio: 25% de participação, negócio estimado em R$ 1.200.000 na saída, dinheiro em seis meses.

Juro da dívida. Os saldos no início de cada ano são 300, 240, 180, 120 e 60 mil. Juro: 36.000 + 28.800 + 21.600 + 14.400 + 7.200 = **R$ 108.000**. Conferência: 12% × (300 + 240 + 180 + 120 + 60 mil) = 12% × 900.000 = 108.000.

Diluição do sócio. 25% × 1.200.000 = **R$ 300.000**.

Tempo. Dívida: 4 × 5.000 = R$ 20.000. Sócio: 6 × 5.000 = R$ 30.000.

COMPONENTE	DÍVIDA BANCÁRIA	SÓCIO INVESTIDOR
Juro em 5 anos	R$ 108.000	R$ 0
Diluição na saída	R$ 0	R$ 300.000
Custo de tempo	R$ 20.000	R$ 30.000
Custo monetizável	**R$ 128.000**	**R$ 330.000**
Garantia	Imóvel e aval pessoal	Normalmente nenhuma
Liberdade	Limites contratuais; parcela todo ano, com ou sem receita	Decisão, informação e saída compartilhadas

Tabela 5.2 · Custo Real do Capital™ de duas alternativas. Exemplo ilustrativo; contas conferidas: 108.000 + 0 + 20.000 = 128.000 e 0 + 300.000 + 30.000 = 330.000.

Na soma, a dívida custa menos da metade. O teste de fôlego conta outra história: a primeira parcela anual é 60.000 + 36.000 = R$ 96.000, ou R$ 8.000 por mês, cobrada com a fase ainda em obra. No ano dois, 60.000 + 28.800 = R$ 88.800. Com resultado hipotético de R$ 90.000 no ano dois conservador, a cobertura é

90.000 ÷ 88.800 = 1,01, abaixo de 1,2. Valem as três saídas do Mapa de Dívida Zion™. O sócio custa mais em reais e não cobra parcela, mas leva as quatro coisas do equity. «A régua não escolhe por você: ela mostra o que você está trocando.»

Outros caminhos: definições e riscos

As obras do método citam arranjos que reduzem a necessidade de dinheiro ou mudam quem opera. Aqui eles aparecem só definidos, com os riscos que as fontes apontam.

ATENÇÃO AO TERMO

Arrendamento tem três sentidos nas fontes

No Panorama, "arrendamento" é forma de operar: o dono aluga o empreendimento pronto a alguém, que «fica com o risco. Você troca potencial por previsibilidade.» No mesmo Panorama, "arrendar" é uma das cinco saídas para a terra. Na Jornada do COMO há a porta "alugar para hospedar". **Aqui vale o segundo sentido**: arrendar a terra ou o imóvel de outra pessoa para entrar sem comprar.

- **Permuta:** você dá parte do empreendimento em troca da terra. Exige, segundo o Panorama, «Projeto estruturado e avaliação aceita pelos dois lados.»
- **Arrendamento (para entrar):** testar o modelo antes de imobilizar capital, com contrato longo e cláusula de benfeitoria. O risco: o ativo não é seu.
- **Pré-venda:** vender diárias, cotas ou unidades antes de abrir. «Pré-venda não é receita. É um passivo com cara de caixa.»
- **Condo-hotel:** «Cada unidade tem dono diferente e a operação é única. Na prática, o comprador da unidade financia a obra.» Você presta contas a muitos proprietários.
- **Multipropriedade:** várias pessoas donas da mesma unidade, com semanas definidas. «A multipropriedade vende décadas de promessa.»
- **Contrato de gestão:** «Outra empresa opera e divide a receita.» Para quem administra, A Ordem das Coisas avisa: «opera um ativo que pode ser retirado de você a qualquer renovação.»
- **Franquia ou bandeira:** «Compra demanda pronta, e paga por ela em taxa e em liberdade.»

Condo-hotel e multipropriedade têm regras jurídicas e regulatórias próprias, fora deste módulo. Gestão e franquia não trazem dinheiro: mudam quem opera. Como diz o Volume 05, «O imóvel não precisa ser seu para o negócio ser seu.»

Tudo lado a lado

CAMINHO	O QUE CUSTA	O QUE LEVA	RISCO PRINCIPAL	QUANDO FAZ SENTIDO
Capital próprio	Nada em juro	Nada	Todo o risco em você	Até o limite de perda
Pessoa do círculo	Juro baixo a médio	Às vezes participação	A relação, se não houver contrato	Ponte curta, com contrato
Comprador de unidade	Obrigação futura	A unidade vendida	Reputação, se a entrega atrasar	Unidades da fase 1, com projeto e licença
Pré-venda	Desconto e noites futuras	Parte do calendário	Passivo com cara de caixa	Quando o desconto cabe na margem
Dívida bancária	Juro e parcelas periódicas	Garantia e liberdade	Carência curta e aval pessoal	Operação madura ou prazo curto até a receita
Fomento	Juro baixo, contrapartidas	Garantia e fiscalização	Desembolso lento	Infraestrutura, com antecedência
Sócio investidor	Diluição	Resultado, decisão, informação, saída	Sócio errado por uma década	Fases seguintes, depois de criar valor
Permuta	Parte do empreendimento	Participação ou unidades	Avaliação mal feita	Terra ótima e capital curto
Arrendamento (entrar)	Aluguel do terreno ou imóvel	Benfeitorias, ao fim do contrato	O ativo não é seu	Testar o modelo antes de imobilizar
Condo-hotel	Propriedade das unidades	Receita dividida em pool	Governança com muitos donos	Com operação que sustente a promessa
Multipropriedade	Frações de uso	Semanas por décadas	Distrato e desgaste de marca	Idem

CAMINHO	O QUE CUSTA	O QUE LEVA	RISCO PRINCIPAL	QUANDO FAZ SENTIDO
Contrato de gestão	Parte da receita	A operação do dia a dia	Dependência do operador	Ter o ativo sem tocar a operação
Franquia ou bandeira	Taxas	Liberdade de decidir padrão	Pagar por demanda que não vem	Quando falta demanda

Tabela 5.3 · Leitura do método, não recomendação. Síntese do Volume 05 · Investimento, do Panorama, da Jornada do COMO · Etapa 01 e de A Ordem das Coisas. Cada caso exige advogado e contador.

Todo capital tem preço. O barato cobra juros. O caro cobra participação. O errado cobra o projeto inteiro.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO (EDIÇÃO DO PROJETO)

Outra leitura é pelo que você aceita ceder. Em degraus, a partir do Volume 05: quem não cede nada faseia e usa o próprio capital; quem cede juros vai à dívida; quem cede participação, ao equity; quem cede propriedade, a modelos como o condo-hotel.



O degrau mais baixo cede nada em controle e concentra todo o risco em você.

Figura 5.3 · A escada do controle cedido. Leitura do método a partir da árvore de decisão do Volume 05 (edição do projeto). Pré-venda, arrendamento e contratos de operação cedem outras coisas: ver Tabela 5.3.

ANTES DE ASSINAR QUALQUER COISA

Contratos, aval, sociedade e cada arranjo deste capítulo têm consequências jurídicas e tributárias próprias. Leve a sua combinação a advogado e contador antes de assinar, e peça toda proposta de crédito por escrito, com as quatro variáveis do Mapa de Dívida Zion™. O pilar F · Financiar aprofunda o tema.

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** Marina (decisão do Z01: ajustar) tem terreno herdado, e a linha do terreno na Régua é zero, por escrito. Ela fixa o limite de perda e o capital próprio contratado, preenche a régua e classifica as seis fontes. Com sobra média de R$ 2.320 por mês no regime (R$ 27.840 por ano no Capítulo 3, já com a Lista do Que Ninguém Orça™), e negativa no conservador, dívida com parcela na obra não passa no teste de fôlego. A estudar: fasear, fomento com antecedência, sócio depois de estruturar.
- **Jornada B · Quero crescer:** Rafael (decisão do Z01: seguir) vai crescer administrando imóveis de terceiros, do outro lado do contrato de gestão: o risco é perder o imóvel na renovação, mitigado com prazo mínimo, multa e obrigação de reinvestimento. Se ampliar, dívida pode servir, porque já há caixa; mas a folga real é a sobra de R$ 203,52 por mês do conservador do Z01, o pior trimestre.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Capital próprio contratado e limite de perda vêm antes de qualquer capital de terceiros.
- São seis fontes, em dois grupos de três, e elas se combinam.
- O custo real tem cinco componentes: juro, diluição, garantia, tempo e liberdade. Juro zero não é capital gratuito.
- A Régua do Quanto Captar™ tem quatro linhas de necessidade; reserva e custo da captação são as que somem. O número vai exato.
- Em dívida para obra, a carência decide; a cobertura se calcula no ano dois, no cenário conservador.
- Equity leva resultado, decisão, informação e a sua saída, e nada disso se desfaz sem comprar de volta.
- Os demais arranjos mudam o que você precisa ter, e todos pedem advogado e contador.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda de memória antes de abrir a resposta.

1. Quais são as seis fontes do Mapa das Seis Fontes™, e como se dividem em dois grupos?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Por que o capital próprio é "o mais barato em dinheiro e o mais caro em risco"? Que número vem antes dele?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Quais são os cinco componentes do Custo Real do Capital™, e quais se somam em reais?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Uma dívida tem taxa baixa e carência de principal de doze meses, com uma obra de onze. Por que ela pode reprovar no teste de fôlego?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

Na tabela do Custo Real do Capital™, as duas fontes sem juro, capital próprio e investidor, são as que mais custam nas outras colunas: uma em risco, a outra em participação.

REFLEXÃO

Se o seu projeto desse errado amanhã, o pior cenário seria perder o investido ou alcançaria a sua casa?

DICA

Esta semana, pergunte a três bancos a taxa para o seu perfil, a carência possível e a garantia exigida. Anote com data.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 05

1. Qual é o seu limite de perda aceitável, e quanto do seu capital próprio está contratado, não esperado?

2. Preencha as seis linhas da Régua do Quanto Captar™. Qual é o número exato?

3. Classifique as seis fontes em disponível, possível ou fora, com uma justificativa.

4. Para as duas fontes mais prováveis, escreva os cinco componentes do custo real. Onde não souber, escreva a pergunta e para quem.

5. Escreva em uma linha o que você está trocando na combinação escolhida, e quais perguntas levará ao advogado e ao contador.

CAPÍTULO 06

PREMISSAS, CENÁRIOS E ESTRESSE

Testar antes de *comprometer.*

Antes de assinar obra, contrato ou dívida, descubra em que ponto o seu plano para de funcionar e se esse ponto está longe.

NESTE CAPÍTULO

- O Painel de Premissas Defensáveis™ e a Projeção em Quatro Camadas™, em nível introdutório.
- O Teste dos Três Cenários™ aplicado ao plano.
- A Curva de Caixa Acumulado™ e o Teste de Estresse Zion™, mês a mês.
- O ponto de quebra em uma frase, e o custo de descobri-lo tarde.
- Quando o teste manda seguir, ajustar, fasear, mudar de porta ou parar.

Você já tem as peças: o que possui de verdade, a porta, o investimento necessário, a primeira fase e as fontes possíveis. Falta a pergunta que separa plano de desejo: ele aguenta?

Não interessa quanto o projeto rende no melhor caso. Interessa em que ponto ele para de funcionar, e se esse ponto está longe.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

O teste tem três camadas, nesta ordem: premissas, cenários e estresse no caixa. Pede uma tarde e uma planilha.

REVISITE

Do Z01, Capítulo 5: você aplicou o Teste dos Três Cenários™ na Folha de Viabilidade Zion™ e calculou o equilíbrio com impostos e cancelamento. Aquele teste perguntava se o lugar paga a operação no ano maduro. Aqui a pergunta é outra: o seu caixa atravessa a obra e a rampa até lá? Tente lembrar as quatro leituras do conservador.

Primeiro, premissas que se defendem

Todo teste herda a qualidade das premissas. Se a diária veio do fim de semana de alta, nenhum cenário salva a conta.

Investidor não testa o seu modelo. Ele testa três premissas, e decide sobre o resto a partir dessas três.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

FRAMEWORK DO MÉTODO

Painel de Premissas Defensáveis™

Premissa defensável tem **fonte verificável** (comparável nominado, contrato, demonstrativo ou orçamento com data; «Experiência pessoal não é fonte.»), **conservadorismo demonstrado** (abaixo da média dos comparáveis, com a média ao lado) e **teste de queda escrito** (10%, 20% e 30% abaixo).

- Sempre questionadas: ocupação do ano 1, diária média e prazo até abrir. Ninguém questiona, e devia, o custo fixo mensal, «onde moram os erros mais caros».
- Passos: troque cada premissa em 10% e marque as cinco que mais movem o resultado; escreva fonte e data; ponha a média dos comparáveis ao lado; rode a queda; escreva a frase de resposta; revise o custo fixo com ceticismo.

Fonte: Volume 05 · Investimento, Capítulo 06.

Leia as frases em voz alta: «Frase que você hesita ao dizer é premissa que ainda não está defendida.»

O plano que vamos testar

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Cinco cabanas, uma fase

Porta de construir, destino de serra (não é o caso de Marina). Mês de 30 dias: 5 × 30 = 150 noites disponíveis. Diária média de R$ 560; deduções e quebra de 18% (impostos, comissões, cancelamento e no-show, 17%, mais quebra de 1%; fator 0,82); custo variável de R$ 100 por noite; custo fixo de R$ 14.000 por mês a partir da abertura.

CAPEX (o investimento até abrir) de R$ 1.200.000, com contingência, pago em oito marcos. Obra do mês 1 (novembro) ao 8; abertura no mês 9, julho, começo da alta. Recursos de R$ 1.350.000 na entrada, «Contratado, não esperado»: os R$ 150.000 além do CAPEX são o capital de giro.

Ocupação de regime com sazonalidade e média anual de 45% (65% em julho, 35% em março e abril). Rampa dentro das faixas da Curva de Rampa do Primeiro Ano™ (Jornada do COMO · Etapa 02): 35% da ocupação de regime nos meses 1 a 3 de operação, 55% nos meses 4 a 6, 75% nos meses 7 a 12.

Números didáticos, não são dados de mercado nem projeção para o seu caso.

A receita multiplica duas curvas, sazonalidade e rampa. É a regra da camada de diária da Projeção em Quatro Camadas™.

FRAMEWORK DO MÉTODO

Projeção em Quatro Camadas™

«Receita projetada como uma linha só é uma opinião.» Quatro camadas, cada uma com a sua lógica: **diária** (unidades × ocupação × diária, mês a mês); **serviços ao hóspede** (hóspedes × taxa de captura × ticket médio); **cessão de espaço** (datas no ano × valor médio da data) e **outras**, como day use. Na diária, «Duas curvas, não uma.»: a sazonalidade, que se repete, e a maturação, que acontece uma vez. Fonte: Volume 05 · Investimento, Capítulo 07.

O exemplo só tem a diária; a modelagem completa fica para o pilar Financiar.

O Teste dos Três Cenários™ no ano maduro

Primeiro a régua que você já conhece: 5 × 365 = 1.825 noites no ano. Cada noite deixa 560 × 0,82 − 100 = R$ 359,20 para pagar o fixo de R$ 168.000.

EXEMPLO ILUSTRATIVO	CONSERVADOR	BASE	OTIMISTA
Diária · ocupação	R$ 504 · 36%	R$ 560 · 45%	R$ 616 · 51,75%
Noites vendidas	657	821,25	944,4
Receita	R$ 331.128	R$ 459.900	R$ 581.774
Resultado operacional	**R$ 37.825**	**R$ 126.993**	**R$ 214.611**
Ponto de ruptura	29,4%	25,6%	22,7%

Regras: Jornada do COMO · Etapa 02, Passo 13. Base: 459.900 − 82.782 − 82.125 − 168.000 = 126.993. Conservador: 560 × 0,9 e 45 × 0,8; otimista: 560 × 1,1 e 45 × 1,15.

Ruptura do base: 168.000 ÷ 359,20 = 467,7 noites; ÷ 1.825 = 25,6%. São 19,4 pontos até os 45%, longe dos dez que marcam projeto apertado. O conservador é positivo: há folga. No teste de queda, a diária pesa mais: com 30% a menos de ocupação sobram R$ 38.495; com 30% a menos de diária, R$ 13.858.

Se o teste parasse aqui, a decisão seria seguir. Mas o ano maduro só chega depois da obra e da rampa, onde o dinheiro acaba.

A Curva de Caixa Acumulado™ e o Teste de Estresse Zion™

Projeto não quebra por prejuízo. Quebra por falta de caixa num mês específico, e esse mês dá para saber qual é.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

FRAMEWORK DO MÉTODO

Curva de Caixa Acumulado™

- Comece com os recursos contratados, menos usos imediatos, e declare **caixa inicial zero** em nota visível.
- De 12 a 36 meses, some o resultado com sazonalidade real, nunca média, e subtraia o CAPEX no mês de cada marco.
- Ache o menor saldo, com mês e valor: é o número que decide.
- Colchão = menor saldo ÷ CAPEX. «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.»

Fonte: Volume 05 · Investimento, Capítulo 08.

Um mês do base, o mês 9, julho: 65% × 35% = 22,75%; 150 × 22,75% = 34 noites. 34 × 560 = R$ 19.040, menos 18% (R$ 3.427,20), menos 34 × 100 (R$ 3.400), menos R$ 14.000: **– R$ 1.787**. Mesmo abrindo na alta, a rampa deixa o mês negativo.

Agora o estresse, com uma regra que separa teste de teatro:

Cenário que só mexe na ocupação não é estresse, é desconto.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

FRAMEWORK DO MÉTODO

Teste de Estresse Zion™

Três cenários: **base**, as premissas defendidas; **conservador**, «o cenário provável quando algumas coisas não saem perfeitas, que é o normal»; **tensionado**, o da sobrevivência: «A pergunta aqui não é quanto rende, é se atravessa.»

- 01 · Duplique as premissas para o conservador e o tensionado.
- 02 · Mova as sete variáveis para o lado ruim: ocupação, diária, taxa de captura, custo fixo, custo variável, CAPEX e prazo.
- 03 · No tensionado, acione um evento de risco de impacto alto.
- 04 · Rode a curva de caixa nos três; interessa o ponto mais baixo.
- 05 · Ache o ponto de quebra por tentativa, piorando a ocupação até o saldo ficar negativo.
- 06 · Escreva a frase do ponto de quebra, com o aporte que faltaria.
- 07 · Prepare o plano B: o que entra, quanto custa, quem aciona.

Fonte: Volume 05 · Investimento, Capítulo 09. O "conservador" daqui não é o dos três cenários: aquele mexe em diária e ocupação no ano maduro; este mexe em tudo, no caixa da implantação.

No tensionado do exemplo, o fornecedor da estrutura atrasa 90 dias no quinto marco, a diária cai 10% e a rampa anda no piso das faixas (25%, 45% e 65%). Sem serviços, a taxa de captura não entra.

EXEMPLO ILUSTRATIVO	BASE	CONSERVADOR	TENSIONADO
Diária média	R$ 560	R$ 532	R$ 504
Rampa, % do regime	35, 55, 75	35, 55, 75	25, 45, 65
Custo fixo · variável	R$ 14.000 · R$ 100	R$ 14.700 · R$ 105	R$ 15.400 · R$ 110
CAPEX	R$ 1.200.000	R$ 1.260.000	R$ 1.320.000
Atraso (R$ 6.000 por mês parado)	nenhum	2 meses	3 meses
Menor saldo em 36 meses	**R$ 132.803, mês 13**	**R$ 45.197, mês 18**	**– R$ 48.420, mês 19**
Colchão	11,1%	3,6%	negativo

Conferência: 132.803 ÷ 1.200.000 = 11,1%; 45.197 ÷ 1.260.000 = 3,6%. Noites arredondadas ao inteiro; resultados ao real.

MÊS	CALENDÁRIO	BASE: CAPEX (R$)	BASE: RESULTADO (R$)	BASE: SALDO (R$)	TENSIONADO: CAPEX (R$)	TENSIONADO: RESULTADO (R$)	TENSIONADO: SALDO (R$)
0	entrada			1.350.000			1.350.000
1	nov	−180.000	0	1.170.000	−198.000	0	1.152.000
2	dez	−120.000	0	1.050.000	−132.000	0	1.020.000
3	jan	−180.000	0	870.000	−198.000	0	822.000
4	fev	−120.000	0	750.000	−132.000	0	690.000
5	mar	−180.000	0	570.000	0	−6.000	684.000
6	abr	−120.000	0	450.000	0	−6.000	678.000
7	mai	−120.000	0	330.000	0	−6.000	672.000
8	jun	−180.000	0	150.000	−198.000	0	474.000
9	jul	0	−1.787	148.213	−132.000	0	342.000
10	ago	0	−4.661	143.552	−132.000	0	210.000
11	set	0	−6.457	137.095	−198.000	0	12.000
12	out	0	−2.146	134.949	0	−10.851	1.149
13	nov	0	−2.146	**132.803**	0	−10.851	−9.702
14	dez	0	727	133.530	0	−9.638	−19.340
15	jan	0	6.115	139.645	0	−5.088	−24.428
16	fev	0	2.164	141.809	0	−7.211	−31.639
17	mar	0	9	141.818	0	−8.121	−39.760
18	abr	0	9	141.827	0	−5.088	−44.848

Exemplo ilustrativo. Saldo = saldo anterior

Exemplo ilustrativo. Saldo = saldo anterior + CAPEX + resultado. No tensionado, os marcos 5 a 8 escorregam para os meses 8 a 11. Mês 12: 40% × 25% = 10%, 15 noites; 15 × 504 = 7.560; 7.560 − 1.360,80 − 1.650 − 15.400 = −10.850,80, ou −10.851.

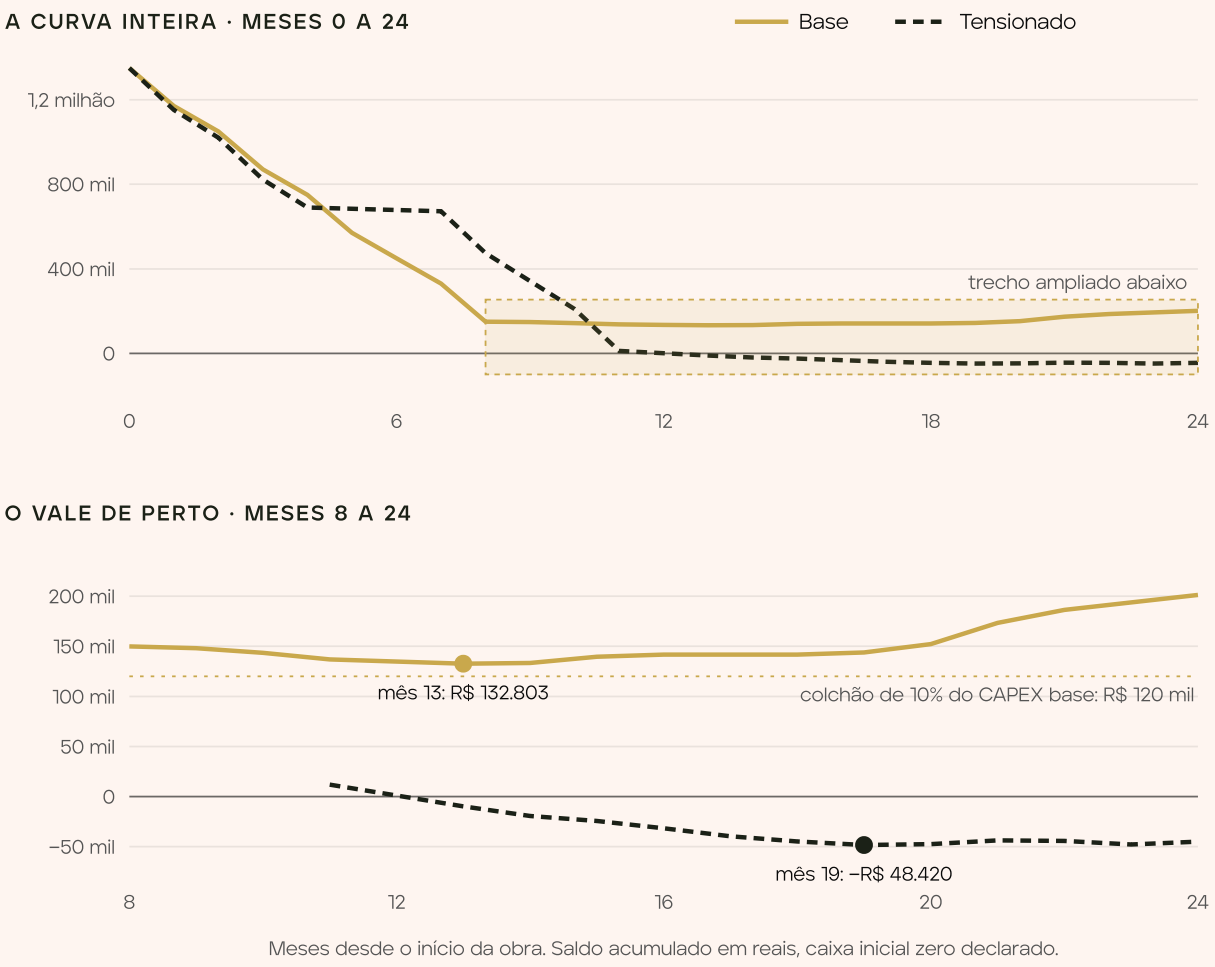


Figura 6.1 · A Curva de Caixa Acumulado™ do exemplo ilustrativo, em escala. Em cima, a curva inteira; embaixo, o vale ampliado, com o zero e o colchão de 10% do CAPEX base.

Leia o vale com as perguntas do Volume 05. Existe barriga negativa? No base, não; no tensionado, o saldo cruza o zero no mês 13. De quanto? R$ 48.420 no fundo, no mês 19, depois dos 18 meses da tabela: horizonte curto esconde o vale. Qual o colchão? 11,1% no base, raspando a régua; 3,6% no conservador. Quando o caixa vira? No base, no mês 14; no tensionado, de forma sustentada só no mês 24.

O tensionado ainda abre em outubro, fora da temporada. Aí, diz o Volume 05, a cessão de espaço contratada em bloco «é frequentemente a diferença entre um ano um apertado e um ano um que quebra».

Qual premissa move o vale

Volte ao Painel e troque cada premissa sozinha, medindo o menor saldo. Antes da figura, preveja: o que move mais o vale, a ocupação ou o CAPEX?

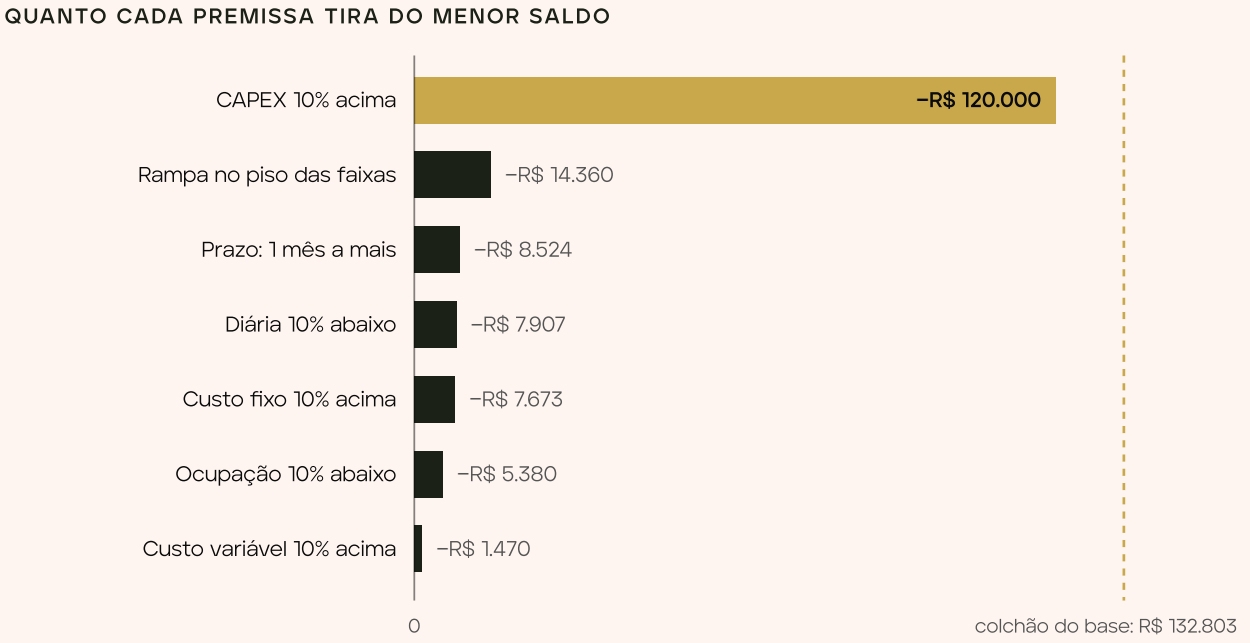


Figura 6.2 · Sensibilidade do menor saldo do base a cada premissa piorada sozinha (exemplo ilustrativo). Prazo: um mês a mais, 12,5% dos oito; rampa: piso das faixas da fonte.

O resultado anual sente a diária; o caixa da implantação sente o CAPEX, pago antes do primeiro hóspede. Cada 1% do CAPEX vale R$ 12.000, e 132.803 ÷ 12.000 = 11,1: um estouro desse tamanho zera o colchão. Para quebrar sozinha, a diária teria de cair 45%, e a ocupação, 57,5%. O atraso isolado não quebra nem com doze meses. Combinado, sim.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · A FRASE DO PONTO DE QUEBRA

Este plano atravessa com CAPEX até 5% acima do orçado e dois meses de atraso, mesmo com a ocupação cerca de 42% abaixo da prevista. Com CAPEX 10% acima e dois meses de atraso, falta caixa no mês 13. Para atravessar o tensionado com colchão de 10%, preciso de mais R$ 180.420 contratados, ou de um CAPEX travado.

Conferência por tentativa: com R$ 1.260.000 e dois meses, o saldo zera com ocupação a 57,5% da prevista; com R$ 1.320.000, fica em − R$ 2.063. Reforço: 48.420 + 132.000 = R$ 180.420.

O custo de descobrir tarde

Descobrir isso agora custa uma tarde; descobrir depois custa o investimento inteiro.

JORNADA DO COMO · ETAPA 02

A Ordem das Coisas: «A mesma decisão custa de três a dez vezes mais quando tomada fora de ordem — porque fora de ordem ela precisa ser corrigida com concreto em vez de com papel.» No papel, o estouro de CAPEX se resolve com preço fechado ou reserva maior; no mês 13, com o caixa no zero, vira crédito caro ou obra parada.

O oposto também cobra: no Z01, Capítulo 6, a Conta do Custo Invisível™ mostrou que esperar sem decidir tem preço. Testar não é adiar; é a forma barata de decidir.

Quando o teste manda fasear, mudar de porta ou parar

O teste não dá nota, dá direção. A Figura 6.3 reúne as regras das fontes num semáforo; a combinação em três faixas é uma leitura deste módulo.



Figura 6.3 · O semáforo do teste. Musgo: seguir; ouro: ajustar; tinta: mudar de porta ou parar. Critérios: Jornada do COMO · Etapas 01 e 02, Volume 05 · Investimento e A Ordem das Coisas.

Ajustar e fasear. O exemplo acende o amarelo. A Etapa 02 dá o cardápio: «Se o investimento necessário exceder o capital real, as opções são reduzir o escopo, faseamento, captar ou mudar de porta de entrada.» Primeiro, travar o CAPEX. Depois, testar uma fase menor. Hipótese: três cabanas, 40% do CAPEX em infraestrutura comum e fixo de R$ 12.000. CAPEX = 1.200.000 × (0,40 + 0,60 × 3 ÷ 5) = R$ 912.000. No tensionado (tudo 10% pior, três meses de atraso, rampa no piso), com o mesmo giro de R$ 150.000 (recursos de R$ 1.062.000, R$ 288.000 a menos), o menor saldo fica em cerca de –R$ 59 mil, no mês 31: pior que o das cinco cabanas. Mas o ano maduro cai para 1.095 × 45% × 359,20 – 144.000 = R$ 32.996, com equilíbrio em 36,6%. Fasear reduziu o cheque, não o risco de caixa: o fixo não encolhe na mesma proporção, três cabanas passam a baixa no vermelho, e a fase menor precisa da própria reserva. Critérios de passagem: Capítulo 4.

Mudar de porta. Se nenhuma fase cabe e a perda possível passa do limite do Capítulo 1: «Se o seu plano atual envolve risco de vida, ele não está maduro — e a correção é reduzir o valor ou mudar de porta, não aumentar a coragem.» Alugar para hospedar ou administrar o de outro (Capítulo 2) pede uma fração do capital. Dívida e sócio: pilar Financiar, com advogado e contador.

Parar. Se nem o base fecha, ou nada muda o suficiente, adiar com condição verificável ou não fazer é resultado legítimo: «Nesse caso adiar não é adiar, é

decidir — e decidir não fazer é um resultado tão válido quanto o outro.»

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** Marina saiu do Z01 com "ajustar": empata com 54 noites por mês, 36,0%, contra 40% estimados, folga de 4,0 pontos, já com cancelamento e quebra do Capítulo 3: menos de dez pontos, projeto apertado. Antes de pedir orçamento, ela monta o Painel, roda a curva da primeira fase e escreve a frase do ponto de quebra. Barriga no tensionado: testa fase menor ou outra porta.
- **Jornada B · Quero crescer:** Rafael seguiu, mas no conservador do Z01 empata com 48 noites e vende 48: sobra de R$ 203,52 por mês. Antes de administrar o imóvel de outro, ele roda a curva dos chalés, com o demonstrativo real, somada à rampa do imóvel novo. Se a baixa vier fraca e o novo encher devagar, o caixa atravessa? Se não, cresce menor.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Premissa defensável tem fonte verificável, conservadorismo demonstrado e teste de queda escrito.
- Os três cenários dizem se o ano maduro paga a operação, não se o caixa atravessa a implantação.
- A curva de caixa parte de caixa zero, subtrai o CAPEX por marco e procura o menor saldo, que deve valer ao menos 10% do CAPEX.
- Estresse de verdade piora receita, custo, CAPEX e prazo juntos, e termina numa frase de ponto de quebra.
- No resultado anual pesa a diária; no vale da implantação, o CAPEX.
- O teste dá direção: seguir, ajustar ou fasear, mudar de porta ou parar.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda sem consultar. Depois, compare com a resposta de referência.

1. Quais os três atributos de uma premissa defensável? Qual premissa ninguém questiona, mas deveria?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Por que um plano pode passar nos três cenários e falhar na curva de caixa?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Menor saldo de R$ 60.000 com CAPEX de R$ 900.000: o que o colchão diz?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. O que diferencia o tensionado do conservador no Teste de Estresse Zion™?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

Para o Volume 05 · Investimento, o único gráfico que precisa existir numa apresentação de captação é a curva de caixa acumulado: ela comunica em cinco segundos o que uma tabela leva dez minutos para dizer.

REFLEXÃO

Qual premissa do seu plano você teria mais dificuldade de defender em voz alta, com fonte e data?

DICA

Nesta semana, peça ao fornecedor principal da obra uma proposta com preço, prazo e data por escrito. É a premissa que mais move o vale.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 06

1. As cinco premissas que mais movem o seu plano, cada uma com valor, fonte, data e média dos comparáveis.

2. Os seus três cenários no ano maduro: resultado do conservador, ponto de ruptura e folga até a ocupação estimada.

3. A sua curva de caixa, com caixa zero e CAPEX por marco: menor saldo, mês e colchão.

4. O seu tensionado: o que piorou, quanto, qual evento de risco, e o novo menor saldo.

5. A frase do seu ponto de quebra, com o aporte que faltaria e o plano B.

6. Cor do semáforo e próxima ação: seguir, ajustar, fasear, mudar de porta ou parar. Por quê?

CAPÍTULO 07

JORNADA B · QUEM JÁ OPERA

Quem já opera: crescer *com o que já tem.*

Antes de expandir, conserte o que já custa dinheiro hoje. Depois escolha o caminho que cabe no seu caixa, no seu tempo e no seu risco.

NESTE CAPÍTULO

- Por que crescer começa por consertar.
- Os caminhos: administrar ou alugar na região, reformar, ampliar, nova unidade.
- Caixa da operação ou capital de terceiros.
- Duas receitas, erros do Manual e Zion ECROI® como critério.
- Rafael compara três caminhos.

Quem já opera tem o que nenhum iniciante tem: números reais. E tem uma tentação que o iniciante não tem: achar que, se quatro unidades funcionam, oito vão funcionar o dobro. Este capítulo transforma o "seguir" do Z01 em um caminho de crescimento que não aposta mais do que a operação aguenta.

O Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro descreve quem já construiu sem rodeios: «Desenvolvimento acabou. O problema agora é fazer o negócio dar dinheiro.» A próxima unidade é um projeto novo, com todas as perguntas de um projeto novo. Antes dela vem a operação que você já tem.

Primeiro consertar, depois crescer

A regra é simples: resolva primeiro o que já está custando dinheiro hoje, não o que vai custar no ano que vem.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

O Panorama completa com uma escala de urgência: «Calendário vazio custa agora. Produto sem diferenciação custa na próxima temporada. Governança frágil custa no dia em que você precisar se ausentar.» Crescer em cima de um desses problemas não o resolve: multiplica. Quatro chalés com calendário fraco viram seis, agora com mais custo fixo.


Dois testes dizem se você passou do ponto de consertar. O primeiro é de A Ordem das Coisas: «Se você se ausentasse por trinta dias sem aviso, a operação funcionaria e você saberia o resultado do mês ao voltar?» O segundo vem do Z01: o conservador, montado com o pior trimestre, precisa fechar positivo. Se um falha, o primeiro investimento não é tijolo: é o número do mês, o motivo escrito para escolherem você e alguém que decida no seu lugar.

Replicar uma operação que depende do dono não produz duas operações: produz um dono dividido ao meio, com duas operações piores do que a original.

A ORDEM DAS COISAS

REVISITE · Z01, CAPÍTULOS 7 E 8

No Z01 você marcou o Espelho do Travamento™ e achou o elo mais fraco na Pirâmide da Rentabilidade Territorial™: a menor nota, não a média. Rafael, exemplo ilustrativo da Jornada B, fechou com "seguir": sobra de R$ 7.377,60 no base, R$ 203,52 no conservador, nenhuma noite de folga e Potencial de Marca como nota mais fraca. Sem reler: por que "seguir" não era construir o quinto chalé?

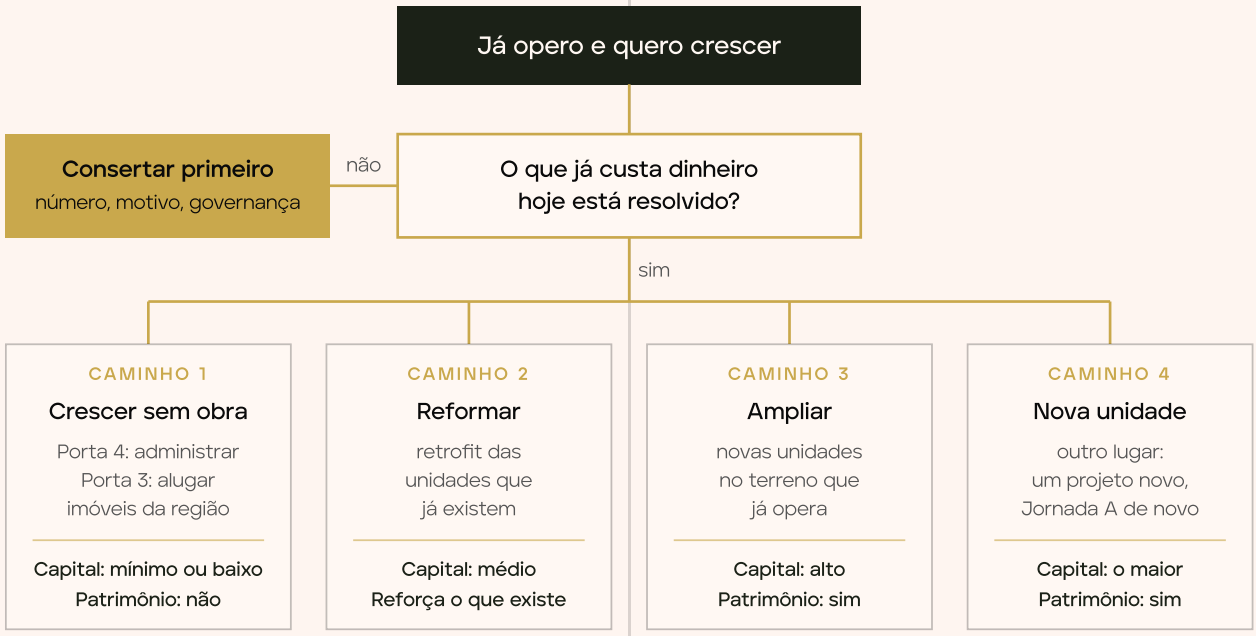

Da esquerda para a direita, cresce o capital, o prazo até o primeiro real e o risco.

Figura 7.1 · A árvore dos caminhos de crescimento. Leitura editorial a partir das fontes.

Crescer sem obra: as Portas 3 e 4 como crescimento

No Capítulo 2, o Mapa das Quatro Portas™ era entrada no negócio. Para quem já opera, duas portas viram o crescimento mais barato. A Jornada do COMO avisa a quem já aluga por temporada ou tem pousada ou hotel pequeno: «uma das quatro portas pode ser o seu próximo crescimento, sem construir nada.»

A **Porta 4** é administrar o imóvel de outra pessoa, em troca de «um percentual da receita, tipicamente entre quinze e vinte e cinco por cento, ou um valor fixo mais participação». O capital é «quase nenhum: sistema, fotografia, material de limpeza e o seu tempo», e quem já opera tem quase tudo: processo de limpeza, roteiro de atendimento, prática de preço e canais.

> *Você escala adicionando imóveis, sem capital, limitado pela sua capacidade de operar.*
>
> JORNADA DO COMO · ETAPA 01

O limite é o tempo. Pela Agenda Real por Semana™, um imóvel administrado exige de 4 a 8 horas semanais; quatro, de 14 a 24. Os riscos são dependência do proprietário e controle limitado: «Os dois se mitigam com contrato — prazo mínimo, multa, obrigação de reinvestimento — e nunca se eliminam.»

A **Porta 3** é alugar um imóvel para hospedar: você fica com a receita menos o aluguel e assume o risco de ocupação, porque o aluguel é fixo e a receita varia. Na abertura da Jornada do COMO, quem abriu uma casa alugada «no décimo quarto mês alugou a segunda casa, com o próprio resultado». O contrato precisa autorizar a hospedagem por escrito, e a locação para temporada tem regra própria na Lei nº 8.245/1991: confirme com um advogado.

Reformar, ampliar ou abrir outra unidade

Reformar é investir nas unidades que já existem. **Retrofit** é a reforma que atualiza uma estrutura de pé (instalações, conforto, eficiência) sem criar unidade nova. As fontes não têm ferramenta de reforma, mas dão três alertas: contingência de 15% a 20% na adequação de imóvel pronto, «porque o que se encontra ao abrir paredes é imprevisível»; a unidade bloqueada para obra, linha da Lista do Que Ninguém Orça™; e o limite do que a obra conserta: «estrutura se reforma em meses, nota se recupera em anos.» Antes, a pergunta do Manual Oficial: «Esta decisão aumenta o valor do empreendimento ou apenas aumenta o custo?»

Ampliar é construir no terreno que já opera. A favor: «Uma operação de duas unidades e uma de quatro têm custo fixo parecido — o que significa que a margem de quatro unidades é muito melhor.» (Jornada do COMO · Etapa 02). Contra: o peso da Porta 1, de 12 a 24 meses até abrir, com capital comprometido desde o primeiro desembolso. E quem já sabe operar «tende a projetar o que ela sabe operar, e não o que o destino sustenta» (A Ordem das Coisas): refaça a leitura de mercado do Z01 para as unidades novas.

Nova unidade em outro lugar é outro projeto: no Panorama, «A Trilha A só serve para a próxima unidade.» Você volta à Jornada A, com dados reais. E vale a condição do Manual: «Quando um empreendimento depende exclusivamente da presença do fundador para funcionar, ele ainda não está preparado para expandir.»

CAMINHO	O QUE EXIGE	ATÉ A PRIMEIRA RECEITA	CONSTRÓI PATRIMÔNIO?	RISCO PRINCIPAL
Administrar (Porta 4)	Sistema, fotografia, limpeza, tempo	2 a 6 semanas	Não	Dependência do proprietário
Alugar (Porta 3)	Mobília, enxoval, reserva de aluguel	4 a 12 semanas	Não	Aluguel fixo, receita variável
Reformar	Obra, contingência, noites bloqueadas	Sem prazo na fonte	Reforça o existente	Paredes abertas; premissa de diária
Ampliar	Projeto, licença, obra, mobiliário, giro	12 a 24 meses (Porta 1)	Sim	Obra, prazo, custo de capital
Nova unidade	Toda a Jornada A	Conforme a porta	Nas Portas 1 e 2	Replicar operação que depende do dono

Fontes: Jornada do COMO · Etapas 01 e 02; A Ordem das Coisas. Linha "Reformar": organização editorial.

Duas receitas, dois tipos de crescimento

As duas receitas de A Ordem das Coisas, vistas no Z01, viram aqui critério de escolha. Sobre a operacional: «É a receita que paga as contas, sustenta o dono e financia o crescimento orgânico.» É ela «que você precisa ver positiva antes de pensar em expansão».

Os caminhos sem obra aumentam a primeira e quase não tocam a segunda: administrar o imóvel de outra pessoa «não acumula valor de venda, e isso precisa ser uma escolha consciente, não uma descoberta no ano cinco». Ampliar e abrir outra unidade constroem patrimônio, mas comprometem capital antes de existir receita nova. Nenhuma das duas é garantida; avaliação de negócio é tema do pilar Financiar.

Financiar o crescimento: caixa da operação ou capital de terceiros

Quem opera tem uma fonte a mais: o próprio caixa. Pela Linha do Tempo até o Primeiro Real™, o prazo curto importa porque «ele gera caixa que financia o passo seguinte, o que reduz a necessidade de capital externo». E, segundo o Volume 05 · Investimento, o demonstrativo real substitui qualquer estimativa genérica de margem e custo.

FONTE	A FAVOR	CONTRA	QUANDO FAZ SENTIDO
Caixa da operação	Sem juro, sem diluição, sem garantia	Lento e sazonal; em excesso, tira o fôlego	Passos pequenos: Portas 3 e 4, reforma por unidade
Capital pessoal fora da empresa	Rápido, sob seu controle	Concentra o risco	Só o Capital Real Disponível™ (Capítulo 1)
Capital de terceiros	Alcança o que o caixa não alcança	«ele tem custo e tem prazo.»	Ampliar ou nova unidade, após o teste do Capítulo 6

Fontes: Jornada do COMO · Etapa 01; Volume 05 · Investimento. Organização editorial.

O Volume 05 diz quando a dívida é a melhor escolha: «Quando existe operação madura gerando caixa que sustenta o serviço durante a implantação do novo.» Madura e sustenta são as palavras-chave: folga nula no pior trimestre (R$ 203,52 por mês) não sustenta parcela nos meses fracos. Fontes, custos e riscos estão no Capítulo 5; instrumento, contrato e garantia, no pilar Financiar, com advogado e contador. Nada aqui é promessa de crédito ou investidor.

Os erros do Manual como filtro de cada caminho

No Z01, os erros do Capítulo 20 do Manual Oficial diagnosticaram a operação. Aqui viram perguntas antes de escolher.

Mas crescer antes de consolidar processos é multiplicar problemas.

MANUAL OFICIAL DO MÉTODO ZION 360°

ERRO, NAS PALAVRAS DO MANUAL	CAMINHO EM QUE MAIS PESA	PERGUNTA ANTES DE ESCOLHER
«O quinto erro é crescer antes da hora.»	Ampliar e nova unidade	Passo na pergunta dos trinta dias?
«O quarto erro é subestimar a operação.»	Porta 4: o padrão vale no imóvel do outro	Quem faz a limpeza e o atendimento extra?
«O segundo erro é começar pela construção.»	Ampliar	Existe demanda medida para as unidades novas?
«O primeiro erro é apaixonar-se pela ideia.»	Reformar	A diária maior é premissa testada ou desejo?
«O maior erro de todos.»	Todos	O que eu ainda não sei sobre o caminho escolhido?

Fonte: Manual Oficial do Método Zion 360°, Cap. 20. As duas colunas da direita são leitura editorial.

FRAMEWORK DO MÉTODO · MANUAL OFICIAL

Zion ECROI®

Para o Manual, é «o framework oficial de tomada de decisão estratégica do Método Zion 360°», que vale antes de investir, captar e expandir. Não tem fórmula nem nota; aqui, os cinco pilares viram perguntas para cada caminho.

- **E · Enxergar:** reforça o que torna o lugar único?
- **C · Compreender:** apoia-se no demonstrativo e em demanda medida?
- **R · Refinar:** que premissa falta testar, e como testá-la barato?
- **O · Organizar:** capital, cronograma, equipe e governança estão escritos?
- **I · Impactar:** o que deixa para hóspede, comunidade e território?

«Quanto maior o investimento, maior deve ser o nível de consciência antes de agir.»

Rafael compara três caminhos

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Quatro chalés, decisão do Z01: seguir

Do Z01: diária de R$ 480, 66 de 120 noites por mês (55%), fixo de R$ 12.000, variável de R$ 100 por noite, deduções e quebra de 18%. Sobra do base: 31.680 − 5.702,40 − 6.600 − 12.000 = **R$ 7.377,60**; do conservador, **R$ 203,52**. O capital real disponível dele, calculado no Capítulo 1, é de R$ 92.595.

Primeiro, consertar. Em seis semanas, ele escreve o motivo pelo qual alguém escolhe os chalés, fecha o mês em uma página e passa limpeza e check-in a uma pessoa da equipe, com roteiro. Só então compara.

A · Administrar dois imóveis de terceiros. Cada casa vende 15 noites a R$ 400: R$ 6.000; as duas, R$ 12.000. Taxa de 20%: R$ 2.400; menos R$ 400 de custos dele: **R$ 2.000** por mês. Capital: R$ 6.000. Na rampa, metade da receita por três meses: 12.000 × 0,5 × 0,20 − 400 = R$ 800. Recuperação: 3 × 800 = 2.400; os 3.600 restantes levam 3.600 ÷ 2.000 = 1,8 mês. Total: cerca de **5 meses**. Primeiro real em cerca de 4 semanas.

B · Reformar os quatro chalés. R$ 25.000 por chalé mais 15% de contingência: 100.000 × 1,15 = **R$ 115.000**. Um chalé por vez, 30 dias bloqueado na baixa, quando venderia 12 noites a R$ 293,60 de contribuição (480 × 0,82 − 100): 12 × 293,60 = R$ 3.523,20 por chalé, R$ 14.092,80 nos quatro. Premissa: diária 10% maior, R$ 528. Ganho: 66 × 48 × 0,82 = **R$ 2.597,76** por mês. Recuperação: 115.000 ÷ 2.597,76 = 44,3 meses; com a receita perdida, 129.092,80 ÷ 2.597,76 = 49,7. Primeiro real em cerca de 2 meses.

C · Ampliar dois chalés. O investimento necessário, montado no Capítulo 3, é de **R$ 602.400**. Com 33 de 60 noites (55%) a R$ 480 e R$ 293,60 por noite, como no Z01 e no Capítulo 3: 33 × 293,60 − 2.000 de fixo adicional = **R$ 7.688,80** por mês. Recuperação: 602.400 ÷ 7.688,80 = 78,3 meses, sem a rampa. Primeiro real em cerca de 15 meses. O desembolso, sem o terreno, é de R$ 542.400 (Capítulo 3): faltam 542.400 − 92.595 = **R$ 449.805** de capital de terceiros.

LINHA	A · ADMINISTRAR DOIS	B · REFORMAR QUATRO	C · AMPLIAR DOIS
Capital	R$ 6.000	R$ 115.000 (+ R$ 14.092,80 de receita perdida)	R$ 602.400 (Capítulo 3)
Prazo até o primeiro real	Cerca de 4 semanas	Cerca de 2 meses	Cerca de 15 meses
Resultado mensal adicional, base	R$ 2.000	R$ 2.597,76, se a diária subir	R$ 7.688,80
Recuperação simples do capital	Cerca de 5 meses	44,3 a 49,7 meses	78,3 meses, antes da rampa
Risco principal	Dependência dos proprietários; horas	Premissa de diária não provada	Obra, prazo e dívida sobre folga nula no conservador
Receita que constrói	Operacional	Operacional; reforça o uso turístico	Operacional e patrimonial
Cabe nos R$ 92.595?	Sim, com folga	Só em etapas, um chalé por vez (R$ 28.750)	Não: faltam R$ 449.805

Exemplo ilustrativo; não são dados de mercado nem da Zion.

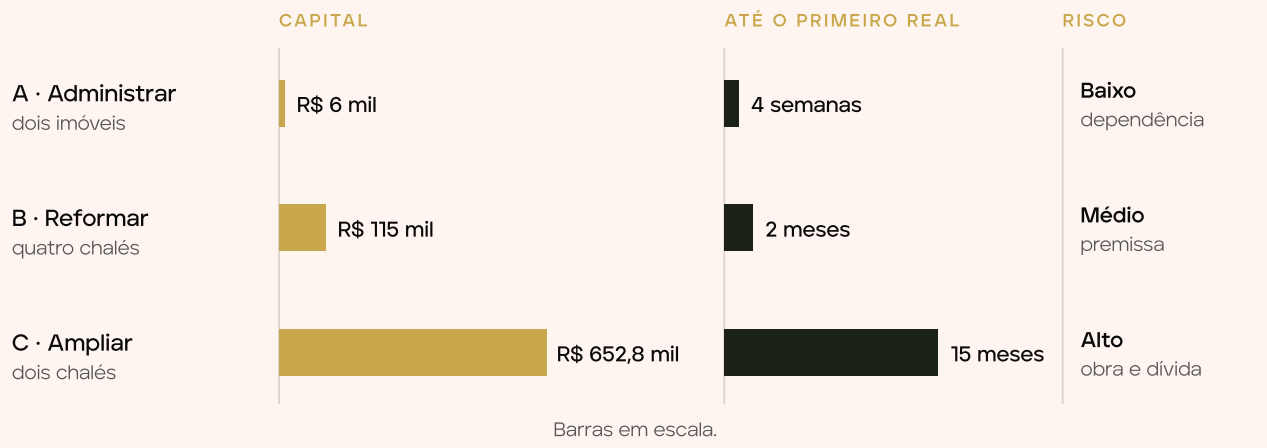


Figura 7.2 · Os três caminhos de Rafael lado a lado. Exemplo ilustrativo.

A DECISÃO DE RAFAEL

Rafael escolhe uma ordem. Primeiro o A: cabe com folga, devolve o capital em meses e testa se o padrão se mantém sem ele. As horas somam às dos chalés, por isso a pessoa da equipe é condição, não detalhe. Contrato com prazo mínimo, multa e reinvestimento.

Depois, a reforma em etapas, paga com caixa: metade da sobra média, 7.377,60 × 0,5 = R$ 3.688,80, mais os R$ 2.000 da Porta 4, dá R$ 5.688,80 por mês. Um chalé custa 25.000 × 1,15 = R$ 28.750, ou 28.750 ÷ 5.688,80 = 5,1 meses de reserva. O primeiro é teste: se a diária não subir, os outros esperam. A ampliação fica para depois, de propósito, com critério de passagem escrito: pergunta dos trinta dias respondida com sim e conservador que pague uma parcela hipotética. É a regra da Jornada do COMO: «Escolha uma, opere por um ano, e some a segunda depois — se ainda fizer sentido.»

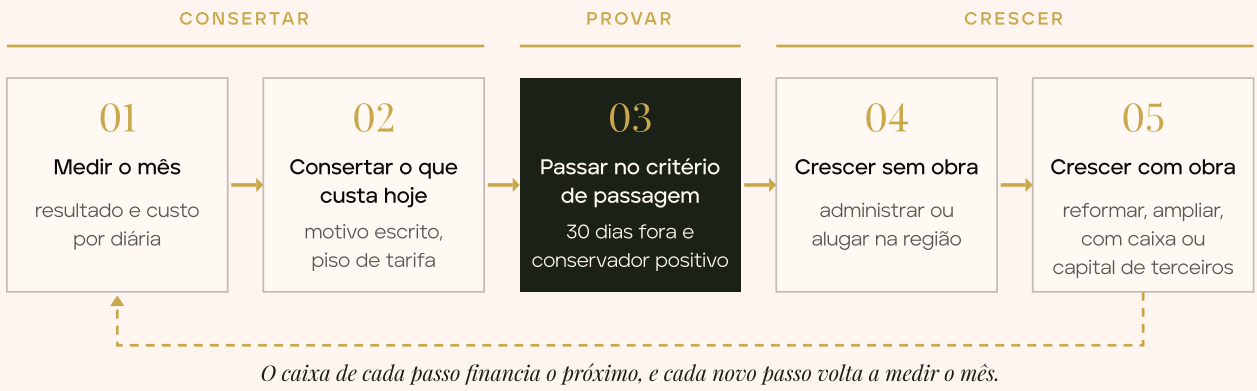


Figura 7.3 · Consertar, provar, crescer. Critério de passagem: o que precisa estar comprovado para o passo seguinte (Capítulo 4).

APLICAÇÃO

A

Quero começar: o que aprender com quem cresce

Copie a ordem de quem cresce: operar pequeno, medir, só depois imobilizar. «Construir depois, com operação rodando e dinheiro próprio, é mais fácil que construir primeiro.» As Portas 3 e 4 são entrada e escola. E desenhe a fase um para funcionar sem você por trinta dias.

B

Quero crescer: o caminho que cabe

Responda à pergunta dos trinta dias e confira o conservador do Z01. Se um falha, os próximos noventa dias são de conserto. Se os dois passam, compare dois ou três caminhos como Rafael, decida a ordem e passe a escolha pelo Zion ECROI®.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Antes de crescer, resolva o que já custa dinheiro hoje: calendário vazio, produto sem diferenciação, governança frágil.
- Dois testes dizem se você passou do ponto de consertar: a pergunta dos trinta dias e o conservador positivo.
- As Portas 3 e 4 são o crescimento mais barato, limitado pelo tempo e protegido por contrato.
- Reformar pede contingência e premissa testada; ampliar dilui o fixo, mas traz prazo e risco de obra.
- Sem obra cresce a receita operacional; com obra, também o patrimônio. A escolha é consciente.
- O caixa financia passos pequenos; o resto vai ao Capítulo 5 e ao pilar Financiar.
- Escolher a ordem vale mais do que escolher um caminho.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

Responda de memória, por escrito, antes de abrir a resposta.

1. Quais são os três custos que o Panorama ordena por urgência, e qual vem primeiro?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Por que a Porta 4 cresce sem capital, e qual é o seu limite?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. No exemplo de Rafael, por que a ampliação ficou para depois, mesmo com o maior resultado mensal?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Que receita cresce quando você administra imóveis de terceiros?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CURIOSIDADE

A Jornada do COMO compara o mesmo capital em portas diferentes: «O mesmo quarto de milhão de reais produz uma unidade em dezoito meses ou seis imóveis administrados em quatro semanas.»

REFLEXÃO

Se você pudesse crescer só com o que a operação gerou nos últimos doze meses, qual seria o primeiro passo?

DICA

Nesta semana, liste três proprietários da região com imóveis parados ou mal operados. Custa zero.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 07

1. O que já custa dinheiro hoje na sua operação (Jornada A: o que custaria se abrisse amanhã)? Ordene por urgência.

2. Pergunta dos trinta dias e sobra do conservador: você passou do ponto de consertar?

3. Compare dois ou três caminhos: capital, prazo até o primeiro real, resultado mensal adicional, recuperação e risco.

4. Quanto da sobra mensal você pode reservar para crescer? Em quantos meses ela paga o primeiro passo?

5. O caminho escolhido constrói receita operacional, patrimonial ou as duas? Por quê?

6. Passe o caminho pelo Zion ECROI® e escreva o critério de passagem do passo seguinte.

CAPÍTULO 08

ENTREGÁVEL DO MÓDULO

O seu Plano *Inicial.*

Este capítulo junta o módulo em uma folha: por qual porta, com qual fase, quanto, de onde e o que decidir nos próximos 90 dias.

NESTE CAPÍTULO

- O que o Plano Inicial é, e o que ele não é.
- Os três blocos da ferramenta: recursos, investimento da fase 1 e fontes.
- A regra de leitura, antes do resultado.
- Dois exemplos ilustrativos, um por jornada.
- Caderno, autoavaliação, atividade aplicada e checklist.

O Z01 terminou em uma decisão escrita: seguir, ajustar ou parar. Aqui ela vira um caminho que cabe no seu capital, no seu tempo e na perda que você suporta: o **Plano Inicial de Desenvolvimento e Alternativas de Capital**, entregável do módulo e porta de entrada dos pilares Desenvolver e Financiar.

Aprender termina quando você entendeu; decidir termina quando existe um documento assinado com a sua escolha e os seus números.

A ORDEM DAS COISAS

Um plano, não um dossiê de captação

O Plano Inicial não é modelo de viabilidade nem material para investidor. É a primeira versão honesta de cinco respostas, contra os dois erros do módulo: a paralisia e a aposta maior do que você aguenta perder.



Figura 8.1 · Os cinco passos do Plano Inicial e as três leituras possíveis.

Bloco 1 · Os recursos

Traga do Capítulo 1 o Capital Real Disponível™. O quadro tem duas linhas de resultado, e a Jornada do COMO avisa: «Confundir as duas é como operações abrem sem giro.» Digite a primeira, o **capital investível**, porque o giro entra no Bloco 2. Não o desconte duas vezes.

Depois, o **limite de perda aceitável** do Teste de Risco Suportável™: «Esse número, e não o saldo, é o seu capital de risco.» Depois, as horas da Agenda Real por Semana™, em horário de hóspede, e a decisão do Z01. Ajustar entra como condição. Parar vale para o lugar analisado no Z01: ali, nenhum arranjo de capital conserta um lugar que não sustenta o negócio, mas a Porta 3 ou a 4 em outro lugar continuam abertas (Capítulo 1).

A pergunta certa não é quanto você tem, é quanto você pode perder sem comprometer a sua vida.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO

Bloco 2 · O investimento da fase 1

É a Conta do Investimento Necessário™ do Capítulo 3, em cinco números, só da primeira fase: «Tudo o que sai antes de abrir, mais o que sai depois de abrir e antes de a receita cobrir.»

- **Investimento visível:** o orçamento do construtor ou do fornecedor; na Porta 3, mobília e adequação; na Porta 4, sistema e fotografia.
- **O que ninguém orça**, em % do visível: infraestrutura de sítio, projeto e licenciamento, gerenciador de obra e pré-operação. «O resto são as linhas que não aparecem no orçamento do construtor.» As dez linhas da Lista do Que Ninguém Orça™ são custo de operação: entram no fixo, no variável e nas deduções da receita (Capítulo 3), e por isso aumentam o giro.
- **Contingência**, em % do visível mais o não orçado. A Etapa 01 pede de 15% a 20% na primeira obra; a Etapa 02, de 20% a 25% sobre obra e infraestrutura. Na dúvida, o maior: «A contingência que não for usada vira capital de giro adicional, o que nunca é um problema.»
- **Obrigações fixas mensais**, **meses de reserva** e **necessidade técnica**. Pela regra do método, o giro é a necessidade técnica (o déficit acumulado da rampa e os meses negativos do ano de regime, calculados no Capítulo 3) mais uma reserva operacional de três meses de obrigações fixas (custo fixo com retirada, aluguel e taxas fixas). A Régua do Quanto Captar™ fala nos mesmos três meses; os seis meses do Capital Real Disponível™ ficam só como referência preliminar antiga.

Bloco 3 · As fontes

Distribua o necessário pelas seis fontes do Mapa das Seis Fontes™ (Capítulo 5). Cada uma cobra algo além do juro: «Juro, diluição, garantia, tempo e liberdade.»

FONTE (MAPA DAS SEIS FONTES™)	O QUE ELA LEVA EM TROCA
Capital próprio	«o mais barato em dinheiro e o mais caro em risco, porque concentra.»
Pessoa física do seu círculo	A relação. Exige «contrato escrito, com as mesmas cláusulas que você exigiria de um desconhecido.»
Comprador de unidade	«Capital rápido, custo alto em obrigação futura e o maior risco reputacional de todas as fontes se a entrega atrasar.»
Dívida bancária	Juro, garantia real e às vezes pessoal, e parcela que corre antes de a operação gerar caixa.
Linha de fomento ou crédito direcionado	Tempo: é lenta, burocrática e tem contrapartidas. Também é dívida.
Investidor	Participação e governança: «Compra decisão, informação e a sua saída.»

Fonte: Volume 05 · Investimento, Mapa das Seis Fontes™ e Custo Real do Capital™. Nível introdutório; contratos são do pilar Financiar.

Permuta e arrendamento não são fonte de dinheiro: reduzem o necessário, porque o terreno ou o imóvel deixa de sair do caixa. E capital de terceiros só conta «quando está contratado, não quando é uma possibilidade» (Jornada do COMO). Antes disso, é premissa.

A regra, antes do resultado

Conhecer a regra antes impede ajustar os números até a resposta agradar:

- **Não orçado** = visível × %.
- **Contingência** = (visível + não orçado) × %.
- **Giro** = custo fixo × meses.
- **Investimento necessário** = visível + não orçado + contingência + giro.
- **A captar** = investimento necessário − capital próprio usado. Capital próprio acima do capital real: não cabe.

- **Soma das fontes**: deve igualar o investimento necessário. A ferramenta mostra a diferença.
- **Exposição a perda** = capital próprio + dívida (bancária e de fomento): o que você perderia ou deveria se der errado. Simplificação didática: não mede aval, garantia, empréstimo do círculo nem, na Porta 3, os aluguéis contratados e a multa de saída, que entram na perda máxima (Capítulo 2).

Com as contas feitas, a leitura verifica três perguntas, nesta ordem:

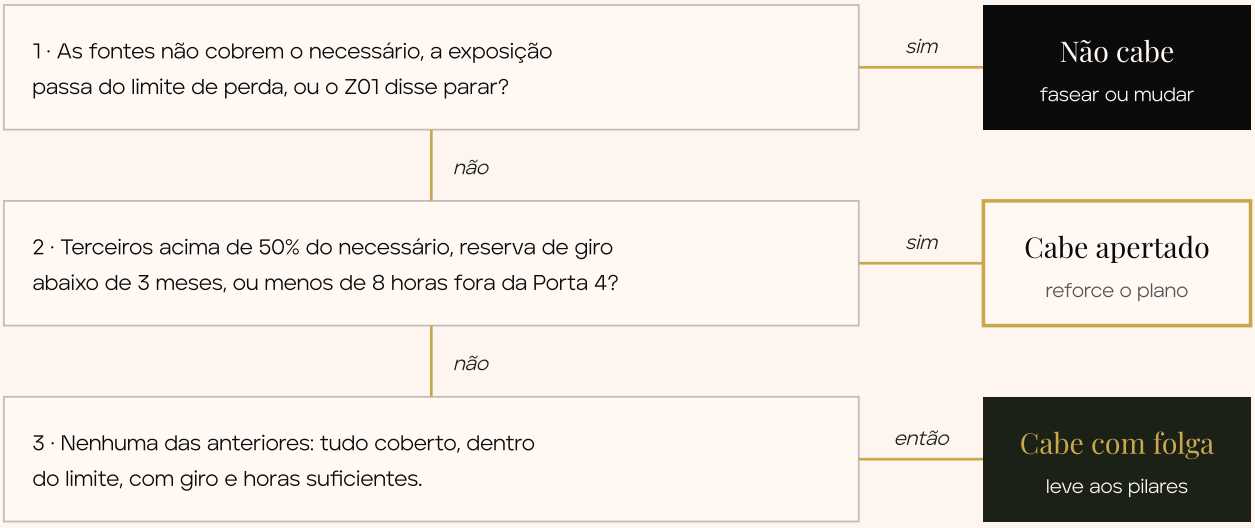


Figura 8.2 · A regra de leitura do Plano Inicial, verificada de cima para baixo.

O problema mais grave decide: a primeira pergunta trata do que impede o plano; a segunda, do que o fragiliza. A Porta 4 escapa da regra das horas: um imóvel administrado pede de quatro a oito horas (Agenda Real por Semana™).

O QUE A FERRAMENTA NÃO FAZ

A leitura é do método, aplicada aos seus números. Não é promessa de crédito, investidor, retorno nem ocupação. Estruturação jurídica e captação são do pilar Financiar, sempre com advogado e contador.

REVISITE

De memória: qual foi a sua decisão no Z01, e quais as três notas mais fracas do Zion Score™? Quais são, em ordem, os quatro filtros do Comparador das Quatro Portas™ (Capítulo 2)? Se travou, volte ao capítulo.

Como ler o resultado

Não cabe não encerra a Jornada: «as opções são reduzir o escopo, faseamento, captar ou mudar de porta de entrada» (Etapa 02). Comece por fase 1 menor ou outra porta; trocar capital próprio por dívida não reduz a exposição.

Cabe apertado pede reforço antes do dinheiro: confirmar fontes, porque «a combinação de três fontes pequenas costuma ser mais viável do que uma fonte grande»; mais meses de giro; ou alguém contratado para acompanhar obra e operação.

Cabe com folga é licença para seguir aos pilares, não para assinar amanhã. Faça antes o Teste de Estresse Zion™ do Capítulo 6: rode de novo com visível mais caro e mais meses de giro, o efeito de abrir tarde ou vender menos, e escreva o ponto de quebra em uma frase.

Não interessa quanto o projeto rende no melhor caso. Interessa em que ponto ele para de funcionar, e se esse ponto está longe.

Dois exemplos resolvidos

Marina e Rafael voltam com os números ilustrativos.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina, do ajuste a uma fase 1 que cabe

Do Capítulo 1: capital investível de R$ 380.000 (o giro entra no necessário), limite de perda de R$ 180.000, 8 horas em horário de hóspede. Ela roda três versões: as cinco cabanas do Capítulo 3; duas cabanas, com infraestrutura já para as cinco e um investidor não contratado; e a Porta 3, duas casas alugadas na serra enquanto a energia avança, porque é «a que permite testar um destino antes de comprometer patrimônio» (A Ordem das Coisas).

EXEMPLO ILUSTRATIVO · MARINA	5 CABANAS (CAP. 3)	2 CABANAS	PORTA 3 · 2 CASAS
Visível	R$ 825.000	R$ 330.000	R$ 76.000
Não orçado	R$ 295.000	R$ 264.000 (80%)	R$ 15.200 (20%)
Contingência	R$ 311.146	R$ 118.800 (20%)	R$ 13.680 (15%)
Giro	R$ 185.728	R$ 90.000 (45.000 de rampa, hipótese, + 3 × 15.000)	R$ 54.000 (27.000 de rampa, hipótese, + 3 × 9.000)
Investimento necessário	**R$ 1.616.874**	**R$ 802.800**	**R$ 158.880**
Fontes	R$ 380.000 próprios	180.000 próprios + 622.800 investidor	R$ 158.880 próprios
Diferença	faltam R$ 1.236.874	zero	zero
Exposição (limite R$ 180.000)	R$ 380.000	R$ 180.000	R$ 158.880
Terceiros sobre o necessário	0%	77,6%	0%
Leitura	**Não cabe**	**Cabe apertado na ferramenta; não cabe enquanto o investidor não for contratado**	**Cabe apertado** (a ferramenta mostra folga; horas e multa pedem ajuste)

Cinco cabanas: desembolso do Capítulo 3, R$ 1.866.874 menos o terreno de R$ 250.000. Porta 3: 76.000 × 0,20 = 15.200; 91.200 × 0,15 = 13.680; 27.000 + 3 × 9.000 = 54.000; 76.000 + 15.200 + 13.680 + 54.000 = 158.880. Necessidade técnica das duas versões menores: hipótese ilustrativa do déficit da rampa, a confirmar mês a mês como no Capítulo 3.

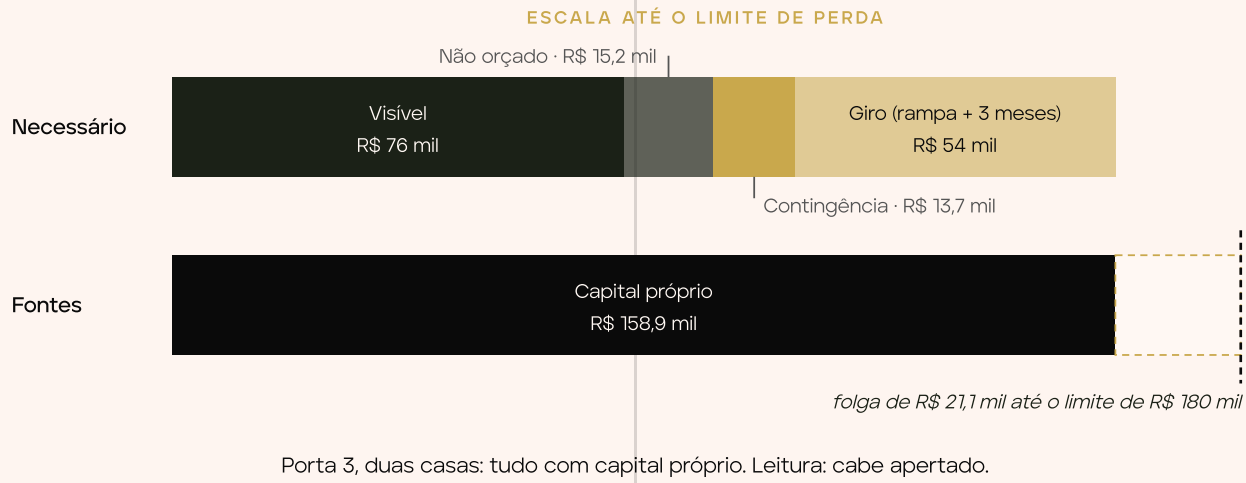


Figura 8.3 · Exemplo ilustrativo de Marina: a fase 1 pela Porta 3, o que ela precisa e de onde vem, com o limite de perda marcado.

As cinco cabanas falham duas vezes: faltam R$ 1.236.874 e a exposição passa o limite em R$ 200.000. Duas cabanas dependem 77,6% de um investidor que ela não tem, e abaixo de três unidades, avisa a Etapa 02, o fixo precisa ser muito enxuto. Marina escolhe a Porta 3. O investimento sem giro, R$ 104.880, fica abaixo do teto de R$ 150.000 do Capítulo 1, e, antes da multa, a folga de 21.120 cobriria o aporte de 20% (0,20 × 104.880 = 20.976); com a multa, não cobre.

Duas ressalvas que a ferramenta não vê. Duas casas alugadas pedem mais que as 8 horas de Marina (6 a 12 para uma, 16 a 30 para três): só cabem com a pessoa local do Capítulo 1, cujo custo precisa estar nos R$ 9.000 de fixo. E a perda máxima da Porta 3 inclui os aluguéis contratados: com aluguel hipotético de R$ 2.500 por casa e multa de três aluguéis, são mais R$ 15.000, e a perda máxima vai a R$ 173.880. Cabe no limite, mas a folga cai para R$ 6.120 e já não cobre o aporte de 20%. Leitura completa: cabe apertado.

Teste de estresse. Com a folga e os 13.680 da contingência, ela aguenta um estouro de 34.800 sobre visível e não orçado, ou 38,2% de 91.200. Mas o risco maior da Porta 3 é o aluguel fixo com ocupação baixa. Ponto de quebra: mais de oito meses sem receita (54.000 + 21.120 = 75.120, ou 8,3 meses de fixo) levam o plano além do limite. Critério de passagem para construir, escrito por ela: doze meses com uma alta e um vale, resultado positivo no conservador, viabilidade de energia em mãos e fonte da obra contratada.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael, crescer sem obra

Capital real de R$ 92.595 (Capítulo 1). Caminho do Capítulo 7: consertar, administrar dois imóveis de terceiros (R$ 6.000 de capital, R$ 400 por mês de custos), reformar um chalé por vez com caixa, ampliar depois. Limite de perda de R$ 30.000; 10 horas por semana.

- **Investimento:** visível de R$ 5.000 (fotografia, enxoval, material) mais 20% não orçado, R$ 1.000 (contrato com advogado): os R$ 6.000. Contingência de 15%, R$ 900; giro de 3 × 400 = R$ 1.200, sem necessidade técnica, porque a taxa cobre os custos dele desde a rampa (Capítulo 7). Necessário: **R$ 8.100**.
- **Fontes:** R$ 8.100 próprios; exposição bem abaixo do limite. Leitura: **cabe com folga**.

A folga é de dinheiro, não de risco: a Porta 4 depende do proprietário e do tempo. «Você escala adicionando imóveis, sem capital, limitado pela sua capacidade de operar.» A primeira decisão dos 90 dias é escrever por que alguém escolhe os chalés dele.

APLICAÇÃO

- **Jornada A · Quero começar:** rode a ferramenta com o projeto inteiro e com a menor fase 1 que já opera. Se nenhuma couber, teste a Porta 3 ou a 4 antes de desistir.
- **Jornada B · Quero crescer:** use o caixa da operação só depois de separar o giro dela (três meses de obrigações fixas, mais a necessidade técnica, se houver). Compare duas formas de crescer e fique com a de menor exposição.

O plano de 90 dias

A estrutura abaixo é do Z02, montada com ações das fontes. Cada linha é uma decisão com data, sem virar fuga: «análise sem fim é procrastinação com cara de diligência» (Volume 05).

PERÍODO	O QUE DECIDIR	EXEMPLO ILUSTRATIVO · MARINA
Dias 1 a 30	Ações de custo zero	Pedido de viabilidade de energia; convenção e zoneamento das casas
Dias 31 a 60	Números com fonte e data	Orçamento de mobília; contrato com autorização expressa, revisado por advogado
Dias 61 a 90	Decisão escrita	Assinar o plano da Porta 3; entrar em D00 e F00

Estrutura do Z02. Do Panorama: «Descubra qual precisa ser pedida primeiro e peça essa hoje.»

Fasear não é falta de ambição. É o que faz a ambição caber no caixa.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

CADERNO DO Z02

Responda com o seu caso real. As respostas ficam salvas apenas neste navegador; para guardar, use o botão de imprimir ou salvar em PDF ao final.

1. Qual porta você escolheu?

○ Construir ○ Comprar pronto e adaptar ○ Alugar para hospedar

○ Administrar o de outro ○ Crescer na operação atual

2. Qual foi a decisão do Z01, e o que ela muda neste plano?

3. O seu capital real (investível) e o seu limite de perda, com a conta.

4. A porta escolhida e por quê. Quais você descartou, e por qual filtro?

5. O que é a fase 1, e qual é o critério de passagem para a fase 2?

6. O investimento necessário em linhas: visível, não orçado, contingência, giro e total.

7. De onde vem o dinheiro, quanto de cada fonte, e o que cada uma leva em troca.

8. O resultado do teste de estresse e o ponto de quebra em uma frase.

9. Os três maiores riscos e o que você faz se cada um acontecer.

10. O plano de 90 dias: as decisões, cada uma com data.

11. Por qual pilar você começa, e por quê?

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O plano responde porta, fase 1, quanto, de onde e o que decidir em 90 dias.
- Digite o capital investível; o giro entra no necessário.
- Necessário = visível + não orçado + contingência + giro.
- Exposição (próprio mais dívida) não passa do limite de perda.
- Fonte de terceiros só é capital quando contratada.
- O problema mais grave decide; não cabe pede fasear ou mudar de porta.

Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o e-book. Depois, abra cada resposta de referência e compare.

PERGUNTAS DE RECUPERAÇÃO

1. Quais são as seis fontes do Mapa das Seis Fontes™? Quais três não têm terceiro profissional?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Qual é a diferença entre capital real e limite de perda? Por que, com pouco capital, sobram as Portas 3 e 4?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Por que fasear reduz o risco, e o que é um critério de passagem?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Exemplo ilustrativo: visível de R$ 200.000, não orçado de 30%, contingência de 20%, fixo de R$ 10.000, necessidade técnica de giro de R$ 30.000, R$ 150.000 próprios. Qual é o necessário, e quanto captar?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

5. Fontes de R$ 500.000, igual ao necessário: R$ 200.000 próprios, R$ 150.000 de dívida e R$ 150.000 de investidor. Limite de perda de R$ 300.000, giro com a necessidade técnica e três meses de reserva, 15 horas, Z01 seguir. Qual é a leitura, e o que você mudaria?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

6. Um plano tem ponto de ruptura de 38% de ocupação contra 45% estimados, conservador positivo, e no tensionado o menor saldo é – R$ 20.000, com CAPEX de R$ 800.000. Qual é a cor do semáforo, e o que você faz antes de assinar?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

ATIVIDADE APLICADA

Entregue o Plano Inicial de Desenvolvimento e Alternativas de Capital

Preencha a ferramenta e o Caderno do Z02: porta, fase 1, investimento em linhas, fontes, leitura, estresse e 90 dias. Salve em PDF e guarde no seu Dossiê. Se você tem acompanhamento da equipe Zion, leve este PDF à próxima conversa.

CRITÉRIO	PESO	O QUE SE ESPERA
Coerência entre recursos, porta, fase e fontes	40%	A leitura segue dos números; a porta passa nos quatro filtros.
Justificativa	30%	Percentuais com fonte; portas descartadas com o filtro.
Identificação de riscos	20%	Ponto de quebra e resposta a cada risco.
Clareza e próximos passos	10%	Decisões com data nos 90 dias e o pilar de entrada.

CURIOSIDADE

Num exemplo ilustrativo da Jornada do COMO: «O mesmo quarto de milhão de reais produz uma unidade em dezoito meses ou seis imóveis administrados em quatro semanas.»

REFLEXÃO

Se o seu plano desse errado no pior mês, quanto você perderia ou ficaria devendo? Esse número muda a sua vida?

DICA

Leia o plano em voz alta para alguém de fora da família. Toda frase em que você hesitar é uma premissa que ainda não está defendida.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 08

1. Releia o Caderno do Z01. O que o Plano Inicial mudou na sua decisão?

2. Explique em um minuto, a alguém de fora, por que a sua fase 1 cabe ou não.

3. Qual fonte do seu plano é a menos garantida? O que a confirmaria, e até quando?

Checklist: estou pronto para os pilares?

- [ ] Sei o meu capital investível e o meu limite de perda.
- [ ] Comparei as portas pelos quatro filtros e sei por que descartei cada uma.
- [ ] Montei o investimento necessário da fase 1, com giro.
- [ ] Defini a fase 1 e escrevi o critério de passagem para a fase 2.
- [ ] Sei de onde vem cada real e o que cada fonte leva em troca.
- [ ] Rodei o teste de estresse e escrevi o ponto de quebra em uma frase.
- [ ] Listei os riscos e o que faço se cada um acontecer.
- [ ] Tenho o plano de 90 dias com datas e sei por qual pilar começo.

PRÓXIMA ATIVIDADE

Os Marcos Zero dos pilares, começando por Doo e Foo

Com o Plano Inicial impresso, comece pelo D00, Marco Zero de Desenvolver, onde a fase 1 vira projeto, e pelo F00, Marco Zero de Financiar, onde as fontes ganham estrutura e contrato, com advogado e contador. Na Jornada B, siga depois para o pilar que o plano apontou.

APOIO

Z02

Glossário e *referências.*

Capital Real Disponível™	O que você resgata em trinta dias, menos reserva pessoal (seis a doze meses de despesas), dívidas caras e compromissos dos próximos vinte e quatro meses. Menos o capital de giro do negócio, sobra o capital para o investimento.
Limite de perda aceitável	Quanto você pode perder sem comprometer a sua vida. É esse número, e não o saldo, o seu capital de risco.
Risco suportável	Capacidade de absorver perda, diferente da disposição a correr risco. O Teste de Risco Suportável™ faz três perguntas (valor, prazo de vinte e quatro meses, aporte de mais 20%); qualquer "não" pede valor menor ou outra porta.
Porta de entrada	A forma de entrar em hospedagem. O Mapa das Quatro Portas™ traz quatro: construir, comprar pronto, alugar para hospedar e administrar o imóvel de outro.
CAPEX	Investimento necessário para construir e equipar o projeto até ele estar pronto para receber o primeiro hóspede.
Conta do Investimento Necessário™	Tudo o que sai antes de abrir, mais o que sai depois de abrir e antes de a receita cobrir, incluindo pré-operação, capital de giro e contingência.
Lista do Que Ninguém Orça™	Dez custos da operação que costumam faltar, como reposição, impostos sobre a receita, cancelamento e o seu tempo não remunerado.
Contingência	Reserva para o desvio de toda obra ou adequação. As fontes usam faixas e bases diferentes: declare a sua. A não usada vira capital de giro.
Capital de giro	Dinheiro para pagar a operação enquanto a receita não cobre os custos: déficit da rampa, reserva da baixa temporada e margem de três meses de custo fixo.
Rampa	Da abertura à ocupação de regime, em doze a dezoito meses (Curva de Rampa do Primeiro Ano™). Consome caixa.
Fase e gate	Fase um é o menor conjunto que já opera e gera caixa. Gate é o que precisa estar comprovado, por escrito, para a fase seguinte começar.
Adiamento legítimo	Adiar com razão nomeada, condição verificável e data aproximada. O contrário é o adiamento indefinido.

Mapa das Seis Fontes™	Capital próprio, pessoa física do seu círculo, comprador de unidade, dívida bancária, fomento ou crédito direcionado e investidor.
Capital próprio	O mais barato em dinheiro e o mais caro em risco, porque concentra.
Custo Real do Capital™	Cinco componentes: juro, diluição, garantia, tempo e liberdade.
Equity	Capital que entra em troca de participação no negócio. Leva resultado, decisão, informação e a sua saída.
Dívida	Capital que entra em troca de juros e devolução. O Mapa de Dívida Zion™ olha carência, prazo total, garantia (o aval pessoal pode alcançar a sua casa) e cobertura do serviço da dívida.
Carência	Período antes de pagar. A de principal (só juro) é comum; a total é rara. Em obra, pesa mais que a taxa.
Sócio investidor	Entra com dinheiro; você, com projeto e execução. Decide quanto valor você criou antes de vender participação.
Permuta	Dar parte do empreendimento em troca do terreno. Exige projeto estruturado e avaliação aceita pelos dois lados.
Arrendamento	Três sentidos nas fontes: arrendar a terra de outro para testar sem imobilizar capital; arrendar o seu empreendimento a quem paga valor fixo e fica com o risco; e a porta alugar para hospedar (Capítulo 5).
Pré-venda	Vender diárias, cotas ou unidades antes de abrir. Entra como caixa, mas é obrigação a entregar.
Condo-hotel	Cada unidade tem dono diferente e a operação é única (pool de locação). O comprador da unidade financia a obra.
Multipropriedade	Várias pessoas donas da mesma unidade, com semanas definidas.
Contrato de gestão	Outra empresa opera e divide a receita. Permite ter o ativo sem tocar a operação.
Régua do Quanto Captar™	CAPEX da fase, giro, reserva de implantação, custo da captação e terreno não pago, menos o capital próprio contratado.

Teste dos Três Cenários™	Conservador, base e otimista. O conservador (diária 10% e ocupação 20% abaixo do base) precisa funcionar.
Teste de estresse	No Teste de Estresse Zion™, os cenários base, conservador e tensionado movem várias variáveis juntas. Pergunta se o projeto atravessa, não quanto rende.
Ponto de quebra	A combinação, em uma frase, em que o projeto deixa de funcionar.
Caixa acumulado	Soma mensal do resultado menos os desembolsos de CAPEX. Na Curva de Caixa Acumulado™, o menor saldo decide; colchão saudável: ao menos 10% do CAPEX.
Plano Inicial	O entregável do Z02: porta, fase, investimento, fontes, testes e próximos noventa dias.

Fontes

- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 01: Como eu sei se isso é para mim?*. Outubro de 2026.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 02: Como eu sei se dá certo aqui?*. Outubro de 2026.
- Zion. *Volume 05 · Investimento*. Duas edições (Zion Hotel Academy, primeira edição, outubro de 2026; e Zion Hospitality Academy). 2026.
- Zion. *A Ordem das Coisas*. 2026.
- Zion. *Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro*. Outubro de 2026.
- Zion. *Manual Oficial do Método Zion 360°*. 2026.
- Os exemplos numéricos identificados como ilustrativos foram criados para fins didáticos ou extraídos das fontes acima, onde também são ilustrativos.

Para conferir no seu caso

Antes de assinar, captar ou comprometer capital, verifique pelo menos:

- Contratos, garantias e avais, com advogado, antes de assinar.
- O regime tributário, os impostos sobre a receita e a estrutura societária, com contador.
- Na porta alugar para hospedar, o contrato de locação, com autorização expressa, e a Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).
- O cadastro de prestadores de serviços turísticos (Cadastur), previsto na Lei nº 11.771/2008, a Lei Geral do Turismo.

- Em apartamentos e condomínios, a convenção do condomínio.
- Qualquer captação de terceiros (sócio, investidor, pré-venda, condo-hotel, multipropriedade), com advogado, antes de oferecer.

Em todos os casos, confirme com profissional habilitado e com os órgãos do seu município.

Este material é educativo. Ele não constitui consultoria jurídica, ambiental, contábil, financeira ou de investimento, e não promete retorno, ocupação, valorização, aprovação de crédito ou de licença, parcerias ou investidores. Os exemplos numéricos são ilustrativos. Decisões de compra, investimento, captação e questões legais devem ser validadas com profissionais habilitados.
